

システムバス 御見積書

御名前 沖縄-那覇SR SB2プレデンシア 様

業者 様

商品名 PREDECENCIA プレデンシア

作成日 2023年8月7日
プラン番号 5601A-2305-0724T
現場番号 C2700601

タカラスタANDARD株式会社
◆沖縄支店 販売課
沖縄県那覇市真地166-1
TEL 098-835-6666 / FAX 098-835-6655

◆那覇ショールーム
TEL 098-835-6688 / FAX 098-888-4444

商品
御見積金額 **¥2,141,000 (税込 ¥2,355,100)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥361,300 (税込 ¥397,430)**

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616(AL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	グランベージュ
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	プレシャスホワイト
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽
カウンター材質	クォーツストーン
カウンター/下カバーカラー	プランソルベ / ホワイト
浴槽前カウンターカラー	—
エプロン材質/カラー	ステンレス / ベージュ
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	パールミルフィーク
パネルカラー(周辺)	ツイードベージュ
ガス種 / 周波数	未定 / 60Hz

◆ 御確認事項

- ★本見積書は商品代金とその搬入・組立・設置費に関するものです。給排水(止水栓含む)、ガス、ダクト、電気の事前配管・事後接続工事及び、商品取付面下地(補強)、コア抜き工事等建設業区分工事全般は別途工事になりますので御了承下さい。
- ★御見積書有効期間は30日です。過ぎている場合は仕様・価格の確認をお願い致します。
- ★ユニット等の特殊搬入費が発生する現場は、別途費用が発生致しますのでご了承下さい。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

- ※階上設置の場合、別途搬入費が発生する可能性があります。
- ※組付費は別途となっております。

--	--

No.*

御名前 沖縄-那覇SR SB2プレデンシア

様

現場番号	C2700601	プラン番号	5601A-2305-0724T	作成日	2023/8/7
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1616サイズ		1	1,219,000	1,219,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	開き戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(20サイズ)	1	+14,500	+14,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・全面デザインプレミアムクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・グランベージュ)	1	+20,000	+20,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(プレシャスホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ベージュ)	1		
11	浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	あり クッションピロー:ホワイト	1	+199,000	+199,000
14	うるぼか湯	なし	1		
15	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
16	ガス温水式床暖房	なし	1		
17	洗い場用水栓	プッシュ式水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB280	1	+71,000	+71,000
18	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド(節水+手元止水)	1		
19	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
20	カウンター	クォーツストーンカウンター(ラグジュアリーライトあり)	1	+89,000	+89,000
21	カウンター	クォーツストーンデュアルカウンター	1	+138,000	+138,000
22	浴槽前間接照明	ラグジュアリーライト	1	+13,500	+13,500
23	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
24	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザインプレミアム)(Kパネル)	1	+85,000	+85,000
25	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
26	天井	カラーフラット天井(ベージュ)	1		
27	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ホワイト	1	+45,500	+45,500
28	換気機器	ランドリーパイプメタルタイプ(1本)	1	+1,500	+1,500
29	換気機器開口	工場開口	1		
30	照明	ストレートライン照明(調光機能付・ラグジュアリーミラー/ライト対応用)	1	+91,000	+91,000
31	天井照明開口	工場開口	1		

御名前 沖縄-那覇SR SB2プレテンシア 様

現場番号	C2700601	プラン番号	5601A-2305-0724T	作成日	2023/8/7
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	ミラー	ラグジュアリーミラー(全幅タイプ)	1	+117,000	+117,000
33	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
34	タオル掛け	クリアタイプ クリア	1		
35	ハンドバー	ステン I型600タイプ	1	+9,000	+9,000
36	収納棚	収納棚なし	1	-17,000	-17,000
37	風呂フタフック	風呂フタフック(固定式)(ホワイト)	1	+4,000	+4,000
38	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
39	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
40	トラップカバー	なし	1		
	システムバス搬入費	現場搬入	1	+3,500	+3,500
システムバス合計			41		¥2,141,000

商品総合計	41	¥2,141,000
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥361,300 (税込 ¥397,430)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

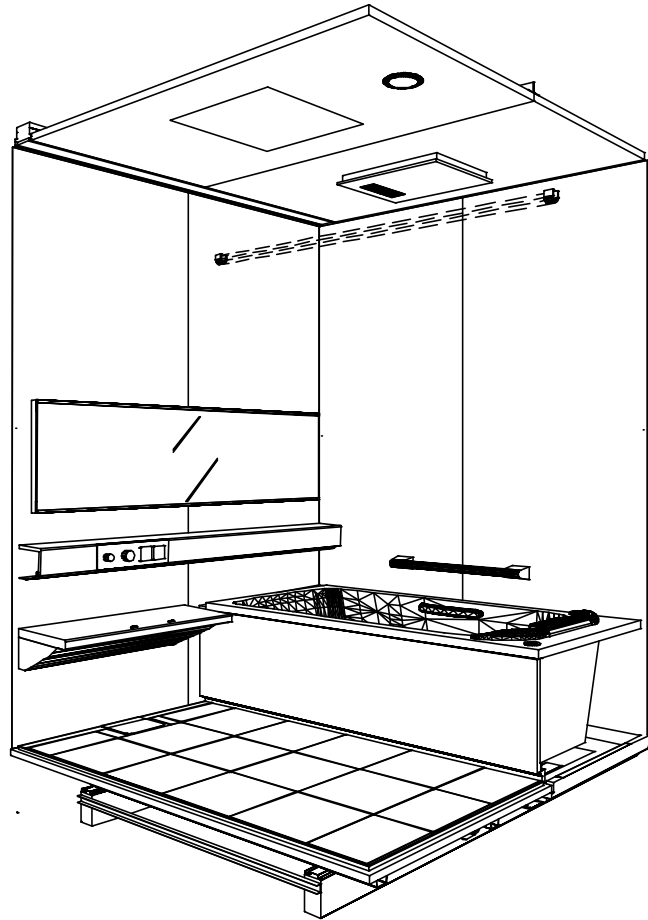

鳥瞰図

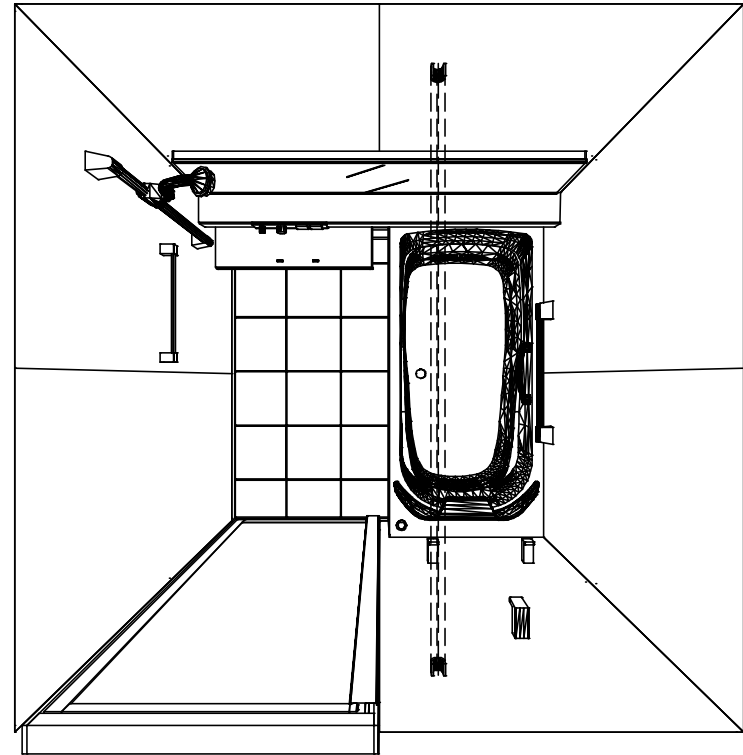

1616

フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

Takara standard
 タカスタンダード株式会社

現場名称： 沖縄-那覇SR SB2アプレシア様邸

現場番号： C2700601

沖縄支店 販売課

PREDECENCIA プレデンスシア

プラン番号： 5601A-2305-0724T


担当営業：

姿図



作成日： 2023年8月7日

担当アドバイザー：


縮尺：A3サイズ等倍




■留意事項
 *印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

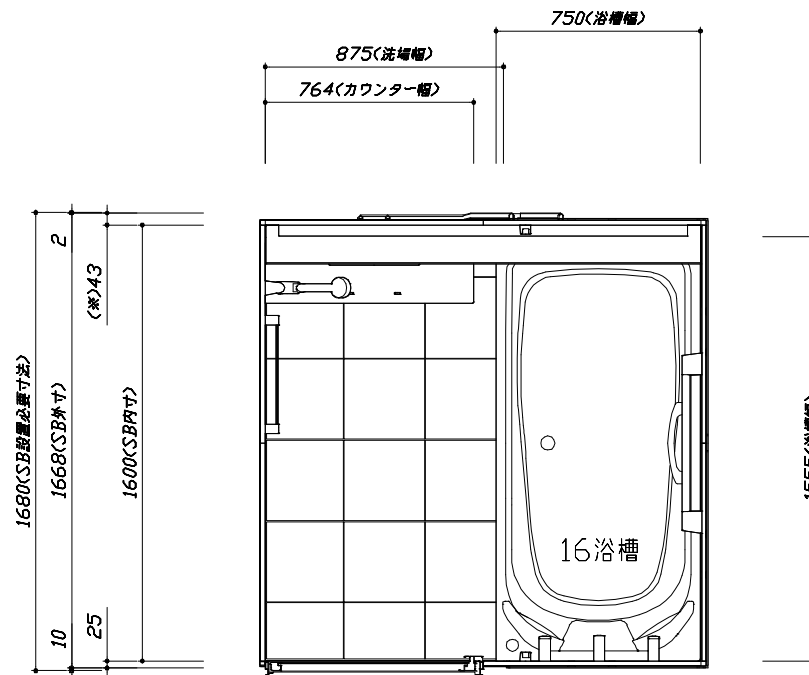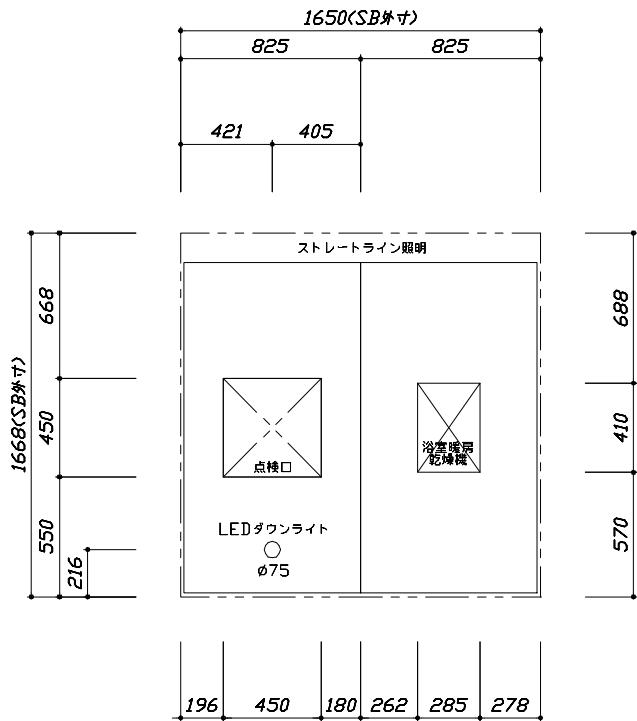

<天井伏図>

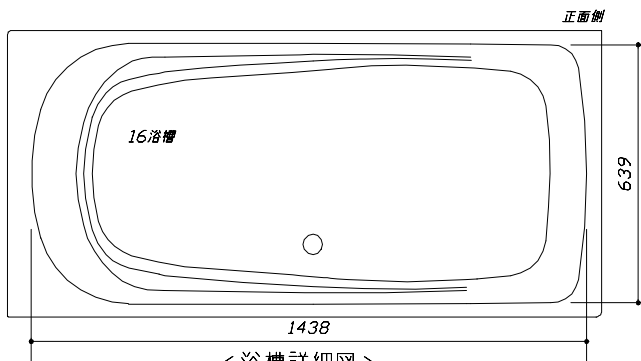

<浴槽詳細図>



<平面図>

Takara standard
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 沖縄-那覇SR SB2アレッソ様邸
 現場番号： C2700601
 沖縄支店 販売課



PREDECENCIA プレデンスシア
 プラン番号： 5601A-2305-0724T
 担当営業：

施工図1 縮尺： 1:25,20
 作成日： 2023年8月7日
 担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法をご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

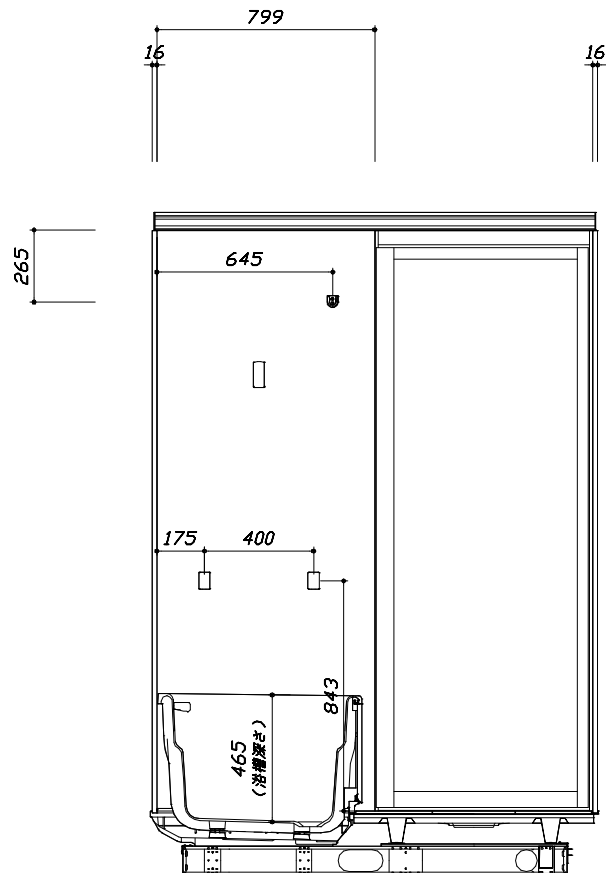

<カウンター対面図>

■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)

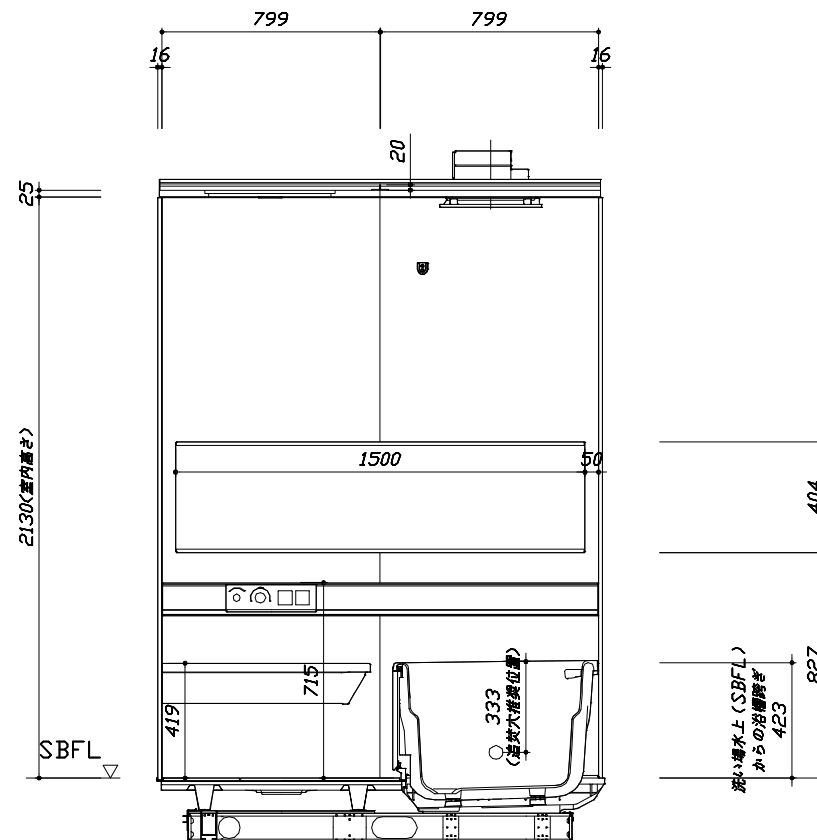

<カウンター面図>

Takara standard
 タカラストANDARD株式会社

現場名称： 沖縄-那覇SR SB2アレスシア様邸
 現場番号： C2700601
 沖縄支店 販売課



PREDECIA プレデンスシア
 プラン番号： 5601A-2305-0724T
 担当営業：

施工図2 縮尺： 1:20
 作成日： 2023年8月7日
 担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法をご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

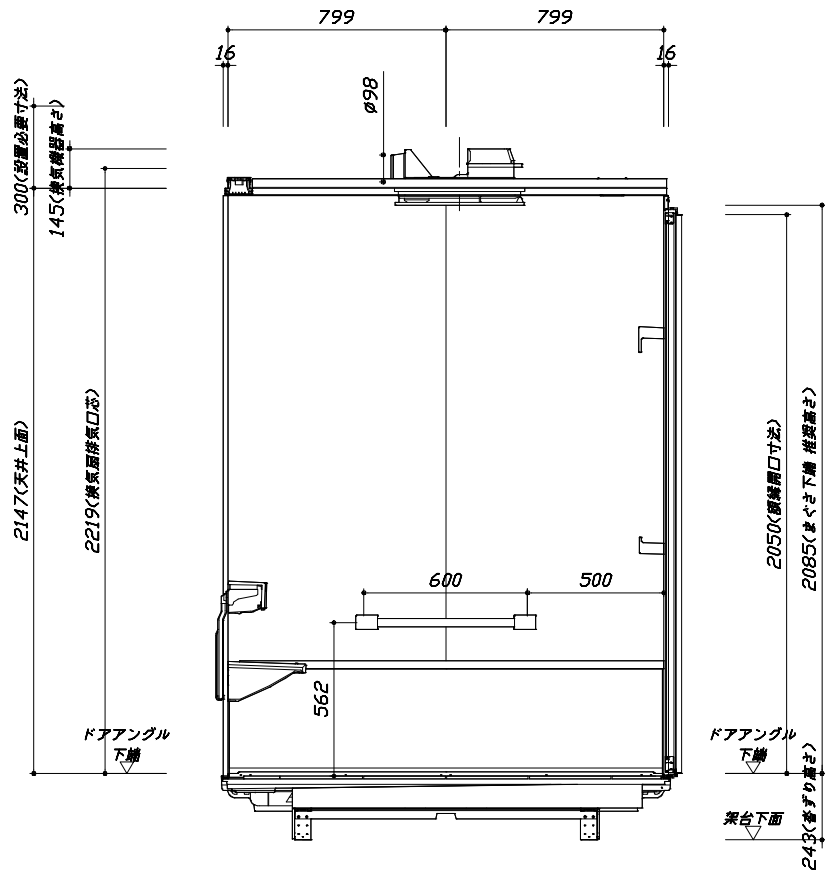

< 浴槽側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)

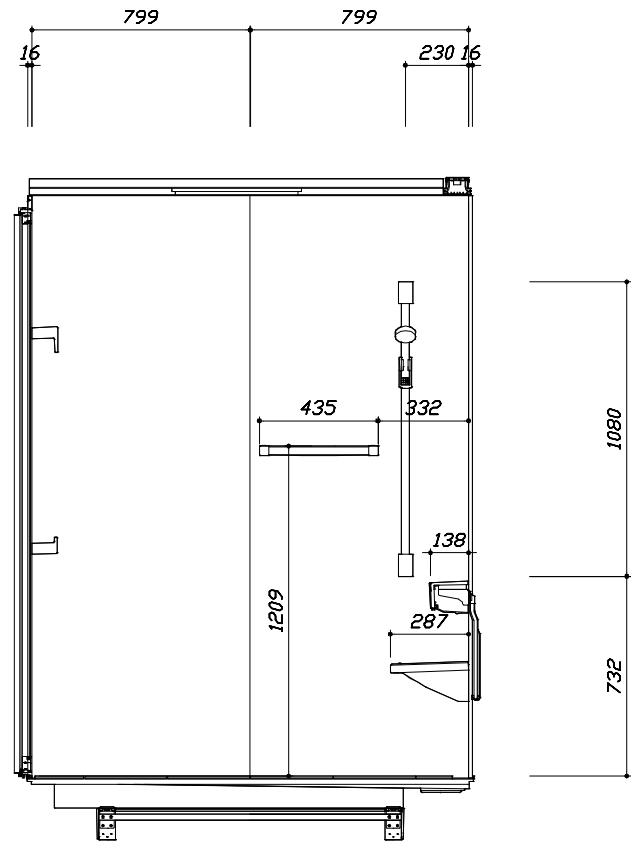

< 洗場側面図 >

Takara standard
 タカラストANDARD株式会社

現場名称： 沖縄-那覇SR SB2プレデンス様邸
 現場番号： C2700601
 沖縄支店 販売課

PREDECENCIA プレデンスア
 プラン番号： 5601A-2305-0724T
 担当営業：

施工図3 縮尺： 1:20
 作成日： 2023年8月7日
 担当アドバイザー：

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	AL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	鋳物ホーロー 裏面保温材・高断熱仕様(発泡ウレタン)
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽 グリップ付(325リットル) 追い焚き穴：あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂(FRP)
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材(発泡ポリエチレン)
カウンター	クォーツストーンデュアルカウンター：クォーツストーン カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	化粧パッドイッチャー(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリアドア：20高さ開き戸(アルミ框/樹脂ガラス/ﾀﾞｲﾌﾞﾙ換気口)
窓1	－
窓2	－
窓枠1	－
窓枠2	－
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂 浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	410kg

アクセサリ仕様表



ミラー	ラグジュアリーミラー くもり止め加工(13W)
収納棚	－
タオル掛け	クリアタイプ：アクリル樹脂製
洗場側水栓	ブッシュ式・サーモスタット(SB280RABNS(H)) (樹脂ホース：ﾀﾞｲﾌﾞﾙ調)
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ) (ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ-T1020S MH)
照明	ストレートライン照明(LED 23.7W調光機能付) ラグジュアリーライト(3.4W)
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V・最大消費電力1250W) (ﾀﾞｲﾌﾞﾙ外径φ98) (常時換気対応品) ホワイト
フロタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	ステンレスタイプ I型600タイプ
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	WP：プレシヤスホワイト
カウンター	H：ブランソルベ
ﾊﾞｯｼﾞ(ｶｳﾝﾀｰ面)	JDN：パールミルフィーク
ﾊﾞｯｼﾞ(周辺・3面)	JDT：ツイードベージュ
水栓上部ｶｯﾀﾞ	－
浴槽エプロン	D：ベージュ
洗場	PD：グランベージュ
ドア	W：ホワイト
収納棚	－
タオル掛け	クリアタイプ(クリア)
ﾗﾝﾄﾞﾘｰｾｯﾄ	M：メタル

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

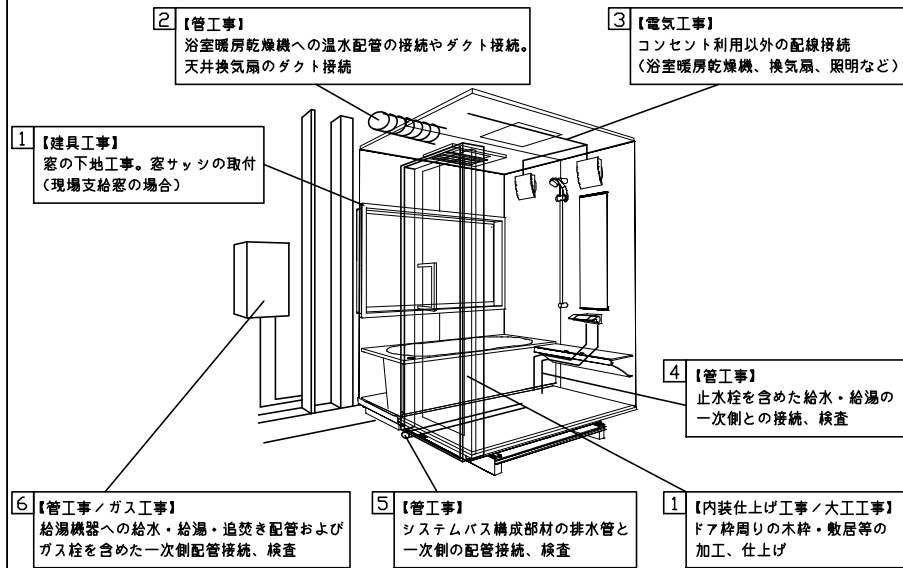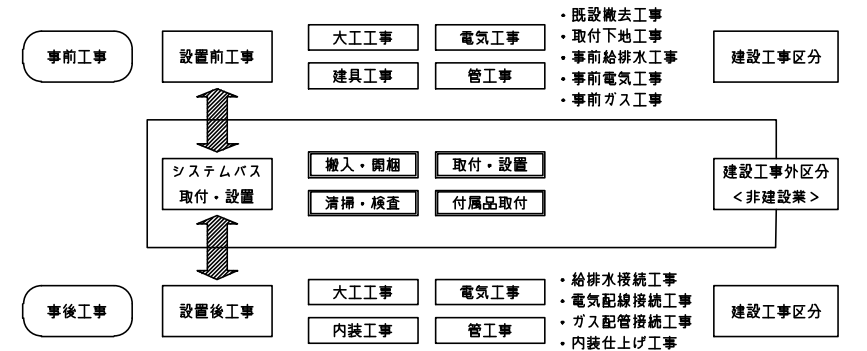

■システムバス 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事					建設工事外		作業内容				
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置					
設置前工事	1 2 3	大工 土 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事				
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事				
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事				
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工				
電気	給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事						
	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事						
システムバス 本体取付・設置	建設工事 外区分	建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	□	浴室専用の架台・浴槽パン、洗い場を所定の位置に設置				
			浴室専用排水トリアップ・配管セットの取付・設置							□	□	洗い場・浴槽パンへの排水トリアップ取付			
			壁パネルの組立・設置								□	□	浴室パネル部材の加工と組立		
			天井・浴槽の組立・設置								□	□	天井部材・浴槽部材の取付		
			内装品、器具類の取付・設置【注記1】									□	□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付	
			水栓類の組立・取付【注記1】									□	□	水栓類の組立、浴室部材への取付	
			浴室専用換気機器の取付【注記1】									□	□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付	
			風呂追焚き部品の取付【注記1】								□	□	循環追焚き金具の取付		
			浴室内給湯機器用リモコンの取付								□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付		
			浴室照明器具の取付									□	□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付	
			その他浴室関連電化機器の取付【注記1】									□	□	電化品、オプション品の取付	
			浴室ドアの組立・取付									□	□	システムバス構成部材のドアの組立・取付	
			浴室窓サッシの取付【注記1】									□	□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付	
			浴室窓枠の組立・取付【注記1】									□	□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付	
			シリコンの充填									□	□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填	
			試運転・完成検査【注記2】									□	□	完成後の試運転、性能確認検査	
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ		○						○	建築壁の躯体加工作業			
			排気ダクトの敷設工事									○	浴室換気機器のダクト敷設工事		
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事										○	建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
	4 5 6	管	浴室換気機器の電気・アース接続工事										○	建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付											○	建築の外装仕上げ工事
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事											○	給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
1 3	電気 他	建築側排水配管との接続工事【注記3】											○	浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
		給湯機器本体工事(試運転・確認)												○	機器の設置工事(ガス、電気工事を含む)
		内装仕上げ工事												○	床、ドア細修、脱衣室仕上げ工事
1 3	電気 他	浴室用電源配線、接続工事												○	浴室機器の事後電気工事
		浴室天井裏の電源、スイッチ工事													○

※【注記1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
 ※【注記2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
 ※【注記3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。




■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。


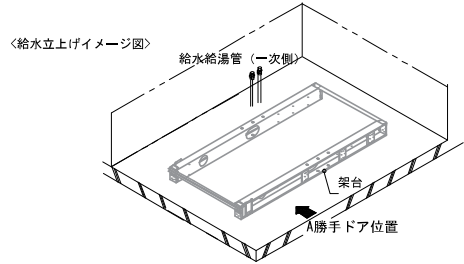


■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より 26.5mm 下がりで打設してください。


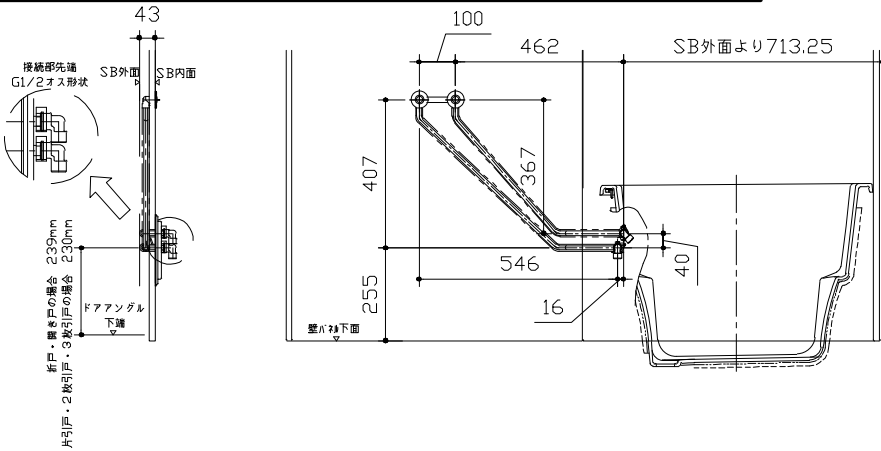


〈給水給湯管取合詳細図〉

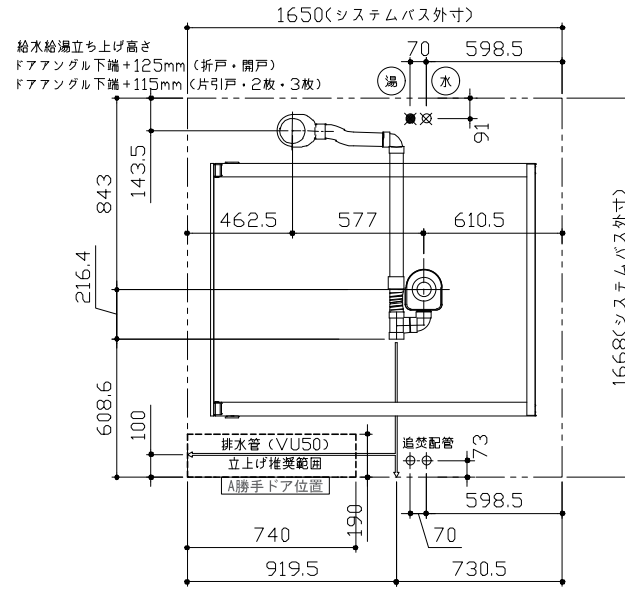

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置



〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

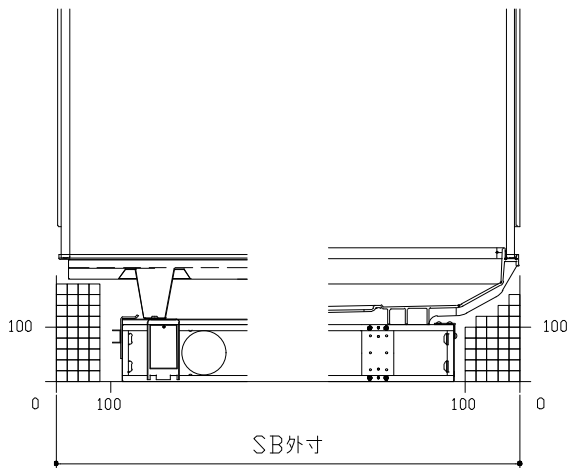

B矢視




A矢視

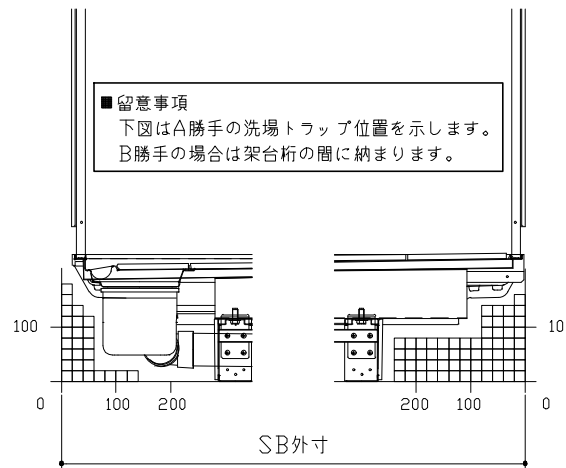

D矢視



C矢視

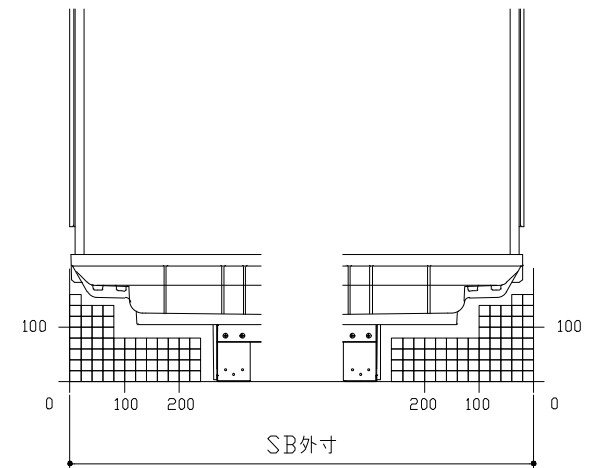

F矢視

E矢視

キープクリーンドア：開き戸・タテ型換気口

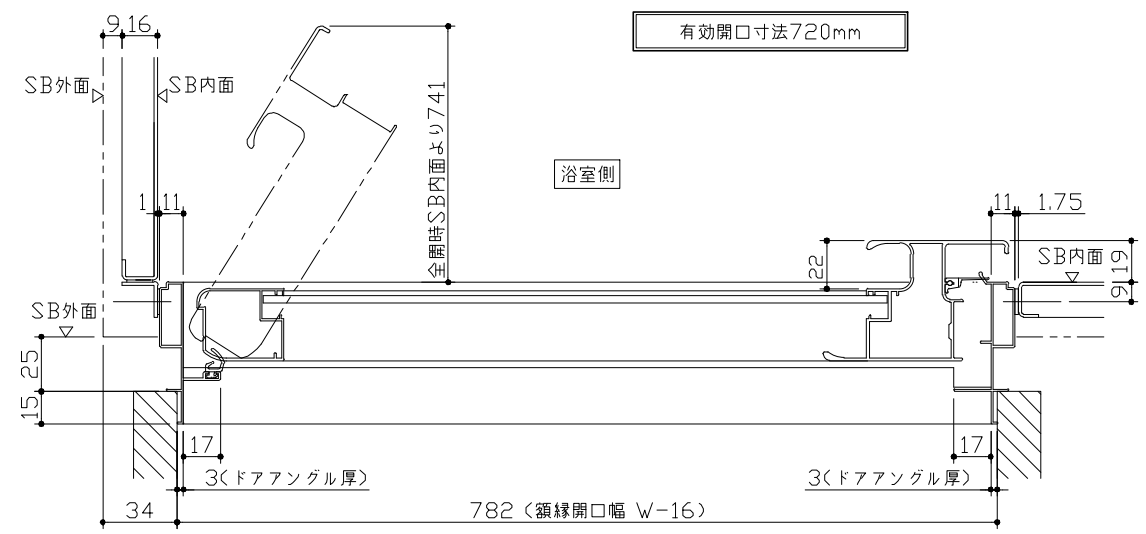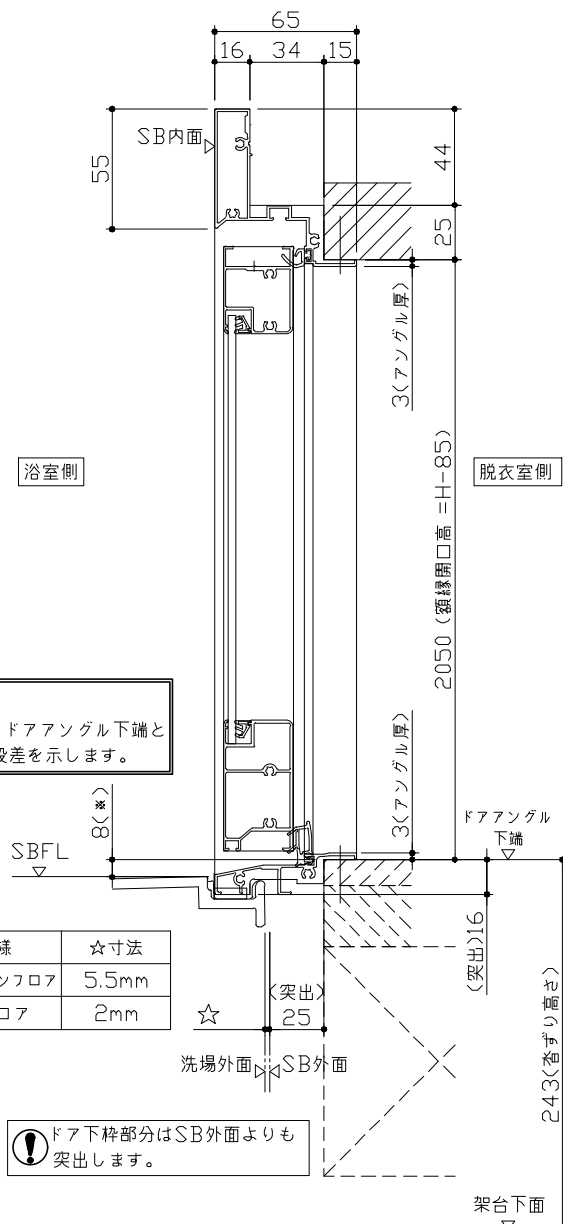


ドア開き角度65°以上でタオル掛けと干渉の恐れがあります。


■留意事項
*印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。


ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

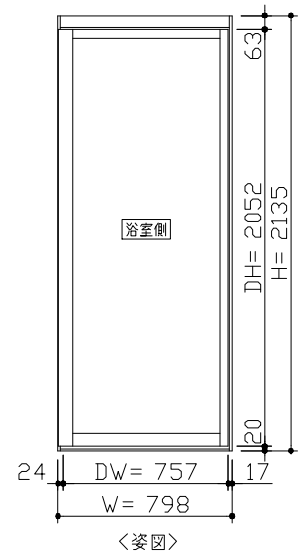

■ドア横の管柱、間柱について
・ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
・躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。








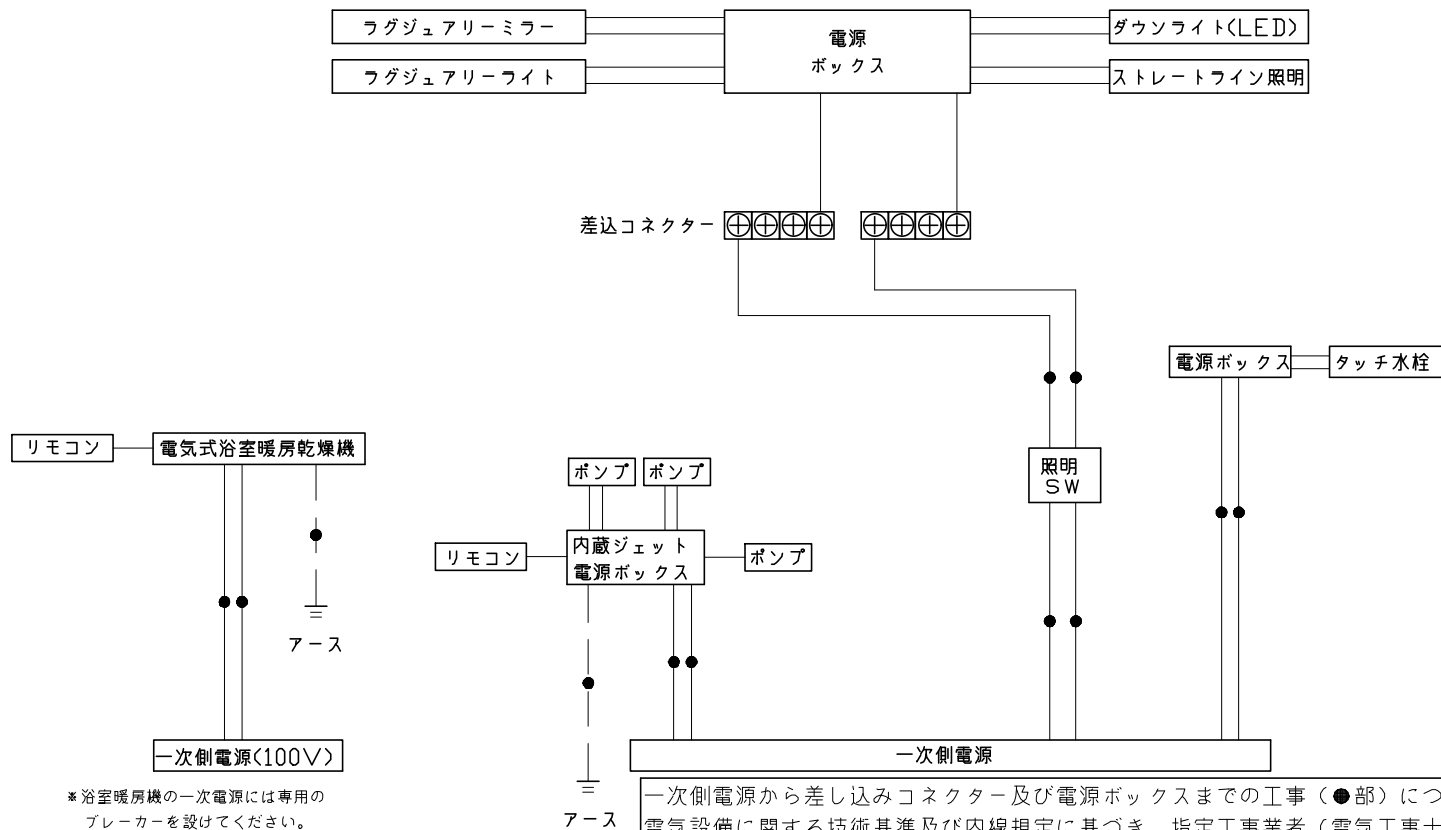


*浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。


アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

Takara standard タカラストANDARD株式会社	現場名称： 沖縄-那覇SR SB2プレジデンシア様邸	PREDENCIA プレデンスシア	電気配線図
	現場番号： C2700601	プラン番号： 5601A-2305-0724T	作成日： 2023年8月7日
	沖縄支店 販売課	担当営業：	担当アドバイザー：

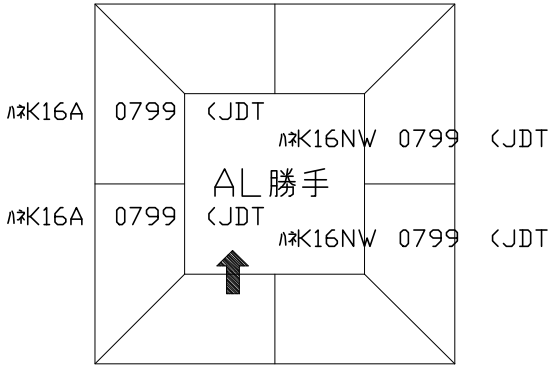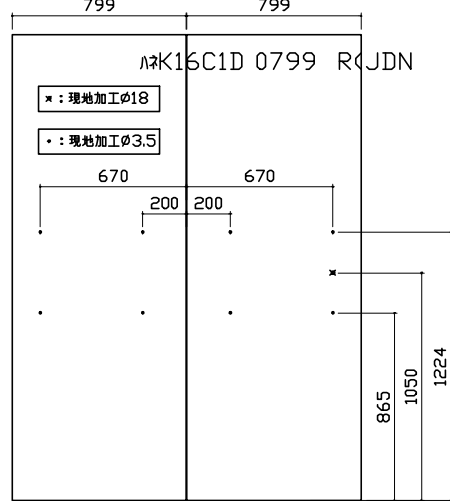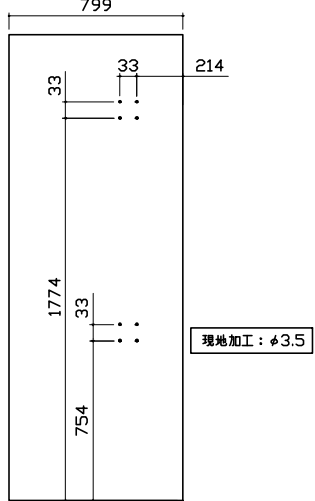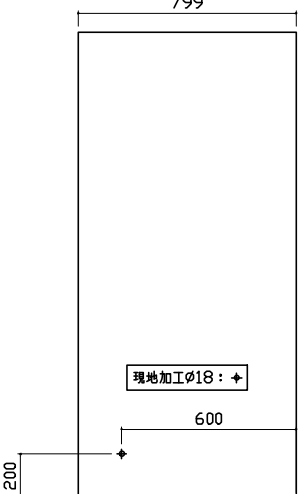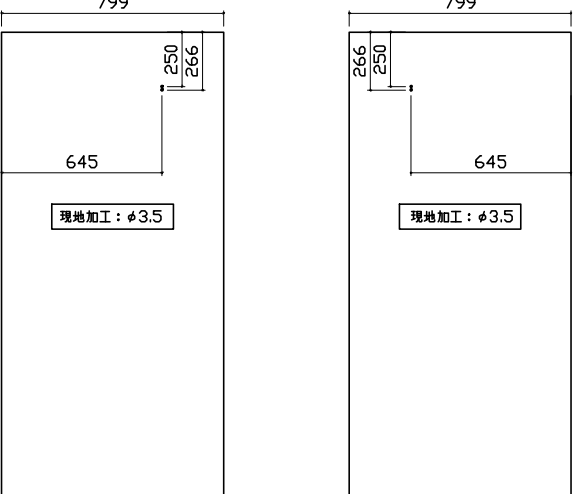パネル割図	ミラー	シャワーフックスライドバー	
<p>パネル割図</p> <p>ΛK16C2D 0799 L<JDN</p> <p>ΛK16C1D 0799 R<JDN</p> <p>ΛK16A 0799 <JDT</p> <p>ΛK16A 0799 <JDT</p> <p>ΛK16NW 0799 <JDT</p> <p>ΛK16NW 0799 <JDT</p> <p>AL勝手</p> <p>ΛK16AD 0799 <JDT</p> 	<p>ミラー</p> <p>ΛK16C2D 0799 L<JDN</p> <p>ΛK16C1D 0799 R<JDN</p> <p>※: 現地加工φ18</p> <p>●: 現地加工φ3.5</p> <p>799</p> <p>799</p> <p>670</p> <p>670</p> <p>200</p> <p>200</p> <p>865</p> <p>1050</p> <p>1224</p> 	<p>シャワーフックスライドバー</p> <p>ΛK16A 0799 <JDT</p> <p>799</p> <p>33</p> <p>33</p> <p>214</p> <p>1774</p> <p>33</p> <p>754</p> <p>現地加工: φ3.5</p> 	
ラグジュアリーライト	ランドリーパイプ	タオル掛け	
<p>ΛK16C1D 0799 R<JDN</p> <p>799</p> <p>200</p> <p>600</p> <p>現地加工φ18: +</p> 	<p>ΛK16AD 0799 <JDT</p> <p>ΛK16C1D 0799 R<JDN</p> <p>799</p> <p>645</p> <p>250</p> <p>266</p> <p>現地加工: φ3.5</p> <p>799</p> <p>645</p> <p>266</p> <p>250</p> <p>現地加工: φ3.5</p> 	<p>ΛK16A 0799 <JDT</p> <p>799</p> <p>450</p> <p>50</p> <p>1200</p> <p>現地加工: φ3.5</p> <p>■ 留意事項 ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。</p> 	
<p>Takara standard</p> <p>タカラスタンダード株式会社</p>	<p>現場名称: 沖縄-那覇SR SB2プレデンス様邸</p> <p>現場番号: C2700601</p> <p>沖縄支店 販売課</p>	<p>PREDENCIA プレデンスア</p> <p>プラン番号: 5601A-2305-0724T</p> <p>担当営業: </p>	<p>穴開け指示図 1/2</p> <p>作成日: 2023年8月7日</p> <p>担当アドバイザー: </p>

風呂蓋収納

※K16AD 0799 (JDT)

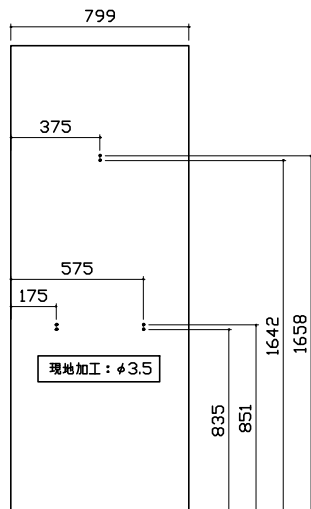

■留意事項
タオルカケ・ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。
