

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 東京-足立SR SB11 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランspa

作成日 2025年6月1日
プラン番号 1444N-2506-0018T
現場番号 C4330531

タカラスタンダード株式会社
◆東京東営業所
東京都足立区西加平2丁目7番12号
TEL 03-5990-5230 / FAX 03-5908-1282

◆足立ショールーム
TEL 03-3860-0297 / FAX 03-3860-0298

商品
御見積金額 ￥763,000 (税込 ￥839,300)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥152,000 (税込 ￥167,200)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1317(AL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームダークグレー
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	クリスタルパールホワイト
浴槽形状	セミスクエア浴槽
カウンター材質	ー
カウンター/下カバーカラー	ー
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	グレイジュアッシュ
パネルカラー(周辺)	グレイジュアッシュ
ガス種 / 周波数	未定 / 50Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
佐々木	五ヶ山	五ヶ山

◆ 備考

--	--

No.*

御名前 東京-足立SR SB11

様

現場番号	C4330531	プラン番号	1444N-2506-0018T	作成日	2025/6/1
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1317サイズ		1	735,000	735,000
2	架台	低床タイプ ボルト脚架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・周辺ハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームダークグレー)	1		
7	排水口カバー	ステンレス	1		
8	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(クリスタルパールホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
11	浴槽形状	人大セミスクエア浴槽	1		
12	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
13	うるぽか湯	なし	1		
14	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
15	浴槽パン	あり	1		
16	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)KF9032HT 水栓上部カウンター(チャコールグレー)	1	-8,000	-8,000
17	洗い場用水栓	エコシャワー(節水+手元止水):KF9032HTAB	1	+6,500	+6,500
18	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
19	カウンター	カウンターなし(洗い場1水栓)	1	-40,000	-40,000
20	シャワーフックスライドバー	なし	1	-5,000	-5,000
21	フレキシブルシャワーホルダー	あり	1	+10,000	+10,000
22	浴室パネル	ハイクラス(全面デザイン 周辺ハイクラス)(Fパネル)	1	+40,000	+40,000
23	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
24	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
25	換気機器	天井換気扇ブラック	1	+3,000	+3,000
26	換気機器開口	工場開口	1		
27	照明	ダウンライト照明(3灯)(白色)	1	-3,000	-3,000
28	天井照明開口	工場開口	1		
29	ミラー	ロングクリアミラー	1		
30	風呂フタ	断熱風呂フタ	1	+3,000	+3,000
31	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000

御名前 東京-足立SR SB11 様

現場番号	C4330531	プラン番号	1444N-2506-0018T	作成日	2025/6/1
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	ハンドバー	メタル I型600タイプ	1	+9,000	+9,000
33	収納棚	収納棚なし	1		
34	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
35	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
システムバス合計			35		¥763,000
商品総合計			35		¥763,000

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥152,000 (税込 ¥167,200)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

パース

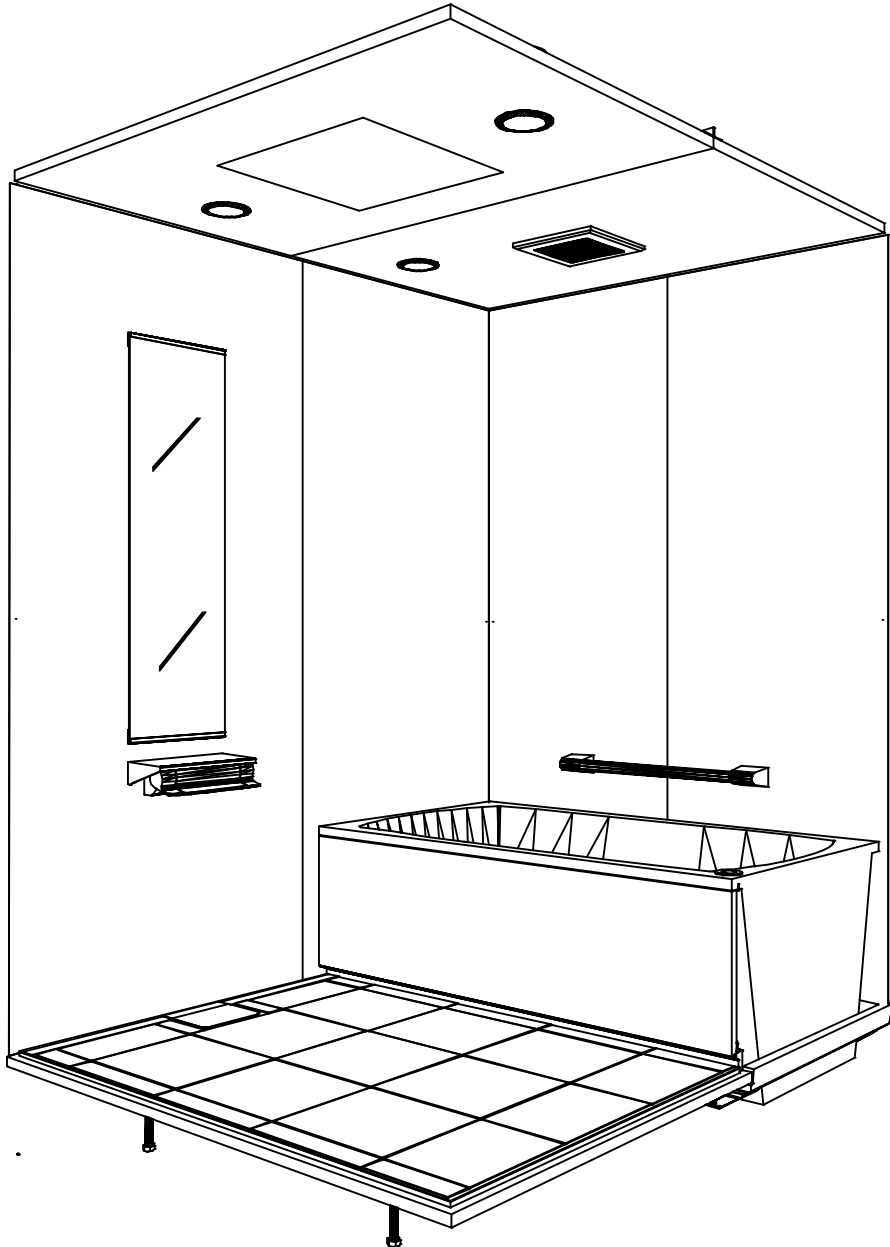

鳥瞰図

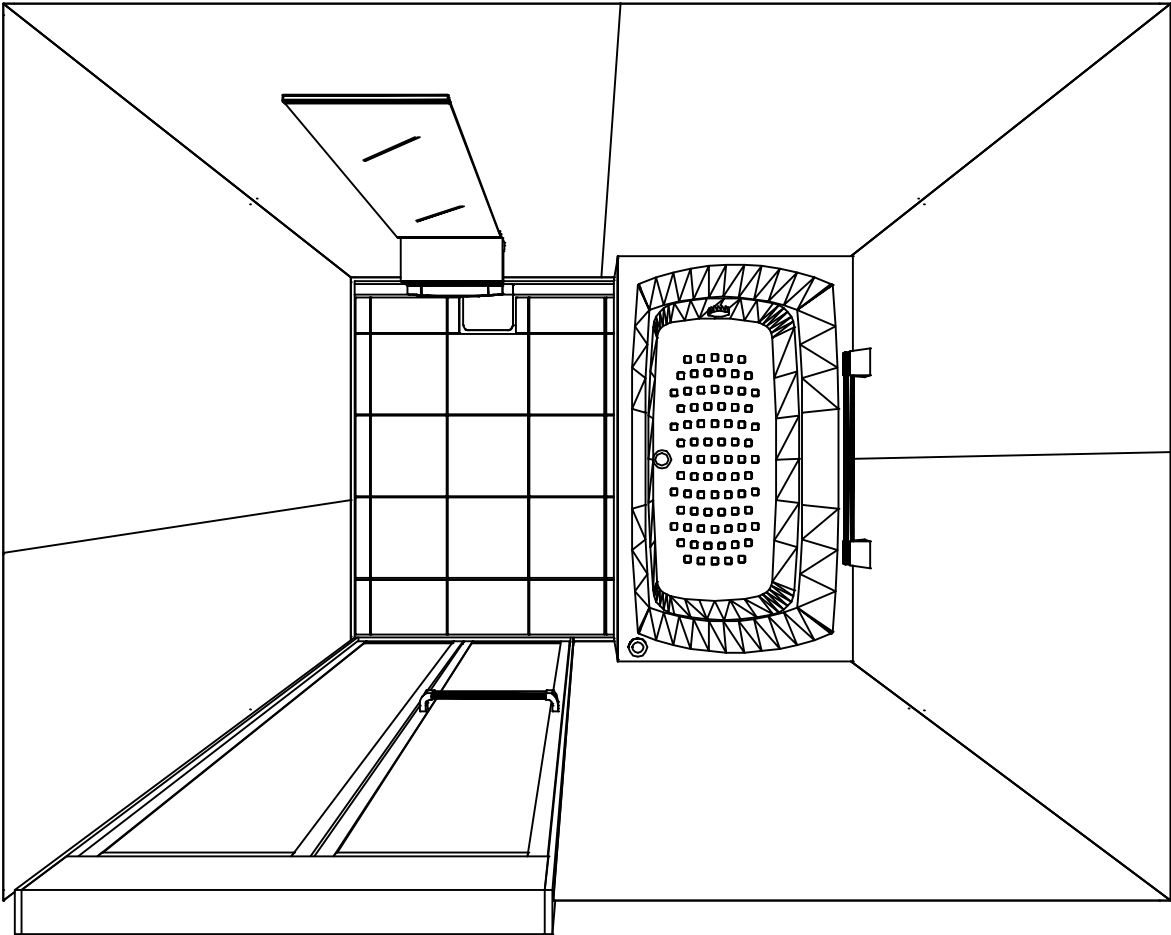

1317

フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： 東京-足立SR SB11様邸	GRANSPA グランspa	姿図	
現場番号： C4330531	プラン番号： 1444N-2506-0018T	作成日： 2025年6月1日	
東京東営業所	担当営業： 佐々木	担当アドバイザー： 五ヶ山	

カウンター面


洗場側面

浴槽側面


カウンター対面

■ 留意事項



* 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

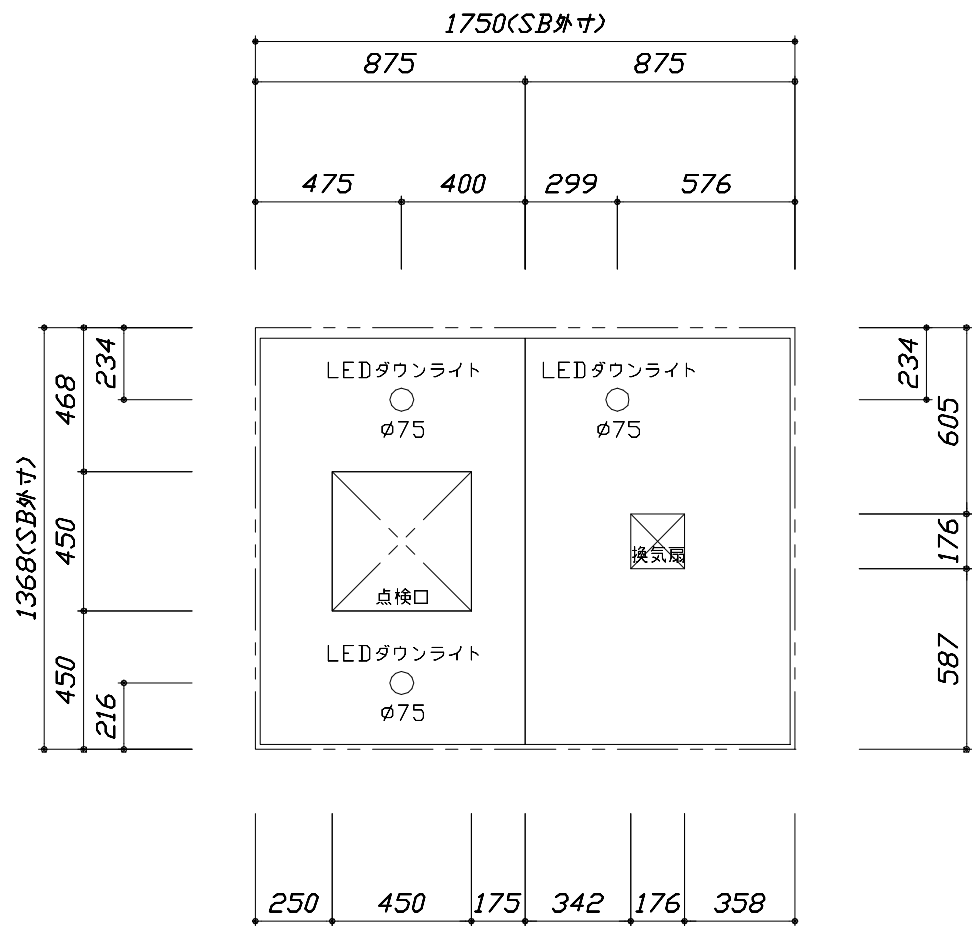

< 天井伏図 >

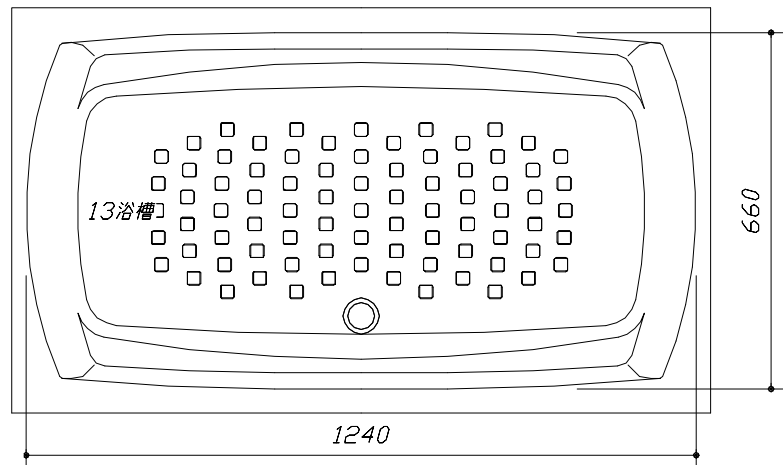


< 浴槽詳細図 >

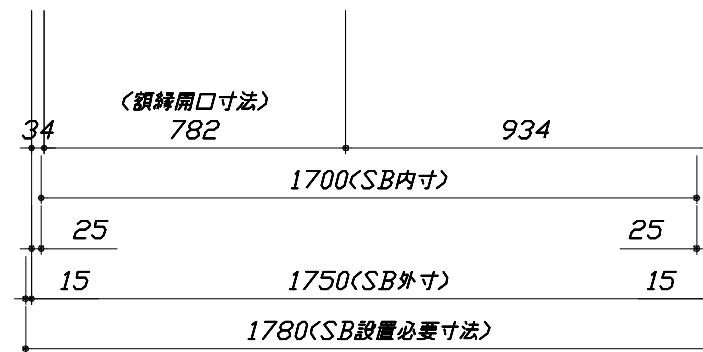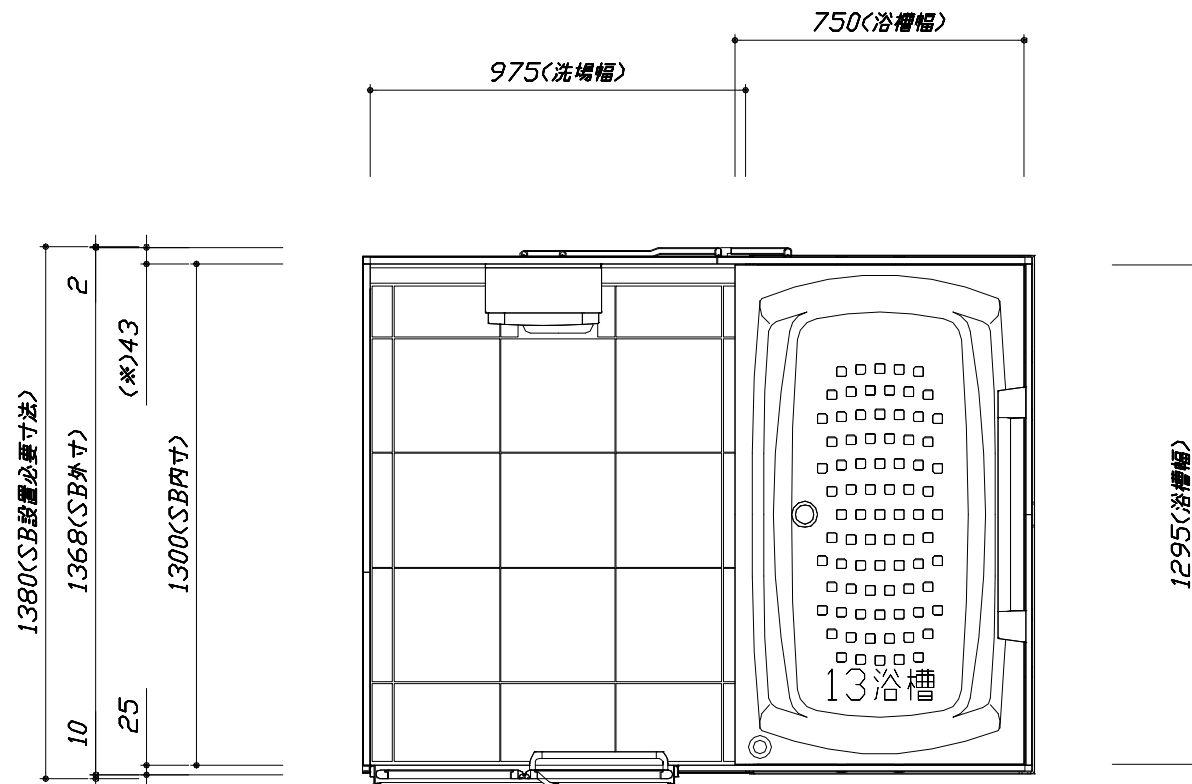

< 平面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

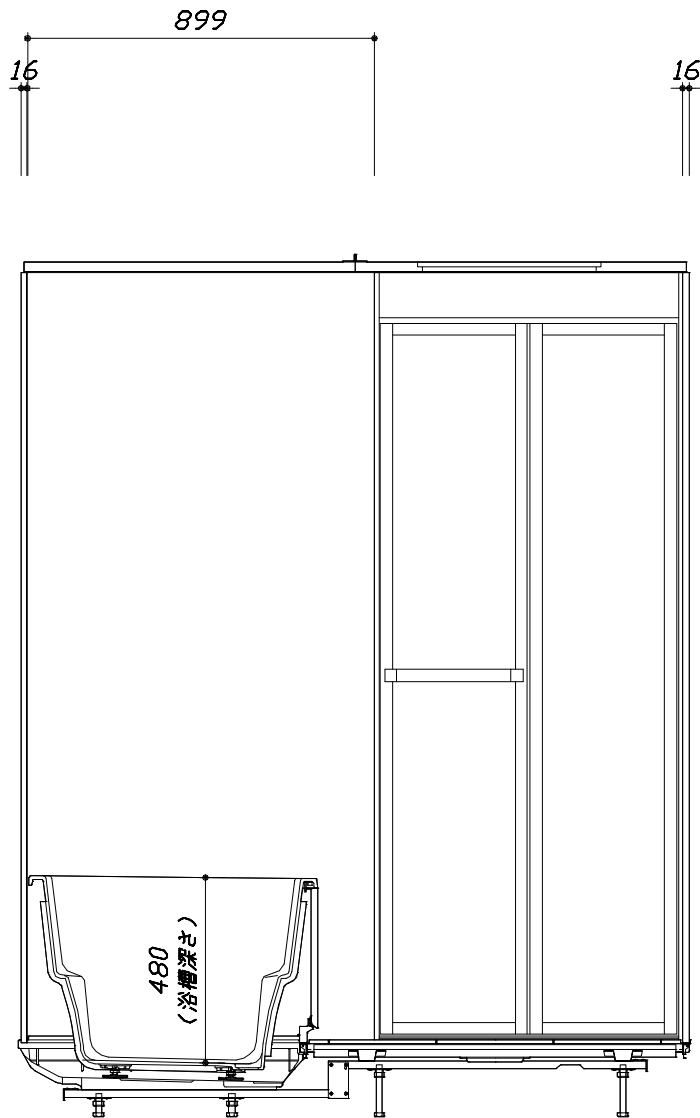

<カウンター対面図>


■ボルト脚架台高さ寸法
各ずり高さに対して
-9~+11mm調整可能

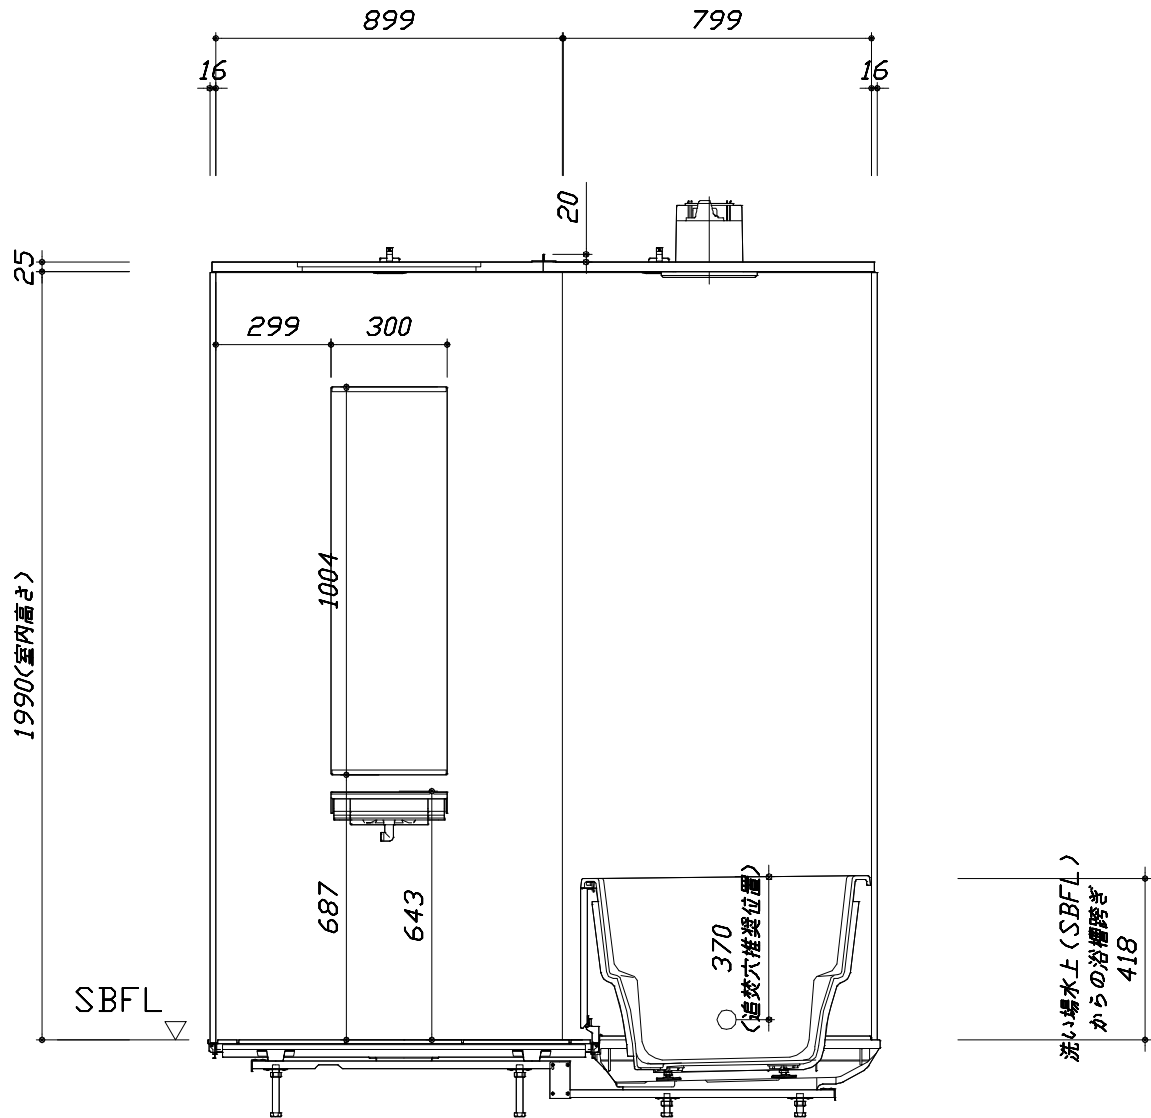


<カウンター面図>

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

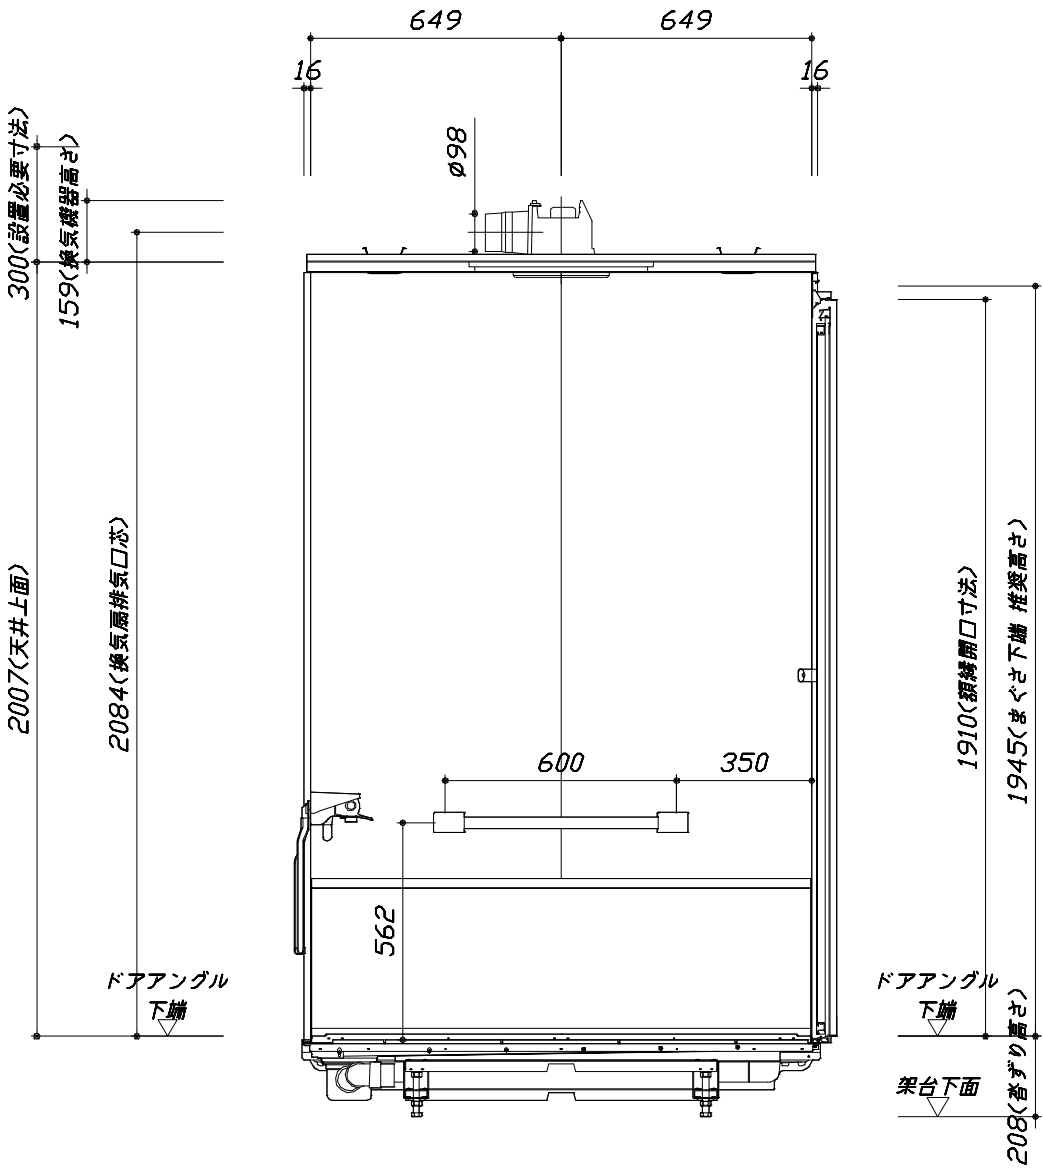

< 浴槽側面図 >

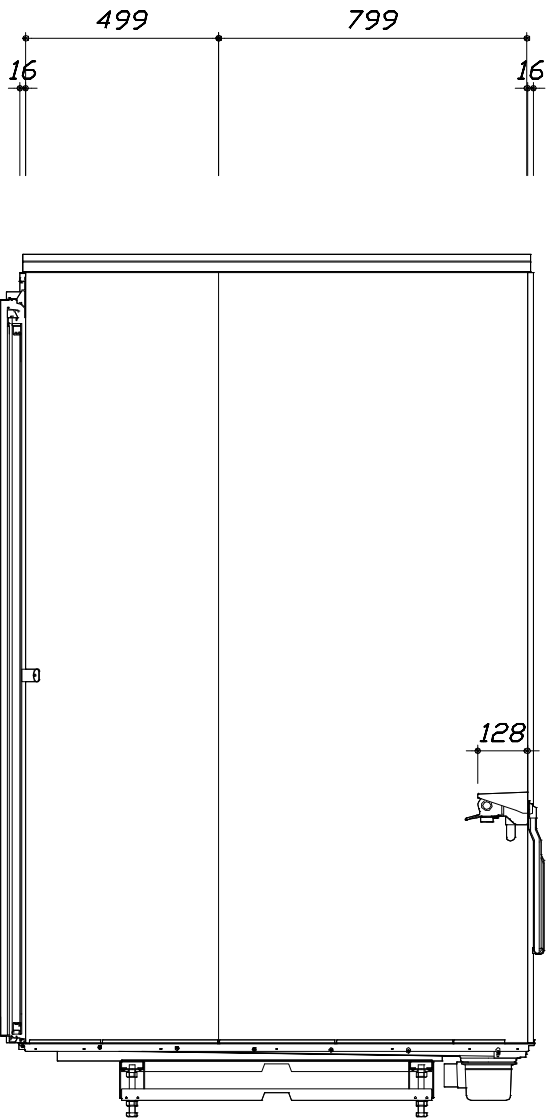

< 洗場側面図 >

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。




■システムバス 工事区分			参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』								
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事	
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
			浴室用電源配線、接続工事					○		浴室機器の事後電気工事	
浴室天井裏の電源、スイッチ工事							○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする



■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。




■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

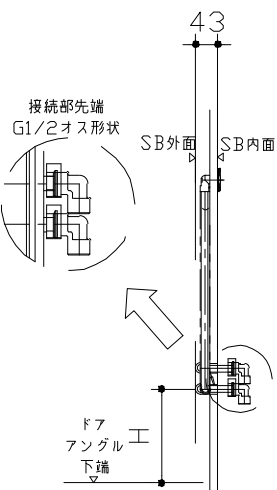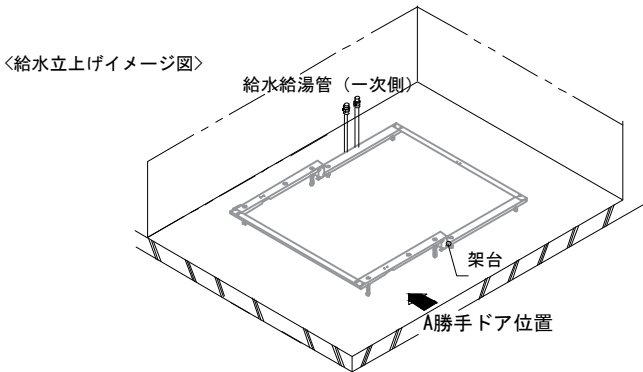


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	182
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	173

＜給水給湯管取合詳細図＞

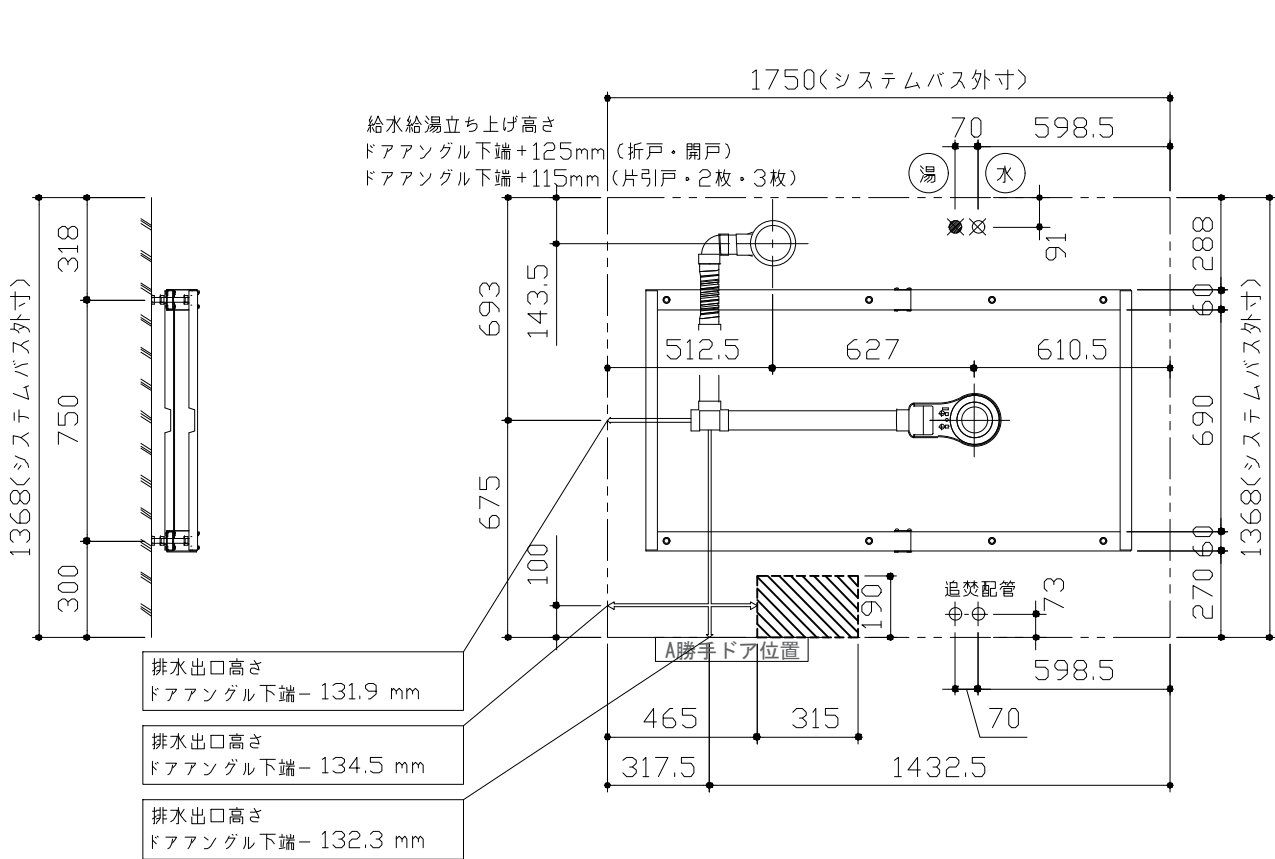

■ 設備記号	
記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置
▨	排水管立上げ推奨範囲 (VP50)

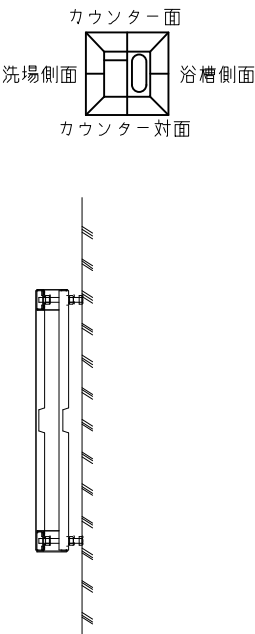

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・浴槽パンの配管導入口下部には給水・給湯・追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水柱・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

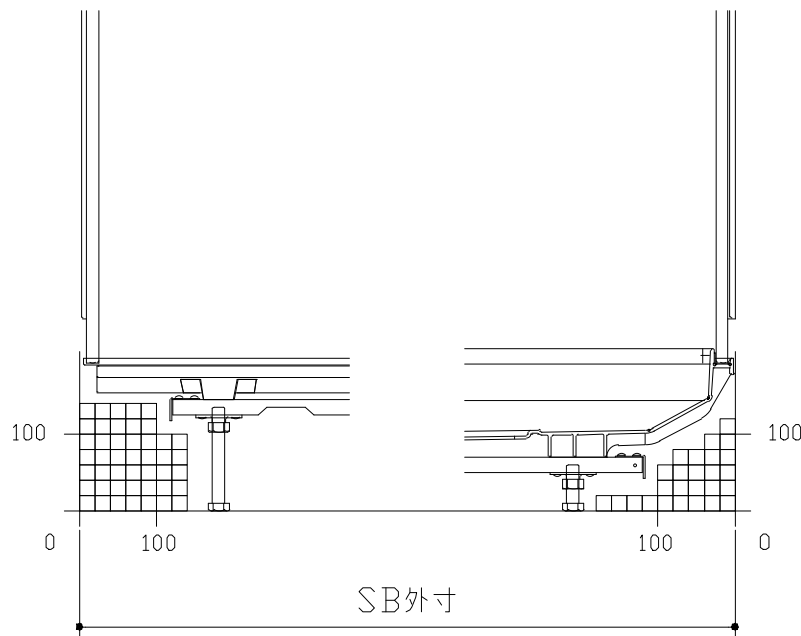


B矢視

A矢視

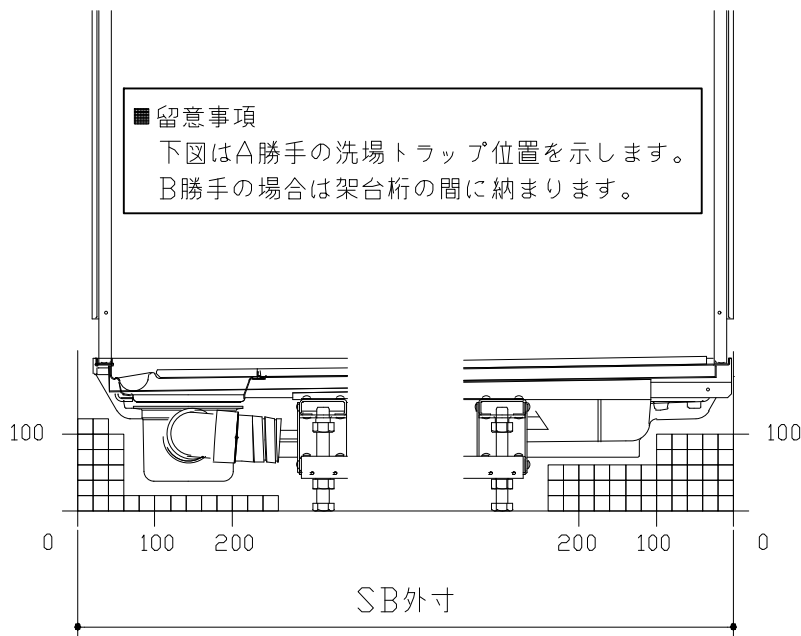

D矢視




C矢視

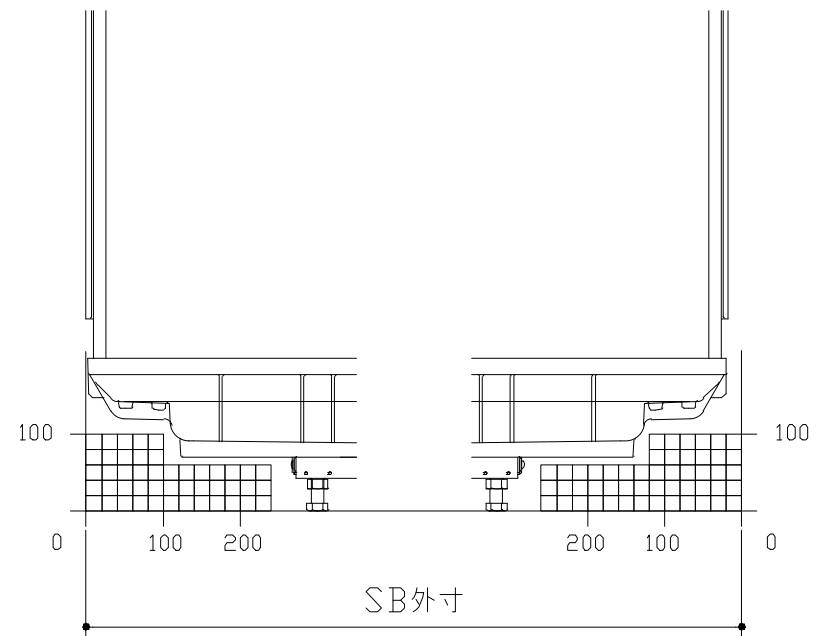

F矢視


E矢視


キープクリーンドア：折戸・上部換気口

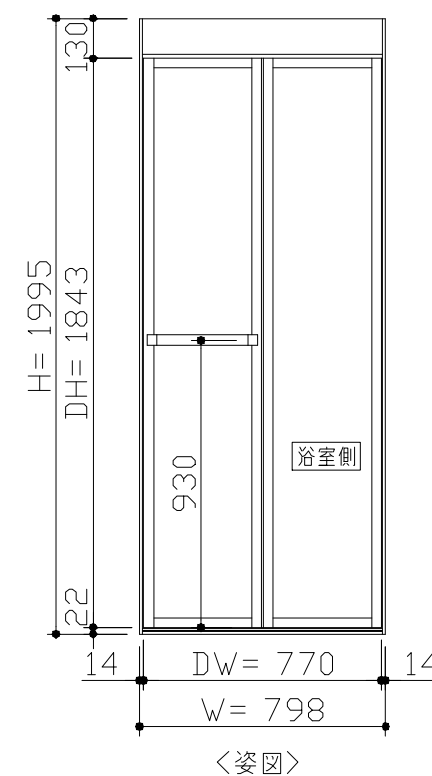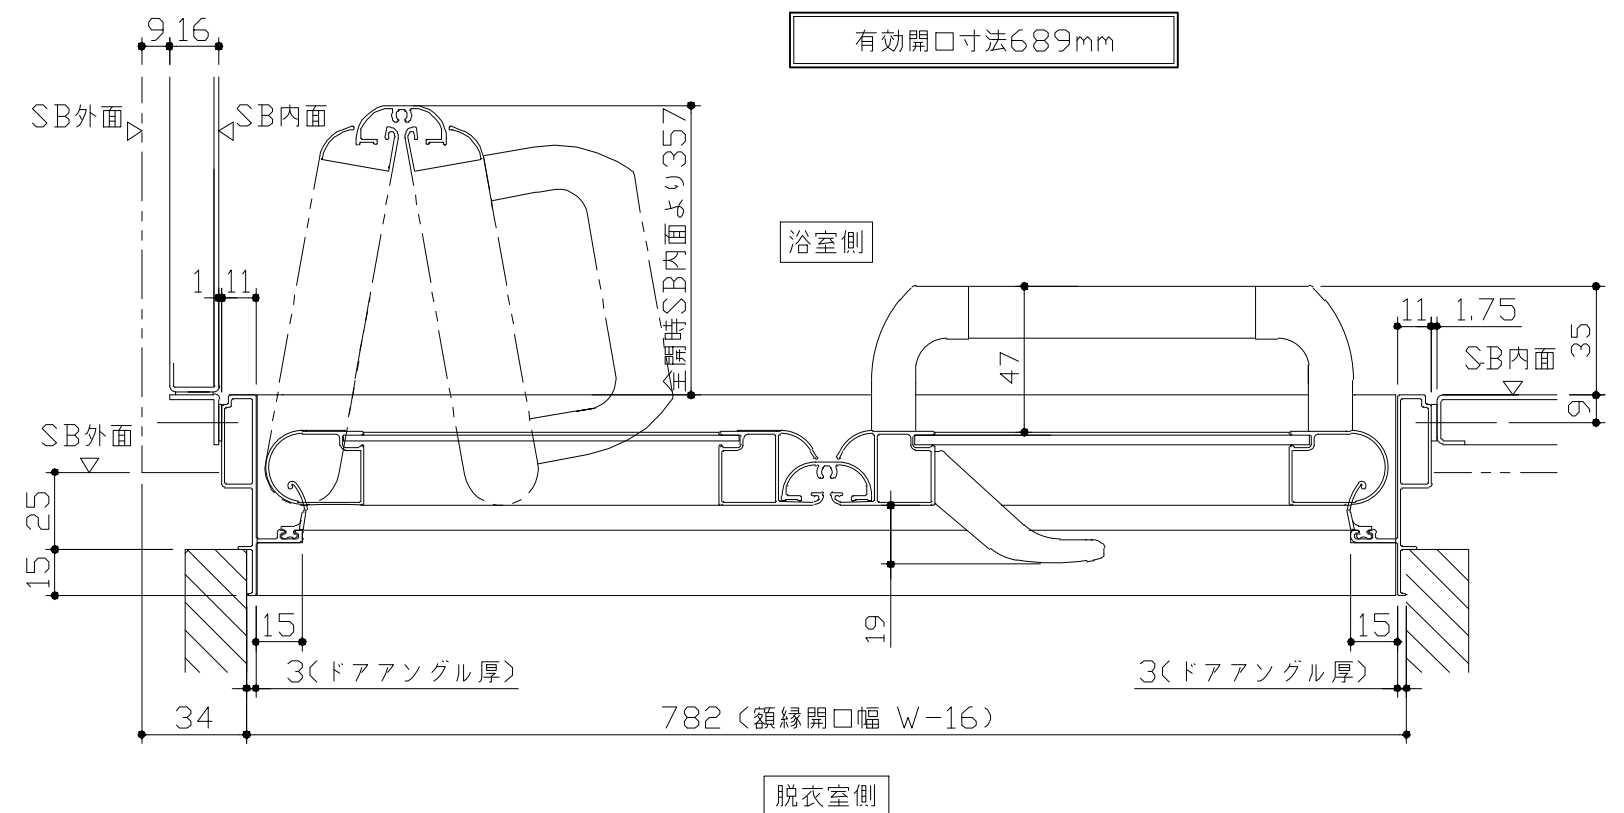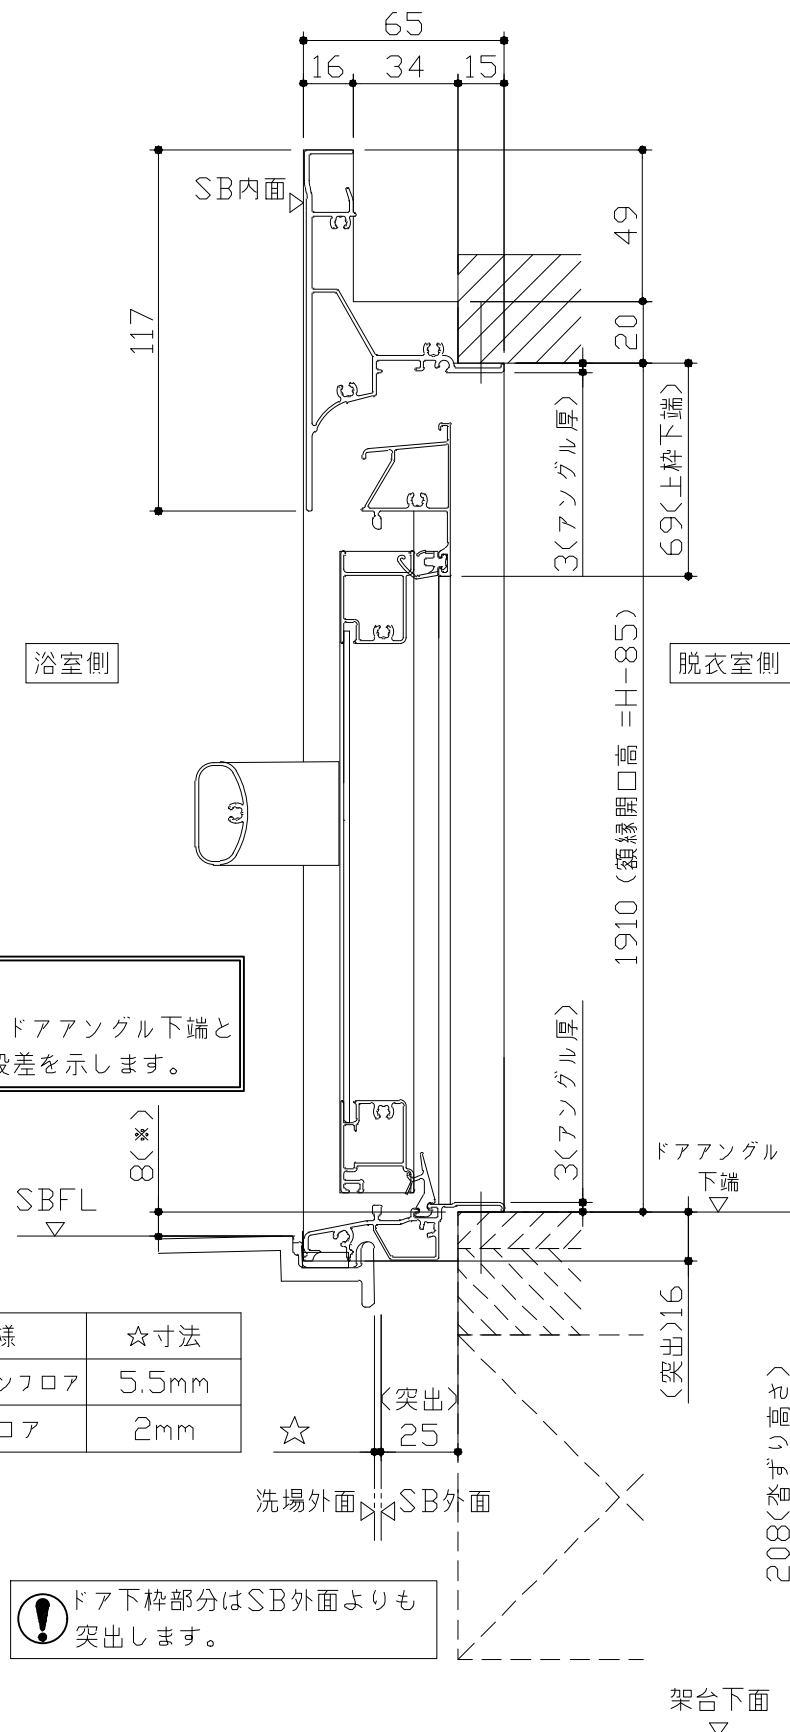

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



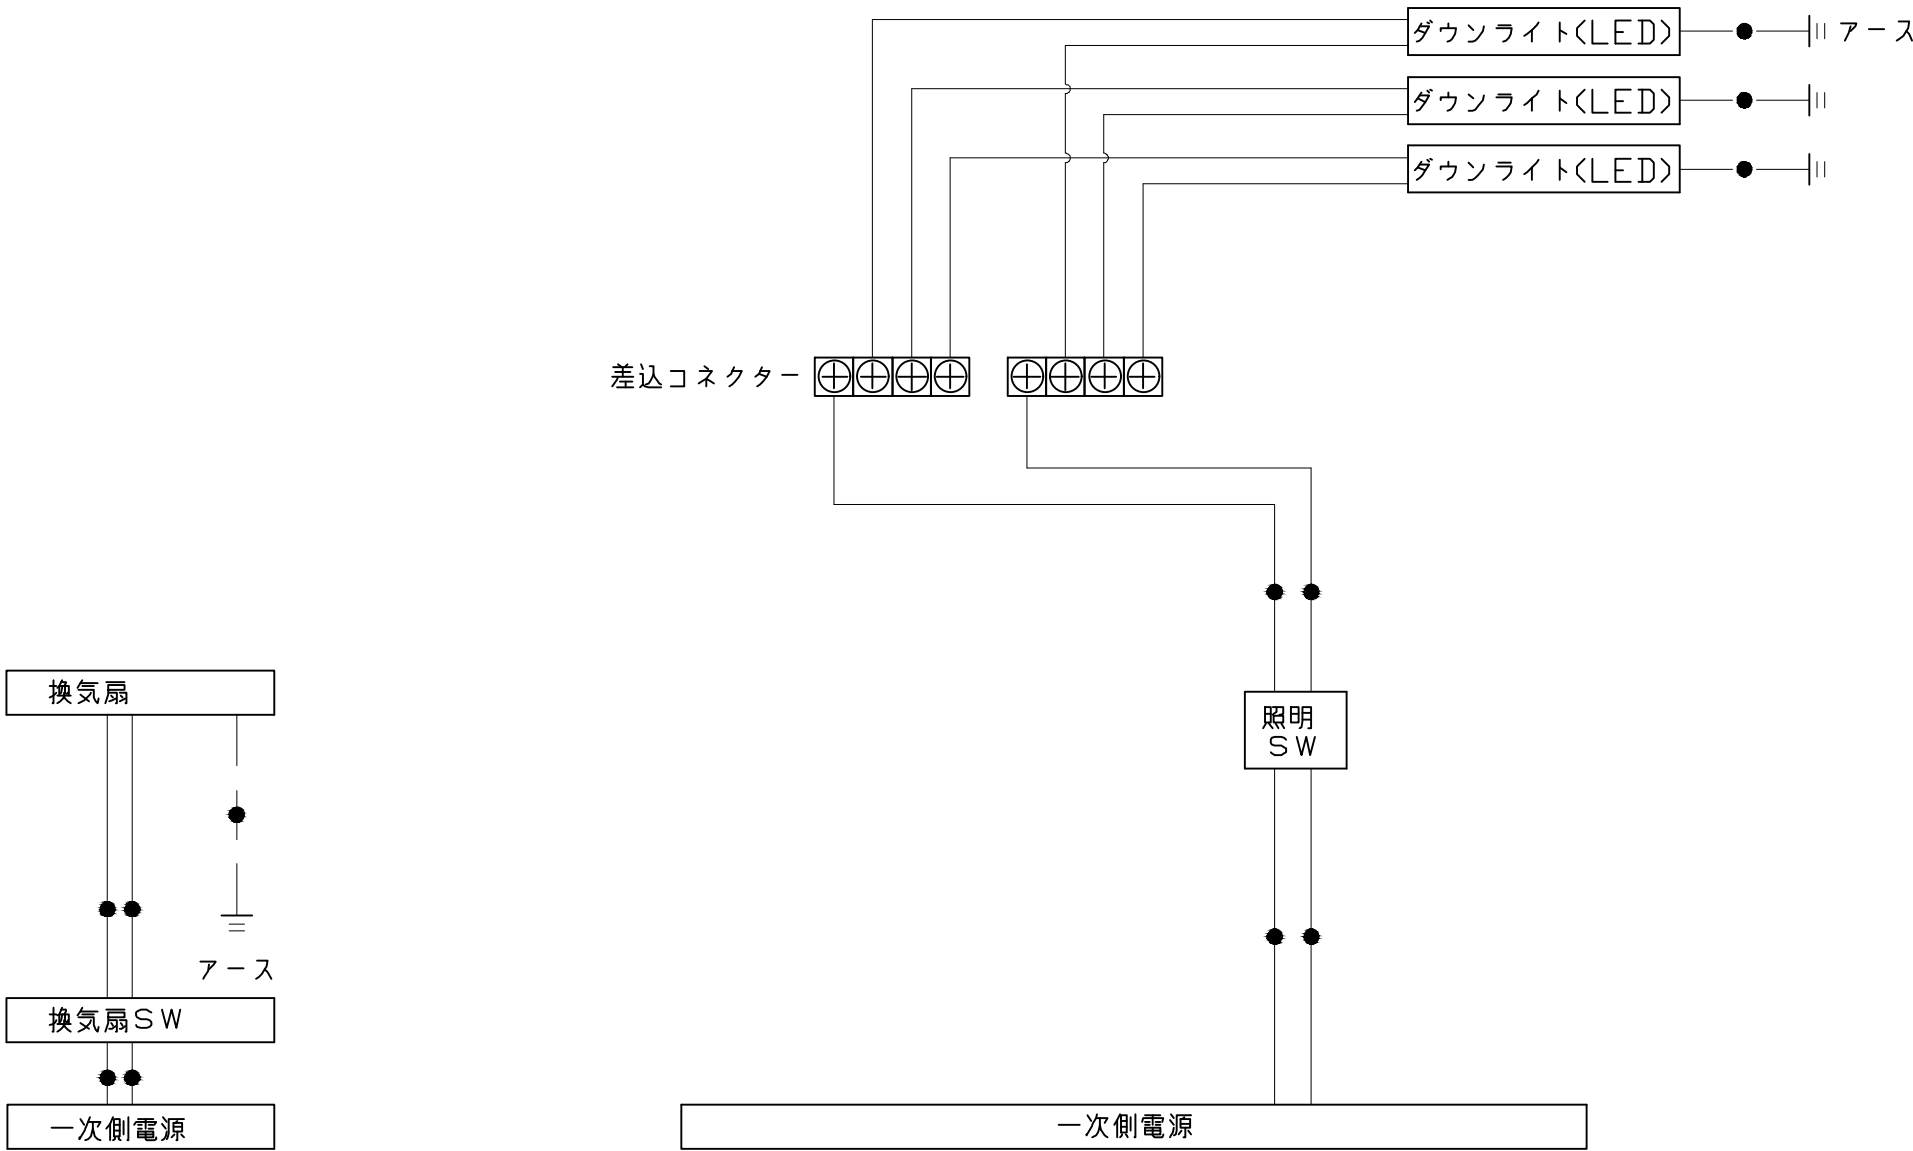

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

 アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

浴槽

750

660

458<底面>

1240

1050<底面>

180

規格

SB	浴槽奥行寸法	
奥行寸法	L	B
1368	1295	27.5
1393	1320	40
1418	1345	52.5
1443	1370	65

502

25

370

φ50

418<奥行き寸法>

480

<最奥部高さ>

洗い場用水栓

300

100

100

100

M22x2

117

78.5

35.5

127.5

56

45.5

605

△

パネル下面

照明

ダウンライト

LED 3.1W (1灯あたり)

φ75 (天井開口)

37.5

φ90

天井厚み 25

4

換気機器

管工事

184

159

174

109

69

42

φ98

77

25

天井厚み

□250

ミラー

枠：SUS304 t0.8

ミラー：表面防曇コートあり（ロングクリアミラー-A）

表面防曇コートなし（ロングミラー-A）

300 (鏡本体)

9.5

11

取付金具

5

鏡

取付金具

25.5

41

218

41

<取付穴ピッチ>

969<取付穴ピッチ>

1000 (鏡本体)

ハンドバー支持部取合詳細図

握りバー

φ30

78.8

キャップ

72

パネル表面

33

30

皿タッピンネジ 4×14

55

40

Takara standard

タカラストANDARD株式会社

現場名称：東京-足立SR SB11様邸

現場番号：C4330531

東京東営業所

GRANSPA グランspa

プラン番号：1444N-2506-0018T





担当営業：佐々木




部材詳細図

1/2

作成日：2025年6月1日

担当アドバイザー：五ヶ山

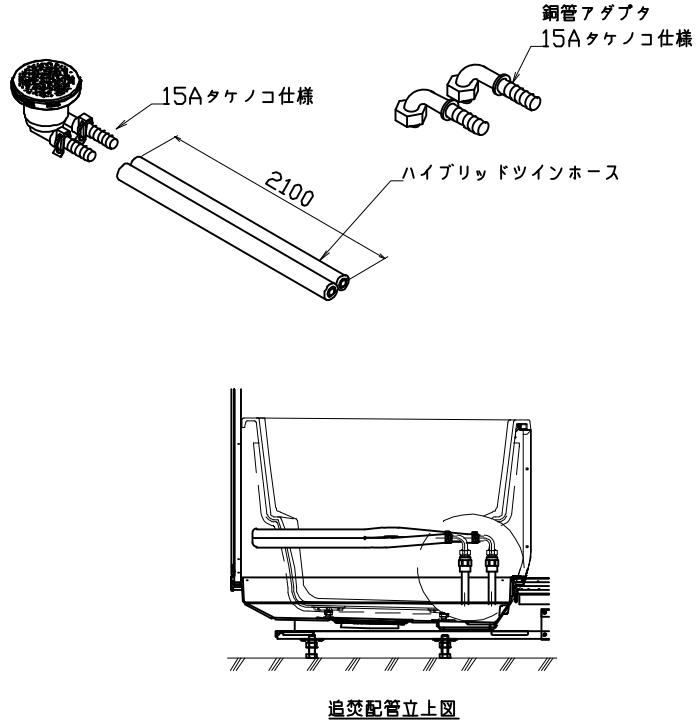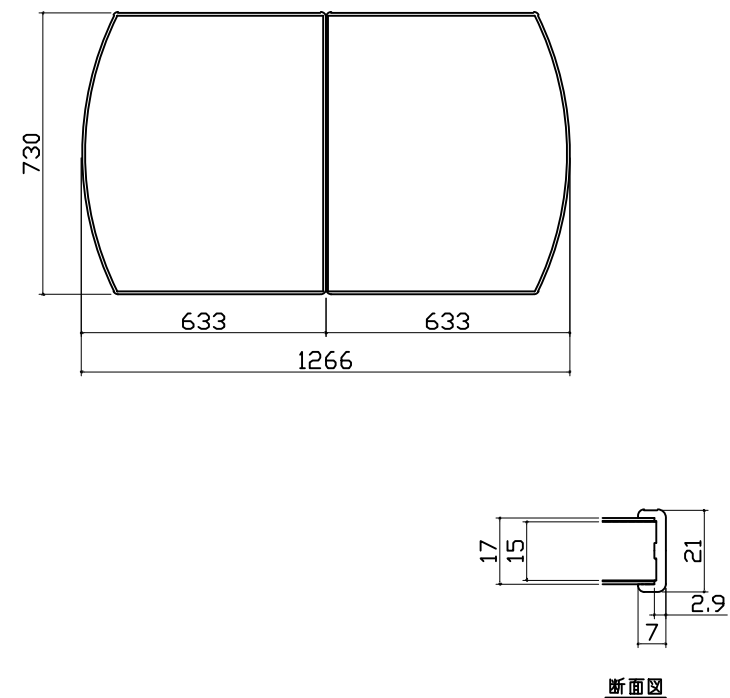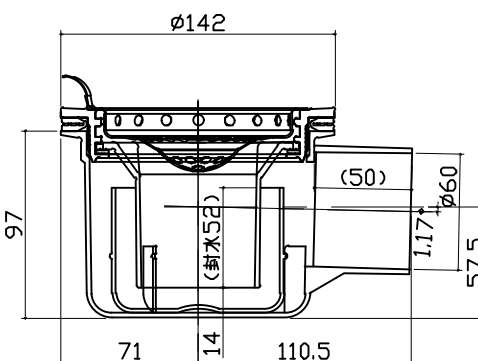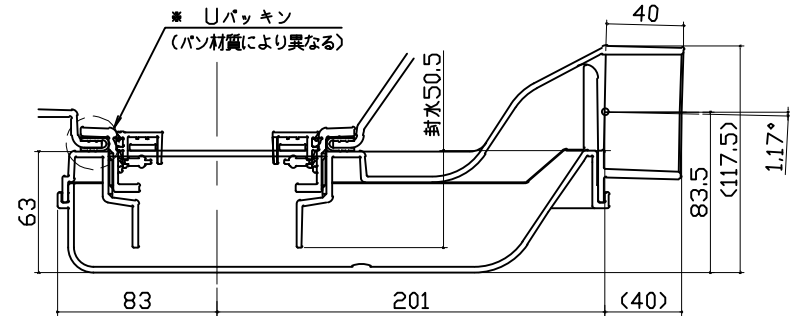循環金具・フロアダプタ関連	風呂蓋 ｺﾌｨｹMVAH-13W	洗い場側排水トラップ		
 銅管アダプタ 15Aタケノコ仕様 15Aタケノコ仕様 2100 ハイブリッドツインホース 追焚配管立上図	 730 633 633 1266 断面図	 ø142 97 71 14 110.5 ø60 57.5 1.17 (50) (封水52)		
浴槽側排水トラップ				
 ※ Uパッキン (パン材質により異なる) 封水50.5 63 83 201 40 83.5 (117.5) 1.17 (40)				
 タカラスタンダード株式会社		現場名称： 東京－足立SR SB11様邸 現場番号： C4330531 東京東営業所	GRANSPA グランスパ プラン番号： 1444N-2506-0018T 担当営業： 佐々木	部材詳細図 2/2 作成日： 2025年6月1日 担当アドバイザー： 五ヶ山

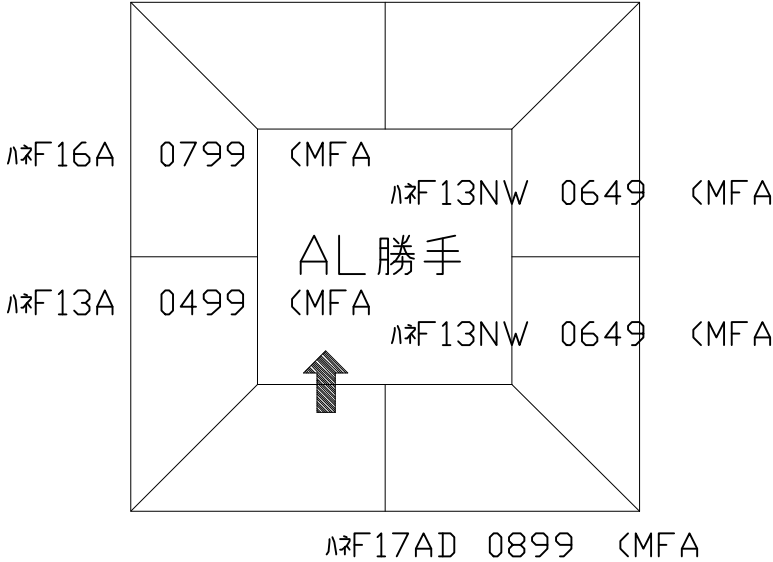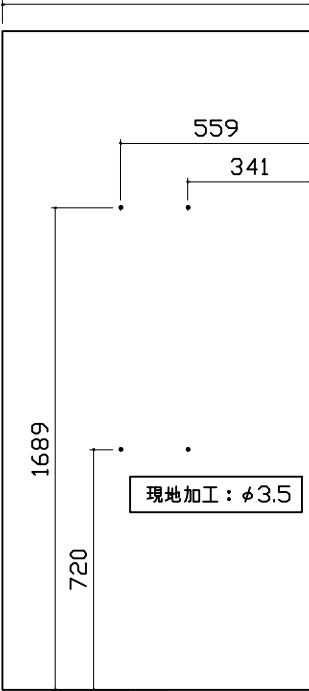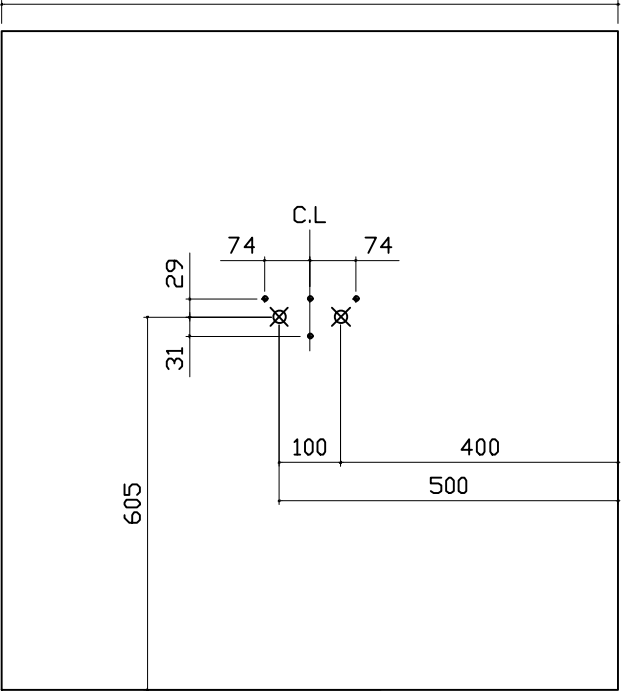パネル割図		ミラー	洗い場水栓取付穴	
ハネF17C2G 0899 <MFA ハネF16C1G 0799 R<MFA ハネF16A 0799 <MFA ハネF13A 0499 <MFA ハネF13NW 0649 <MFA ハネF13NW 0649 <MFA ハネF17AD 0899 <MFA AL勝手 		ハネF17C2G 0899 <MFA 899 559 341 1689 720 現地加工：φ3.5 	ハネF17C2G 0899 <MFA 899 605 29 31 74 C.L 74 100 400 500 ※：現地加工φ33-2か所 ●：現地加工φ6-4か所 	

Takara standard タカラストانダード株式会社	現場名称：東京-足立SR SB11様邸	GRANSPA グランSPA	穴開け指示図	1/1
	現場番号：C4330531	プラン番号：1444N-2506-0018T	作成日：2025年6月1日	
	東京東営業所	担当営業：佐々木	担当アドバイザー：五ヶ山	
