

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 北海道-旭川SR SB5 様

業者 様

商品名 PREDENCIA プレデンスシア

作成日 2020年12月3日
プラン番号 1203E-2012-0024T
現場番号 A6843730

タカラスタンダード株式会社
◆旭川営業所
北海道旭川市末広東1条6丁目
TEL 0166-54-9930 / FAX 0166-54-9932

◆旭川ショールーム
TEL 0166-54-9935 / FAX 0166-54-9941

商品
御見積金額 \1,384,800 (税込 \1,523,280)
()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 \186,000 (税込 \204,600)

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》	
ユニットサイズ	1616 (BR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームベージュ
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	シルキーベージュ
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ハンチ付)
浴槽・風呂フタ	高断熱仕様
カウンター材質	アクリル人造大理石
カウンターカラー	シルキーベージュ
エプロン材質/カラー	ステンレス / ベージュ
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー (正面)	ノルディックグリーン
パネルカラー (周辺)	アジロホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 50Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		千葉

◆ 備考

※展示品売却時、吊り金具・フロフタは新規手配となります。

--	--

No.*

御名前 北海道-旭川SR SB5

様

現場番号	A6843730	プラン番号	1203E-2012-0024T	作成日	2020/12/3
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1616サイズ		1	1,038,000	1,038,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	開き戸<800幅> (ブラック) / 強化ガラス (透明) (19サイズ)	1	+57,000	+57,000
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・全面デザインハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア (ハイクラス・カームベージュ)	1		
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	鋳物ホーロー浴槽 (高断熱浴槽) (シルキーベージュ)	1		
9	浴槽追い焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス (保温材あり) (ベージュ)	1		
11	浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽 (ベンチ付)	1	+50,000	+50,000
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1		
14	ガス温水式床暖房	なし	1		
15	洗い場用水栓	棚付サーモ水栓: 樹脂製ホース (メタル調) KF9152H 水栓上部カウンター (ベージュ)	1		
16	洗い場用水栓	エコシャワー (節水+手元止水+3Way): KF9152HLE/RE	1	+13,000	+13,000
17	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
18	カウンター	人大スクエアカウンター	1		
19	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー (手すりタイプ)	1	+5,200	+5,200
20	浴室パネル	プレミアムクラス (全面デザインハイクラス) (Kパネル)	1	+55,000	+55,000
21	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
22	天井	高光沢フラット天井	1		
23	換気機器	天井換気扇	1		
24	換気機器開口	工場開口	1		
25	照明	ダウンライト照明 (3灯) (電球色)	1	-8,000	-8,000
26	天井照明開口	工場開口	1		
27	ミラー	横長クリアミラー	1	-1,500	-1,500
28	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
29	タオル掛け	クリアタイプ クリア	1		
30	ハンドバー	ステン I型600タイプ	1	+8,000	+8,000
31	収納棚	クリアタイプ クリア (2段)	1	-4,000	-4,000

御名前 北海道-旭川SR SB5 様

現場番号	A6843730	プラン番号	1203E-2012-0024T	作成日	2020/12/3
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	浴室テレビ	16インチ (ホワイト)	1	+156,000	+156,000
33	どこでもラック	シャワーフック (ホワイト)	1	+2,100	+2,100
34	吊り金具	62L	1	+9,000	+9,000
35	給水給湯管	洗い場1水栓<上配管 カウンター側接続>	1		
36	トラップカバー	洗い場側トラップカバー	1		
37	トラップカバー	浴槽側トラップカバー (浴槽パンあり)	1		
システムバス合計			37		\1,384,800

商品総合計	37	\1,384,800
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。


《参考》 別途 商品組付費

システムバス商品組付費 \186,000 (税込 \204,600)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

() 内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

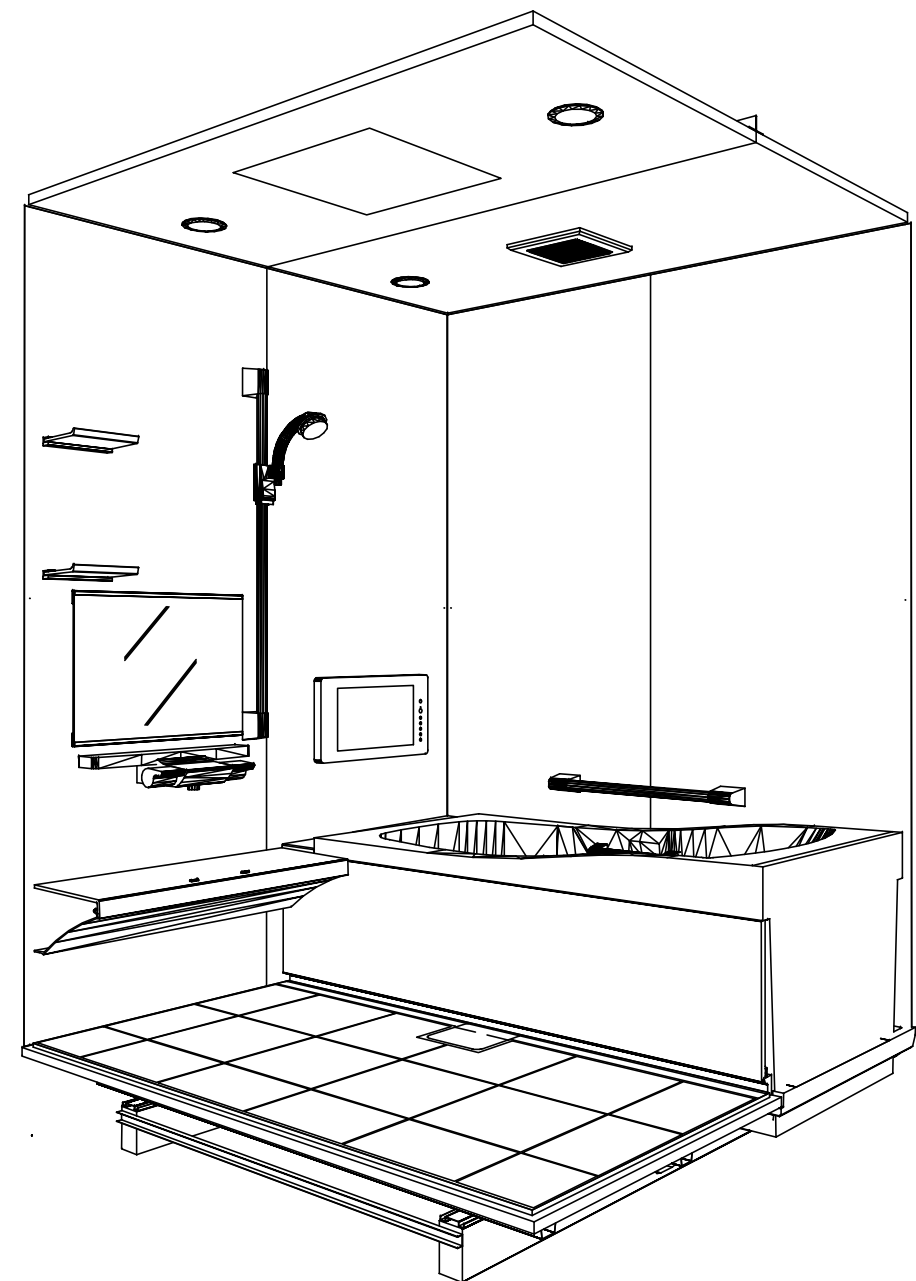

鳥瞰図

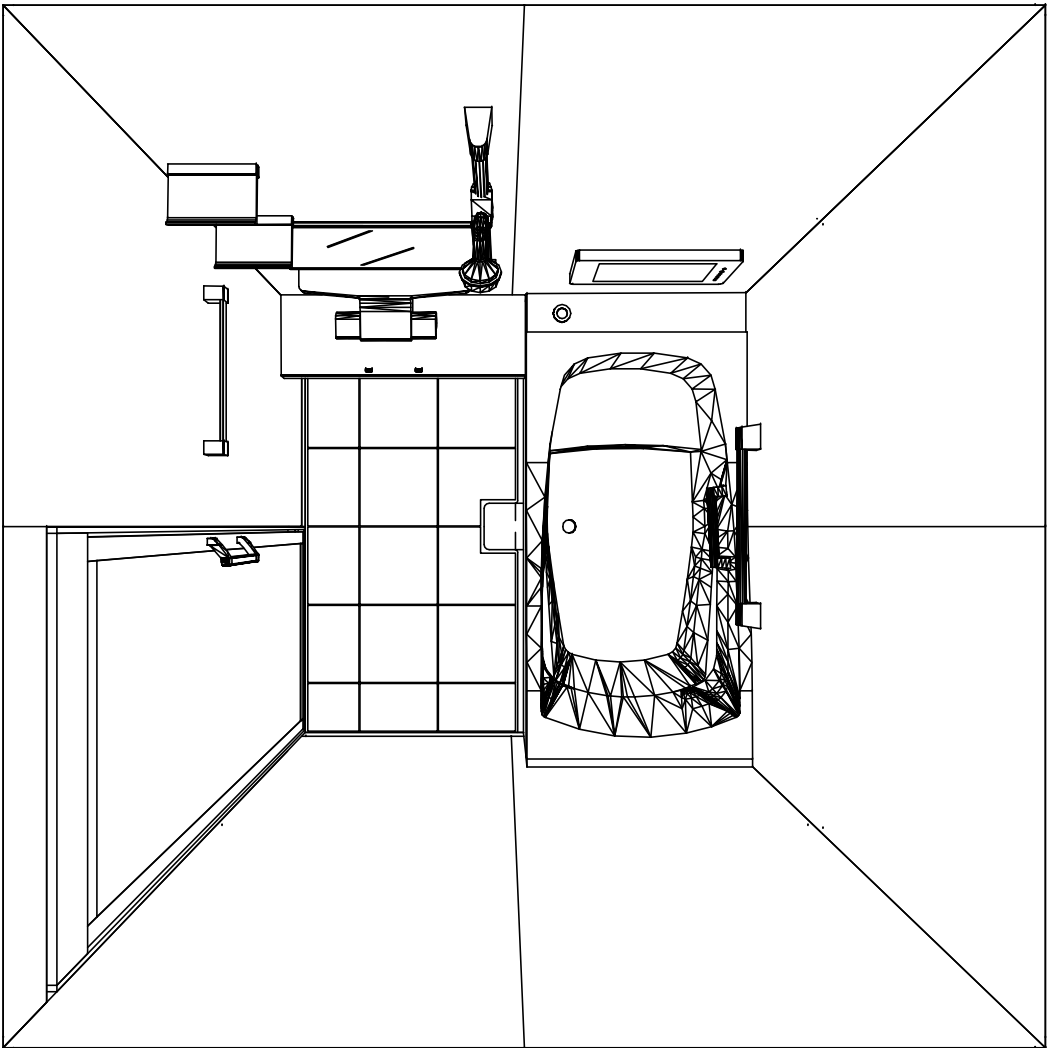

1616
鋳物ホーロー浴槽
高光沢フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

Takara standard タカラストンダード株式会社	現場名称： 北海道-旭川SR SB5様邸	PREDENCIA プレデンスシア	姿図	
	現場番号： A6843730	プラン番号： 1203E-2012-0024T	作成日： 2020年12月3日	
	旭川営業所	担当営業 ：	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

カウンター面


洗場側面

浴槽側面


カウンター対面

■留意事項



※印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

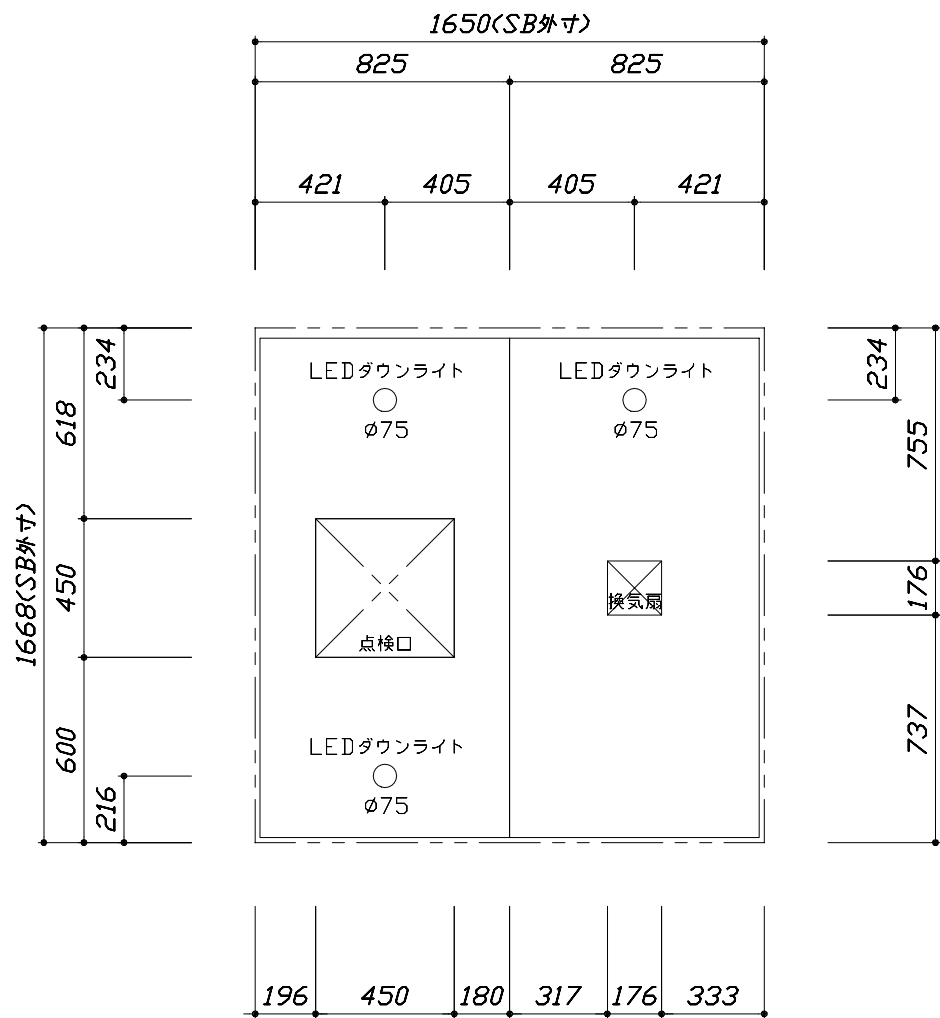

<天井伏図>

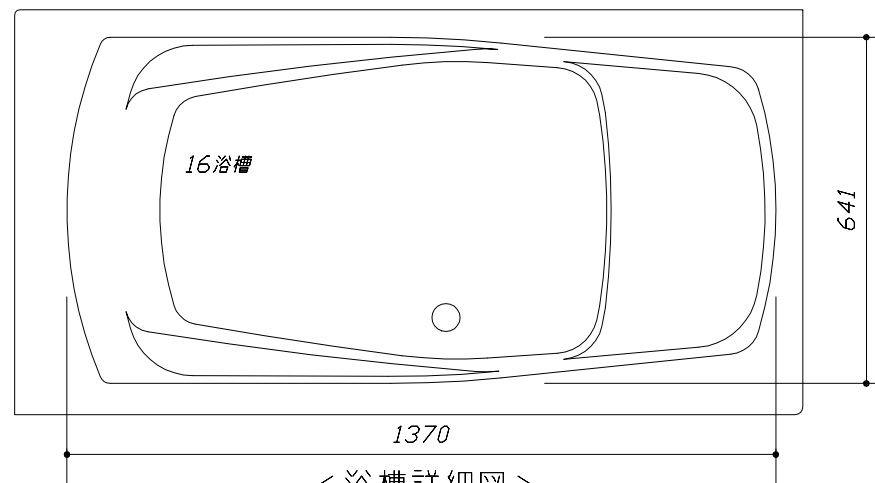



<浴槽詳細図>

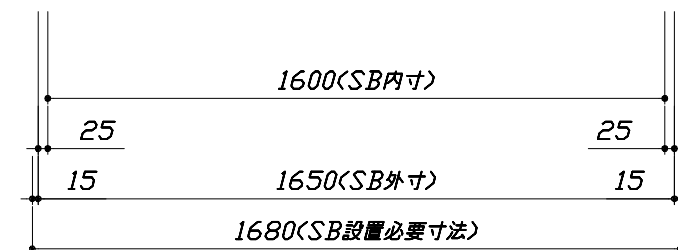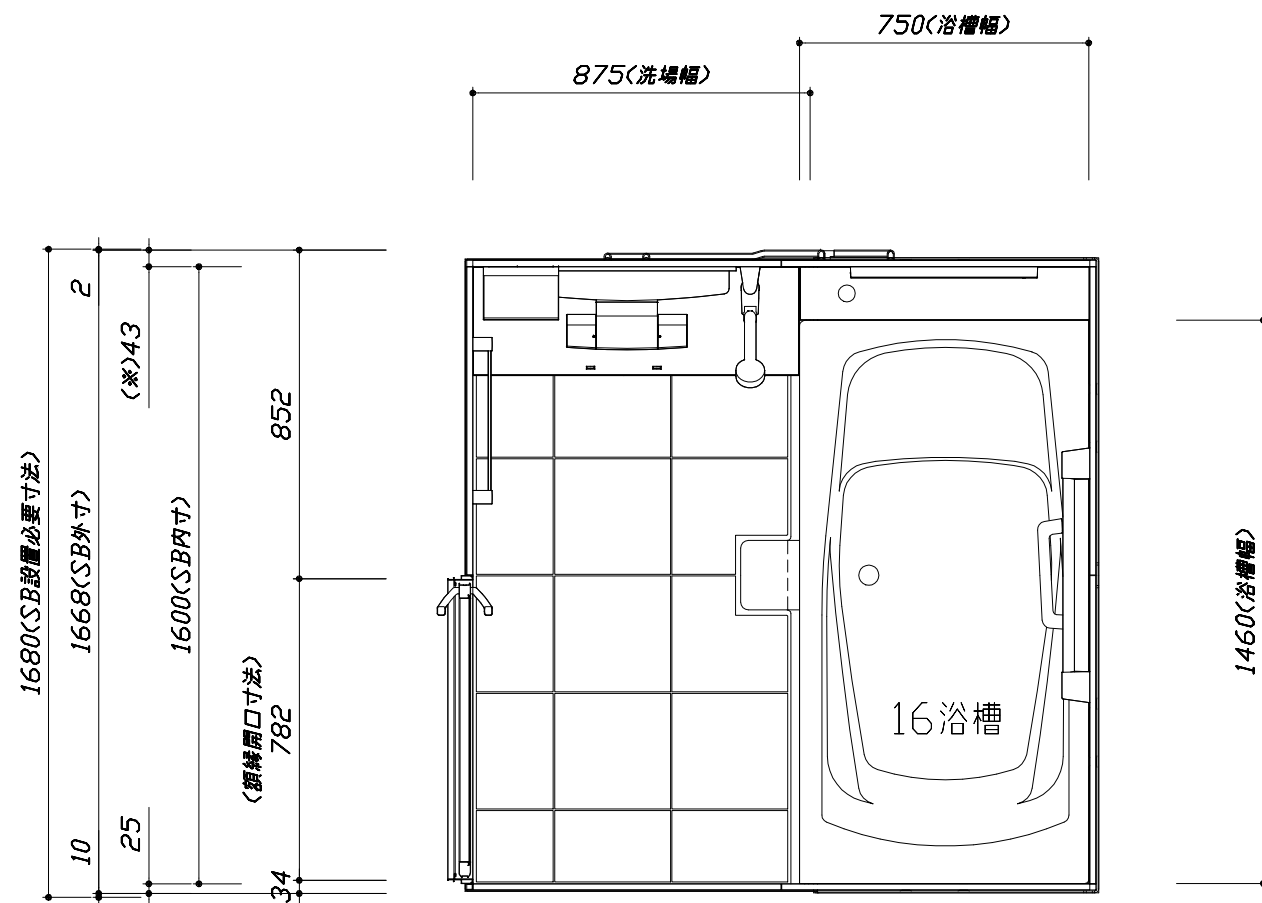

<平面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

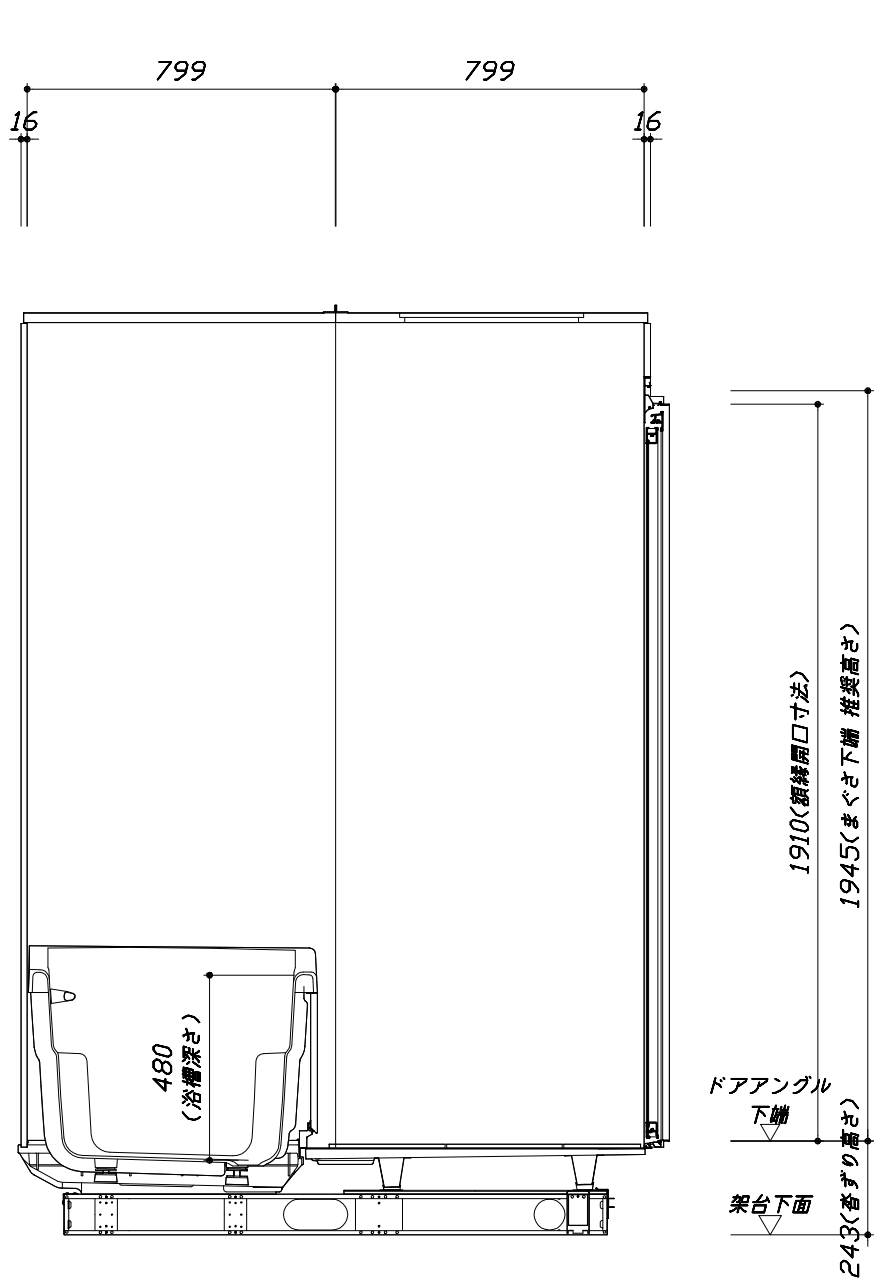

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)



<カウンター対面図>

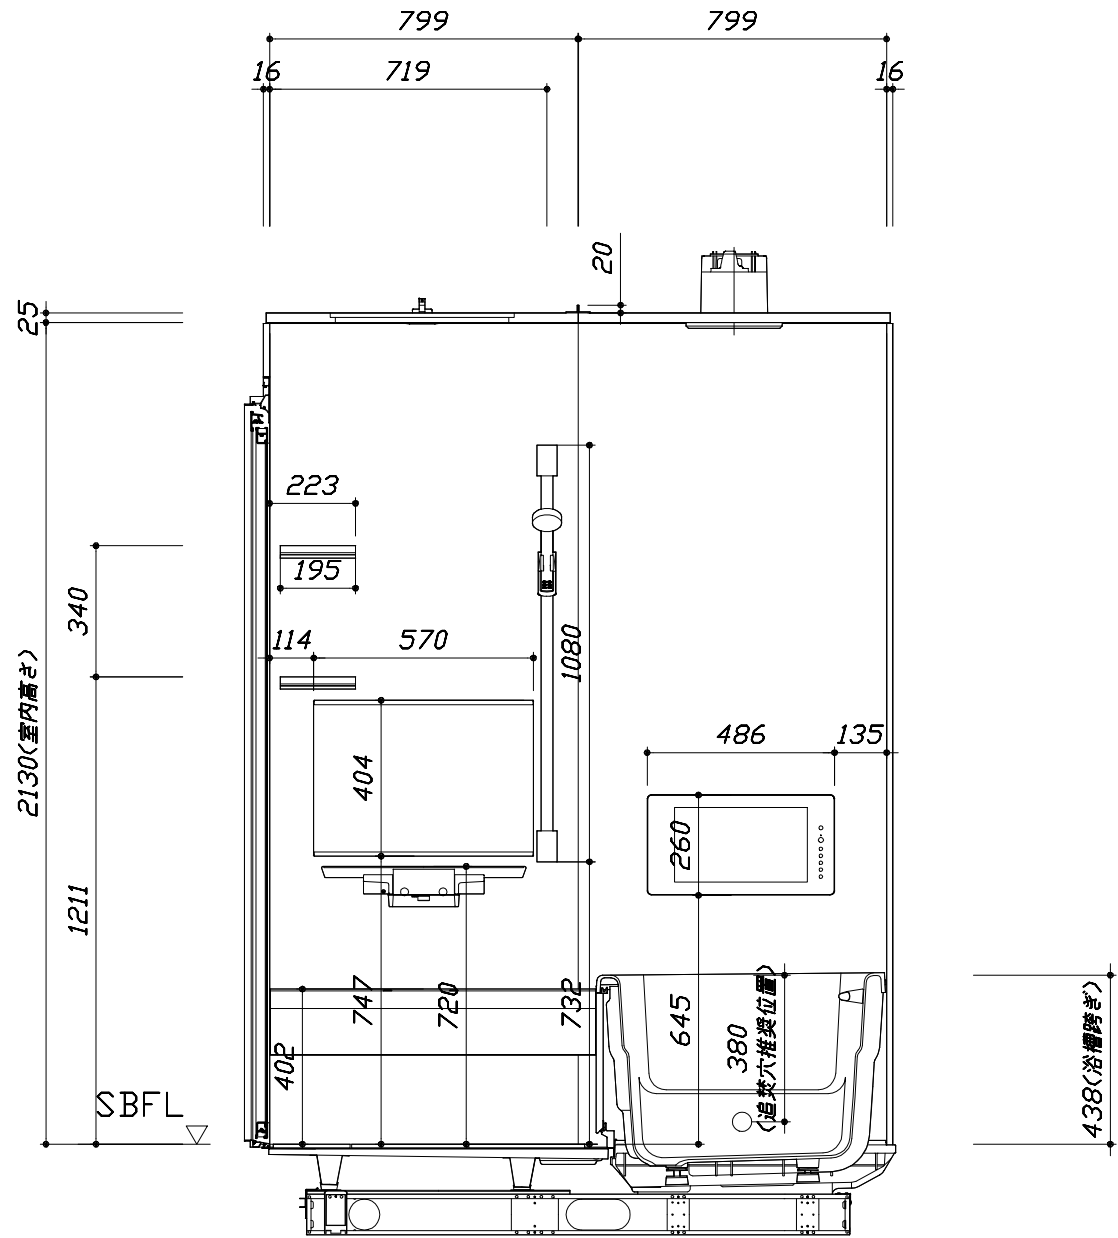

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

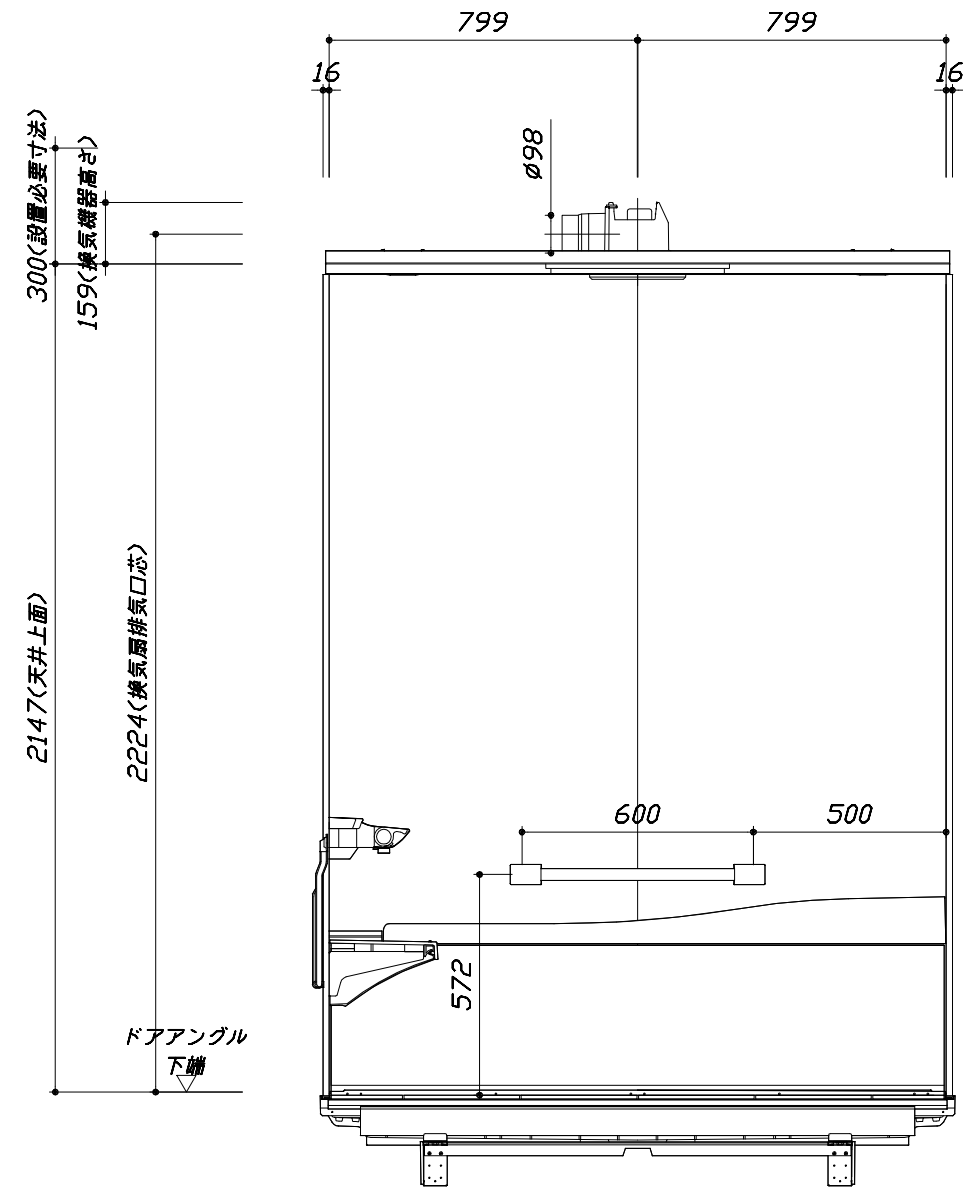

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

< 浴槽側面図 >

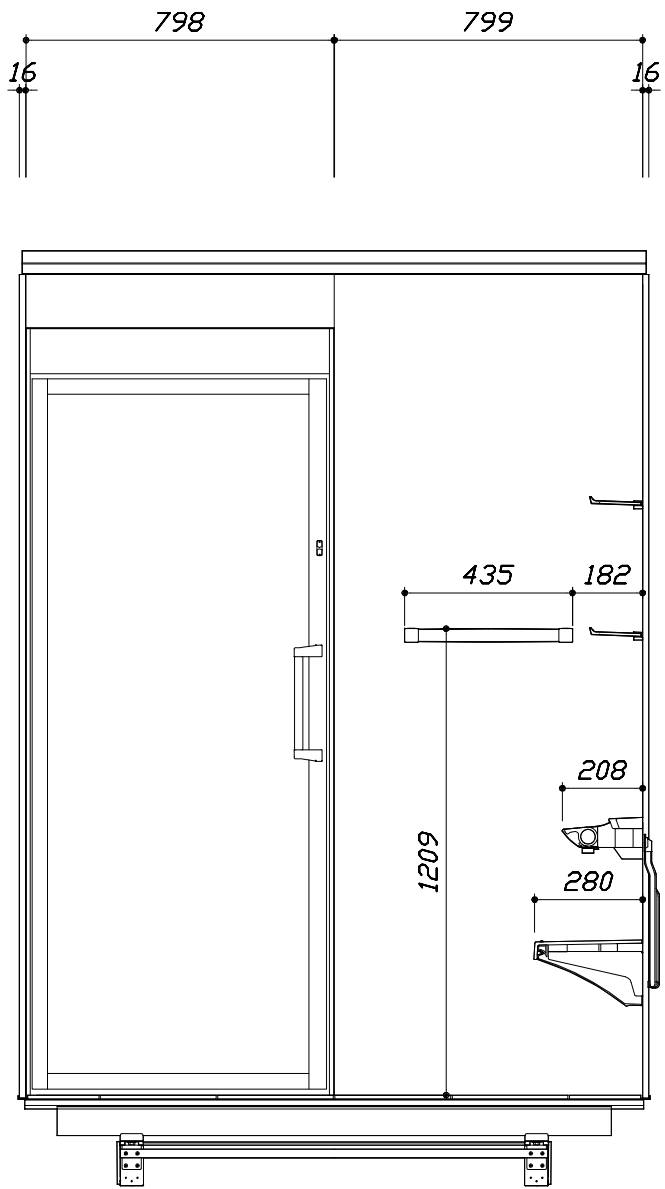

< 洗場側面図 >

Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： 北海道-旭川SR SB5様邸
現場番号： A6843730
旭川営業所

PREDENCIA プレデンシア
プラン番号： 1203E-2012-0024T
担当営業：

施工図3
縮尺： 1:20
作成日： 2020年12月3日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍


基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

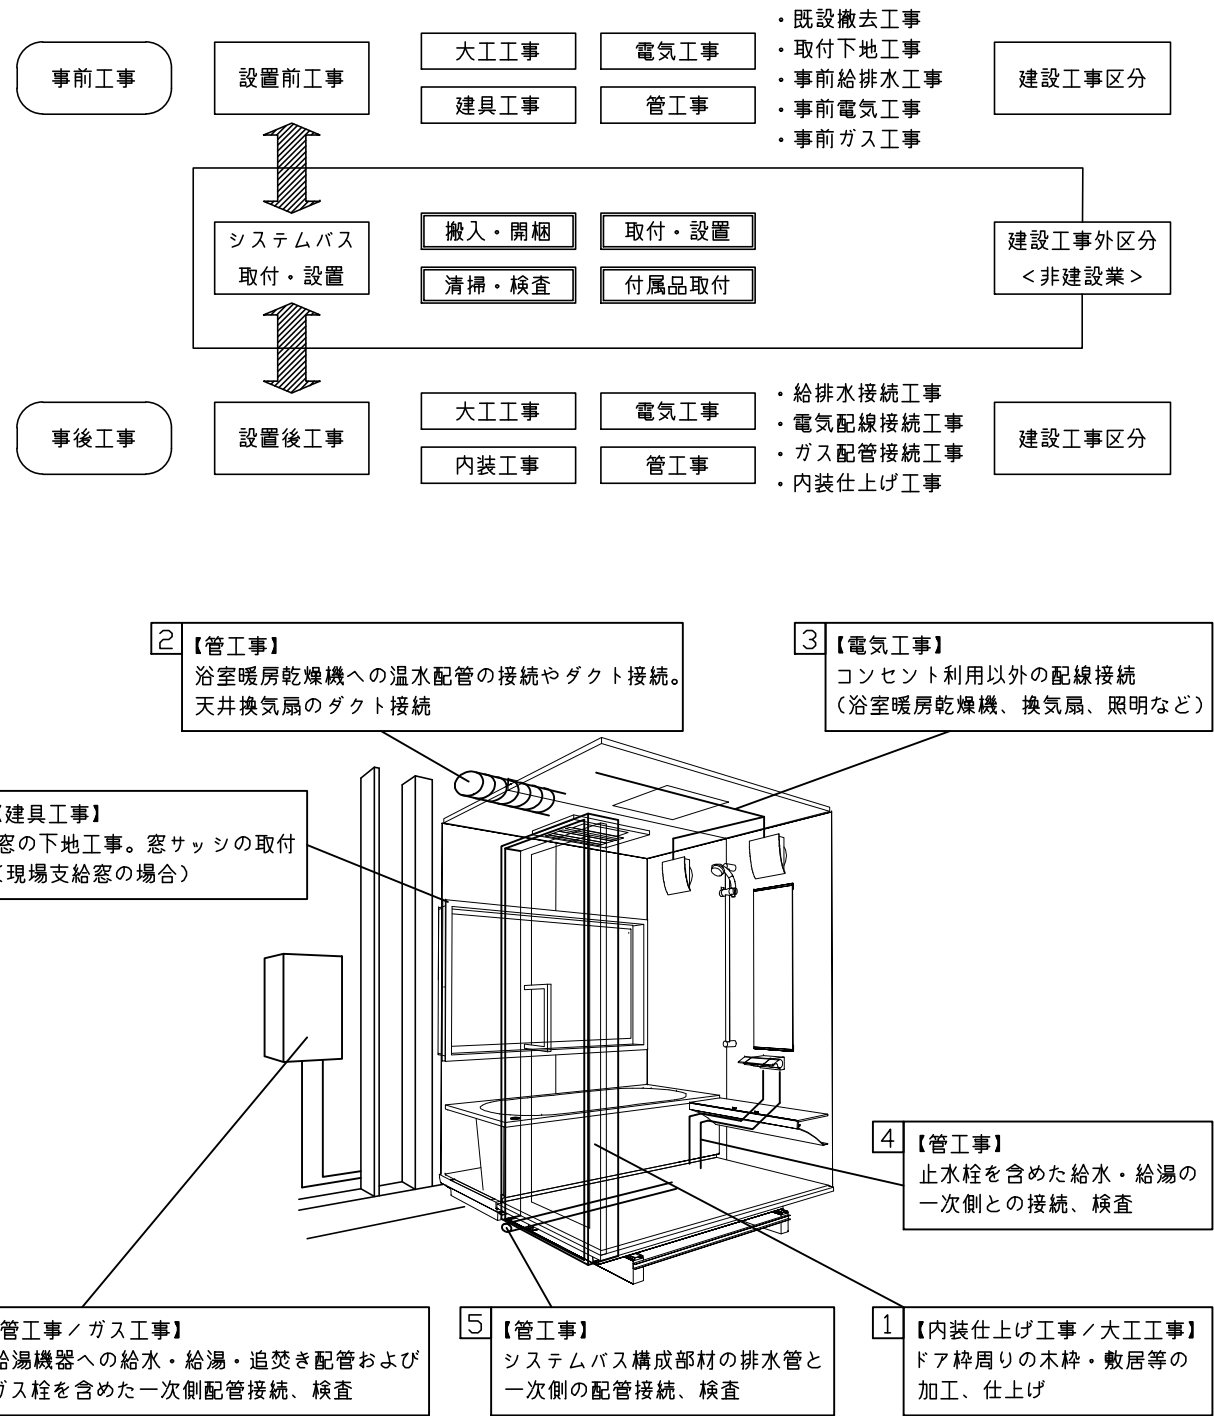

■システムバス 工事区分		参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』									
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	とび 土工 事	建具 工事	管 工事	電気 工事	給湯 機器 設備	シス テム バス 設置	
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
		電気	給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
			浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
		管	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○			建築の外装仕上げ工事
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
	1 3	電気 他	建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
			内装仕上げ工事	○		○					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
			浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事


※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する

※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。






■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

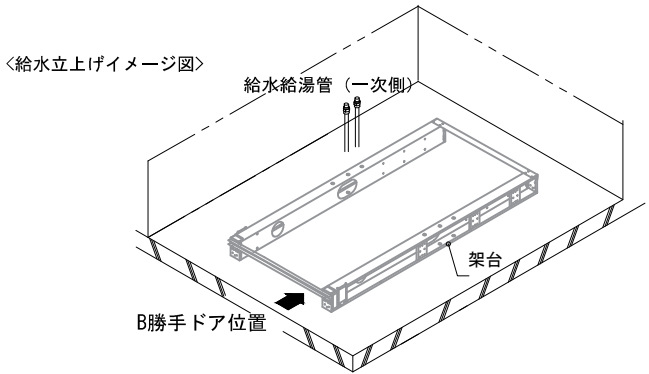


■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より 265mm 下がりで打設してください。

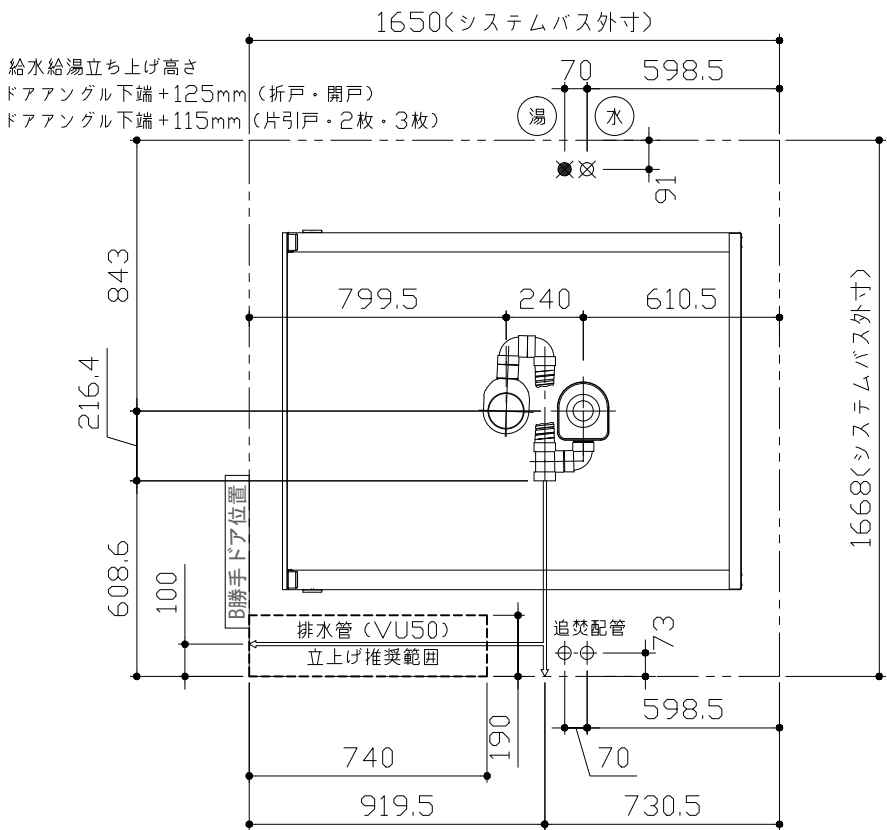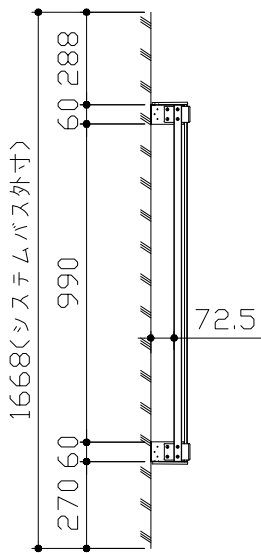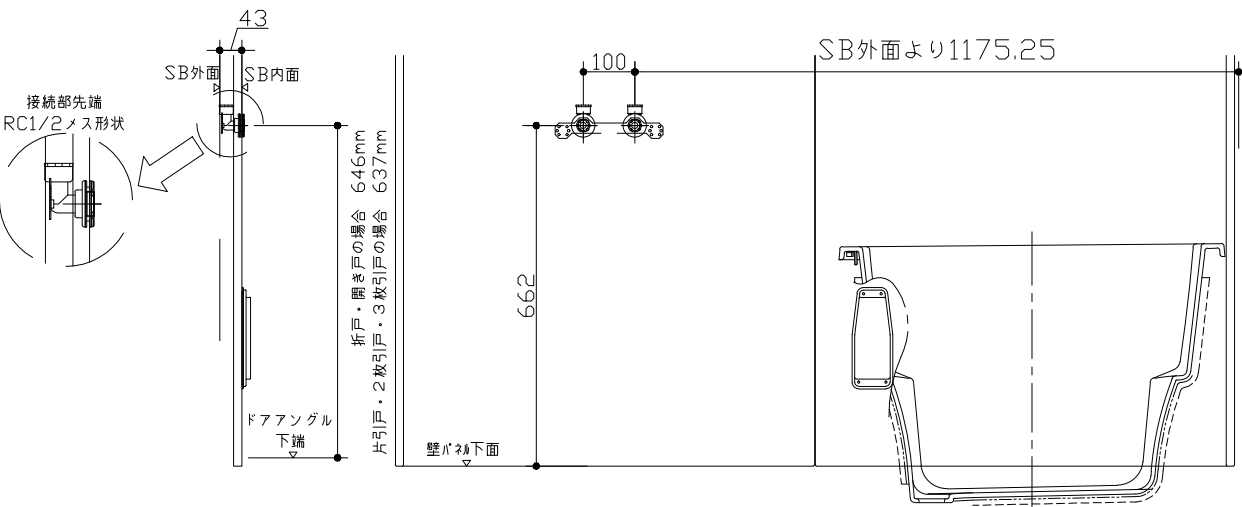

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置



〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

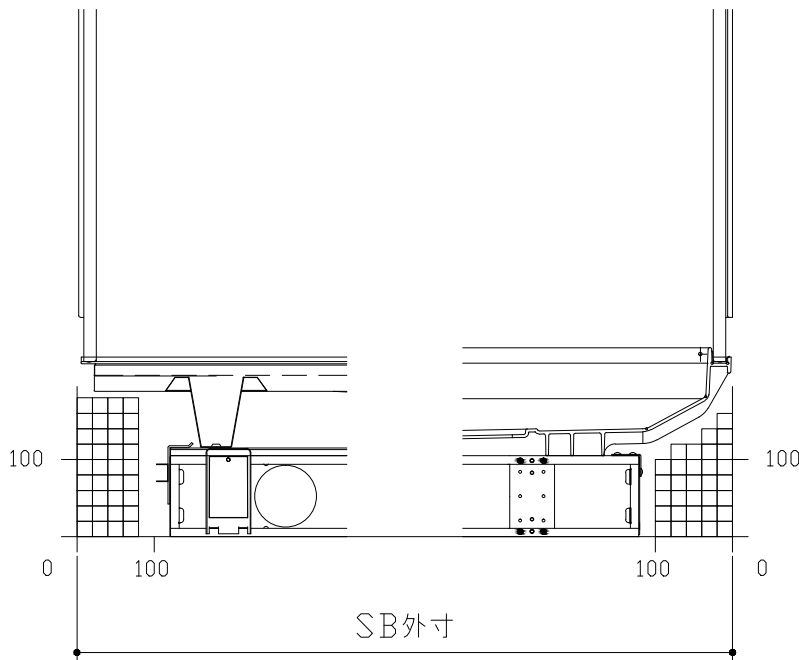


B矢視

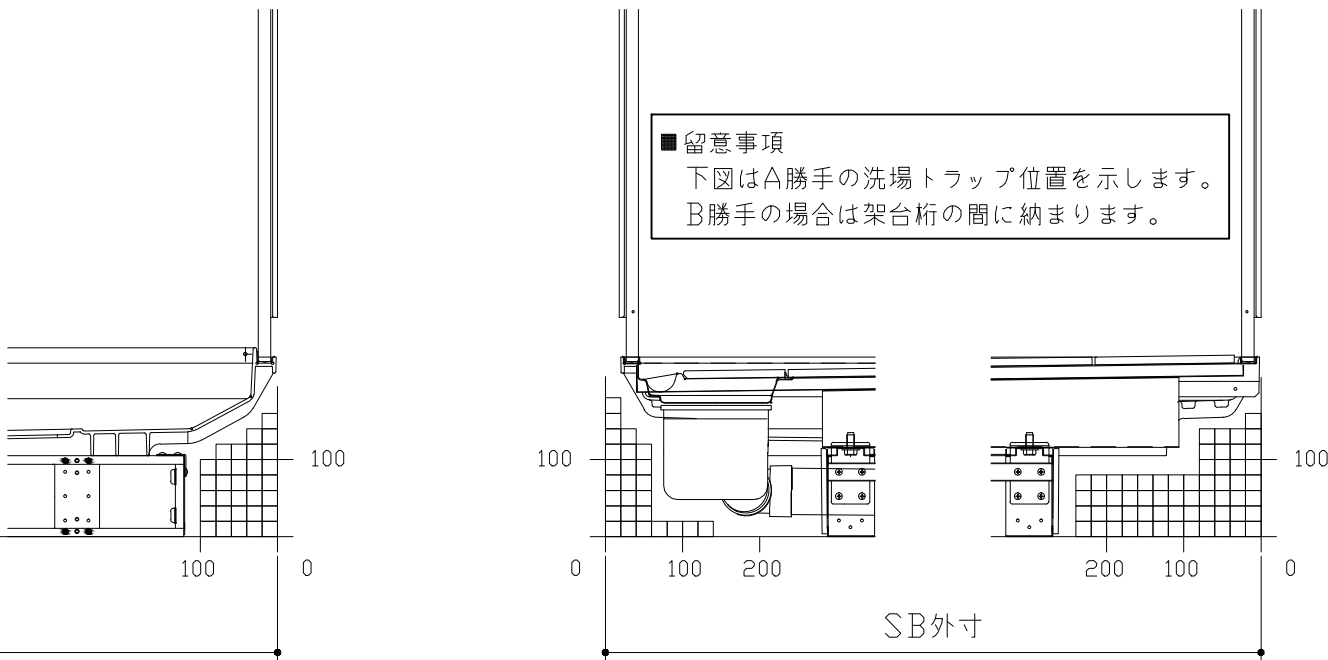


A矢視

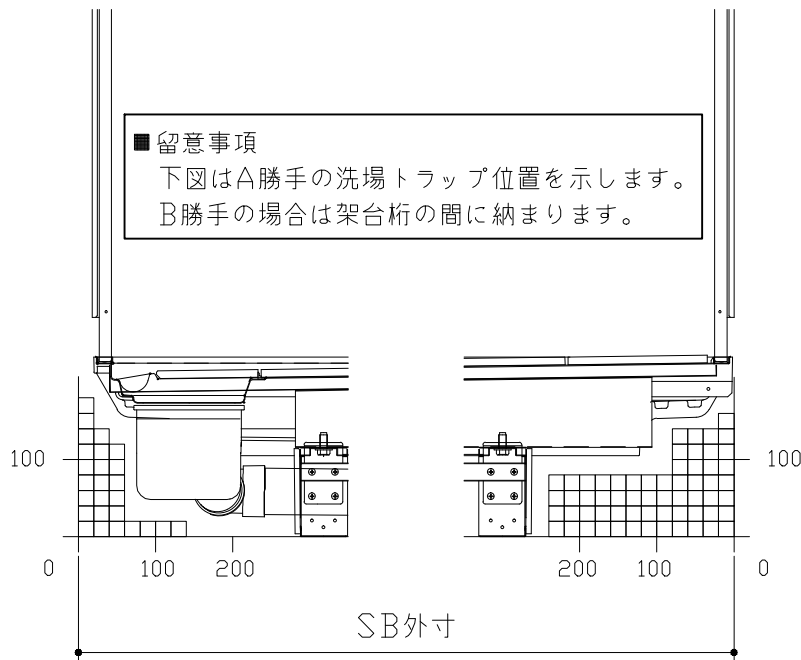


D矢視

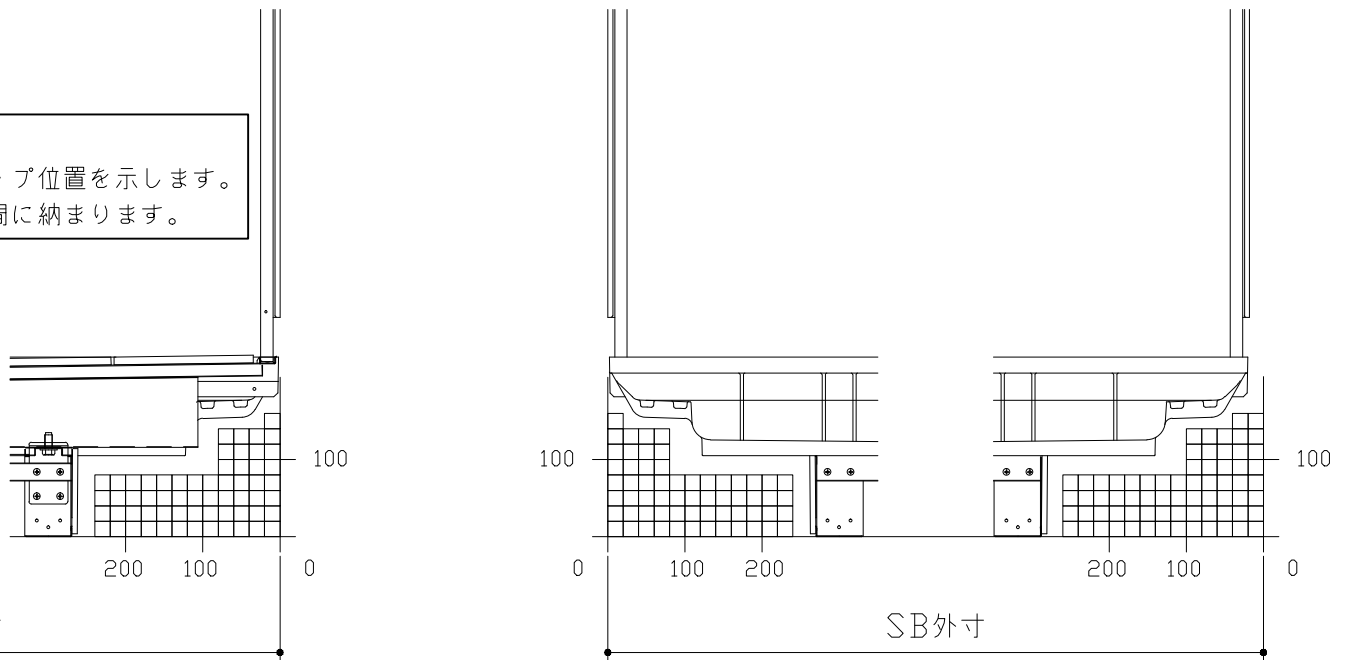

C矢視



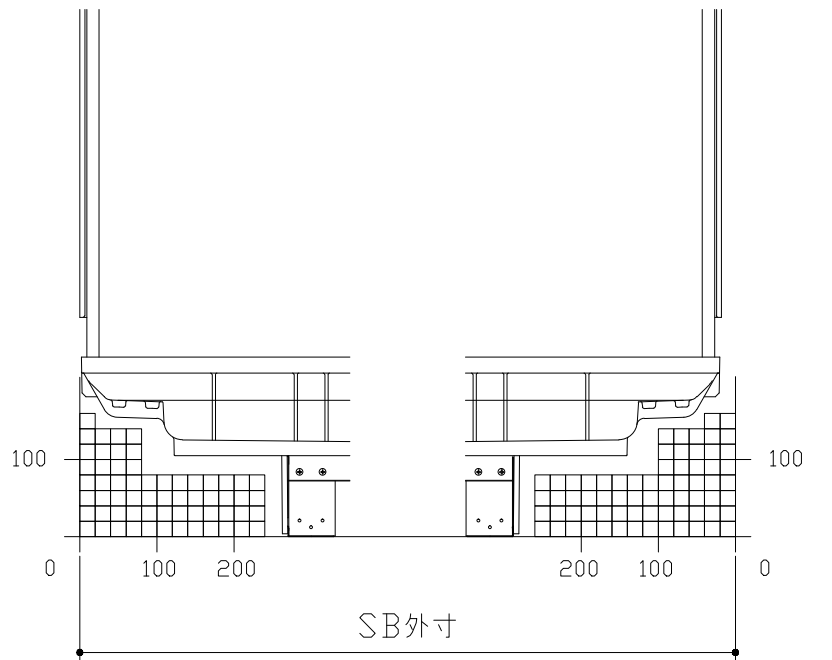


F矢視

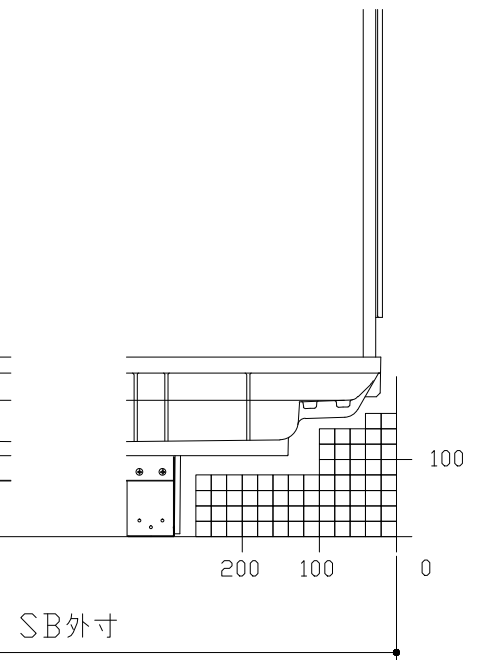


E矢視


キープクリーンドア：開き戸・上部換気口

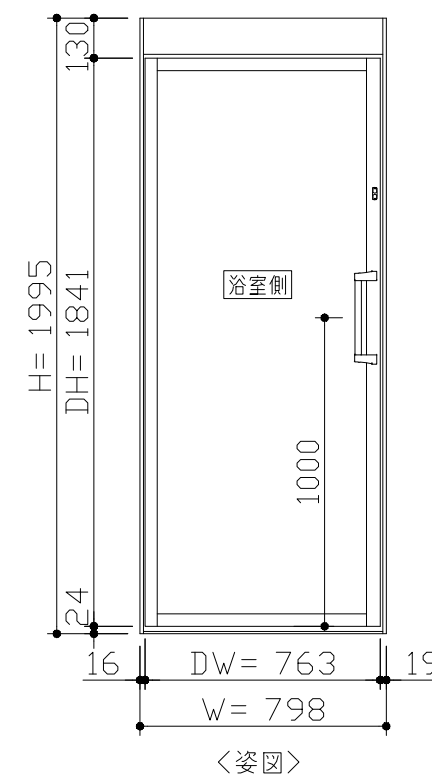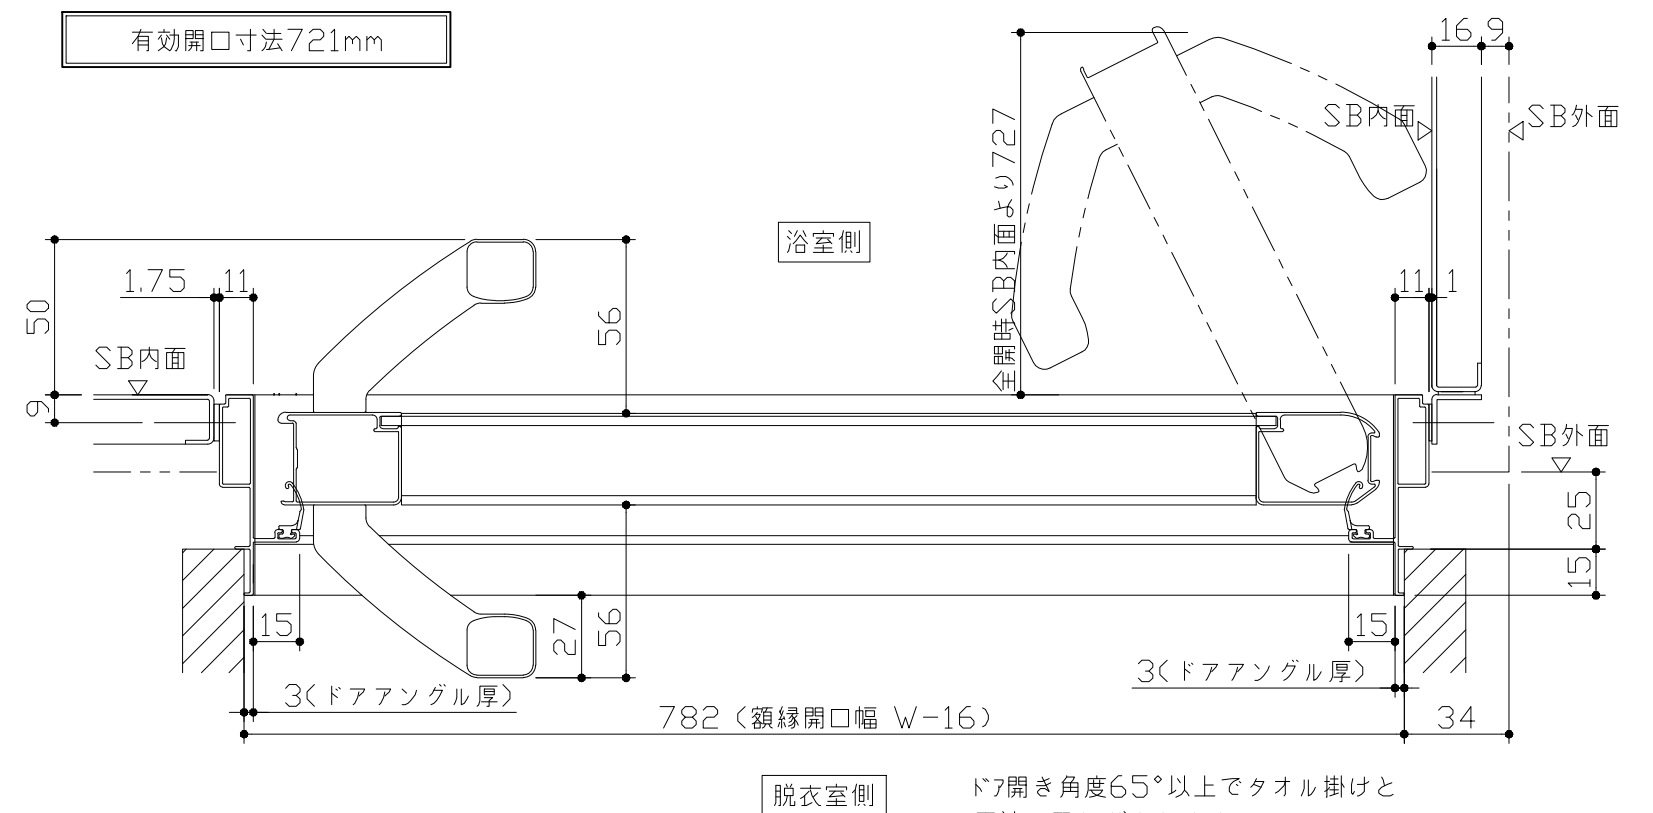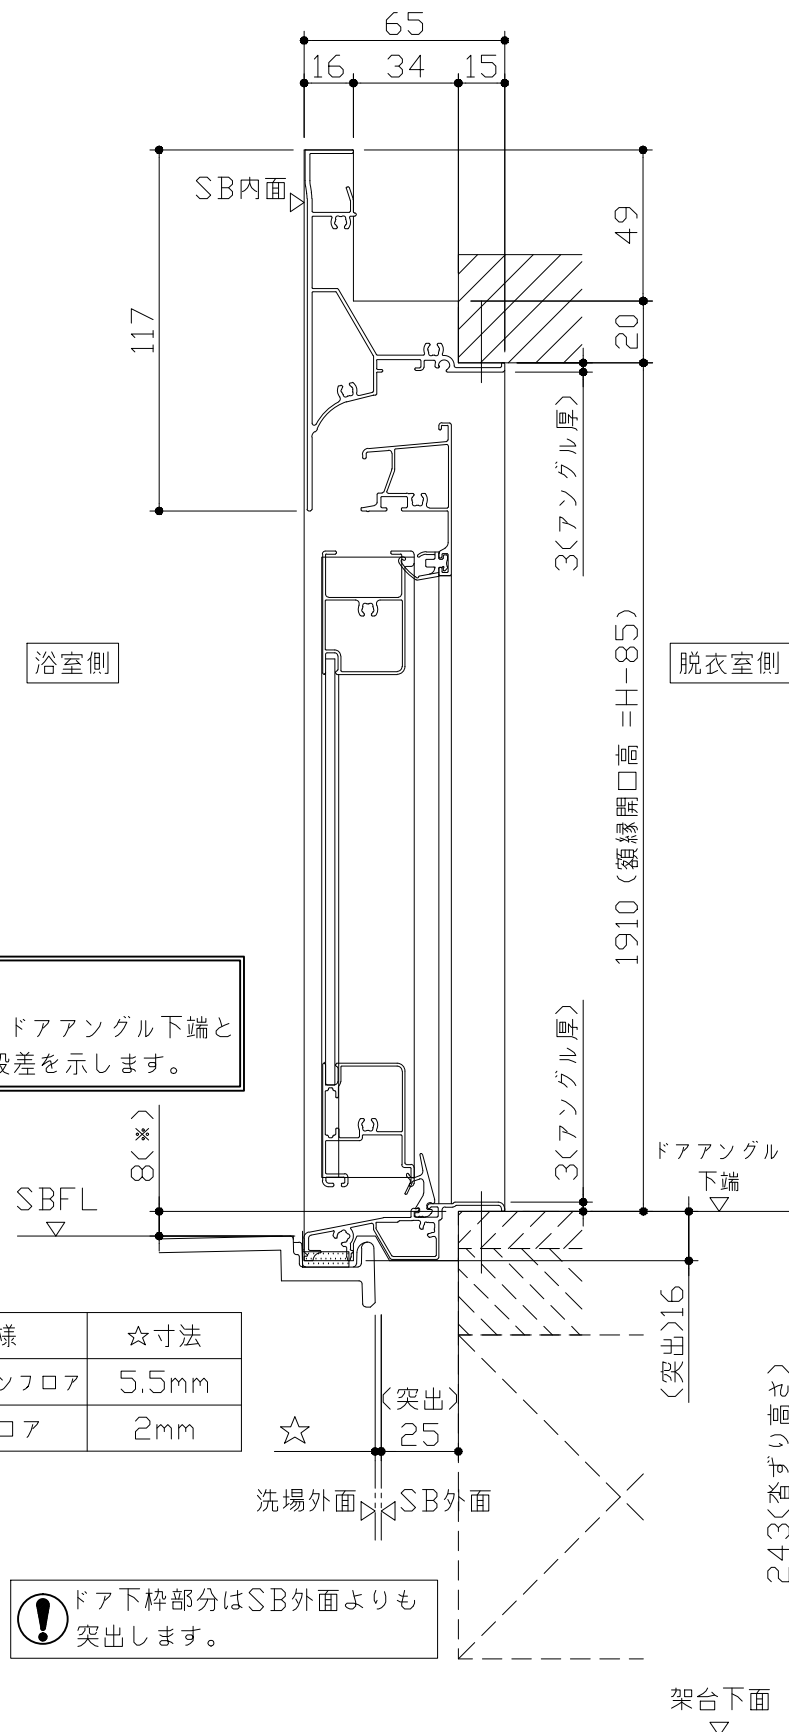

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。


〈参考寸法図〉



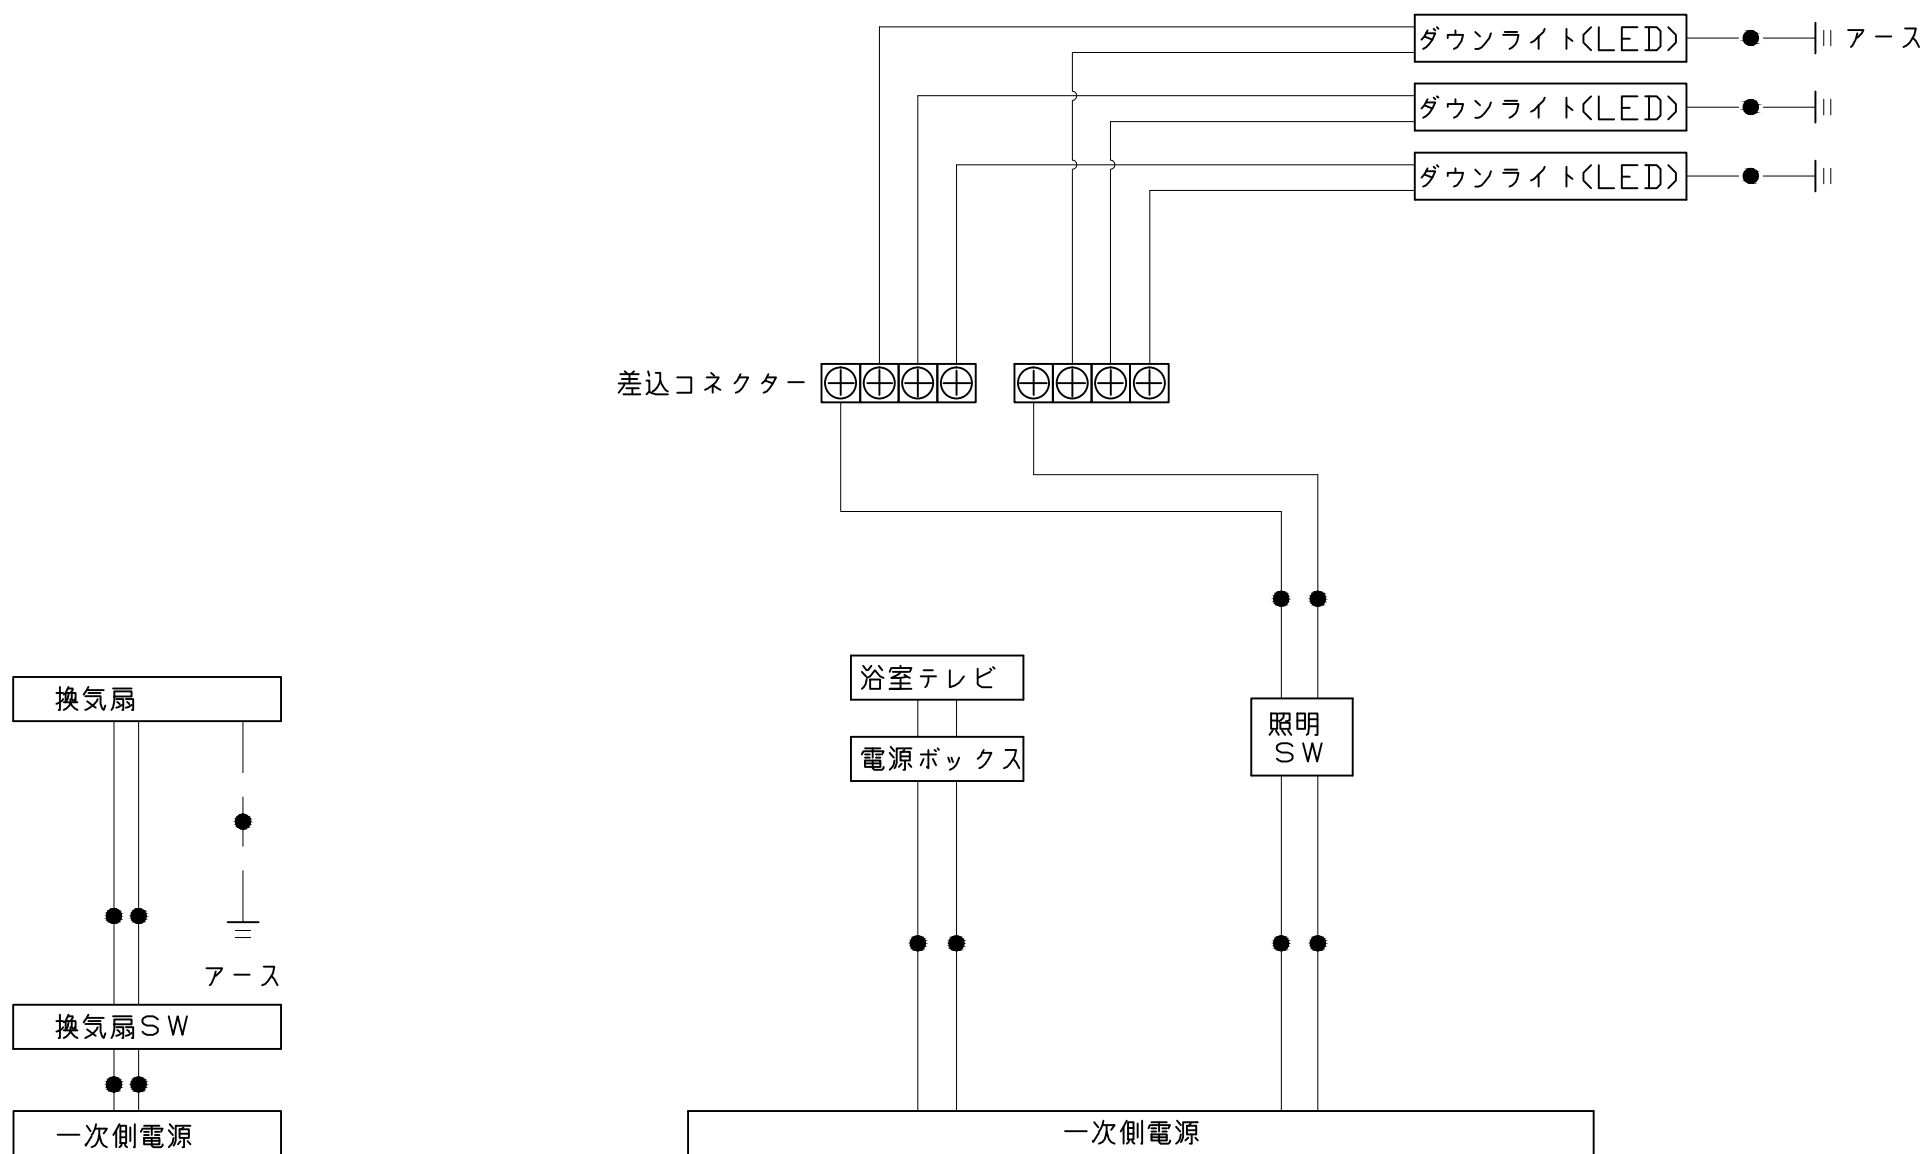


一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。

吊り金具寸法図

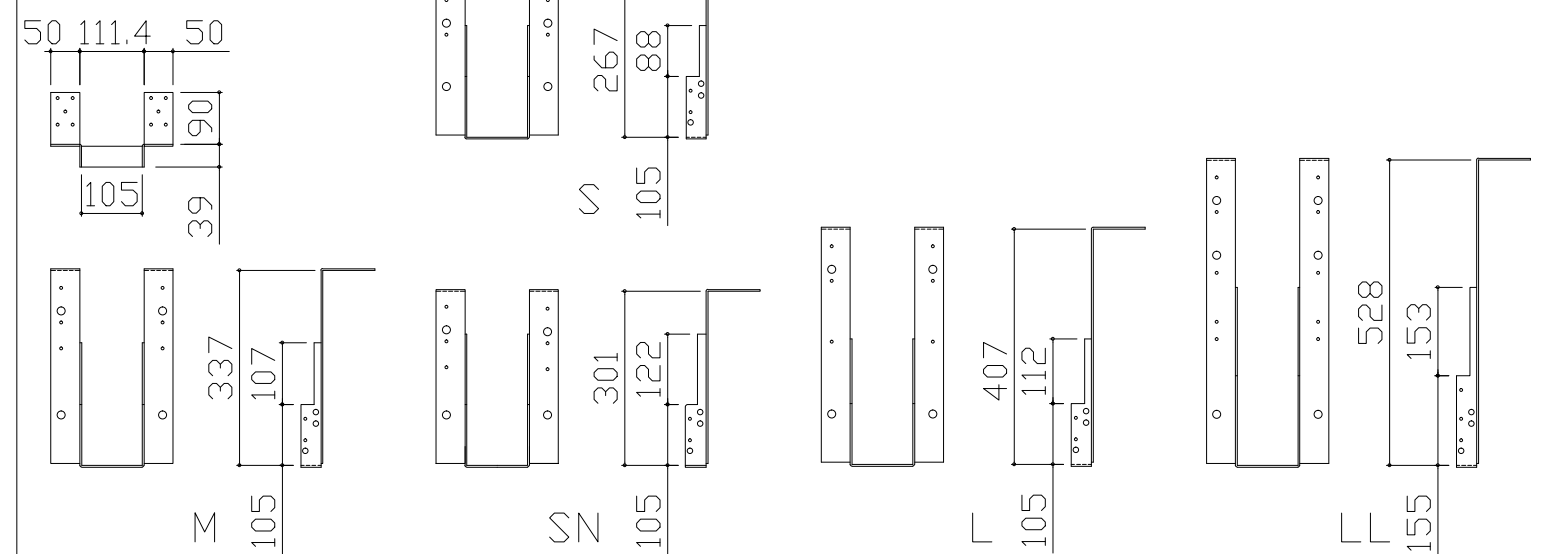

■吊金具設置条件について

- 吊金具を設置する梁（土台）には600～900kgの重量がかかります。
十分な強度を確保した梁（土台）を設置してください。
- 吊金具を設置する梁（土台）の高さ寸法（h）に以下の制約条件があるのでご注意ください。

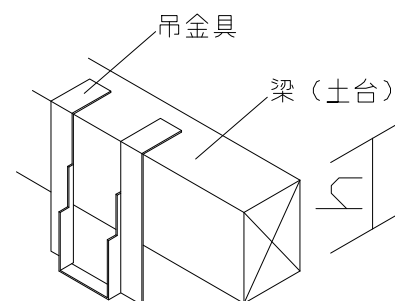

金具セット	h寸法
S	105以上
SN	105以上
M	150以上
L	210以上
LL	240以上

■設置必要材料（現地調達）

【受け梁材が木材の場合】


- 受け梁材（105角 材質：ベイツガ、ベイマツ1級相当品）
- 防錆釘（N-75 80本以上、N-32 20本程度）

【受け梁材が鉄パイプの場合】

- 皿タッピンネジ（クロメート、M4×25 20本程度）


【共通】

- コンパネ（厚み：12mm以上）
- （コーチスクリュー、アンカー、六角レンチ、ドリル）

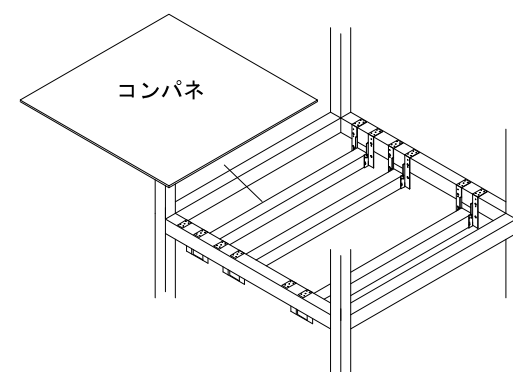

※コンパネは必ず設置してください。

ウケバリ接続金具寸法図




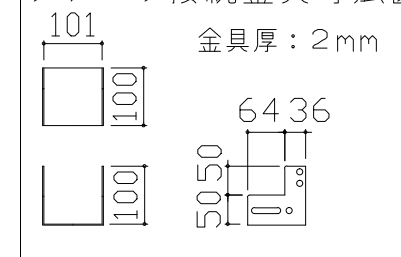


ウケバリ断面図



カウンター面
洗場側面
浴槽側面

洗場側
浴槽側
カウンター対面

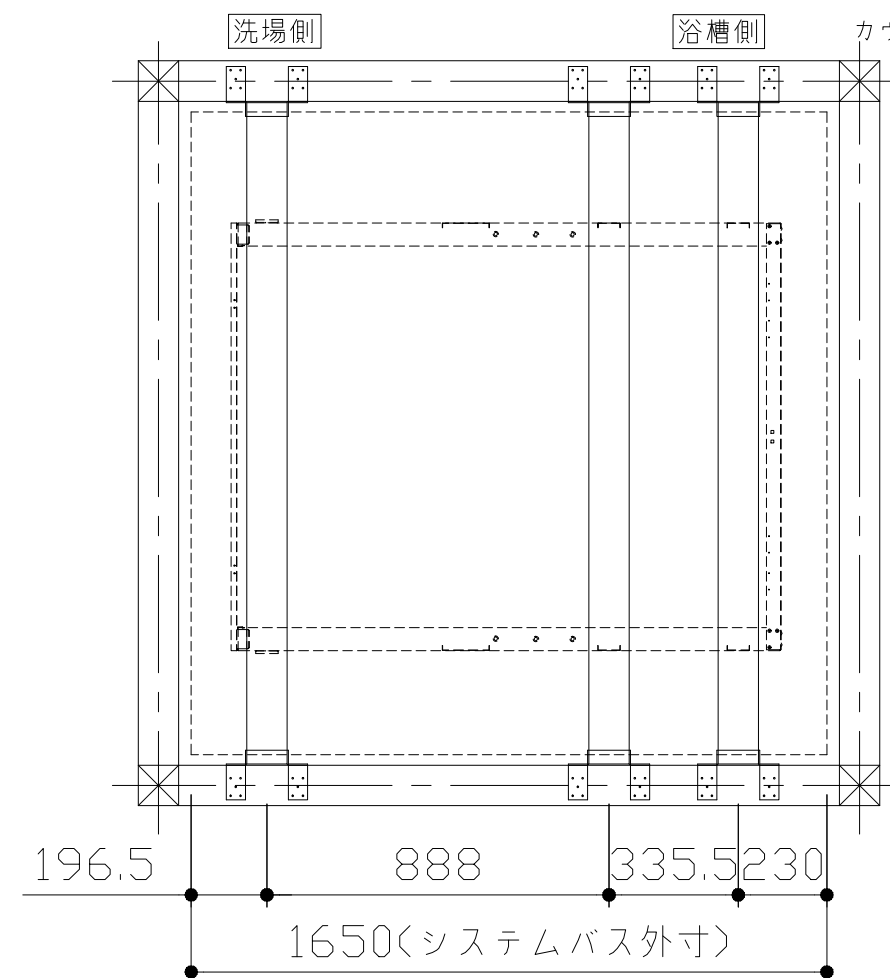

36(※)

ドアアングル下端

- 吊金具参考納まり
- ・床仕上がり36mm(※)
 - ・ツリカゲSN使用
 - ・SBウケバリ使用


Takara standard
タカラストンダード株式会社

現場名称： 北海道-旭川SR SB5様邸
現場番号： A6843730
旭川営業所


PREDENCIA プレデンスΙΑ
プラン番号： 1203E-2012-0024T
担当営業：

吊金具設置図
作成日： 2020年12月3日
担当アドバイザー：

浴槽

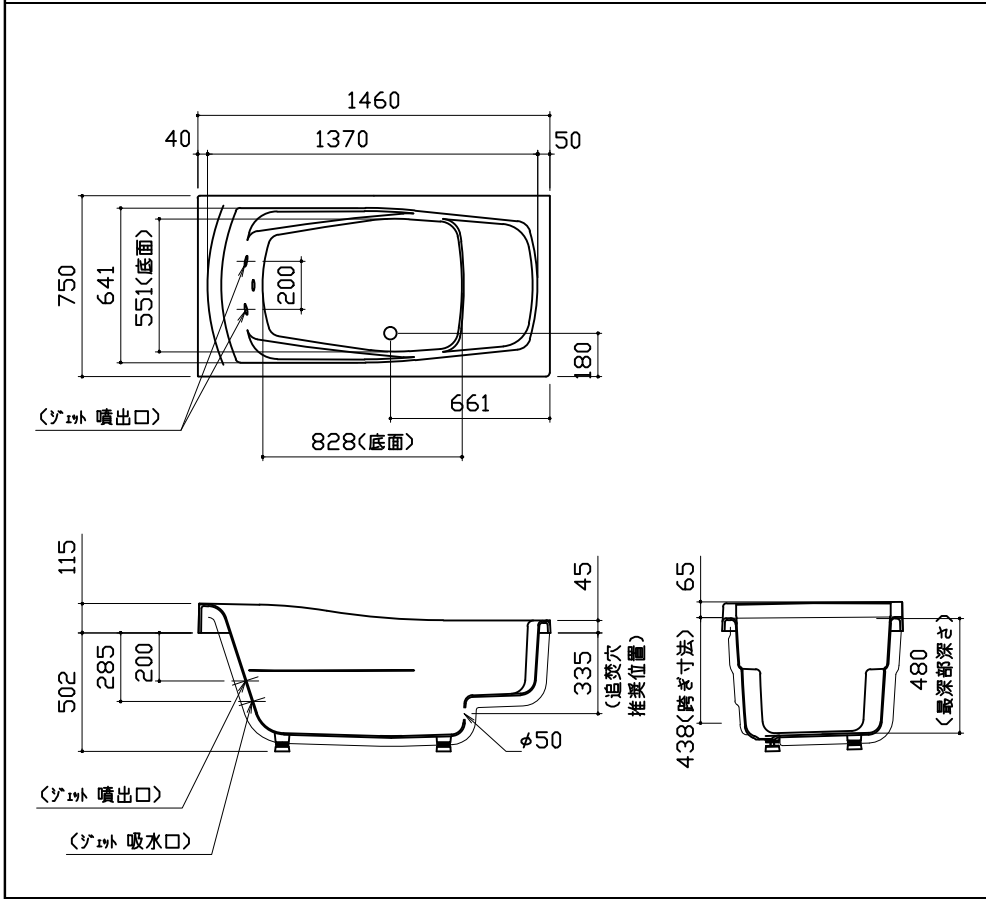

洗い場用水栓

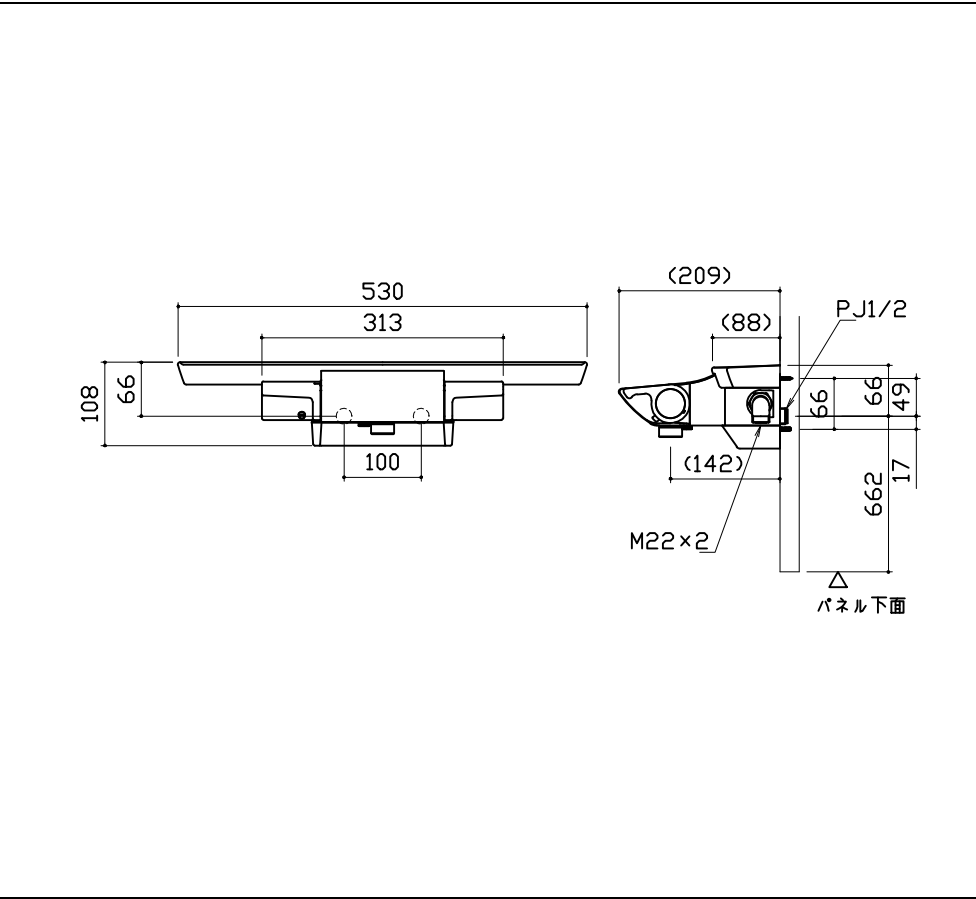

照明

ダウンライト
LED 4.1W (1灯あたり)


φ75 (天井開口)

64


3

φ85


天井厚み 25

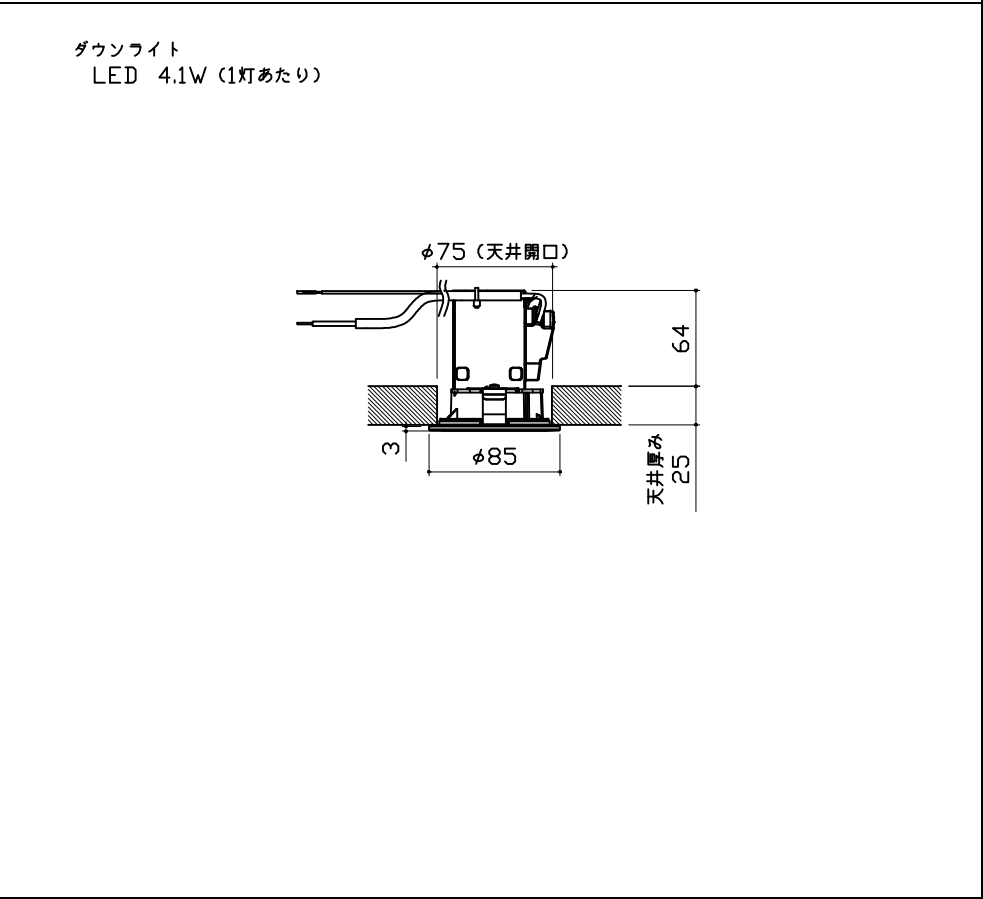

換氣機器

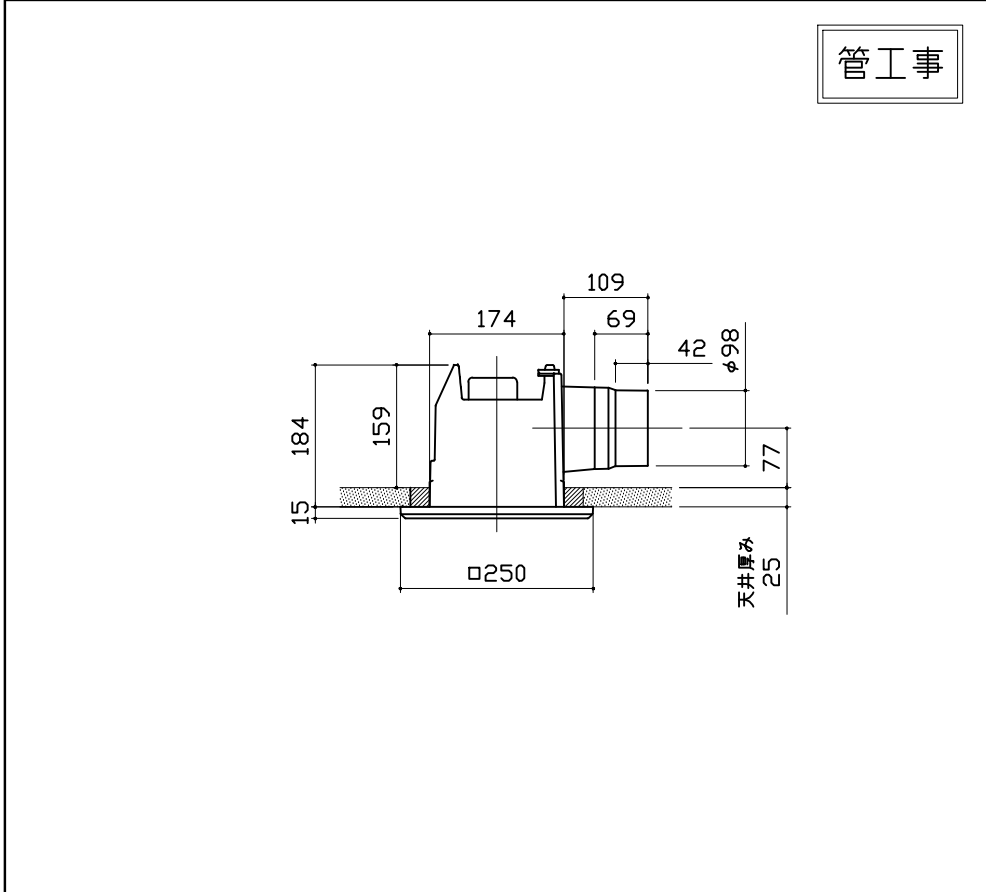

シャーフックスライドバー

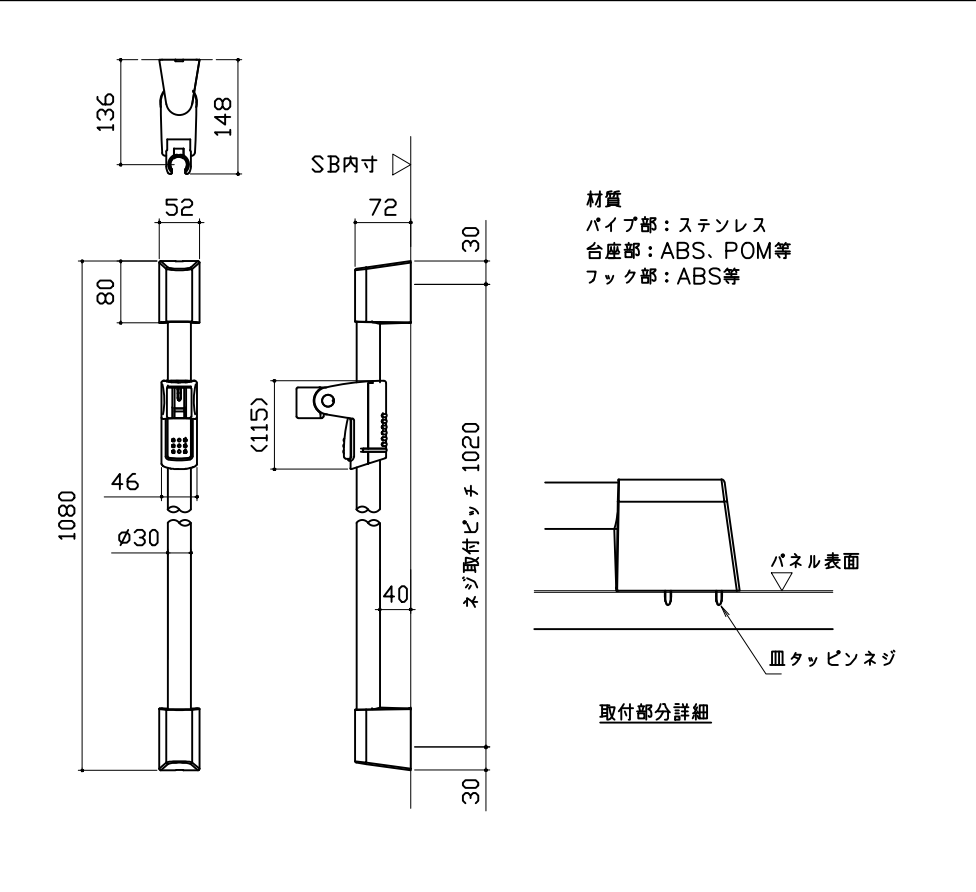








ミラー

枠：SUS304 t0.8
 ミラー：表面防曇コートあり（横長クリアミラー）
 表面防曇コートなし（横長ミラー）

The drawing shows a rectangular mirror frame with the following dimensions and labels:

- Overall width: 570 (鏡本体)
- Overall height: 400 (鏡本体)
- Top flange thickness: 9.5
- Bottom flange thickness: 25.5
- Side flange thickness: 11
- Inner mirror area width: 369 (取付穴ピッチ)
- Inner mirror area height: 369 (取付穴ピッチ)
- Mounting hole pitch (horizontal): 41, 244, 244, 41
- Mounting hole pitch (vertical): 5 (鏡)

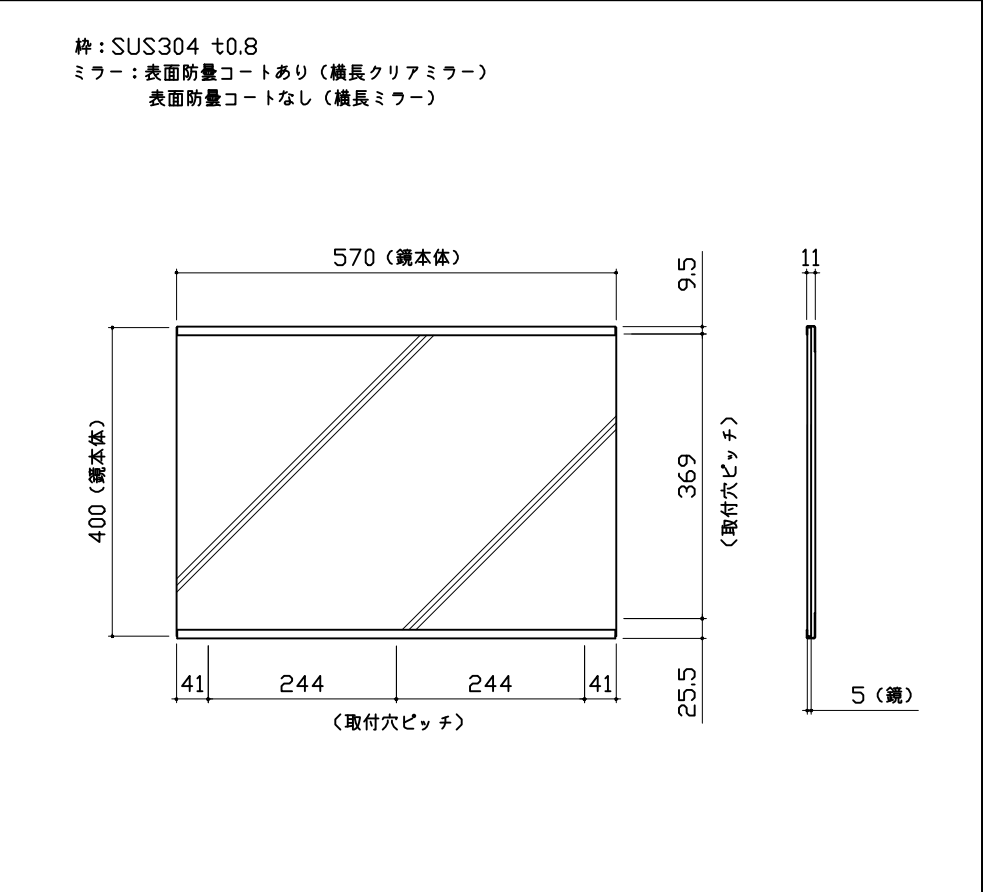


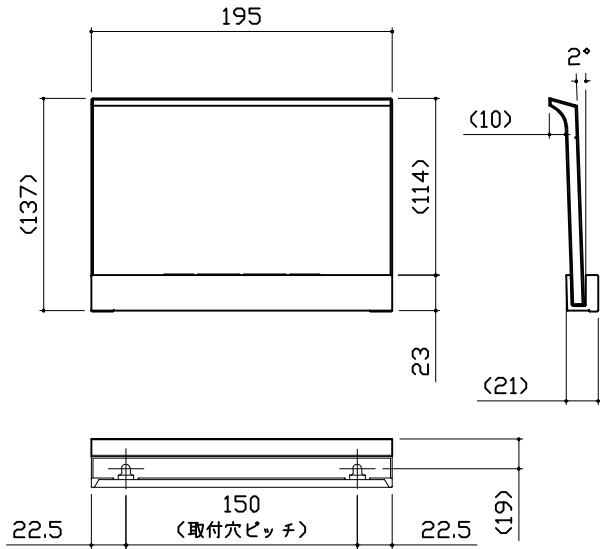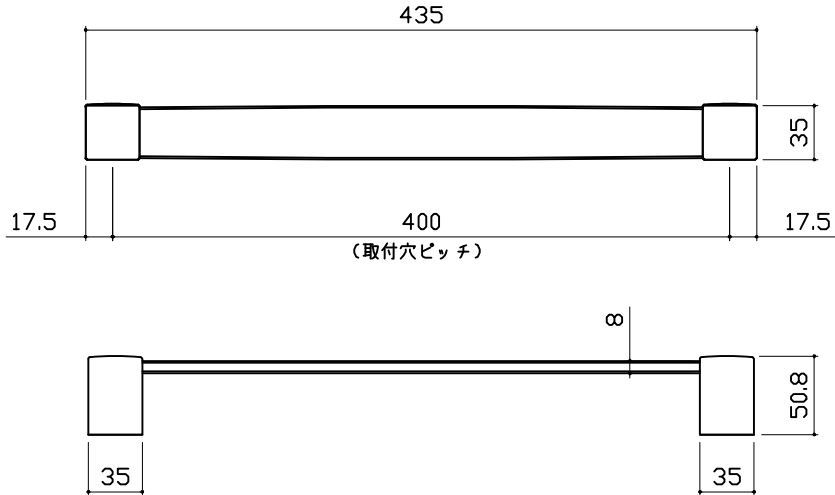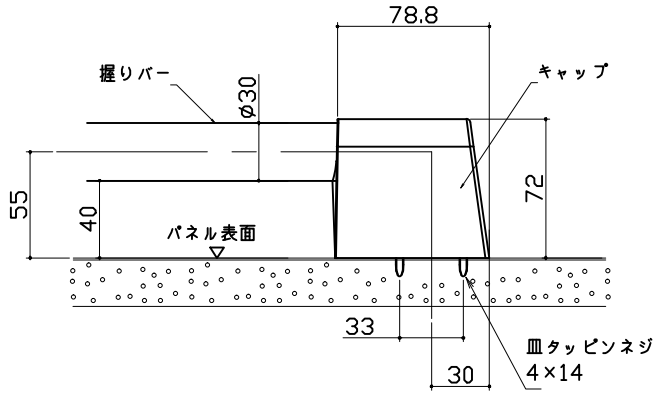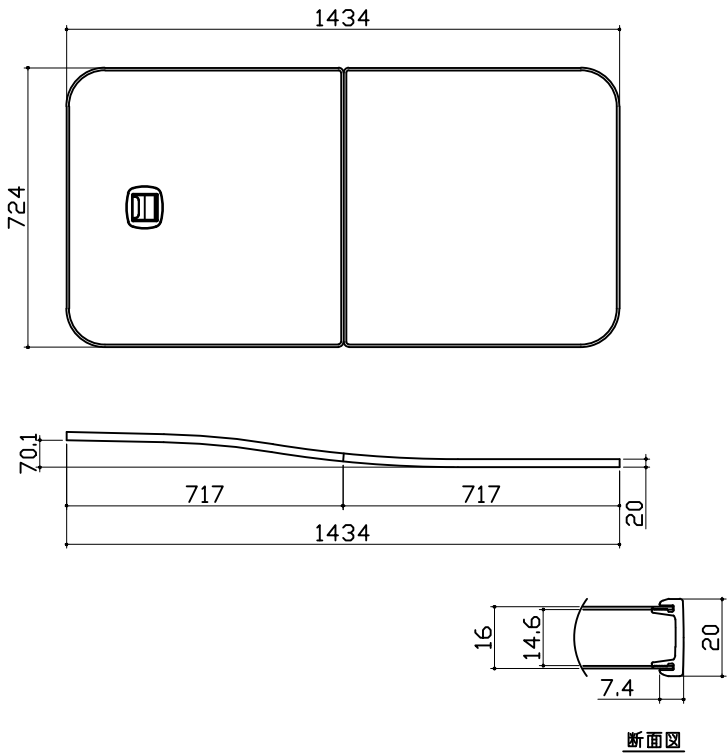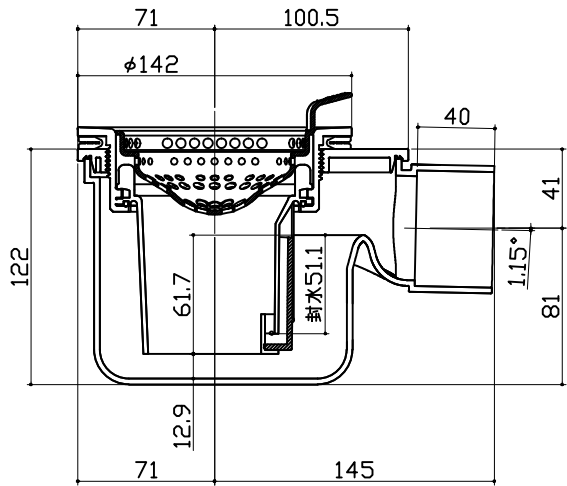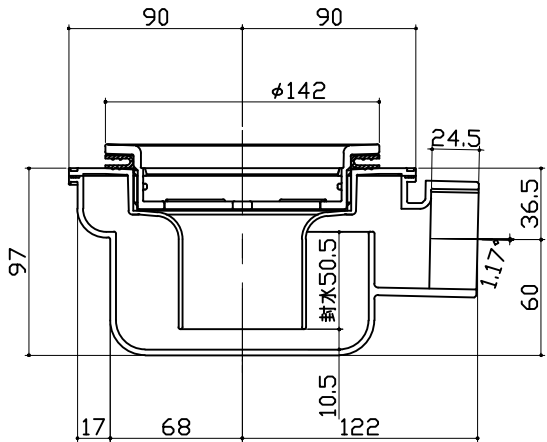収納棚	タオル掛け	ハンドバー支持部取合詳細図		
本体：PMMA 	本体：PMMA ブラケット：ABS（クロムメッキ仕上げ） 			
風呂蓋 フワワMDH-16XST	洗い場側排水トラップ	浴槽側排水トラップ		
				
 タカスタンダード株式会社	現場名称： 北海道-旭川SR SB5様邸	PREDENCIA プレデンスシア	部材詳細図	2/3
	現場番号： A6843730	プラン番号： 1203E-2012-0024T	作成日： 2020年12月3日	
	旭川営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

浴室テレビ①

浴室テレビ②


浴室テレビ本体

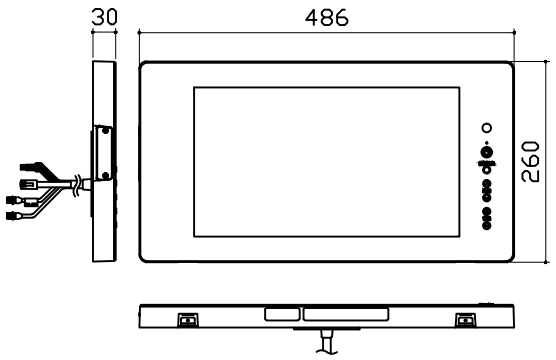

電気工事

TV本体仕様	
名称	浴室テレビユニット
型式	白色:MW16D-3(T) 黒色:MW16D-3B(T)
外形寸法(mm)	幅486×高さ260×奥行30
質量	3.2kg
周囲温度	0~50℃
表示部	画面サイズ 15.6インチ
バックライト	
スピーカー	3W+3W
映像解像度	WXGA:1366×768
消費電力	24W

電源チューナーボックス



電源チューナーボックス仕様

名称	電源チューナーボックス
外形寸法(mm)	幅230×高さ104×奥行47.3
質量	0.95kg
定格入力	AC100V
アンテナ部	F型接続
周囲温度	0~40℃

※三谷商事製

【工事範囲】

当社工事範囲

1. 浴室テレビ本体、電源ボックスの取付
2. モニター中継ケーブルの天井裏への配線
3. 浴室テレビ本体及び電源ボックスとモニター中継ケーブルの接続


電気工事業者様 工事範囲


1. 電源ボックスへ一次側100Vの接続
2. アンテナ線の配線及び接続作業
3. ブレーカーと漏電遮断機の設置







■留意事項

- (1) レコーダー、プレーヤー等の外部機器は接続できません。
- (2) 付属のモニター中継ケーブルは4mになります。
4mで長さが足りない場合には別売品のモニター延長ケーブル（4m）で最長8mまで延長可能です。

電気工事

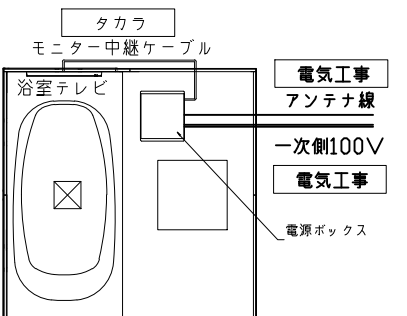

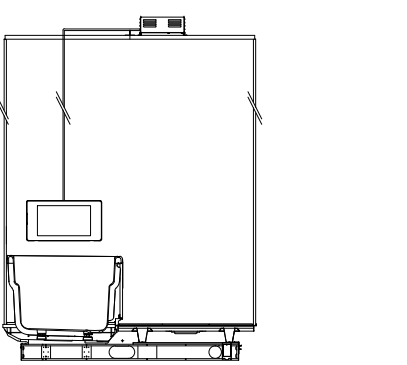

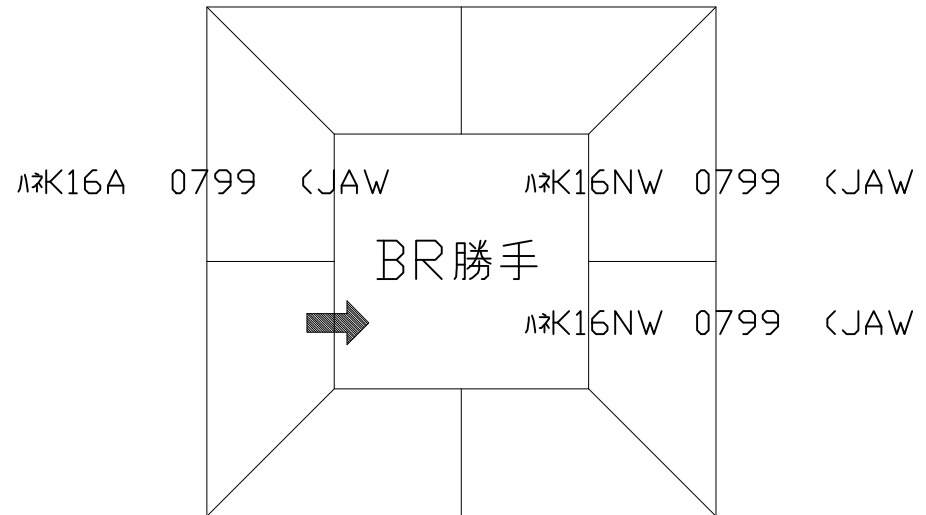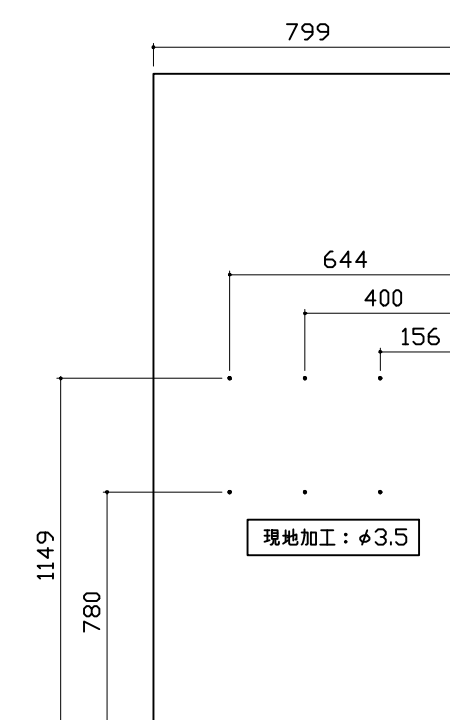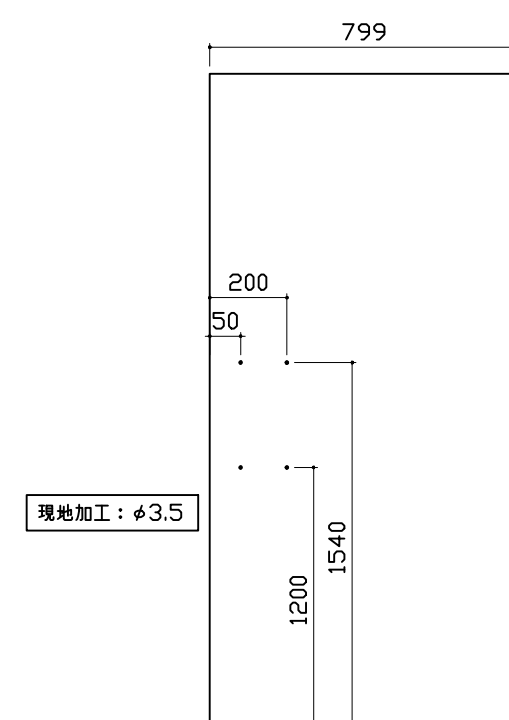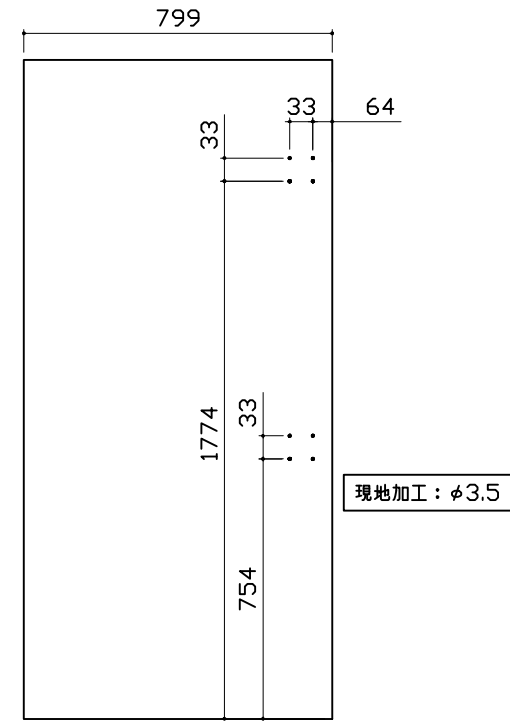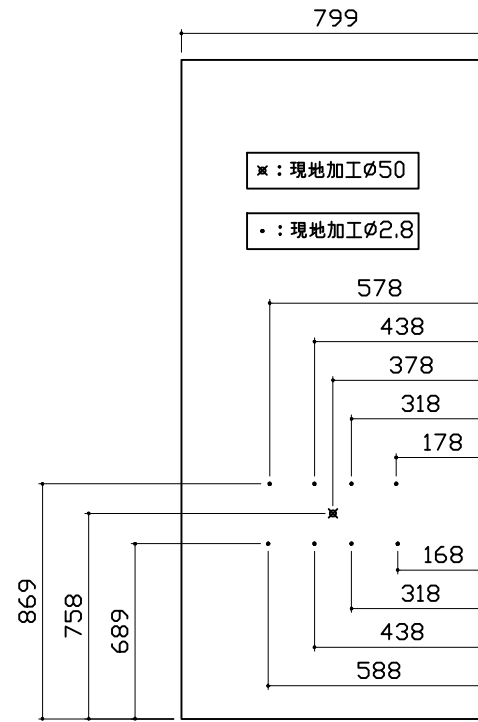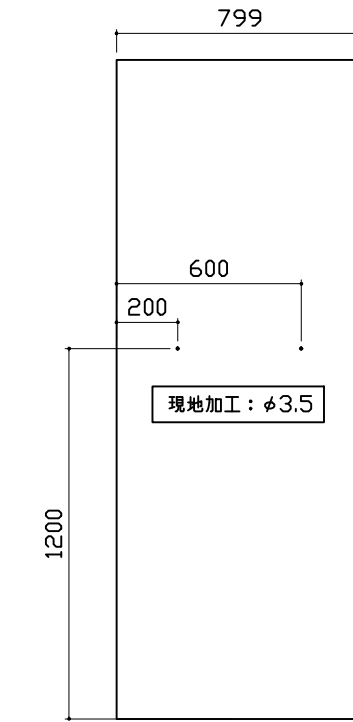パネル割図		ミラー		収納棚			
ハネK16C2J 0799 L<JYH ハネK16C1N 0799 R<JYH  ハネK16A 0799 <JAW ハネK16AD 0799 <JAW		ハネK16C2J 0799 L<JYH  現地加工: φ3.5		ハネK16C2J 0799 L<JYH  現地加工: φ3.5			
シャワーフックスライドバー		浴室テレビ		タオル掛け			
ハネK16C2J 0799 L<JYH  現地加工: φ3.5		ハネK16C1N 0799 R<JYH  ※: 現地加工φ50 ・: 現地加工φ2.8		ハネK16A 0799 <JAW  現地加工: φ3.5 ■留意事項 ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。			
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 北海道-旭川SR SB5様邸		PREDENCIA プレデンスシア		穴開け指示図	1/1
		現場番号： A6843730		プラン番号： 1203E-2012-0024T		作成日： 2020年12月3日	
		旭川営業所		担当営業：		担当アドバイザー：	
