

システムバス 御見積書

御名前 北海道-新旭川SR SB7 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランスパ

作成日 2025年6月3日
プラン番号 1203E-2506-0032T
現場番号 C5950363

タカラスタンダード株式会社
◆旭川営業所
北海道旭川市大雪通6丁目500番39号
TEL 0166-73-5458 / FAX 0166-73-5487

◆旭川ショールーム
TEL 0166-73-5459 / FAX 0166-73-5499

商品
御見積金額 ￥892,400 (税込 ￥981,640)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥163,500 (税込 ￥179,850)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616(BL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	チェッポビアンコ
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	クリスタルパールホワイト
浴槽形状	ラウンド浴槽
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ダークグレー / ブラック
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ジオマーブルアイボリー
パネルカラー(周辺)	パールホワイト
ガス種 / 周波数	13A / 50Hz

◆ 御確認事項

◆ 備考

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
旭川SR	旭川SR	吉川

--	--

No.*

御名前 北海道-新旭川SR SB7

様

現場番号	C5950363	プラン番号	1203E-2506-0032T	作成日	2025/6/3
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	769,000	769,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	開き戸<800幅>(ブラック)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1	+26,500	+26,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・周辺ハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・チェッポビアンコ)	1	+29,000	+29,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(クリスタルパールホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
11	浴槽形状	人大ラウンド浴槽	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
17	浴槽パン	あり	1		
18	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB181-5UTH	1		
19	洗い場用水栓	ヒロカルシャワー:SB181-5UTHB1HK	1		
20	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
21	カウンター	人造大理石カウンター	1		
22	シャワーフックスライドバー	あり	1		
23	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザイン 周辺ハイクラス)(Kパネル)	1	+55,000	+55,000
24	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
25	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
26	換気機器	天井換気扇ブラック	1	+3,000	+3,000
27	換気機器開口	工場開口	1		
28	照明	天井付スクエア照明+ダウンライト(1灯)(電球色)	1		
29	天井照明開口	工場開口	1		
30	ミラー	ロングクリアミラー	1		
31	風呂フタ	風呂フタなし	1	-15,500	-15,500

御名前 北海道-新旭川SR SB7

様

現場番号	C5950363	プラン番号	1203E-2506-0032T	作成日	2025/6/3
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
33	収納棚	スクエアタイプ(3段)＜チャコールグレー＞	1	+1,700	+1,700
34	どこでもラック	タオルハンガーL(チャコールグレー)	1	+2,800	+2,800
35	どこでもラック	小物置きL(チャコールグレー)	1	+3,400	+3,400
36	吊り金具	62L	1	+13,500	+13,500
37	給水給湯管	洗い場1水栓＜上配管 カウンター側接続＞	1		
38	トラップカバー	洗い場側トラップカバー	1		
39	トラップカバー	浴槽側トラップカバー(浴槽パンあり)	1		
システムバス合計			39		¥892,400
商品総合計			39		¥892,400

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥163,500 (税込 ¥179,850)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

パース

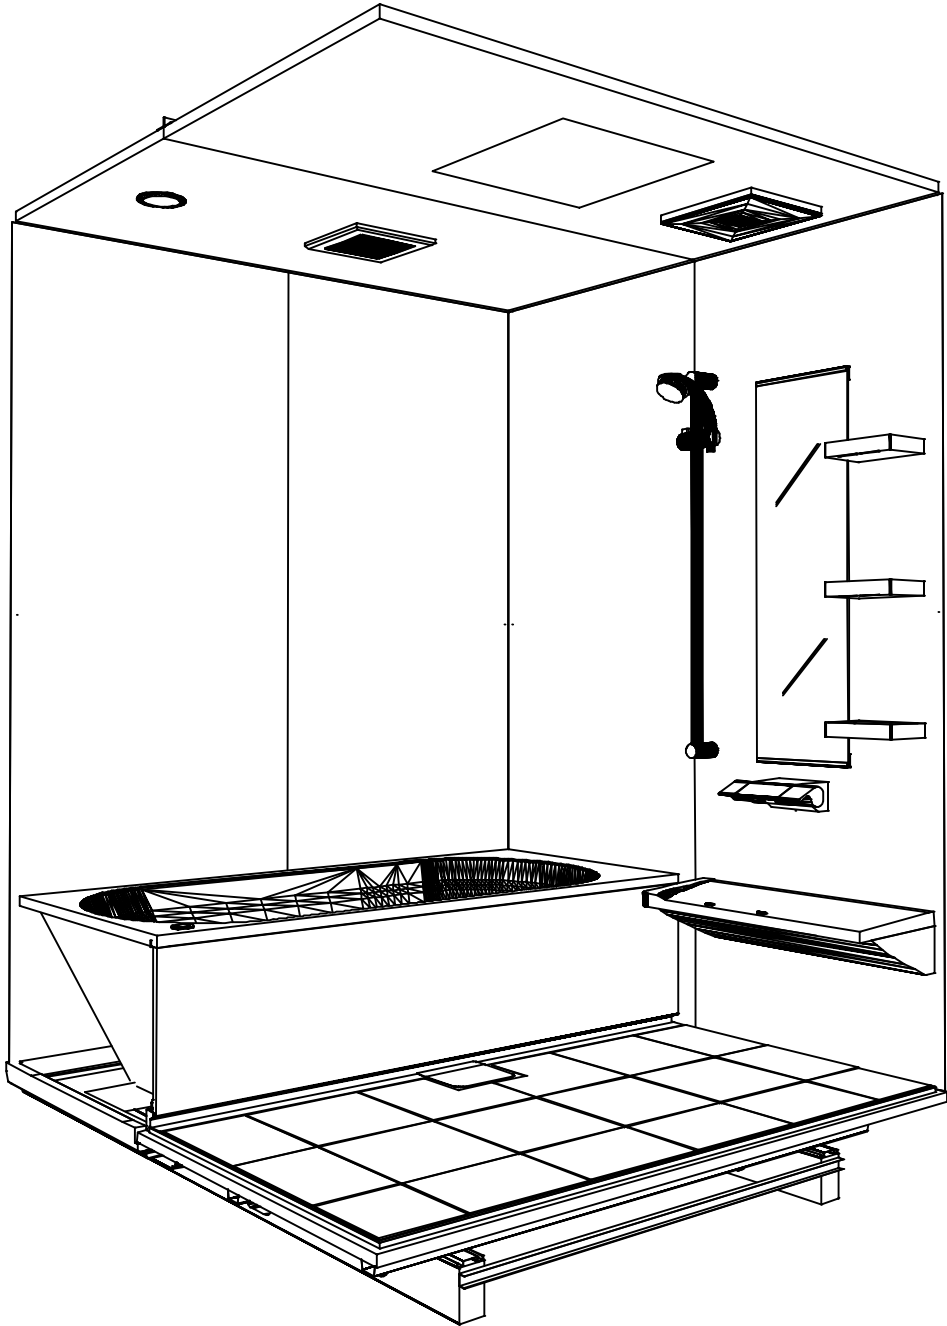

鳥瞰図

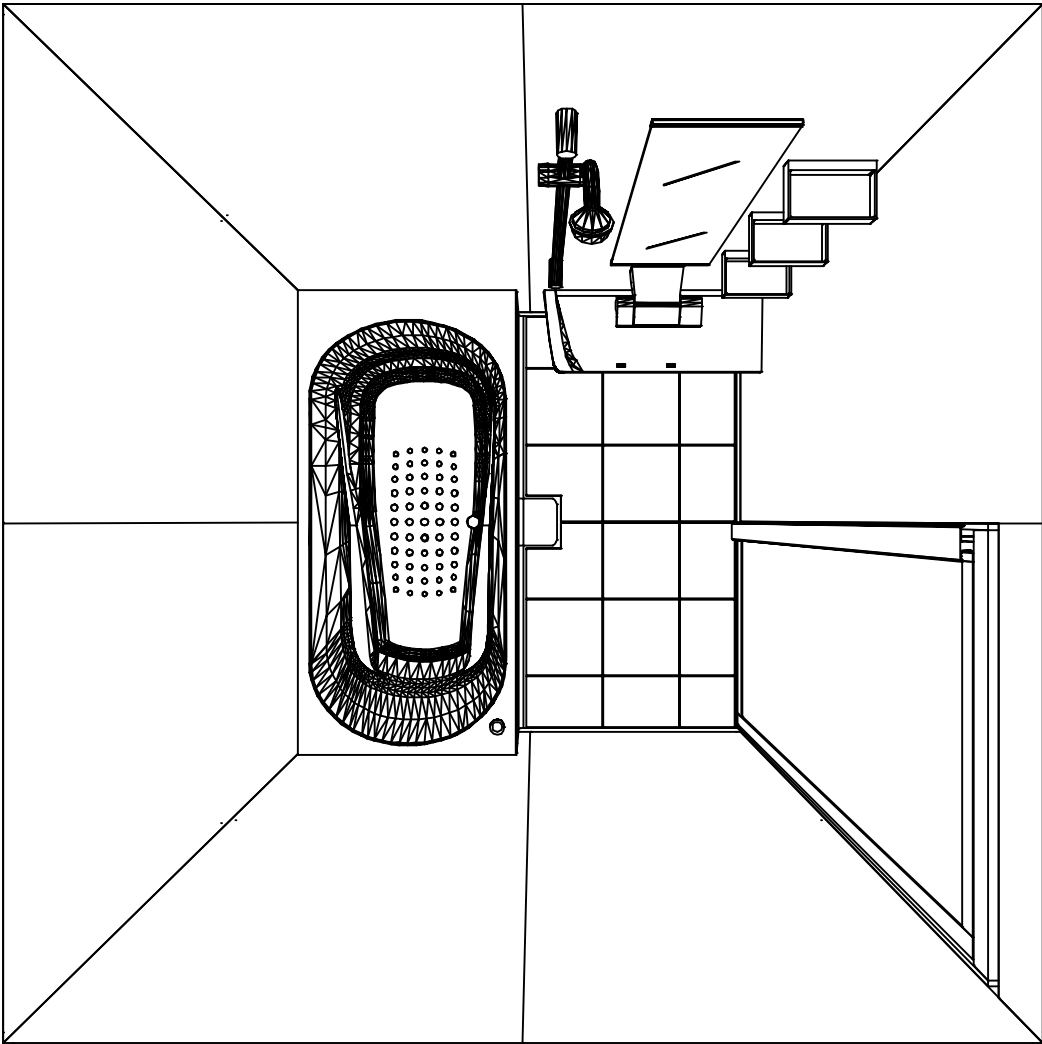

1616

フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： 北海道-新旭川SR SB7様邸	GRANSPA グランスパ	姿図
現場番号： C5950363	プラン番号： 1203E-2506-0032T	作成日： 2025年6月3日
旭川営業所	担当営業： 旭川SR	担当アドバイザー： 旭川SR


カウンター面

浴槽側面


洗場側面

カウンター対面



■ 留意事項
* 印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。

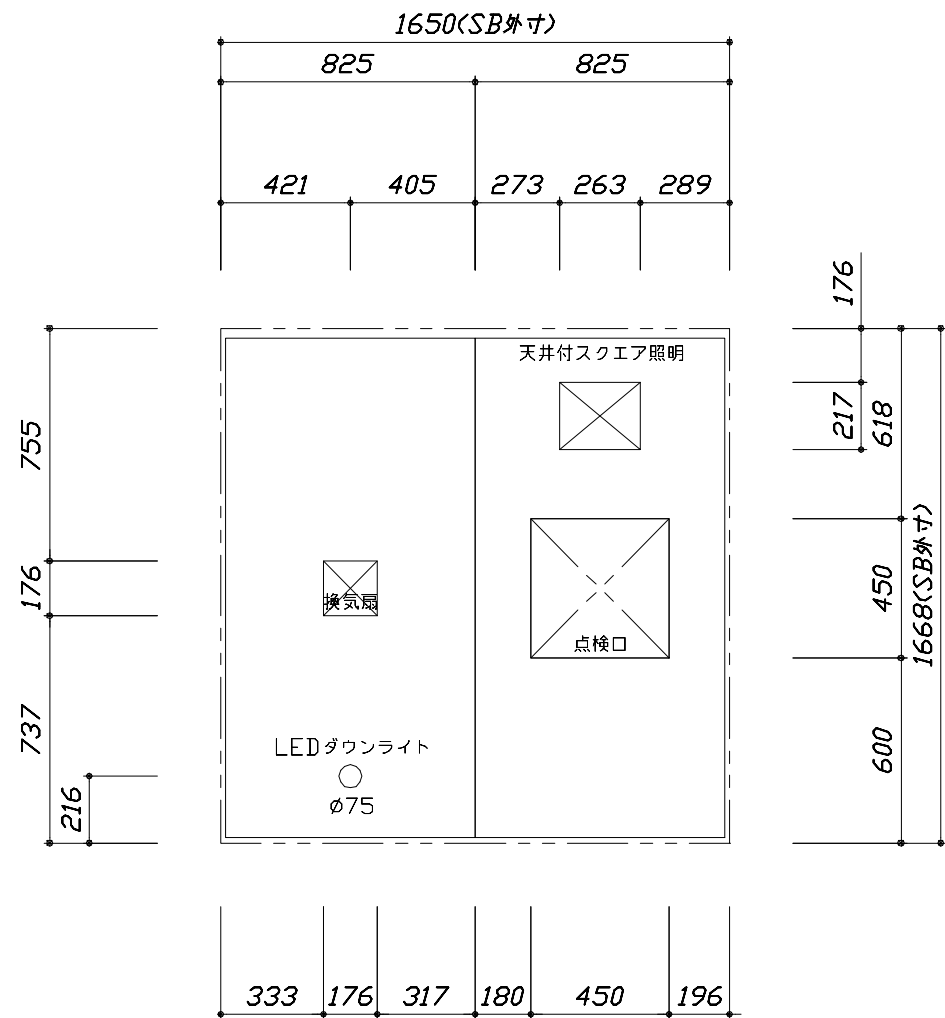

< 天井伏図 >

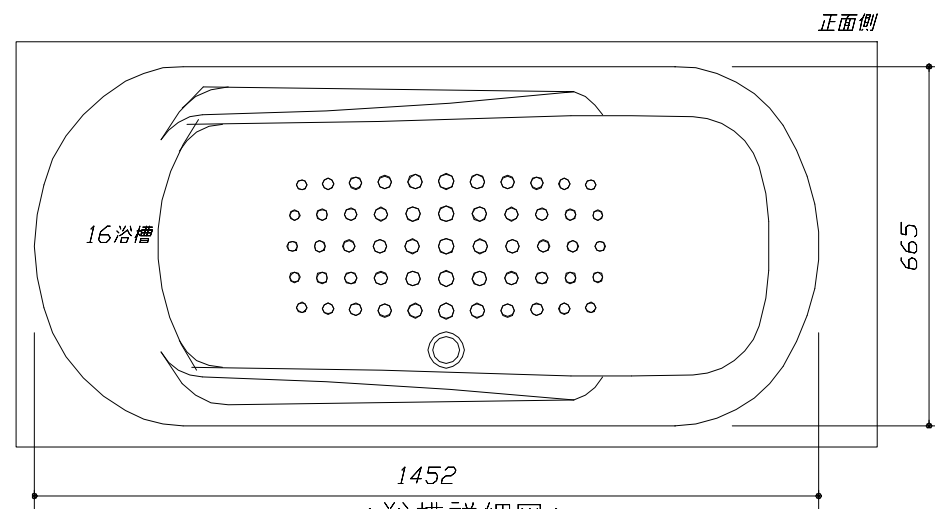


< 浴槽詳細図 >

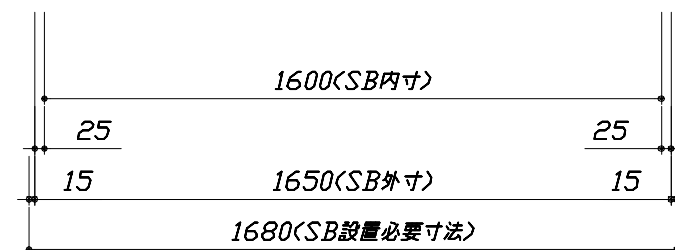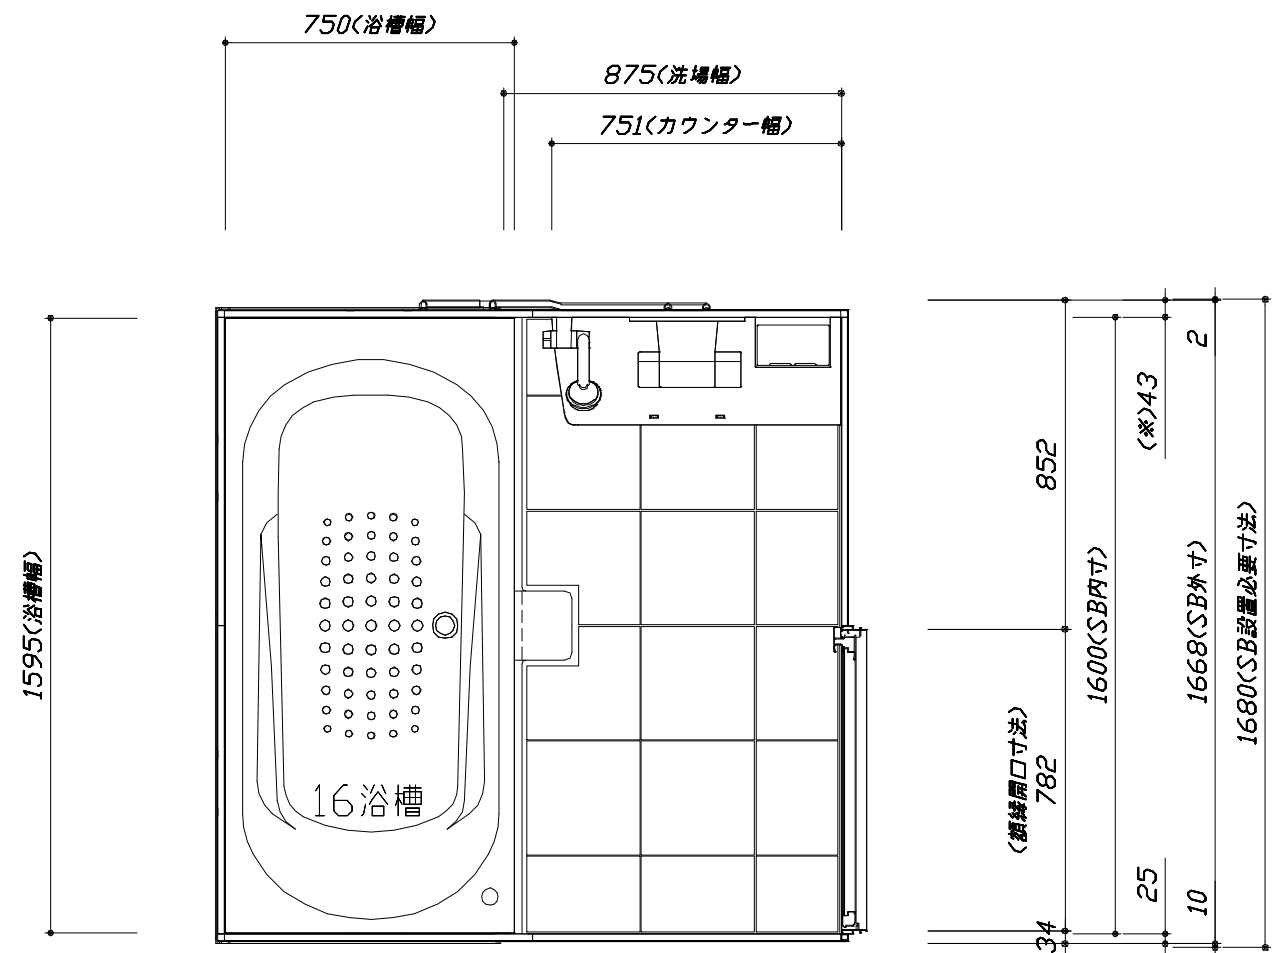

< 平面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

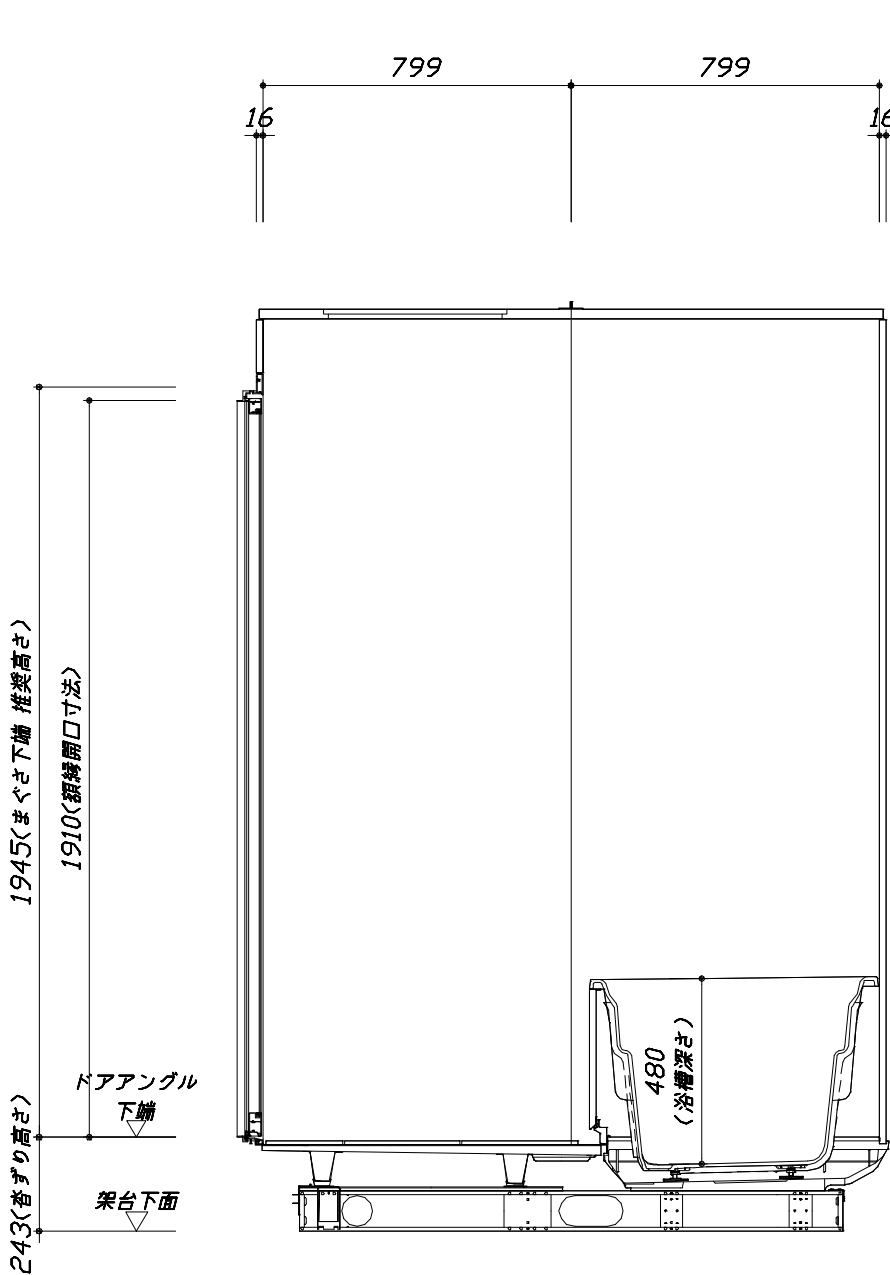

＜カウンター対面図＞


■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
（クリア寸法含む）

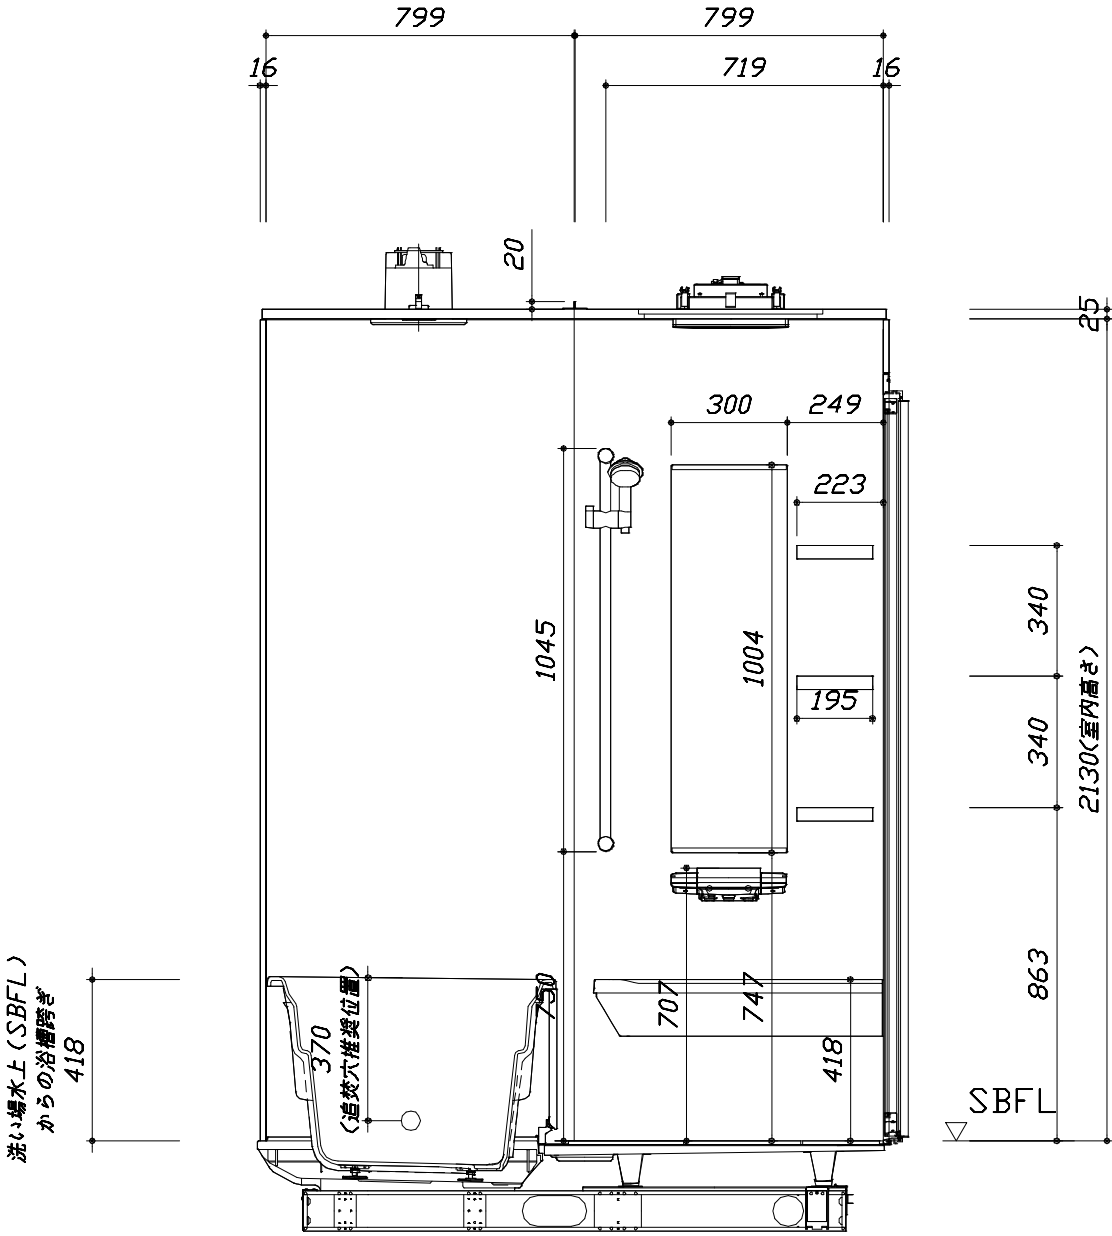

＜カウンター面図＞


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

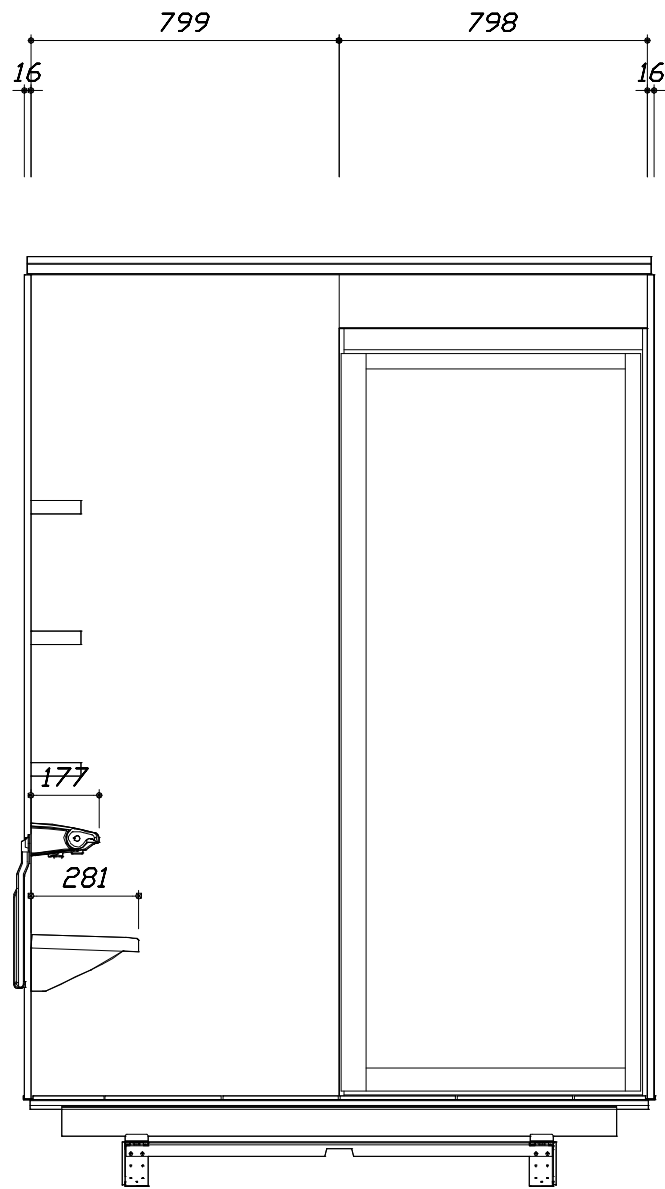

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

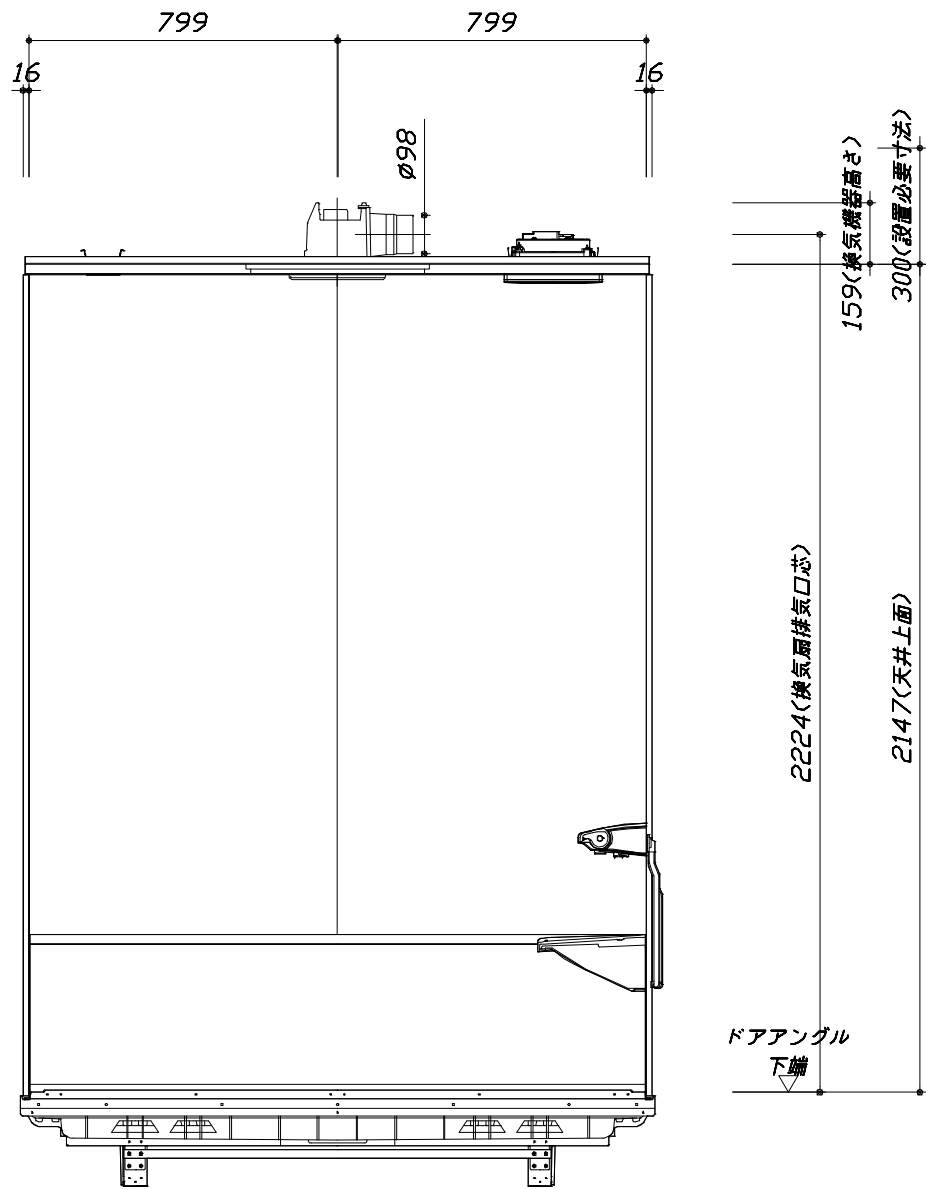

< 浴槽側面図 >

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北海道－新旭川SR SB7様邸
現場番号： C5950363
旭川営業所

GRANSPA グランspa
プラン番号： 1203E-2506-0032T
担当営業： 旭川SR

施工図3
縮 尺： 1:20
作成日： 2025年6月3日
担当アドバイザー： 旭川SR

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	BL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ラウンド浴槽（305リットル） 追い焚き穴:あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	人造大理石カウンター：人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし
天井	化粧サントイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア:19高さ開き戸(アルミ框/樹脂ガラス/ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型換気口)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	洗い場：ＡＢＳ樹脂， 浴槽：ＡＳＡ樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	300kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ロングクリアミラー くもり止め加工
収納棚	スクエアタイプ：ABS樹脂製（3段）
タオル掛け	－
洗場側水栓	サーモスタット(SB181-5UTHB1HK)（樹脂ホース:ﾏﾃﾞﾙ調）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰTN-1020）
照明	天井付スクエア照明＋LEDダウンライト（LED 15.1W電球色）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W) (ﾀﾞｲｬﾐｰﾀﾞ径φ98)ブラック
フロフタ	－
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	－
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	WN：クリスタルパールホワイト
カウンター	KA：ダークグレー
パネル(カウンター面)	JDS：ジオマーブルアイボリー
パネル(周辺・3面)	VW：パールホワイト
水栓上部カウンター	－
浴槽エプロン	K：ブラック
洗場	XW：チェッポビアンコ
ドア / 天井	B：ブラック / B：チャコールブラック
収納棚	スクエアタイプ(CG：チャコールグレー)
タオル掛け	－
ランドリーセット	－

Takara standard タカラストانダード株式会社	現場名称： 北海道－新旭川SR SB7様邸	GRANSPA グランspa	仕様表	
	現場番号： C5950363	プラン番号： 1203E-2506-0032T	作成日： 2025年6月3日	
	旭川営業所	担当営業：旭川SR	担当アドバイザー： 旭川SR	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
			架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置						□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置						□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置						□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】						□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】						□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】						□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付						□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】						□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付						□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】						□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】						□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填						□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】						□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
			浴室用電源配線、接続工事					○		浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○		浴室全体の電気器具、配線接続工事

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

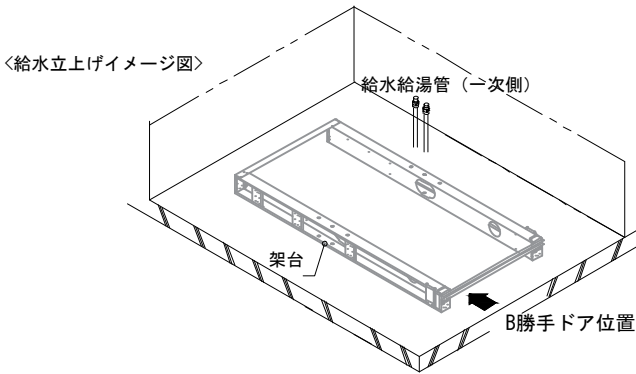

■ 土間コンクリート仕上げ寸法
ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。


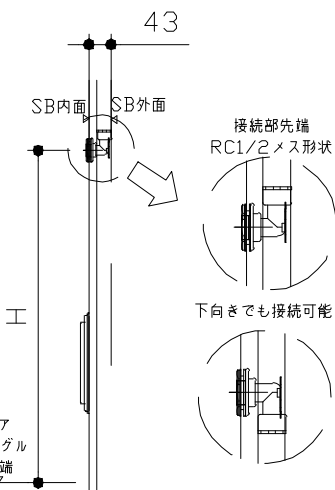
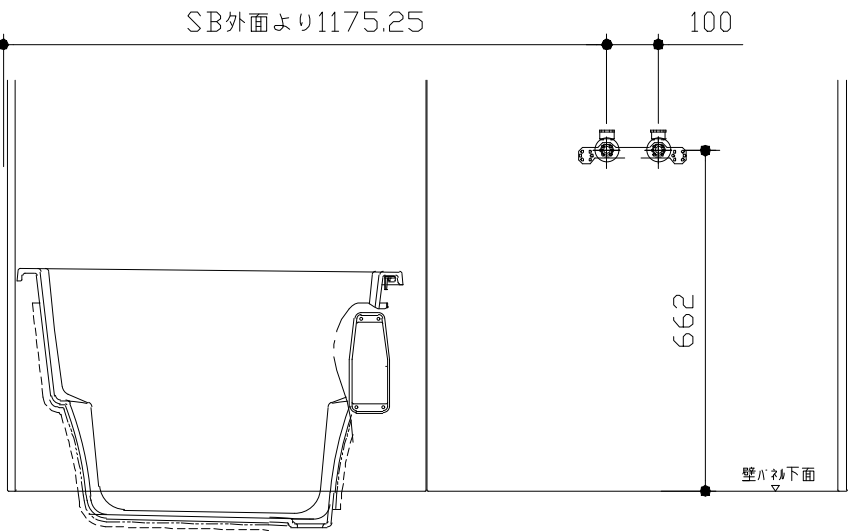


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	646
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	637


＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置

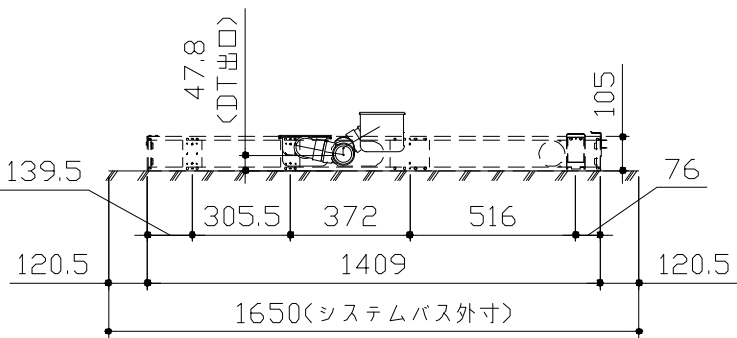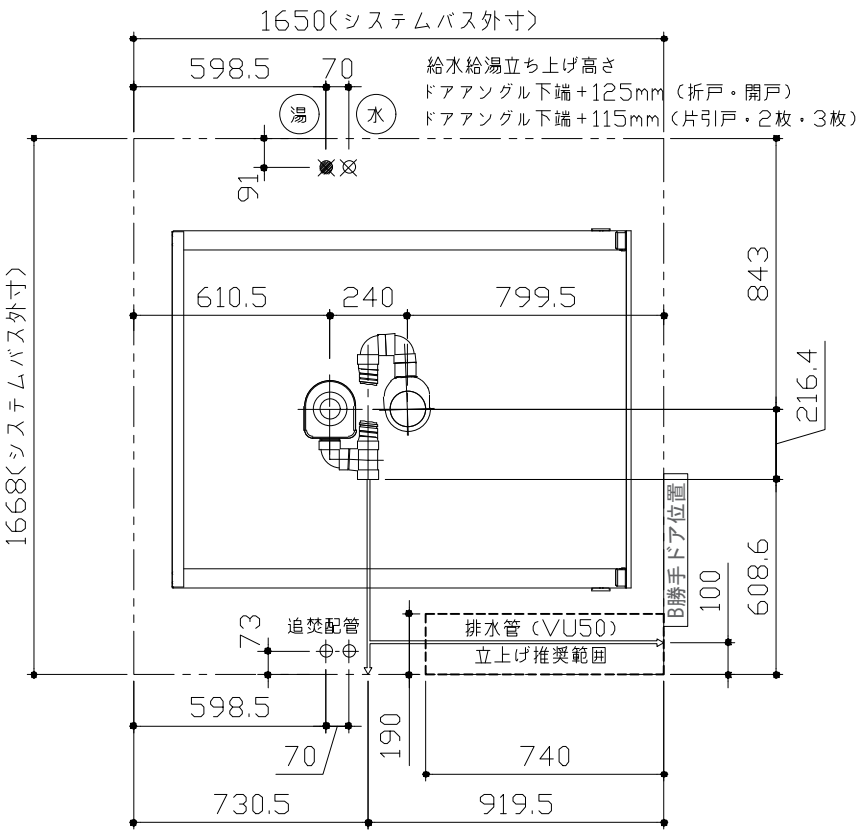

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

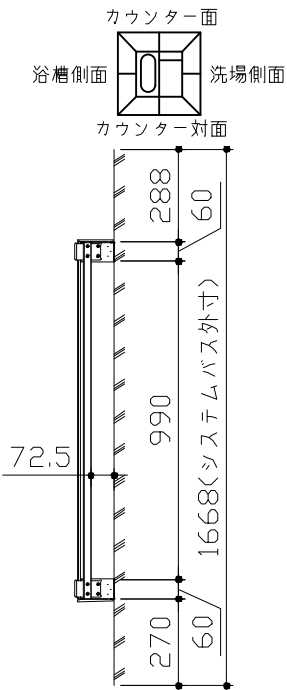


■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

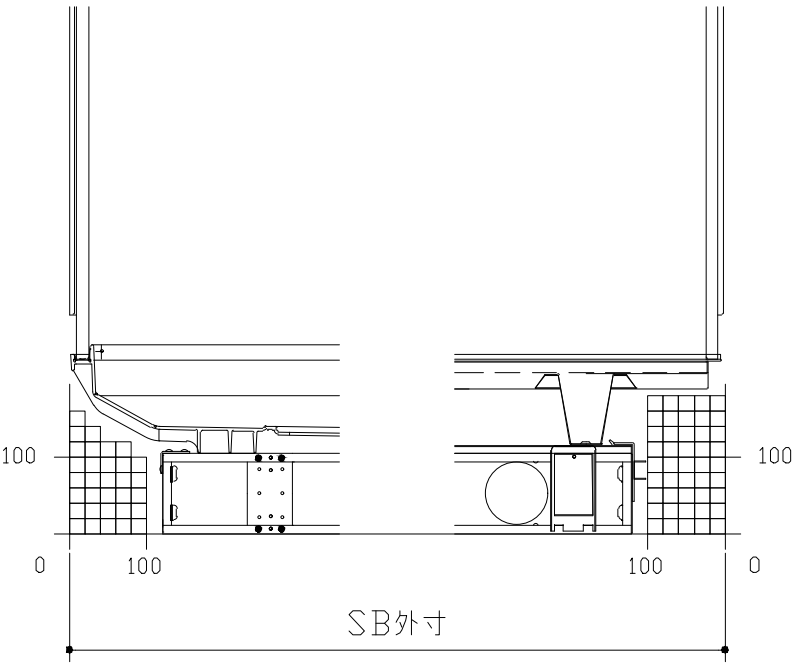


A矢視

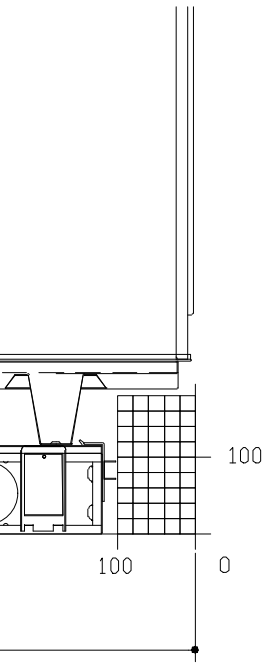


B矢視

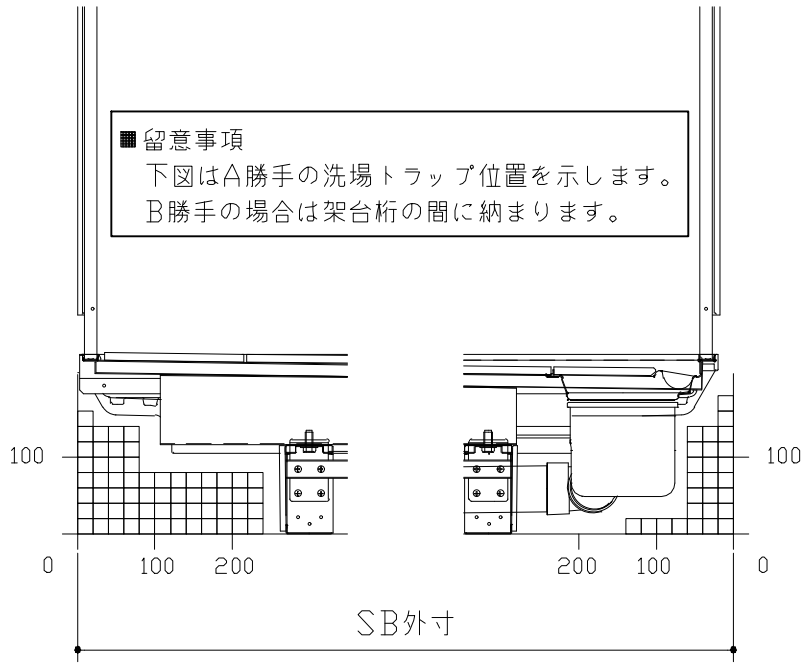


C矢視

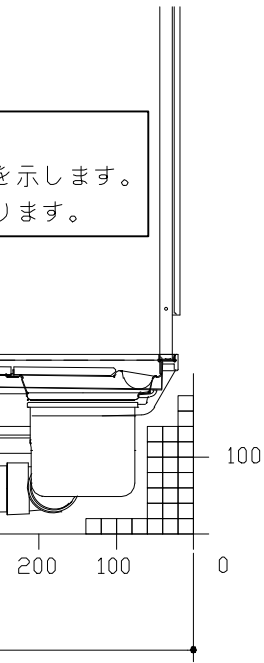

D矢視


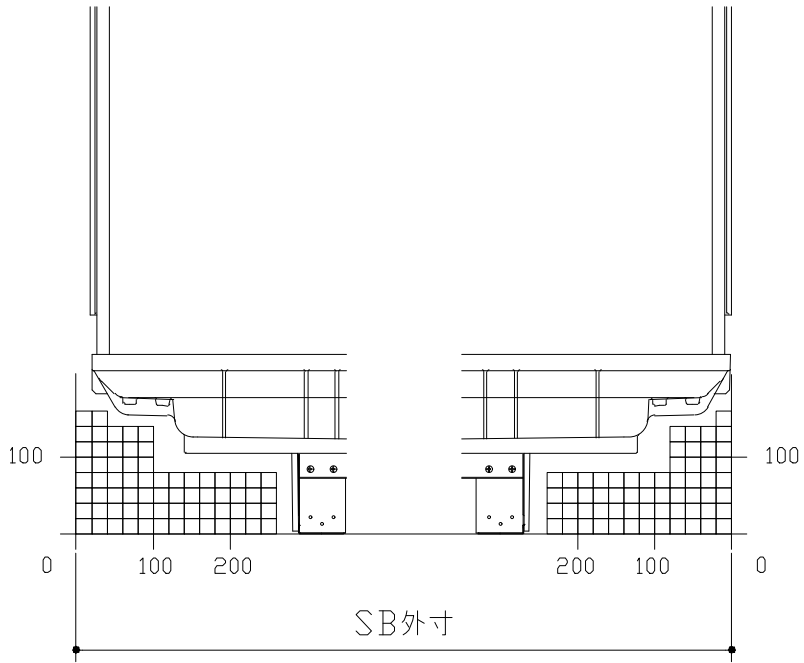


E矢視

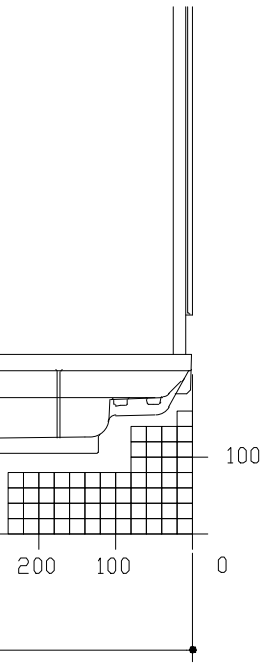


F矢視


キープクリーンドア：開き戸・タテ型換気口

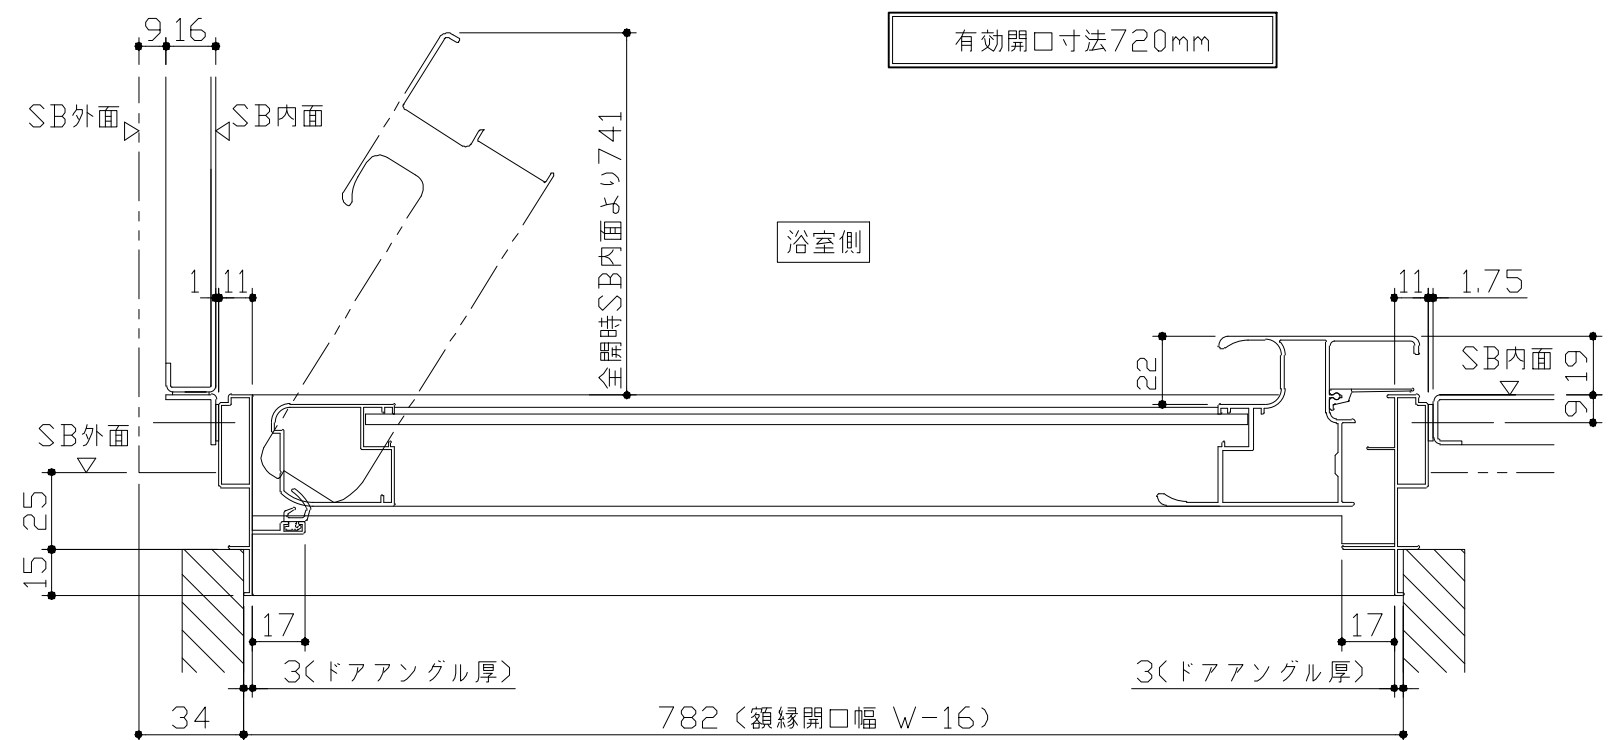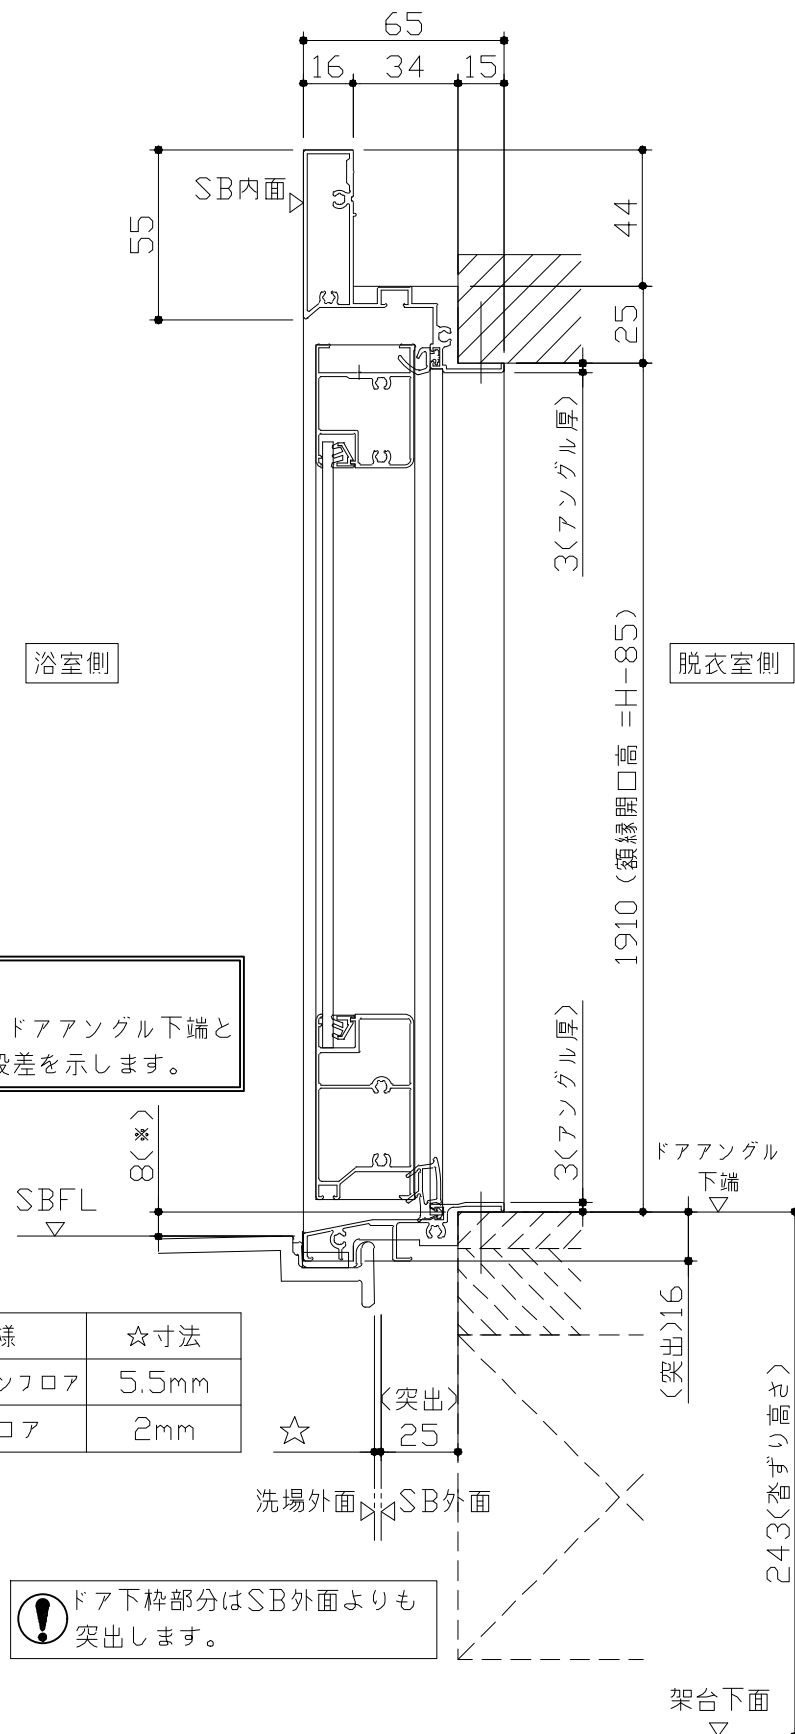

ドア開き角度65°以上でタオル掛けと
干渉の恐れがあります。

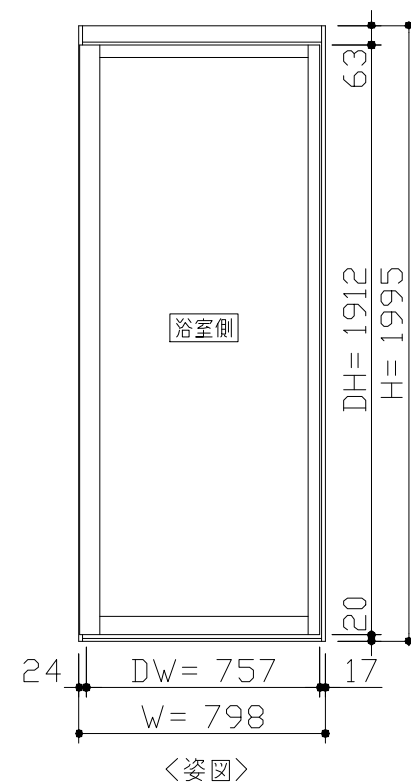



- ドアの開閉について
 ドアの開閉スペースにご注意ください。
 ユニットサイズや収納棚やカウンターなどの
 アクセサリーにより出入りに支障を感じる
 場合があります。

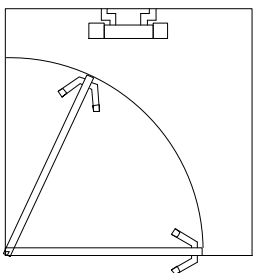

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉




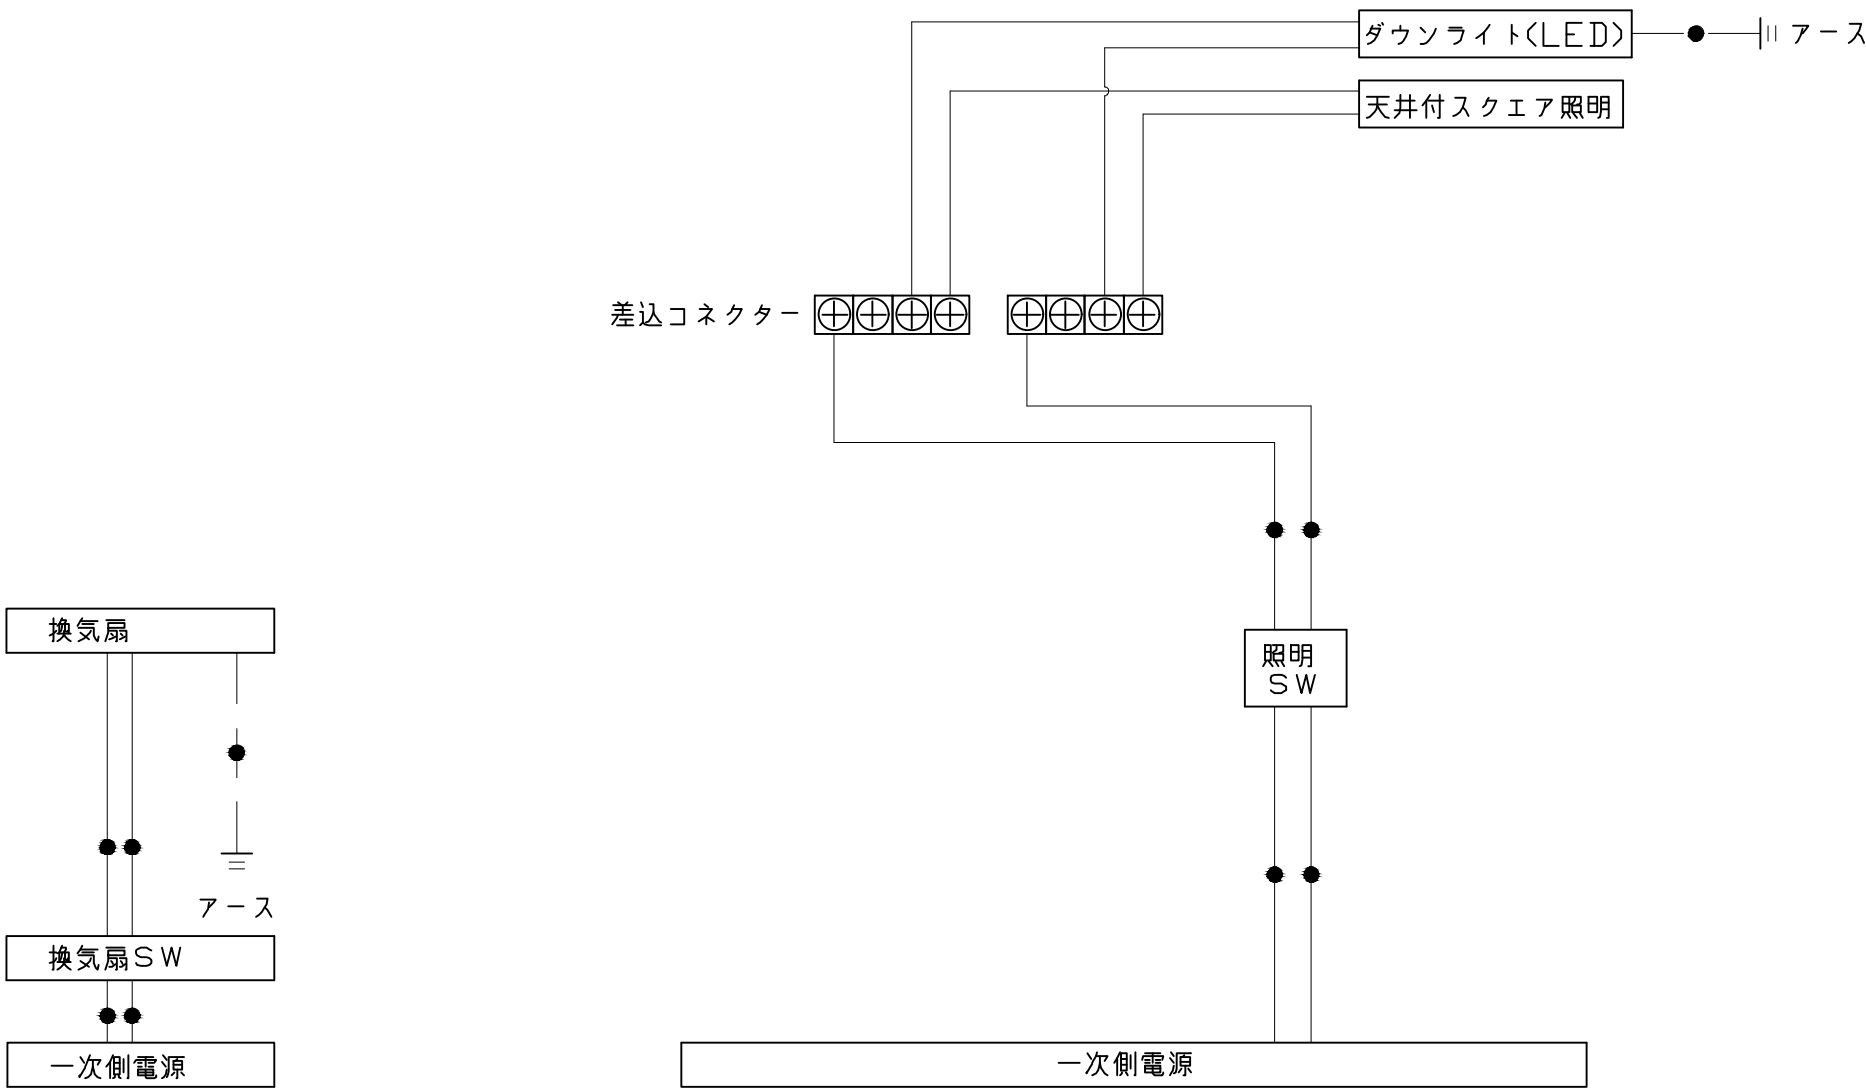

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。


 アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

吊り金具寸法図

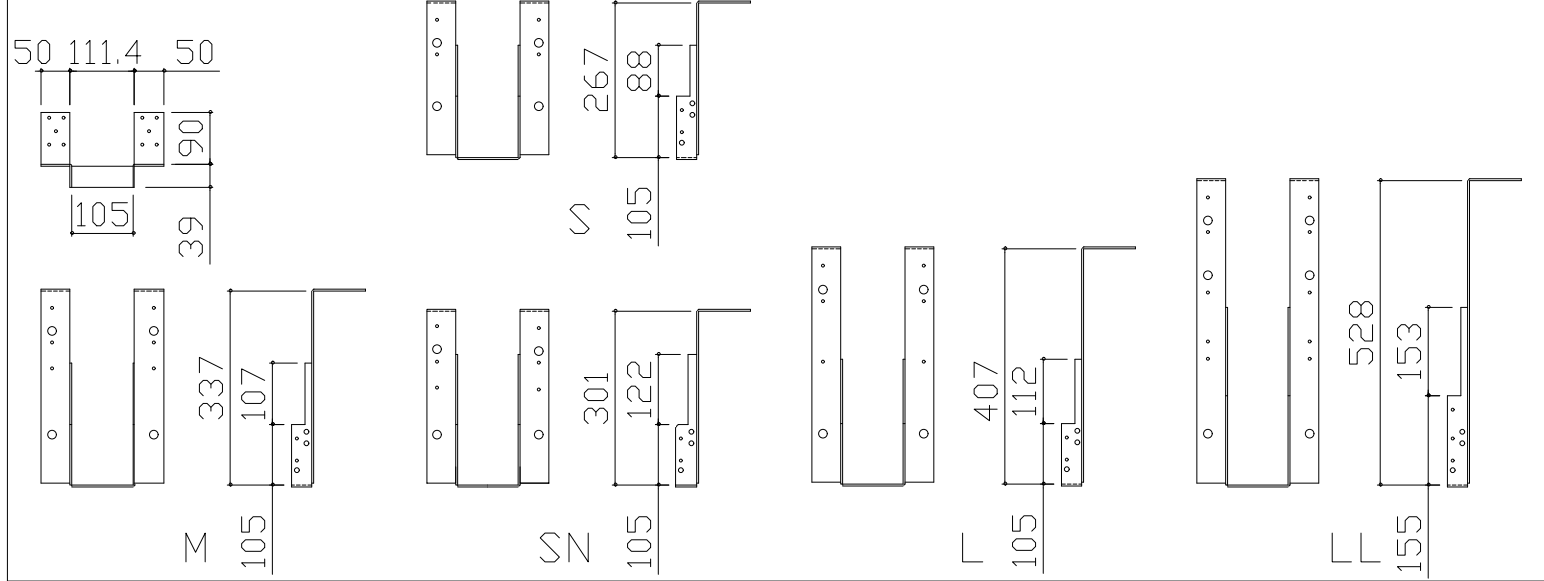


■吊金具設置条件について

- 吊金具を設置する梁（土台）には600～900kgの重量がかかります。
十分な強度を確保した梁（土台）を設置してください。
- 吊金具を設置する梁（土台）の高さ寸法（h）に以下の制約条件があるのご注意ください。


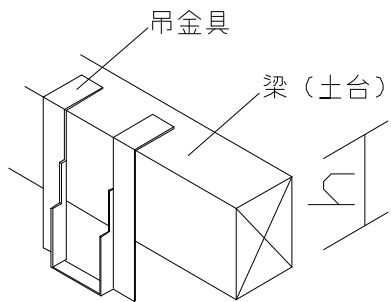


金具セット	h寸法
S	105以上
SN	105以上
M	150以上
L	210以上
LL	240以上

ウケバリ接続金具寸法図



ウケバリ断面図

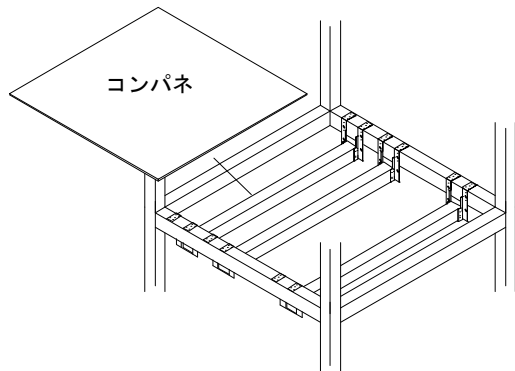

階上に設置する場合などは安全確保（落下防止）の観点よりコンパネを設置してください。

■設置必要材料（現地調達）

【受け梁材が木材の場合】



- 受け梁材（105角 材質：ベイツガ、ベイマツ1級相当品）
- 防錆釘（N-75 80本以上、N-32 20本程度）

【受け梁材が鉄パイプの場合】


- 皿タッピンネジ（クロメート、M4×25 20本程度）




【共通】

- コンパネ（厚み：12mm以上）
- （コーチスクリュー、アンカー、六角レンチ、ドリル）

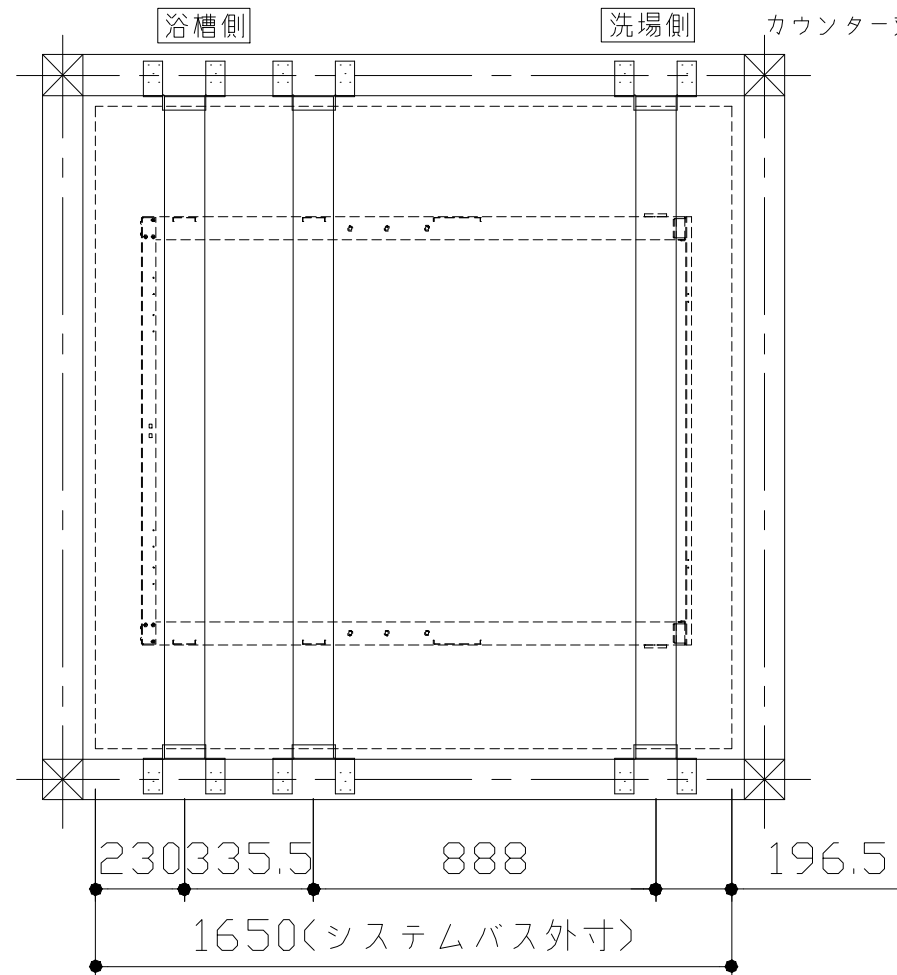


- 吊金具参考納まり
- ・床仕上がり36mm（※）
 - ・ツリカゲSN使用
 - ・SBウケバリ使用

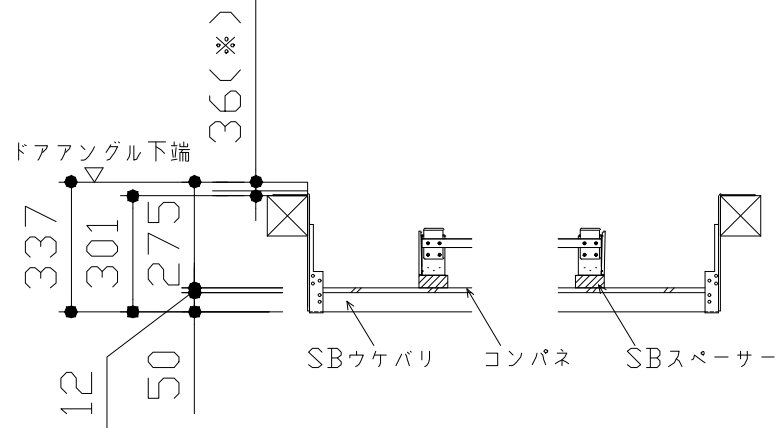

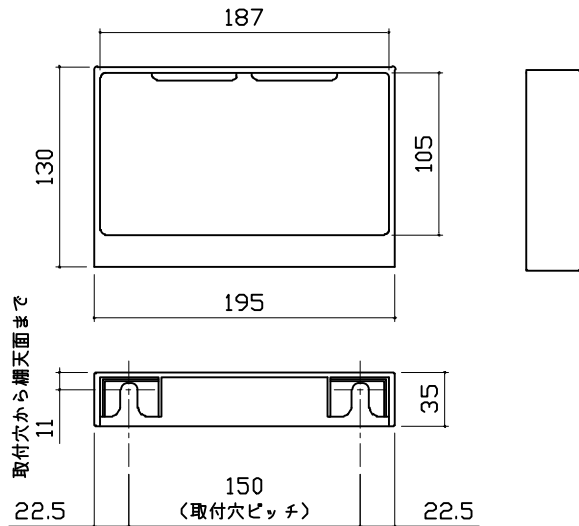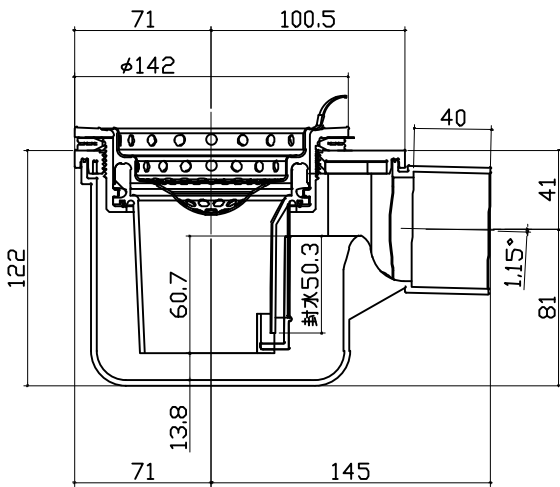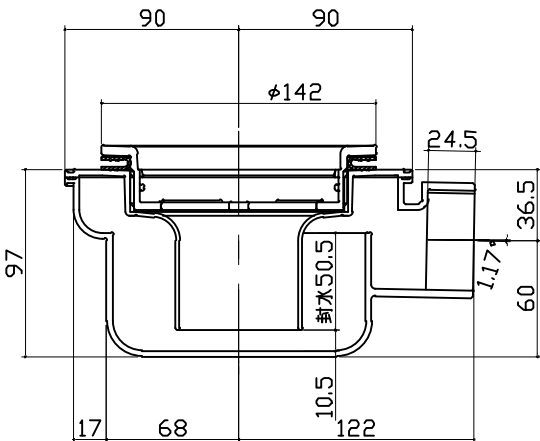収納棚		洗い場側排水トラップ		浴槽側排水トラップ	
本体：ABS 					
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北海道－新旭川SR SB7様邸		GRANSPA グランspa		部材詳細図
	現場番号： C5950363		プラン番号： 1203E-2506-0032T		作成日： 2025年6月3日
	旭川営業所		担当営業：旭川SR		担当アドバイザー： 旭川SR
					2/2

パネル割図		ミラー		収納棚			
ハネK16C2B 0799 R<JDS ハネK16C1G 0799 L<JDS ハネK16NW 0799 <VW ハネK16NW 0799 <VW ハネK16AD 0799 <VW ハネK16A 0799 <VW ハネK16A 0799 <VW BL勝手		ハネK16C2B 0799 R<JDS 799 509 291 1749 780 現地加工：φ3.5		ハネK16C2B 0799 R<JDS 799 1540 1200 860 200 50 現地加工：φ3.5			
シャフーフックスライダー							
ハネK16C2B 0799 R<JDS 799 80 1790 770 現地加工：φ3.5							
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称：北海道-新旭川SR SB7様邸		GRANSPA グランスパ		穴開け指示図	1/1
		現場番号：C5950363		プラン番号：1203E-2506-0032T		作成日：2025年6月3日	
		旭川営業所		担当営業：旭川SR		担当アドバイザー：旭川SR	

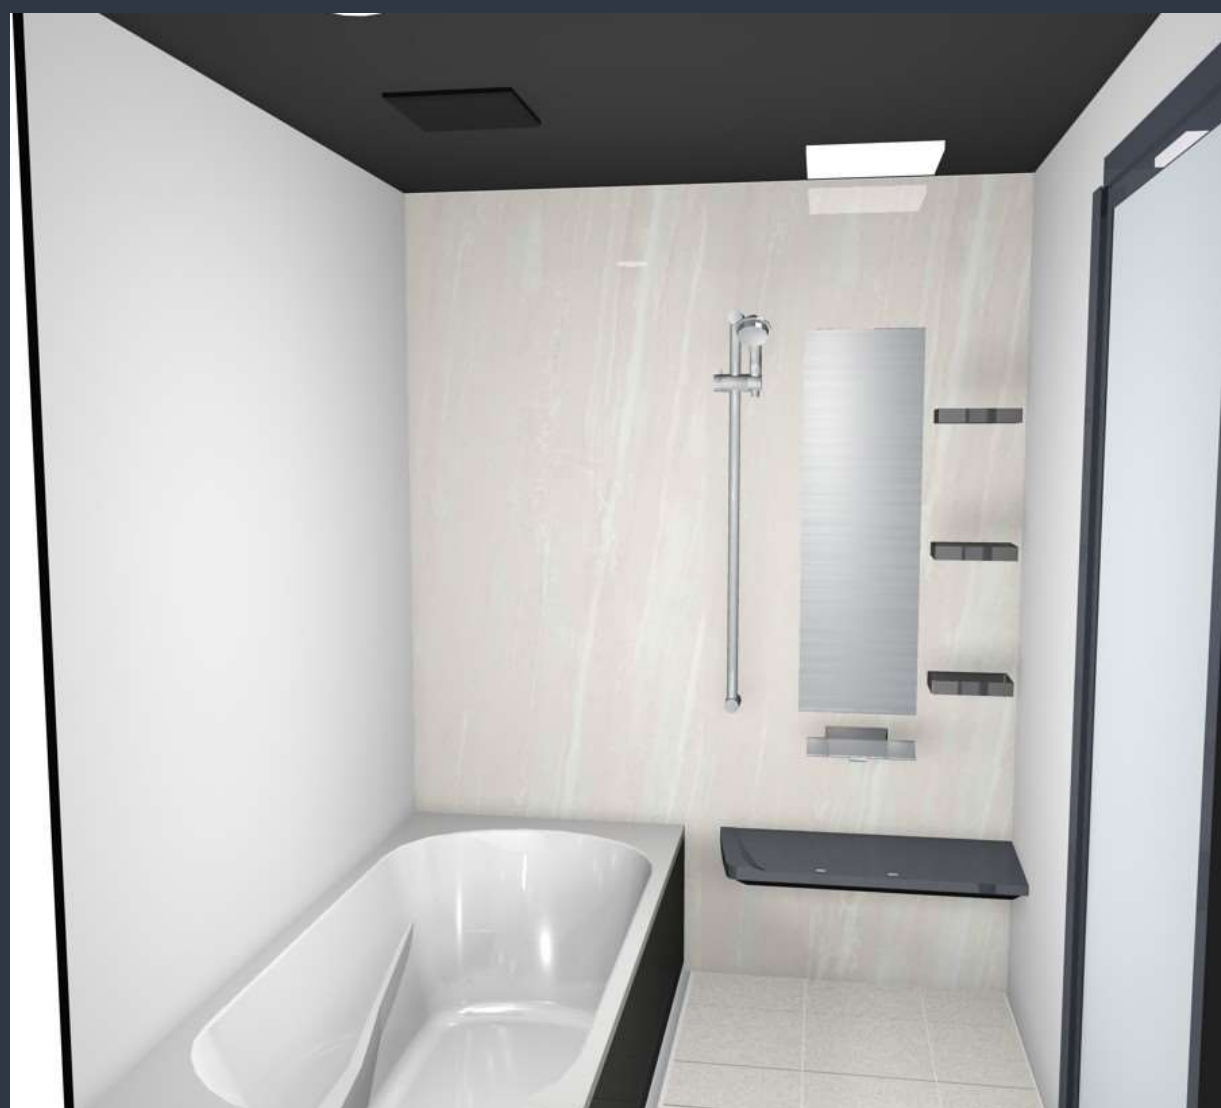

画像はイメージです。

ユニットサイズ 1616(BL勝手)

室内高さ : K タイプ

壁（正面）	壁（周辺）	キープクリーン浴槽	エプロン
プレミアムクラス ジオマーブルアイボリー	ハイクラス パールホワイト	クリスタルパールホワイト	ステンレス製 ブラック
キープクリーンフロア	排水口カバー	フラット天井	キープクリーンドア
プレミアムクラス チェッポビアンコ	タイル仕上げ	チャコールブラック	ドア枠：ブラック 樹脂ガラス：半透明

浴槽形状 ラウンド浴槽



ヒロカルシャワー（SANEI 製）



SB181-5UTHB1HK
節水仕様
節湯
B1
高級感のあるメタリックボディ。
シャワー板が大きく体に当たる
面積が大きいので、包み込む
ような浴び心地。

換気機器

天井換気扇



ブラック

収納棚

スクエアタイプ（3 段）〈カラー：チャコールグレー〉



どこでもラック



小物置き L

キープクリーンフロア（プレミアムクラス）



床は表面が硬く傷つき
にくい磁器タイルなので、
汚れが入り込まず、
お手入れがカンタンです。

震度 6 強相当の振動にも負けない強度

強さの秘密は、浴室の重さを
しっかり支えるフレーム架台。



システムバス下台部分

※画像はイメージです。

カウンター

人造大理石カウンター



カウンターカラー
ホワイト
ベージュ
ダークグレー

※画像はダークグレーです。

シャワーフックスライドバー



TN-1020

シャワーフックを上下に
スライドできます。
また、お好みの角度に
調整することも可能です。

ドア

開き戸



キープクリーンフロア

バック
レス
タテ型
換気口

浴槽仕様

高断熱浴槽



お湯が冷めにくいので、
次に入る人も快適です。

※保温材の表現はイメージです。

システムバスの特長

この心地よさ、タカラオリジナル



ピカピカ

ポカポカ

ガッチリ

優れた素材と機能性が実現する快適な浴室。

キープクリーン浴槽（アクリル人造大理石）



クイーンオブバス

キープクリーン浴槽

美しい光沢と質感、
なめらかな手触りと
優れた清掃性が魅力。

カラーシミュレーション



お好みのカラーの
組み合わせが
見つかります！

グランSPA

水栓

洗い場用水栓



樹脂ホース（メタル調）

サーモスタット

照明

天井付スクエア照明（ブラック）



電球色

浴槽側天井にダウンライトが 1 灯併設されます。

ミラー

ロングクリアミラー



お湯をかけることで、
くもり止め効果を
発揮します。

どこでもラック



タオルハンガー L

ホーロークリーン浴室パネル



お手入れカンタンで清潔、
浴室の壁は高品位ホーロー。

毎日シャワーで流すだけ！

湯アカもサッとひと拭き！

傷つきにくく汚れにくい！

パーフェクト保温



あたたかさを逃がさない！

まるごと包み込むように、
浴室全体を保温材で
完全防備。

パーフェクト
保温

※画像はイメージです。



ホーロークリーン浴室パネル

プレミアムクラス



ジオマーブル
モスグレー



ジオマーブル
アイボリー



ノルディック
グリーン



チェスナット
ベージュ



チェッポディグレー


ハイクラス



テラゾー
ホワイト



リネンホワイト



ブリックグレー



ブリック
ベージュ



ブリック
ダーク



コンクリート
グレー



フロウストーン
グレー



フロウストーン
テラコッタ



スタッコグレー



グレイッシュ
アッシュ



ホワイト
アッシュ



ウォルナット
ホワイト



ウォルナット
グレイッシュ



ウォルナット
ブラック



パール
ホワイト



パール
ベージュ



パール
ブラック



キャンバス
イエロー



カリビアン
ブルー



カラー
ミックス

レギュラークラス



ピッコロタイル
ブルー



ピッコロタイル
ピンク



ラミナストーン
ホワイト



ラミナストーン
ベージュ



サンドストーン
ホワイト



ホワイト



ダーク
グレー



ブラック

洗い場

キープクリーンフロア(プレミアムクラス)



チェッポビアンコ



ピエトラグレイッシュ



サンディグレー

キープクリーンフロア(ハイクラス)



カームホワイト



カームベージュ



カームグレー



カームダークグレー

FRP フロア



ホワイトグレー



グレイベージュ



グレー

浴槽

キープクリーン浴槽(アクリル人造大理石)



クリスタルパール
ホワイト



シュガーライト
グレー



シュガーライト
ベージュ



シュガー
ブラック

FRP 浴槽



ホワイト



ベージュ



ライトグレー
