

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 横浜-海老名SR SB1 様

業者 様

商品名 MINA ミーナ

商品
御見積金額 **¥445,600 (税込 ¥490,160)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 ¥85,000 (税込 ¥93,500)

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

御見積仕様

(システムバス)

ユニットサイズ 1616 (BR勝手)

洗い場仕様 ガラス繊維強化樹脂<FRP>

洗い場カラー ホワイトグレー

浴槽材質 FRP

浴槽カラー ホワイト

浴槽形状 ラウンド

カウンター材質 樹脂

カウンターカラー ホワイト

エプロン材質/カラー 樹脂 / ホワイト

浴室パネル材質 高品位ホーロー

パネルカラー (正面) ミックスウッドダーク

パネルカラー (周辺) ホワイト

ガス種 / 周波数 LPG / 50Hz

御確認事項

作成日 2021年10月29日
プラン番号 2714J-2110-0128T
現場番号 C2773484

タカスタンダード株式会社
海老名ショールーム
神奈川県海老名市上今泉3-1-15

TEL 046-236-5662 / FAX 046-235-9702
厚木営業所
TEL 046-280-6161 / FAX 046-227-5010

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
SB1	ミーナ	ミックスウッド ダーク

備考

--	--

No.*

御名前 横浜-海老名SR SB1

様

現場番号	C2773484	プラン番号	2714J-2110-0128T	作成日	2021/10/29
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	ミーナ 1616サイズ		1	379,000	379,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)/樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
6	洗い場	FRP洗い場(ホワイトグレー)	1		
7	浴槽	FRP(ホワイト)	1		
8	浴槽追焚き穴	あり	1		
9	エプロン	FRP浴槽用保温材なし(ホワイト)	1		
10	浴槽形状	ラウンド浴槽	1		
11	循環金具水受けトレースセット	なし	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
14	浴槽パン	なし	1		
15	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂ホース(シルバー)KF9032SJN	1		
16	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:KF9032SJN	1		
17	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
18	カウンター	ワイドカウンター	1		
19	シャワーフック/スライドバー	シャワーフック	1		
20	浴室パネル	ハイクラス(一面デザイン)(Kパネル)	1	+15,000	+15,000
21	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
22	天井	フラット天井	1		
23	換気機器	天井換気扇	1		
24	換気機器開口	工場開口	1		
25	照明	天井付スクエア照明+ダウンライト(1灯)<電球色>	1	+20,500	+20,500
26	天井照明開口	工場開口	1		
27	ミラー	横長ミラー	1	+8,000	+8,000
28	風呂フタ	シャッター式風呂フタ	1	+3,300	+3,300
29	タオル掛け	タオル掛けなし	1		
30	収納棚	クリアタイプB(2段)	1	+3,500	+3,500
31	どこでもラック	タオルハンガーL(ホワイト)	1	+2,800	+2,800

御名前 横浜-海老名SR SB1

様

現場番号	C2773484	プラン番号	2714J-2110-0128T	作成日	2021/10/29
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	どこでもラック	マルチラック + フック (ホワイト)	1	+3,000	+3,000
33	循環金具セット	ELX	1	+10,500	+10,500
34	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
35	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			35		¥445,600

商品総合計	35	¥445,600
-------	----	----------

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥85,000 (税込 ¥93,500)


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格 < 税率 10 % > を表示しています。

パース

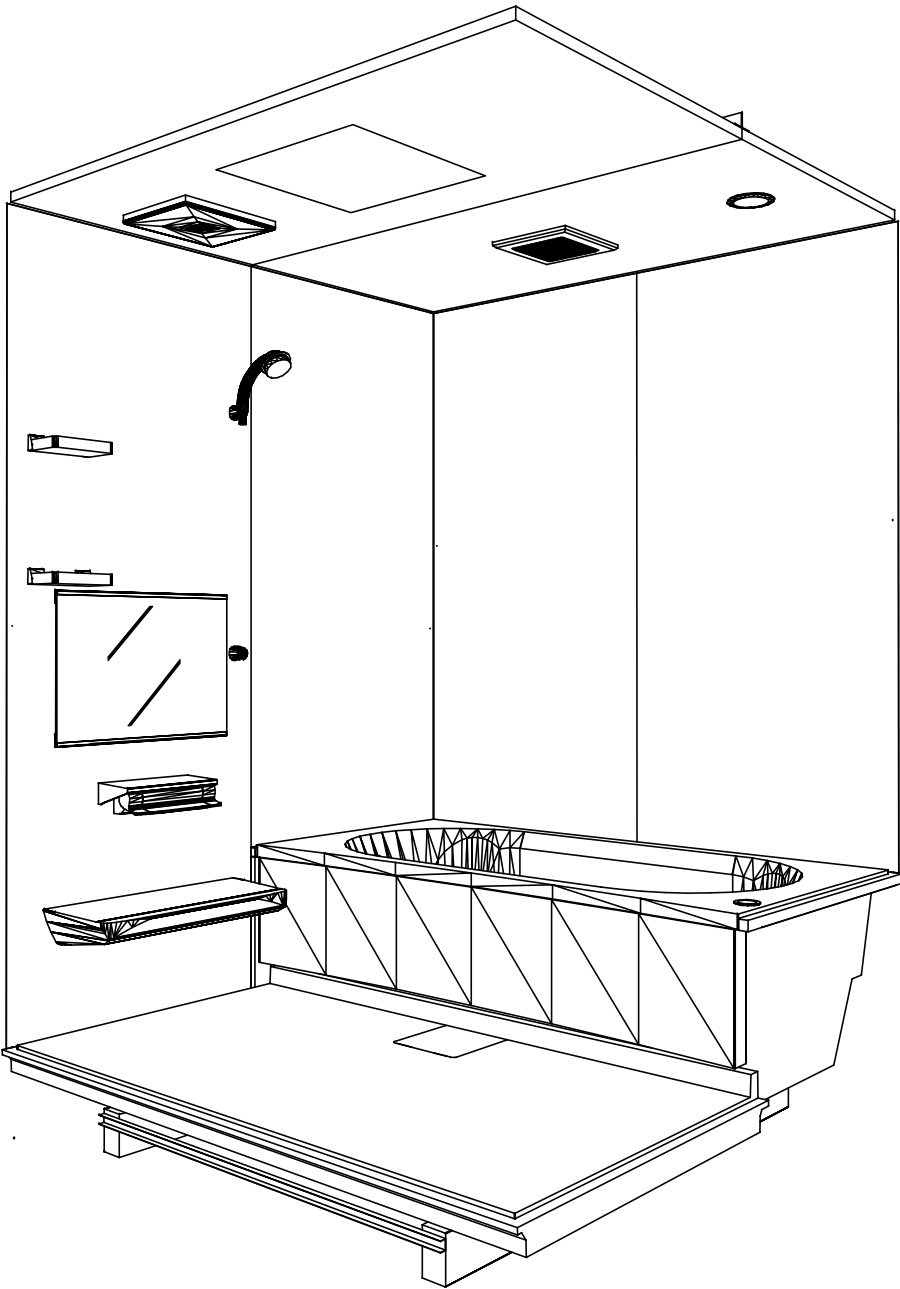

鳥瞰図

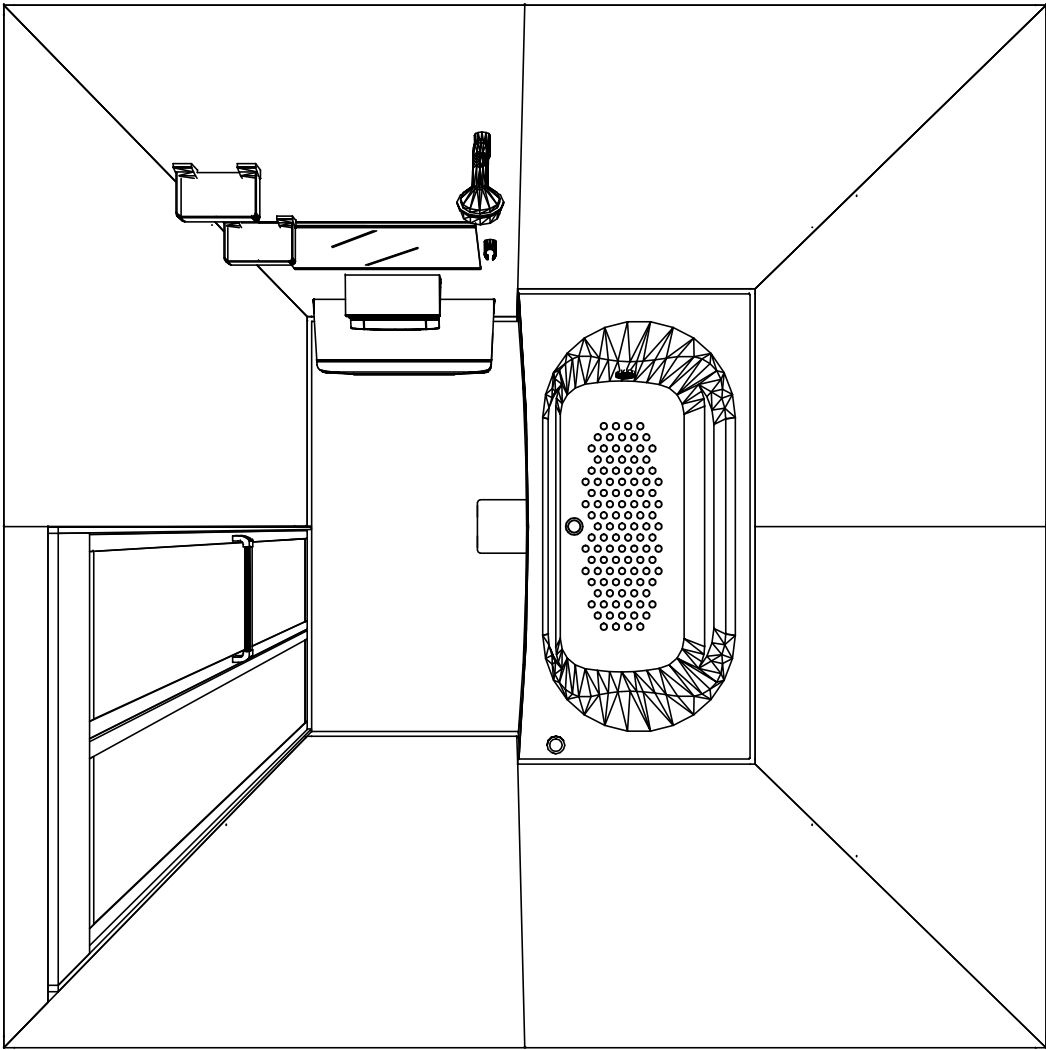

1616
ガラス繊維強化樹脂<FRP>浴槽
フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・
納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認
して頂きますようお願い致します。

Takara standard タカラストンダード株式会社	現場名称： 横浜-海老名SR SB1様邸	M I N A ミーナ	姿図	
	現場番号： C2773484	プラン番号： 2714J-2110-0128T	作成日： 2021年10月29日	
	海老名ショールーム	担当営業 ： SB1	担当アドバイザー： ミーナ	

カウンター面


洗場側面

浴槽側面


カウンター対面

■留意事項


※印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

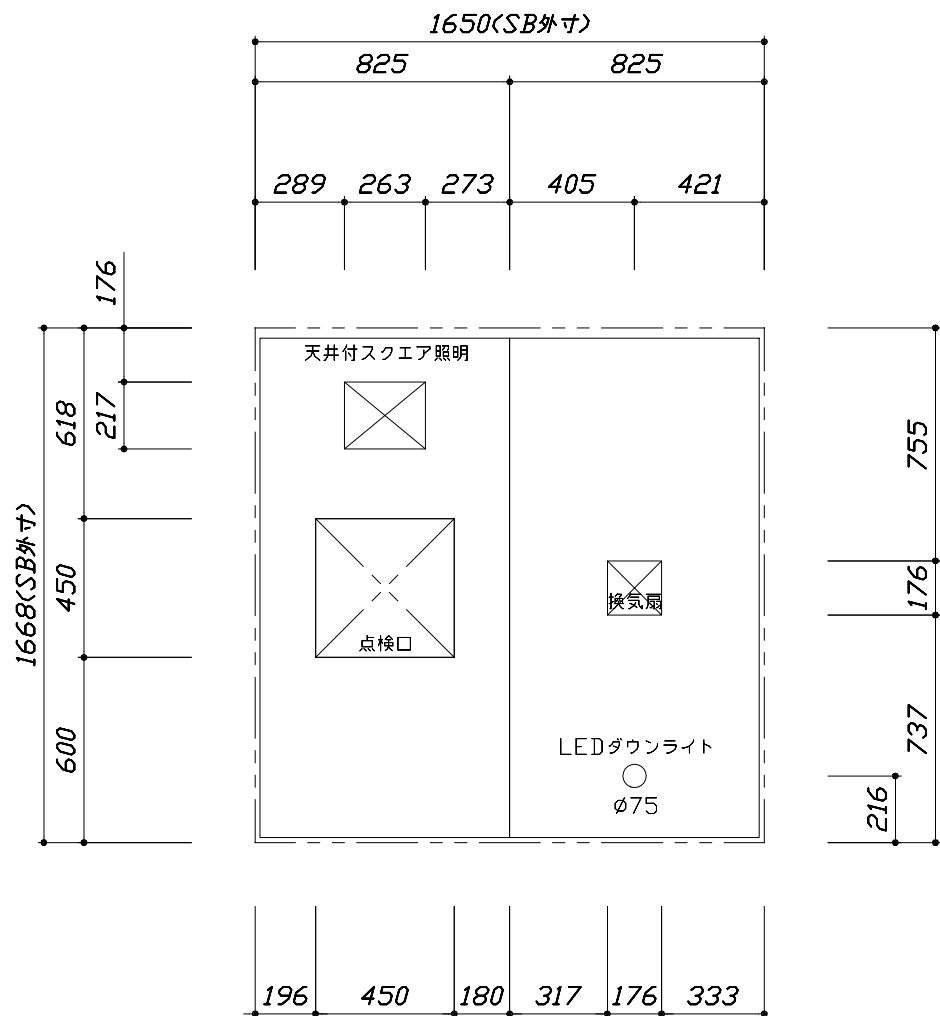

< 天井伏図 >

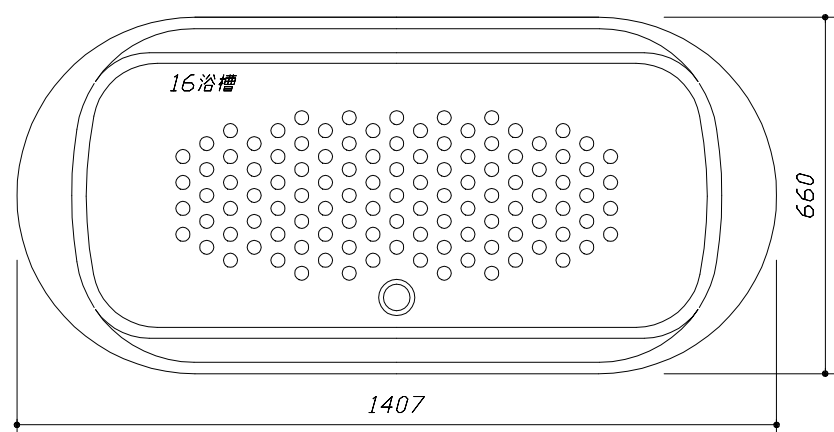



< 浴槽詳細図 >

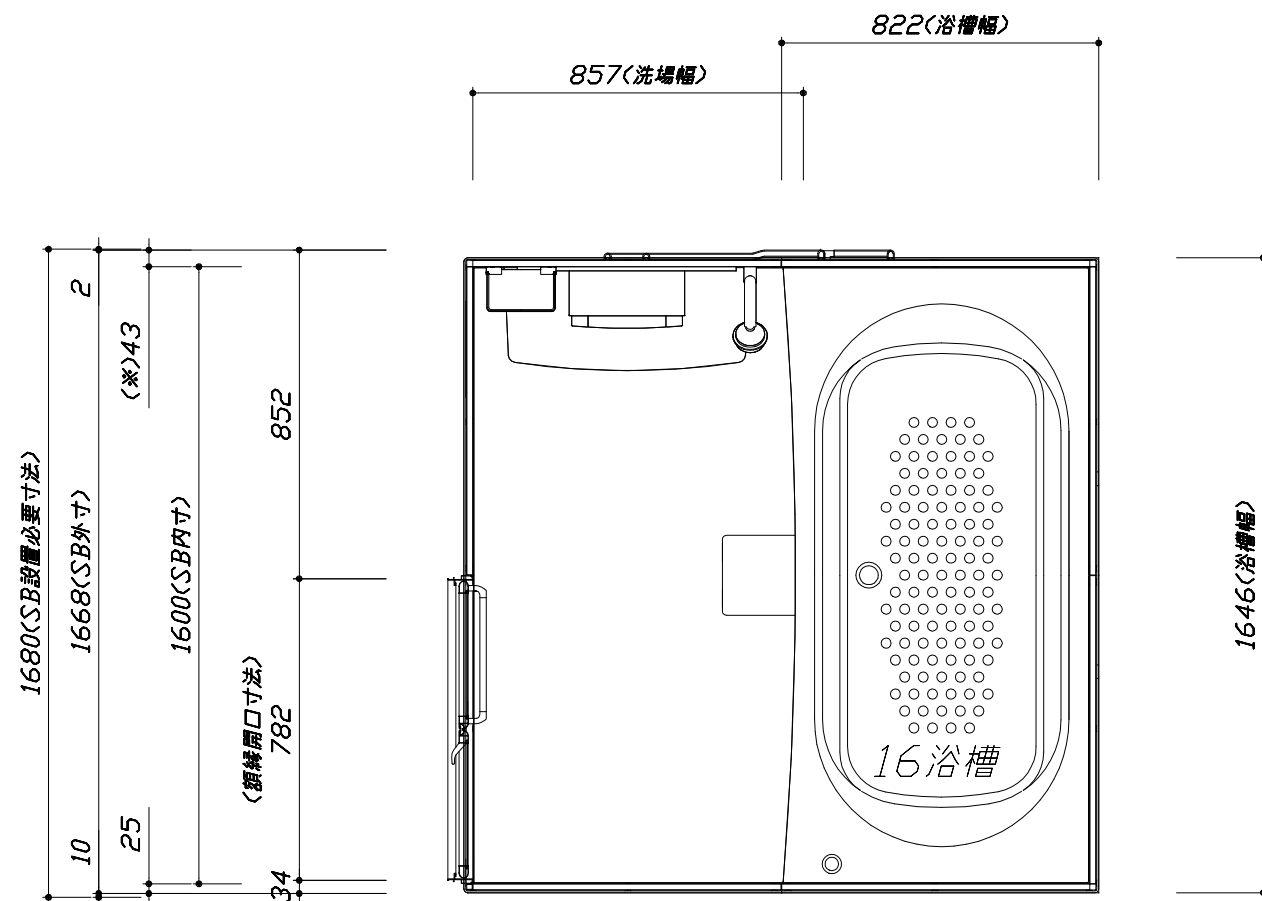

< 平面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。

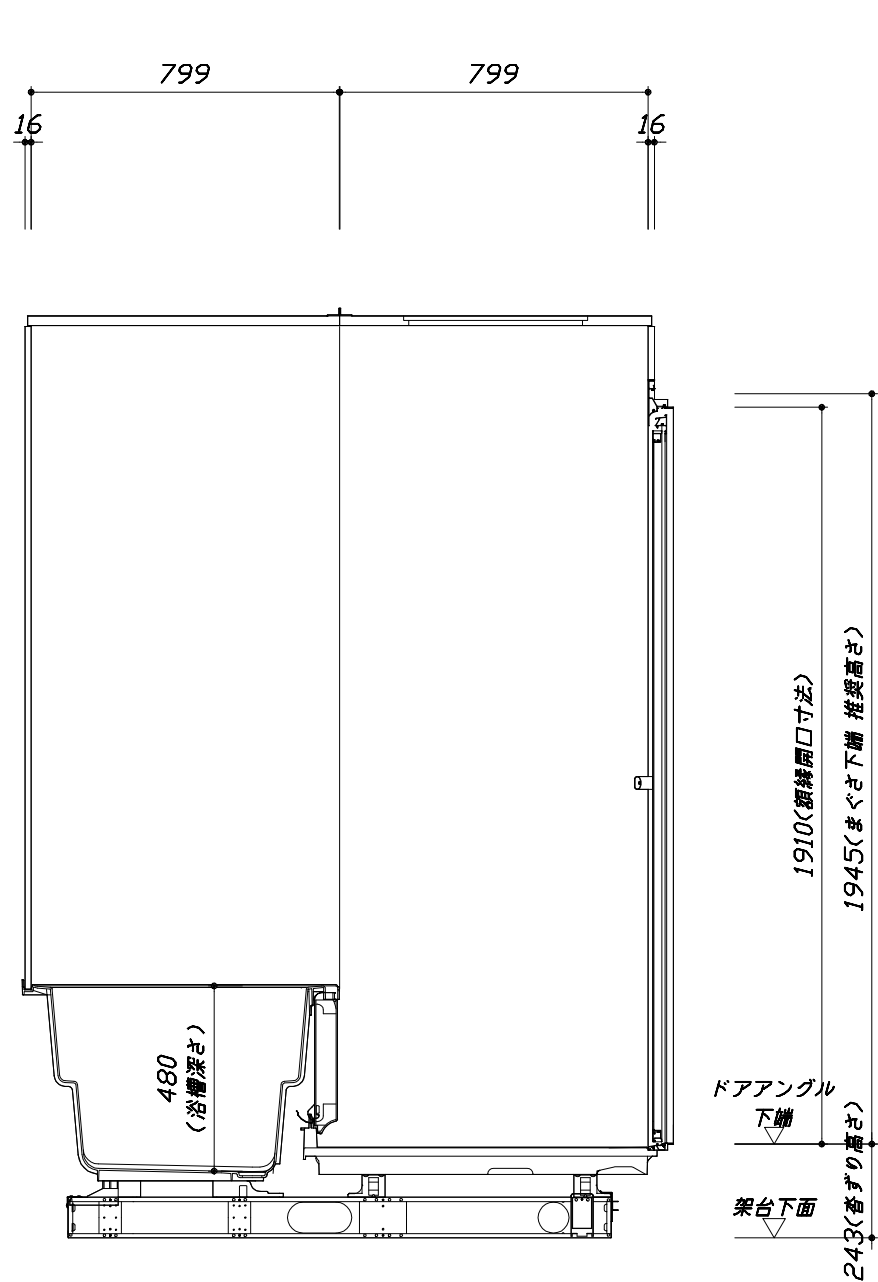

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)



<カウンター対面図>

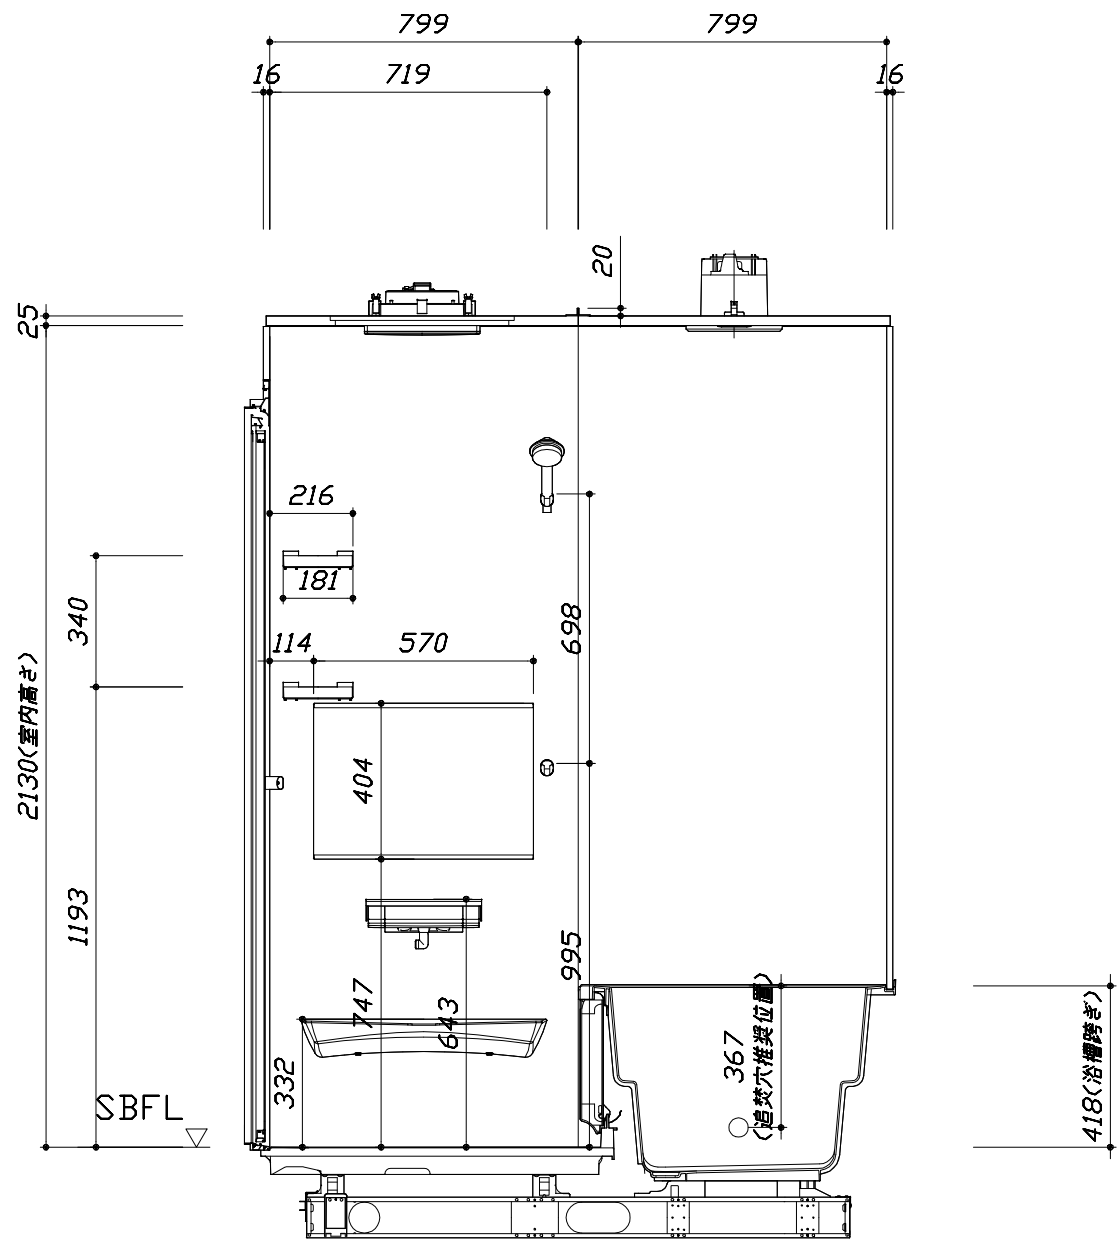

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認お願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。

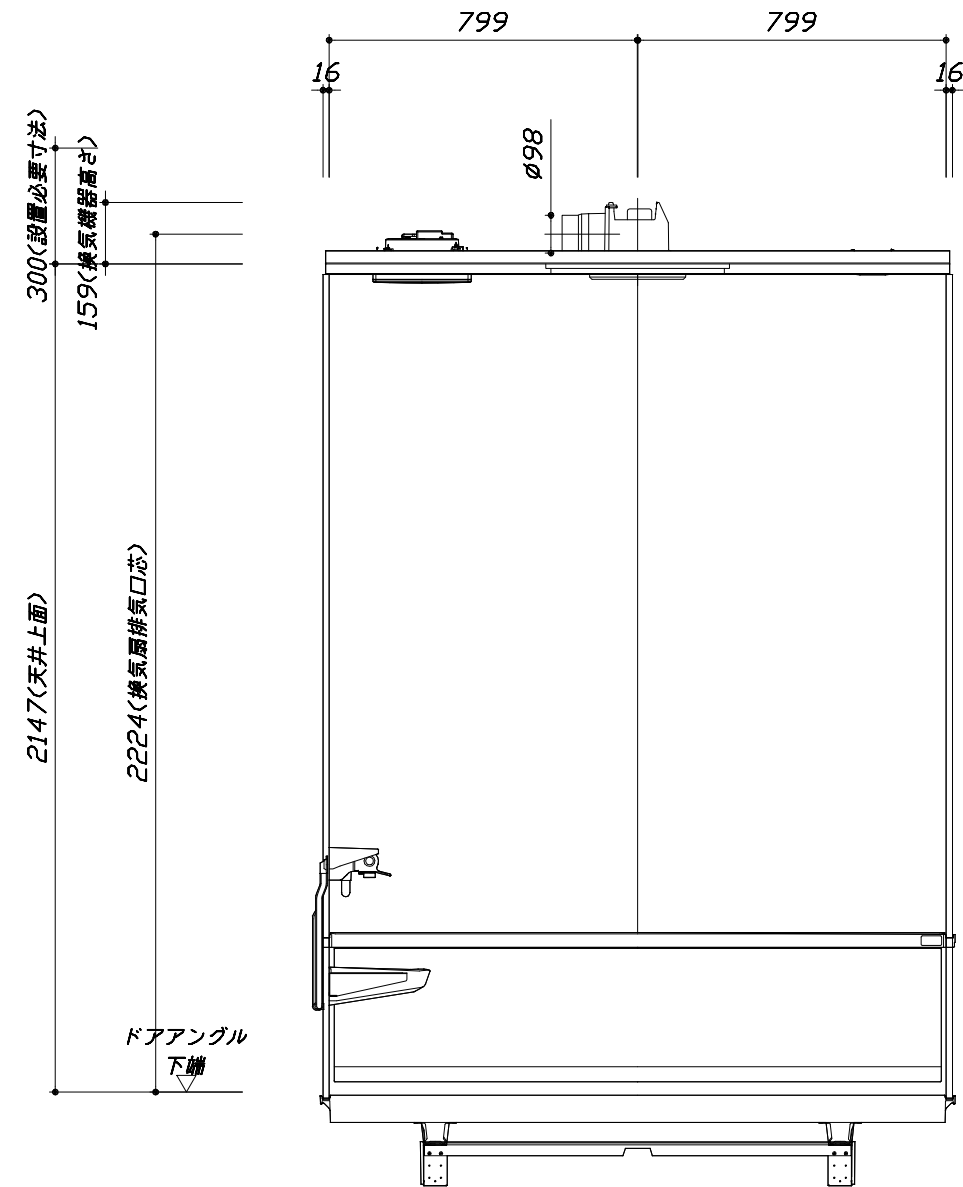

< 浴槽側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

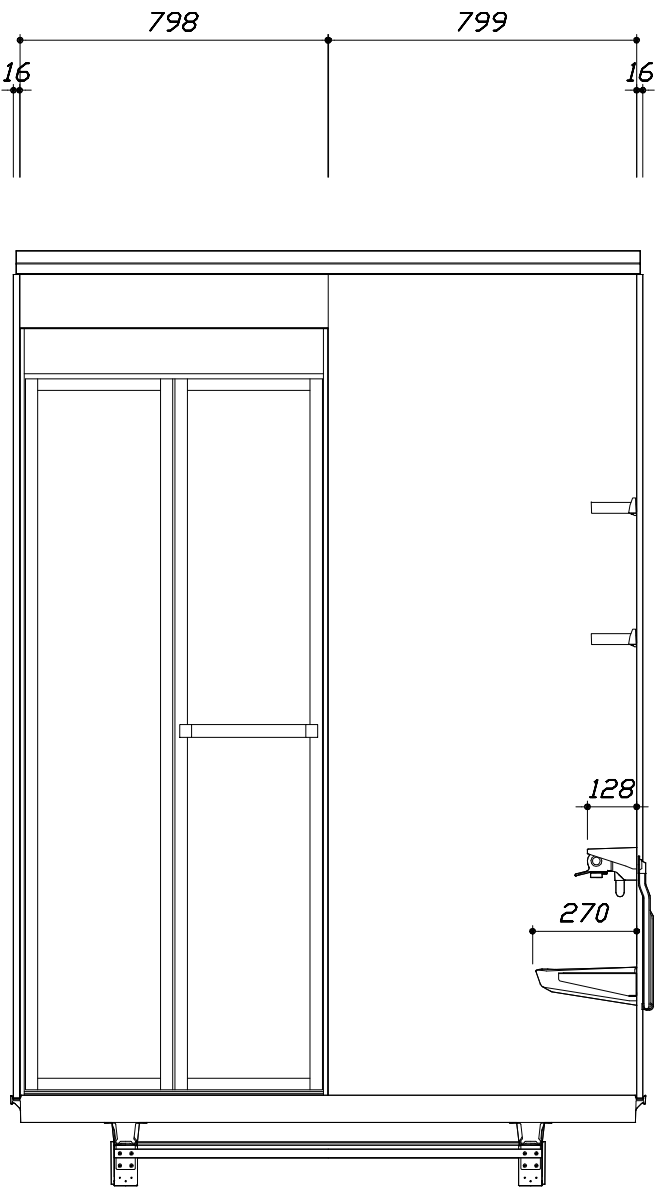

< 洗場側面図 >

Takara standard
タカラストANDARD株式会社

現場名称： 横浜-海老名SR SB1様邸	M I N A ミーナ	施工図3	縮 尺： 1:20
現場番号： C2773484	プラン番号： 2714J-2110-0128T	作成日： 2021年10月29日	
海老名ショールーム	担当営業： SB1	担当アドバイザー： ミーナ	

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	BR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽材質	ガラス繊維強化樹脂（FRP）裏面保温材（発泡ウレタン）
浴槽形状	ラウンド浴槽（310リットル）追い焚き穴:あり
浴槽パン	－
浴槽エプロン	A B S 樹脂
カウンター	ワイドカウンター：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア:19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	A B S 樹脂・封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	250kg

アクセサリ仕様表

ミラー	横長ミラー
収納棚	クリアタイプB：AS樹脂製（2段）
タオル掛け	－
洗場側水栓	サーモスタット(KVK KF9032SJN)（樹脂ホース:シルバー）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
スライドバー	－
照明	天井付スクエア照明＋LEDダウンライト（LED 15.1W電球色）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W)（ダクト径φ98）
フロフタ	シャッター式フロフタ（PP）
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットELX：ホース先端部R1/2オスネジ仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	W：ホワイト
カウンター	W：ホワイト
パネル(カウンター面)	XB：ミックスウッドダーク
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カウンター	W：ホワイト
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	W：ホワイトグレー
ドア	W：ホワイト
収納棚	クリアタイプB
タオル掛け	－
ランドリーセット	－

Takara standard タカラストANDARD株式会社	現場名称： 横浜-海老名SR SB1様邸	M I N A ミーナ	仕様表	
	現場番号： C2773484	プラン番号： 2714J-2110-0128T	作成日： 2021年10月29日	
	海老名ショールーム	担当営業： SB1	担当アドバイザー： ミーナ	


基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

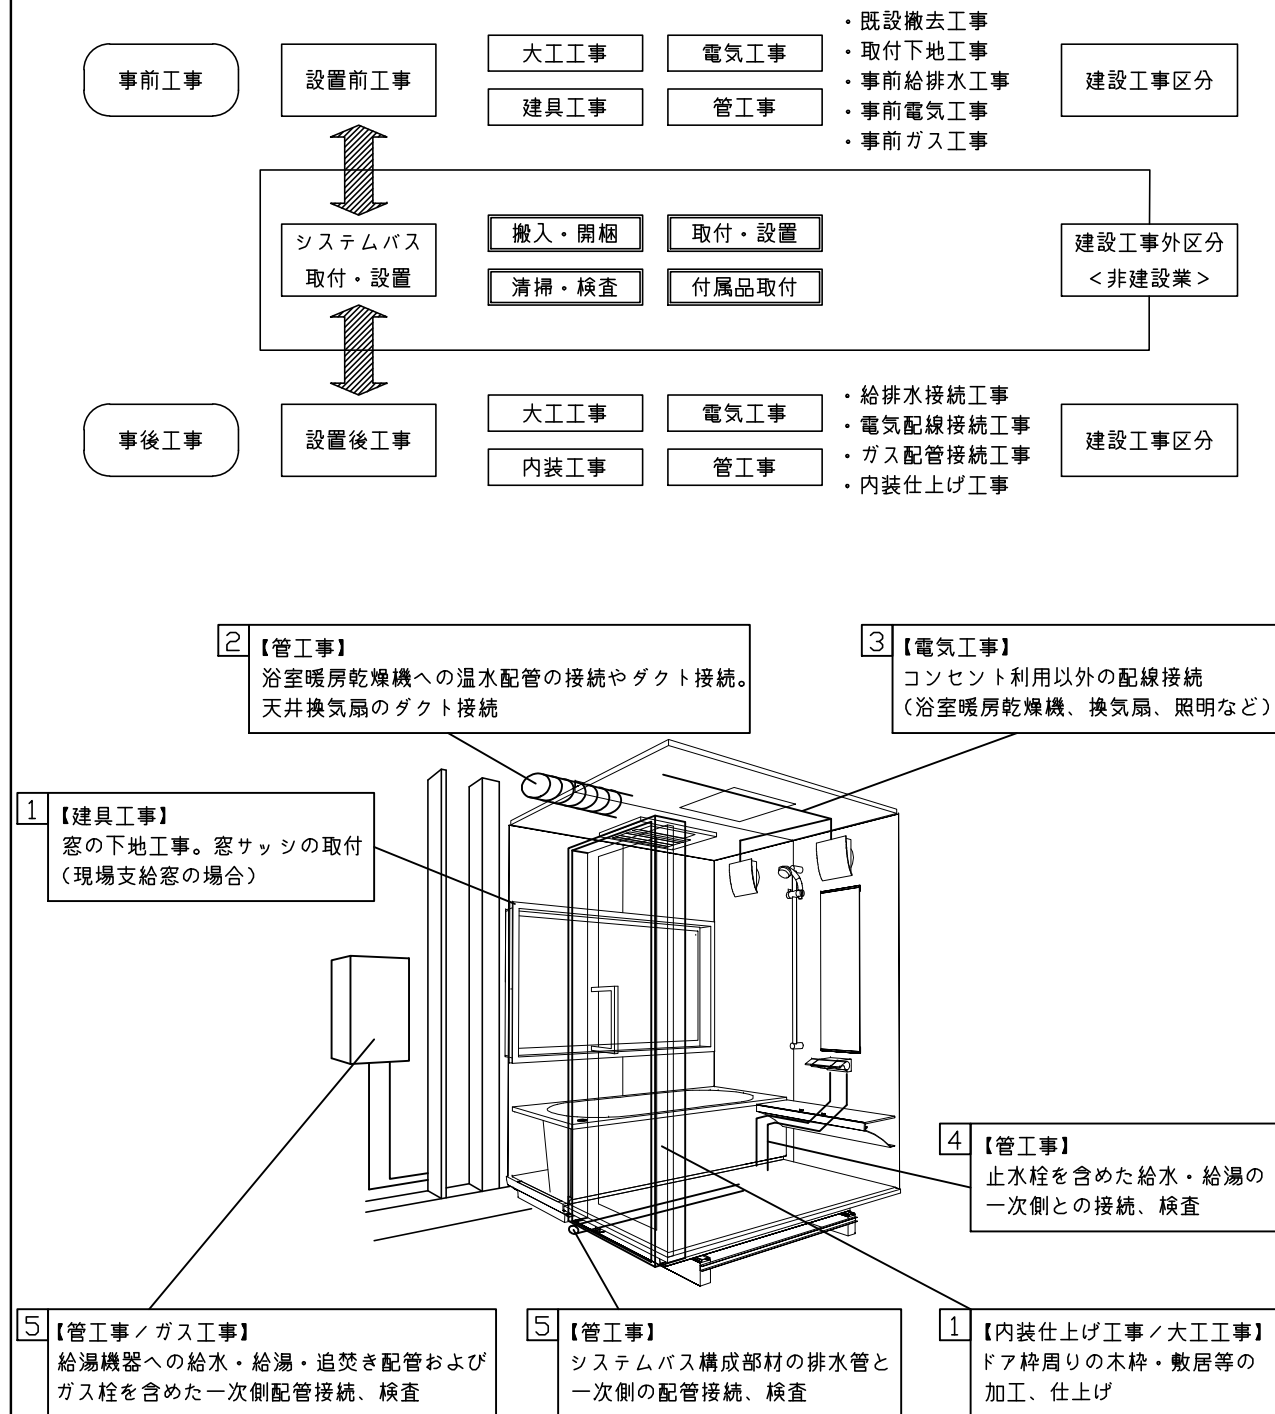

■システムバス 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事					建設工事外	作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 工事	建 具 工事	管 工 事	電 気 工事	給湯 機器 設備		シス テム バス 設置
設置前工事	① ② ③	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事			
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査			
設置後工事	① ② ③	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○			建築の外装仕上げ工事
	④ ⑤ ⑥	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
	① ③	電気 他	内装仕上げ工事	○		○					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
浴室用電源配線、接続工事							○			浴室機器の事後電気工事	
浴室天井裏の電源、スイッチ工事							○			浴室全体の電気器具、配線接続工事	

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする


※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する

※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする

 タカラストانダード株式会社	現場名称： 横浜-海老名SR SB1様邸	M I N A ミーナ	工事区分表	
	現場番号： C2773484	プラン番号： 2714J-2110-0128T	作成日： 2021年10月29日	
	海老名ショールーム	担当営業 ： SB1	担当アドバイザー： ミーナ	


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。







■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

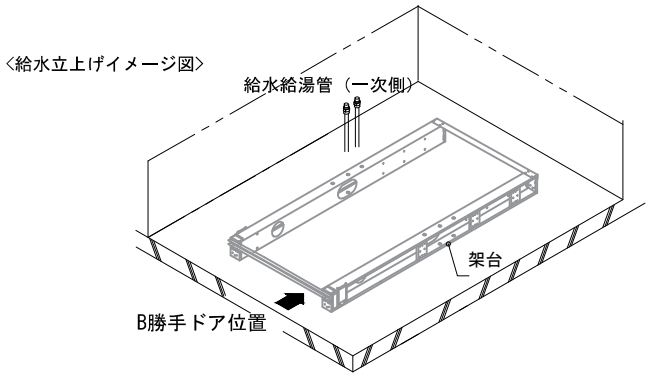



■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より 265mm 下がりで打設してください。

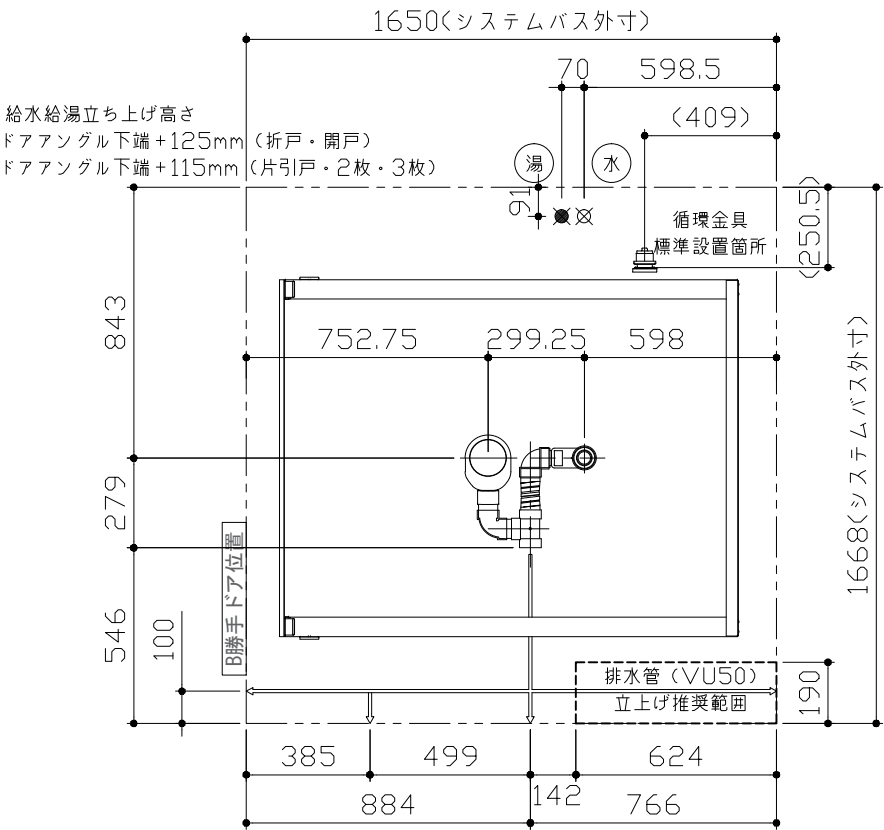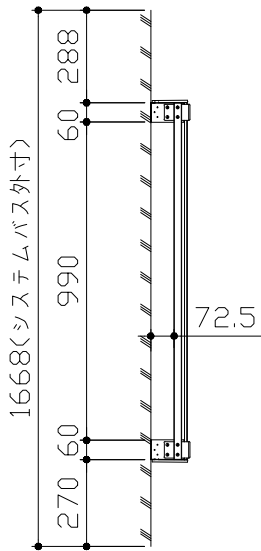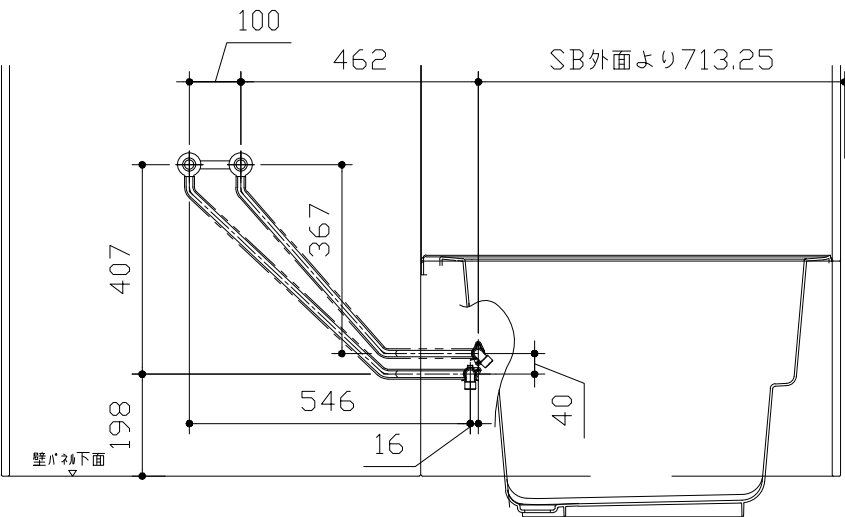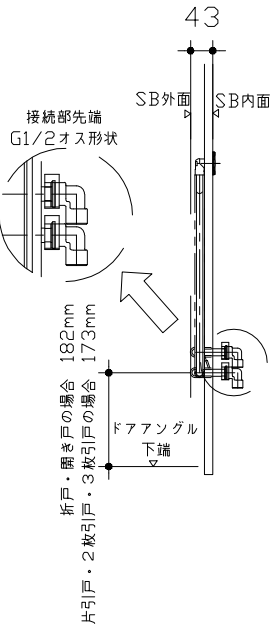

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置

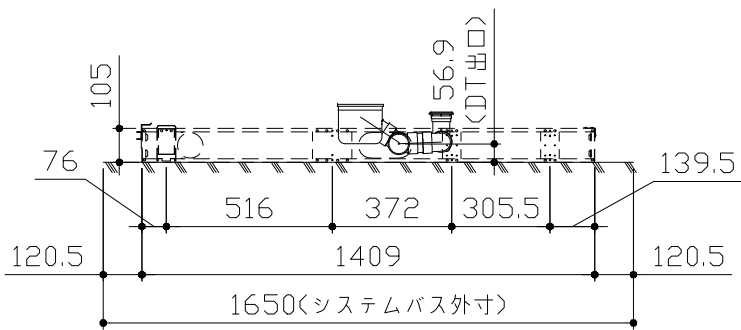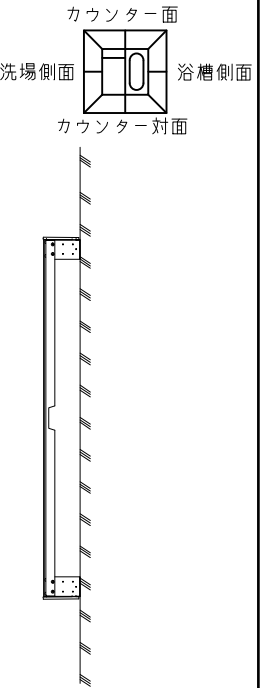




〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉




- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

- ・カウンター面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。

詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。






キープクリーンドア：折戸・上部換気口

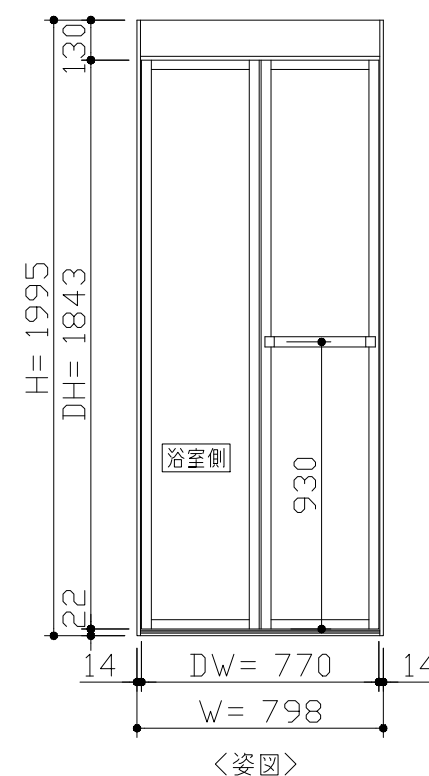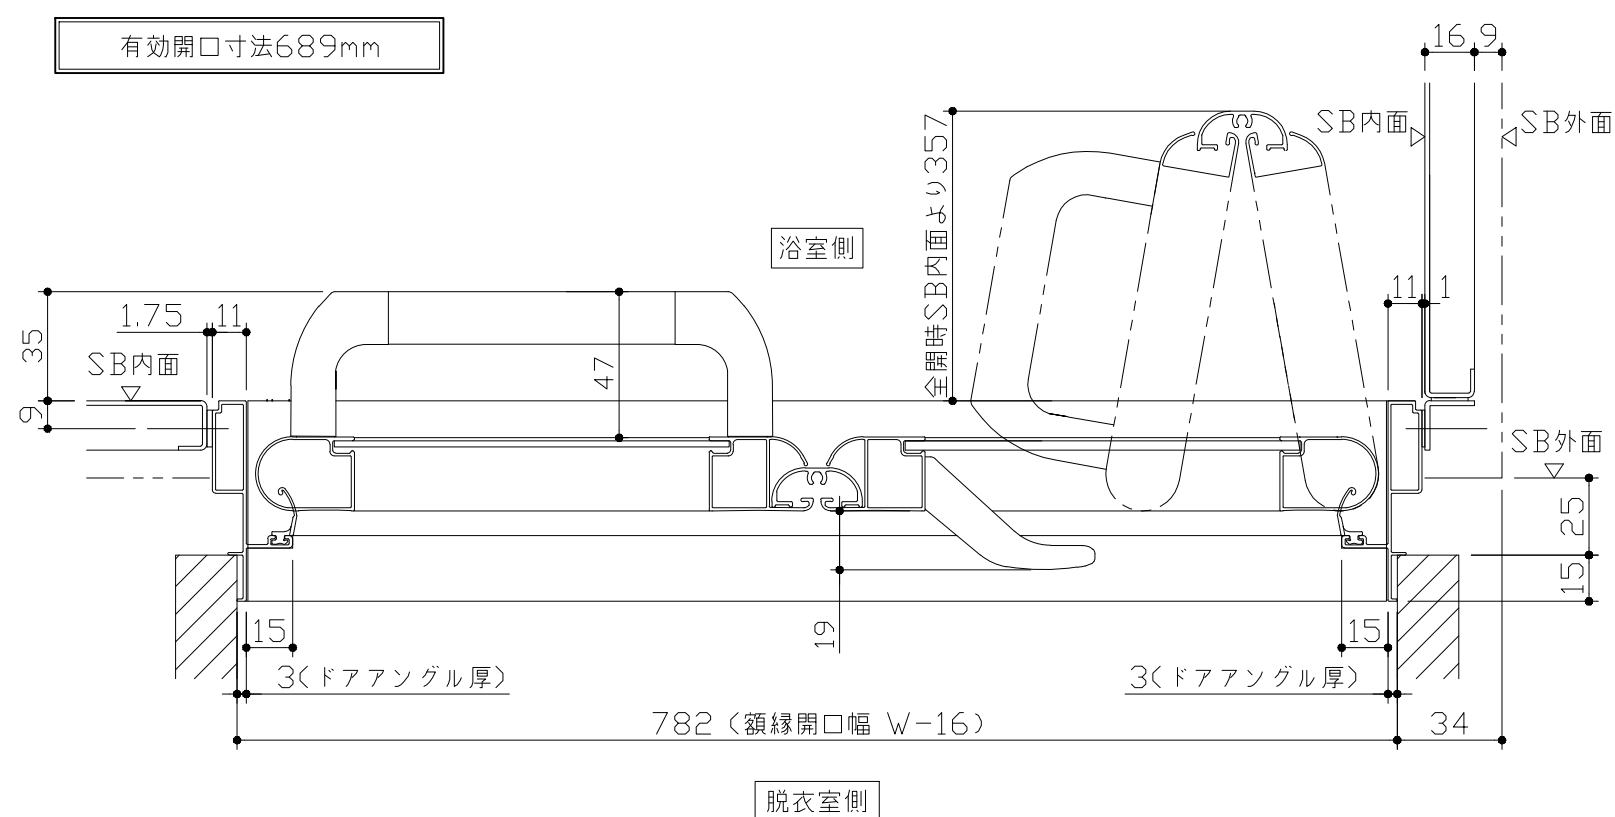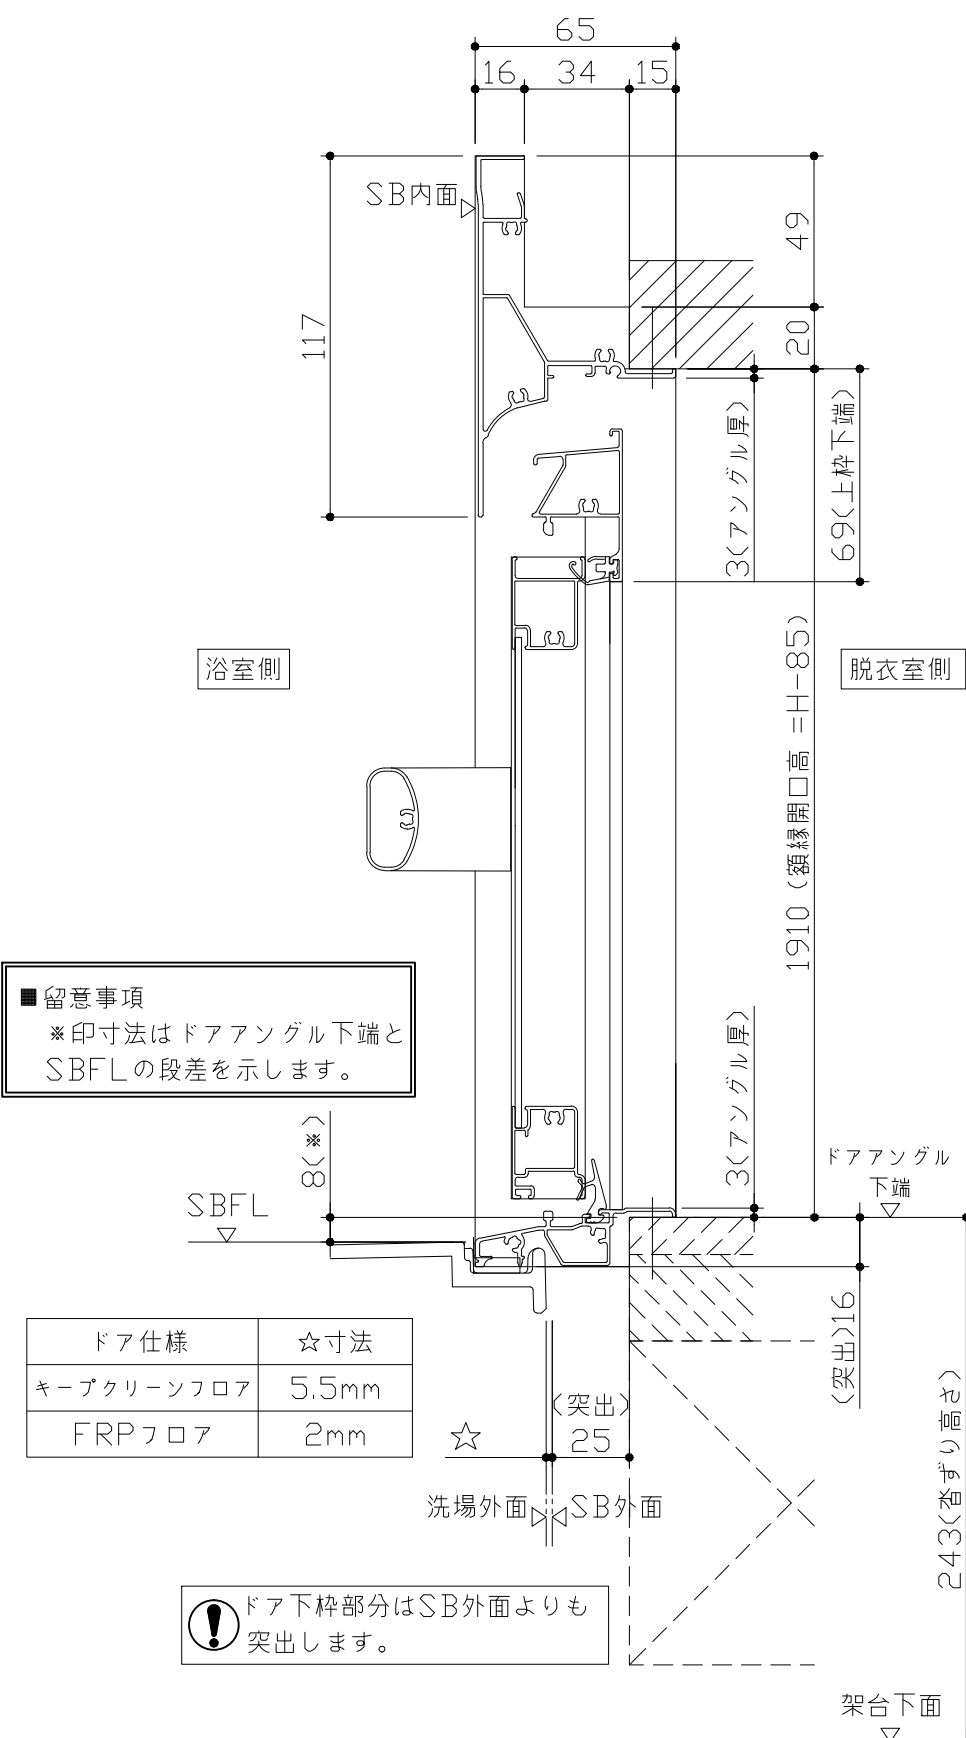








- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



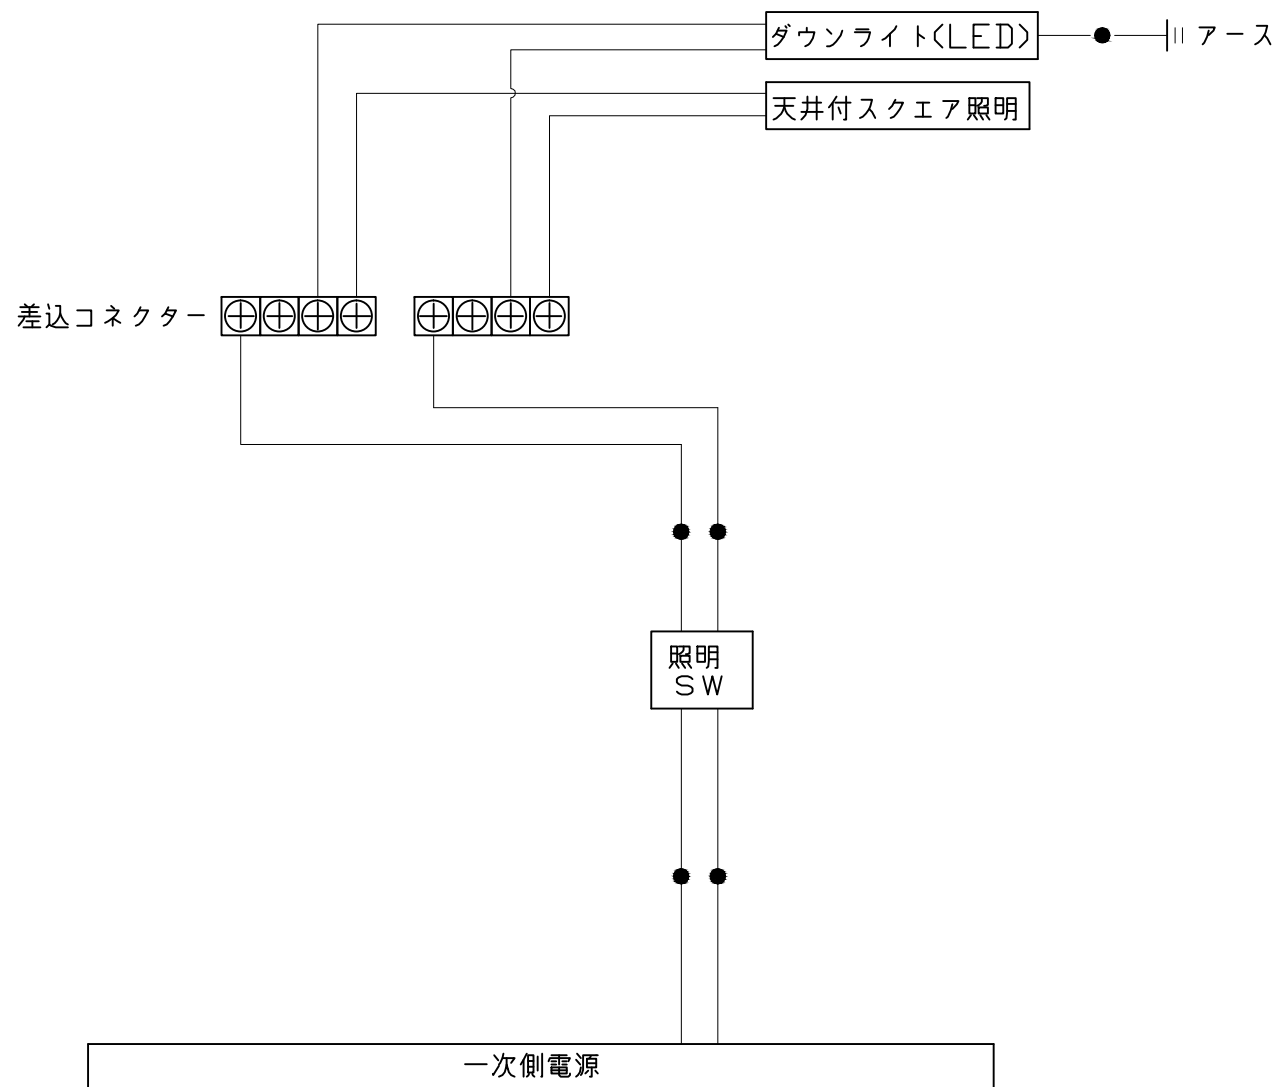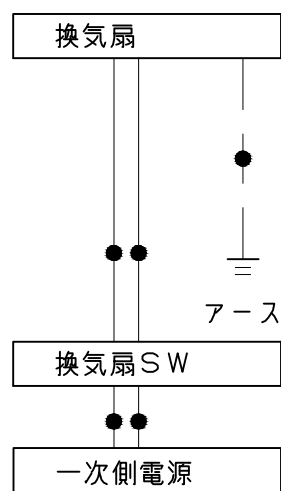

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

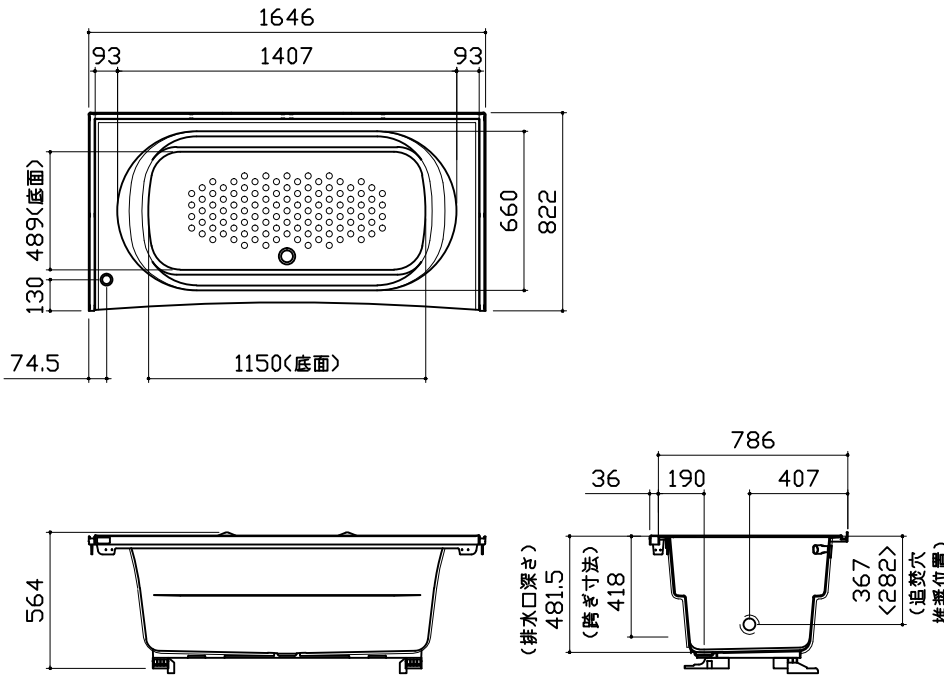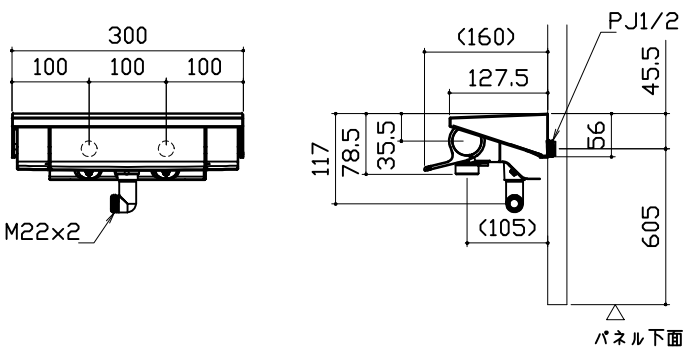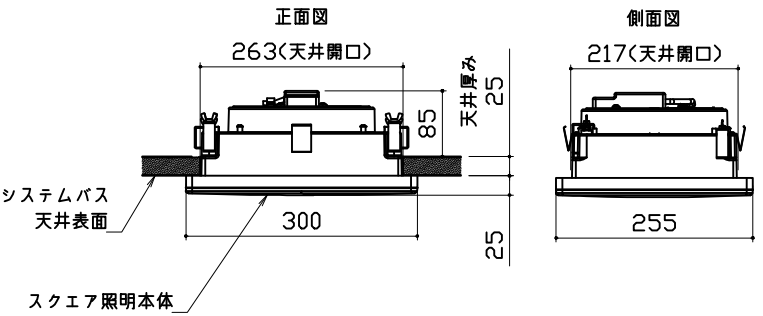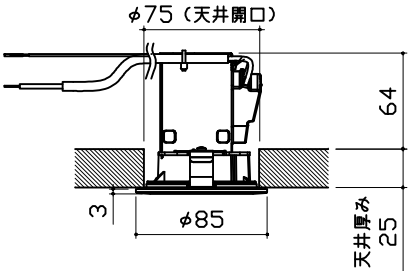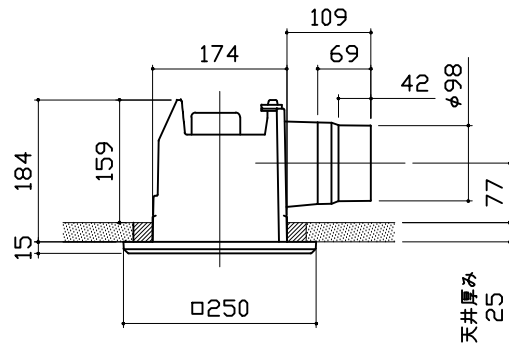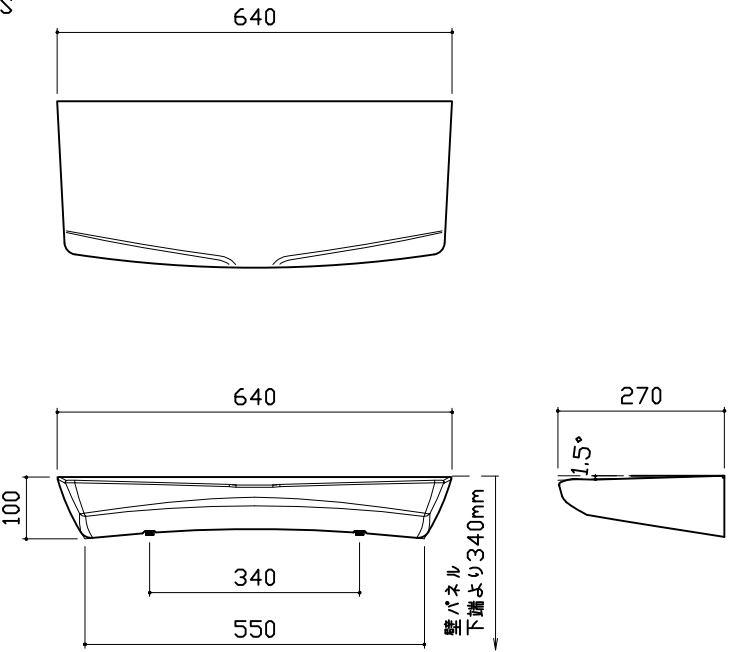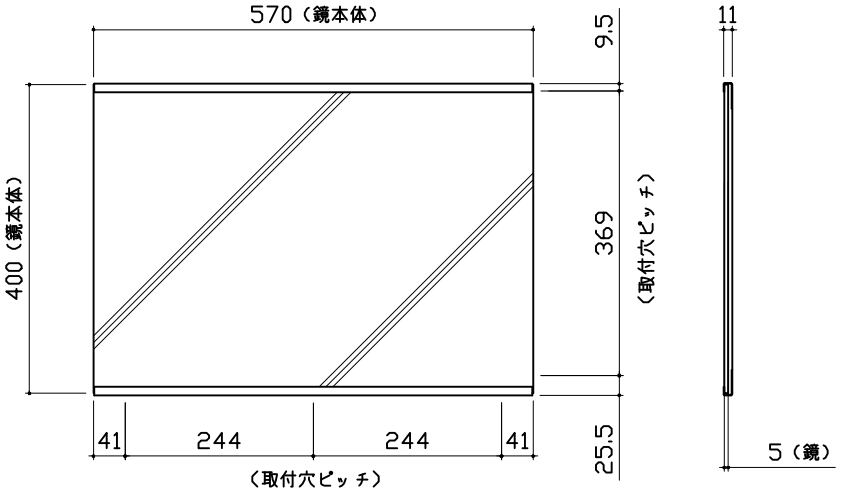浴槽	洗い場用水栓	照明		
 ※ 漏水受け仕様の場合は<>内寸法参照のこと		天井付スクエア照明 LED 11W (1灯あたり)  システムバス 天井表面 スクエア照明本体 ダウンライト LED 4.1W (1灯あたり) 		
換気機器	カウンター	ミラー		
管工事 	本体：ABS 	枠：SUS304 t0.8 ミラー：表面防曇コートあり（横長クリアミラー） 表面防曇コートなし（横長ミラー） 		
 タカラスタンダード株式会社		現場名称： 横浜-海老名SR SB1様邸 現場番号： C2773484 海老名ショールーム	M I N A ミーナ プラン番号： 2714J-2110-0128T 担当営業： SB1	部材詳細図 1/2 作成日： 2021年10月29日 担当アドバイザー： ミーナ

収納棚 本体：AS 取付穴からブラケット天面まで	循環金具・フロアダプタ関連	風呂蓋 7077 ZS-16 I 断面図	
洗い場側排水トラップ	浴槽側排水トラップ フンプッシュ排水栓 ワイヤー引き込み穴 Rタイプを示します。Lタイプは ワイヤー引き込み穴のみ対称になります。		
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜-海老名SR SB1様邸 現場番号： C2773484 海老名ショールーム	M I N A ミーナ プラン番号： 2714J-2110-0128T 担当営業： SB1	部材詳細図 2/2 作成日： 2021年10月29日 担当アドバイザー： ミーナ

パネル割図		ミラー		収納棚			
ハネK16C2Z 0799 LXB ハネL16C1N 0799 CXB ハネK16A 0799 CW ハネL16C1N 0799 CW ハネL16C1N 0799 CW ハネL16C1N 0799 CW ハネK16A 0799 CW BR勝手		ハネK16C2Z 0799 LXB 799 644 400 156 1149 780 現地加工：φ3.5		ハネK16C2Z 0799 LXB 799 200 50 1200 1540 現地加工：φ3.5			
シャワーフックスライドバー							
ハネK16C2Z 0799 LXB 799 80 1701 1678 1003 980 現地加工：φ3.5							
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 横浜-海老名SR SB1様邸		M I N A ミーナ		穴開け指示図	1/1
		現場番号： C2773484		プラン番号： 2714J-2110-0128T		作成日： 2021年10月29日	
		海老名ショールーム		担当営業： SB1		担当アドバイザー： ミーナ	
