

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 横浜-海老名SR SB3 様

業者 様

商品名 PREDECIA プレデンシア

商品
御見積金額 \1,223,100 (税込 \1,345,410)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 \157,000 (税込 \172,700)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

作成日 2021年3月8日
プラン番号 2714J-2103-0054T
現場番号 A6765202

タカスタンダード株式会社
◆海老名ショールーム
神奈川県海老名市上今泉3-1-15

TEL 046-236-5662 / FAX 046-235-9702

◆厚木営業所
TEL 046-280-6161 / FAX 046-227-5010

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
SB3	プレデンシア	ジオマーブルモスクレー

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616 (AL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	グランホワイト
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	プレシャスホワイト
浴槽形状	ラウンド浴槽
浴槽・風呂フタ	高断熱仕様
カウンター材質	アクリル人造大理石
カウンターカラー	プレシャスホワイト
エプロン材質/カラー	ステンレス / ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー (正面)	ジオマーブルモスクレー
パネルカラー (周辺)	ジオマーブルモスクレー
ガス種 / 周波数	未定 / 50Hz

◆ 御確認事項

◆ 備考

--	--

No.*

御名前 横浜-海老名SR SB3

様

現場番号	A6765202	プラン番号	2714J-2103-0054T	作成日	2021/3/8
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1616サイズ		1	1,038,000	1,038,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(グレー)／樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1	+11,500	+11,500
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・全面デザインプレミアムクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・グランホワイト)	1	+20,000	+20,000
7	排水口カバー	ステンレス	1		
8	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(プレシャスホワイト)	1		
9	浴槽追い焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ホワイト)	1		
11	浴槽形状	ラウンド浴槽	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1		
14	ガス温水式床暖房	なし	1		
15	洗い場用水栓	棚付サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)KF9152H 水栓上部カウンター(ホワイト)	1		
16	洗い場用水栓	エコシャワー(節水+手元止水+3Way):KF9152HLE/RE	1	+13,000	+13,000
17	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
18	カウンター	人大スクエアカウンター	1		
19	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー	1		
20	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザインプレミアム)(Kパネル)	1	+85,000	+85,000
21	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
22	天井	高光沢フラット天井	1		
23	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V規格)	1	+41,000	+41,000
24	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
25	換気機器開口	工場開口	1		
26	照明	ダウンライト照明(3灯)(白色)	1	-8,000	-8,000
27	天井照明開口	工場開口	1		
28	ミラー	ロングクリアミラー	1		
29	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
30	タオル掛け	クリアタイプ クリア	1		
31	ハンドバー	ステン I型600タイプ	1	+8,000	+8,000

御名前 横浜-海老名SR SB3

様

現場番号	A6765202	プラン番号	2714J-2103-0054T	作成日	2021/3/8
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	収納棚	クリアタイプ クリア (3段)	1		
33	どこでもラック	風呂フタフック (ホワイト)	1	+2,100	+2,100
34	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500
35	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
36	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			36		\1,223,100

商品総合計	36	\1,223,100
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

【参考】別途 商品組付費


システムバス商品組付費

\157,000 (税込 \172,700)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

() 内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

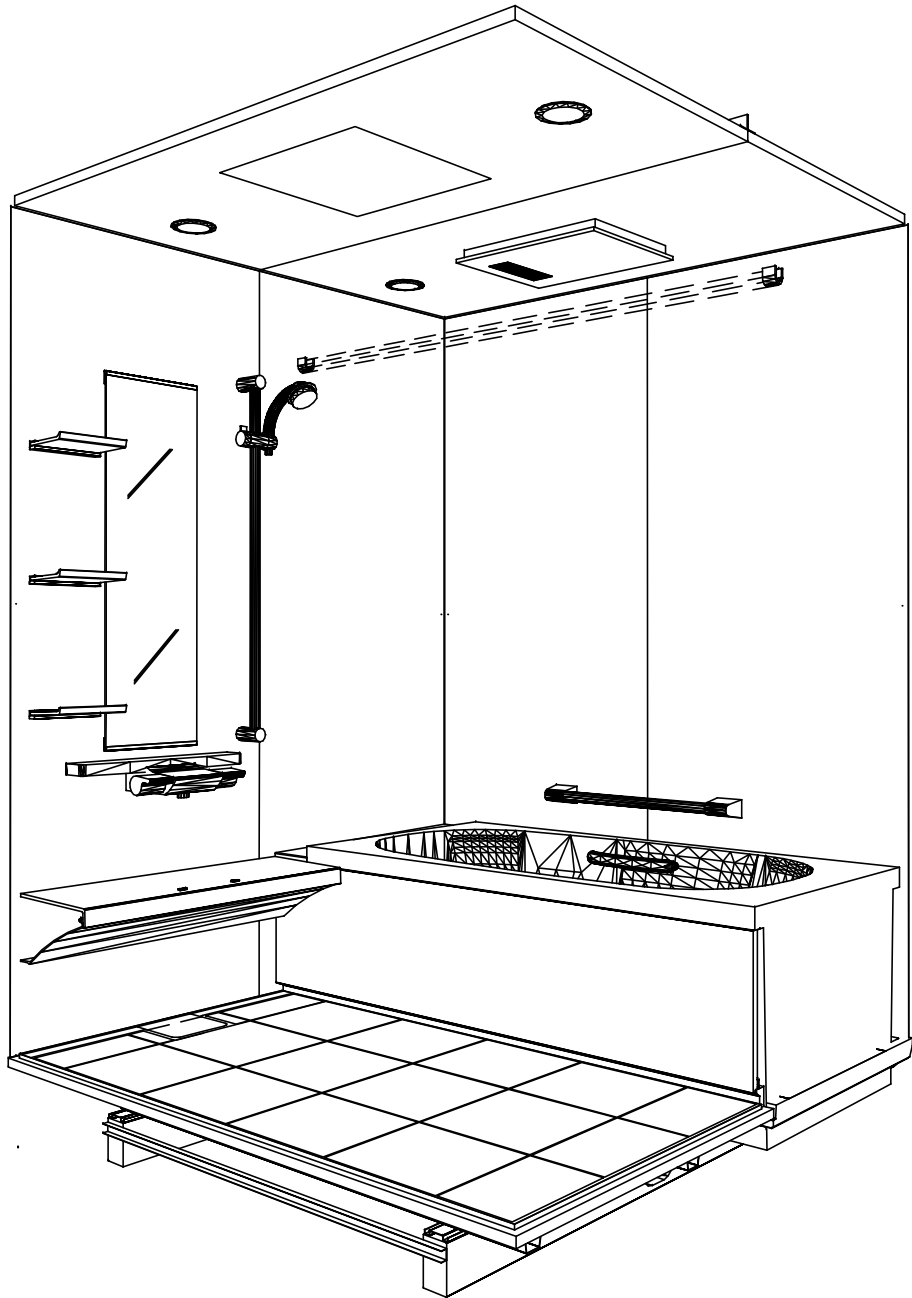

鳥瞰図

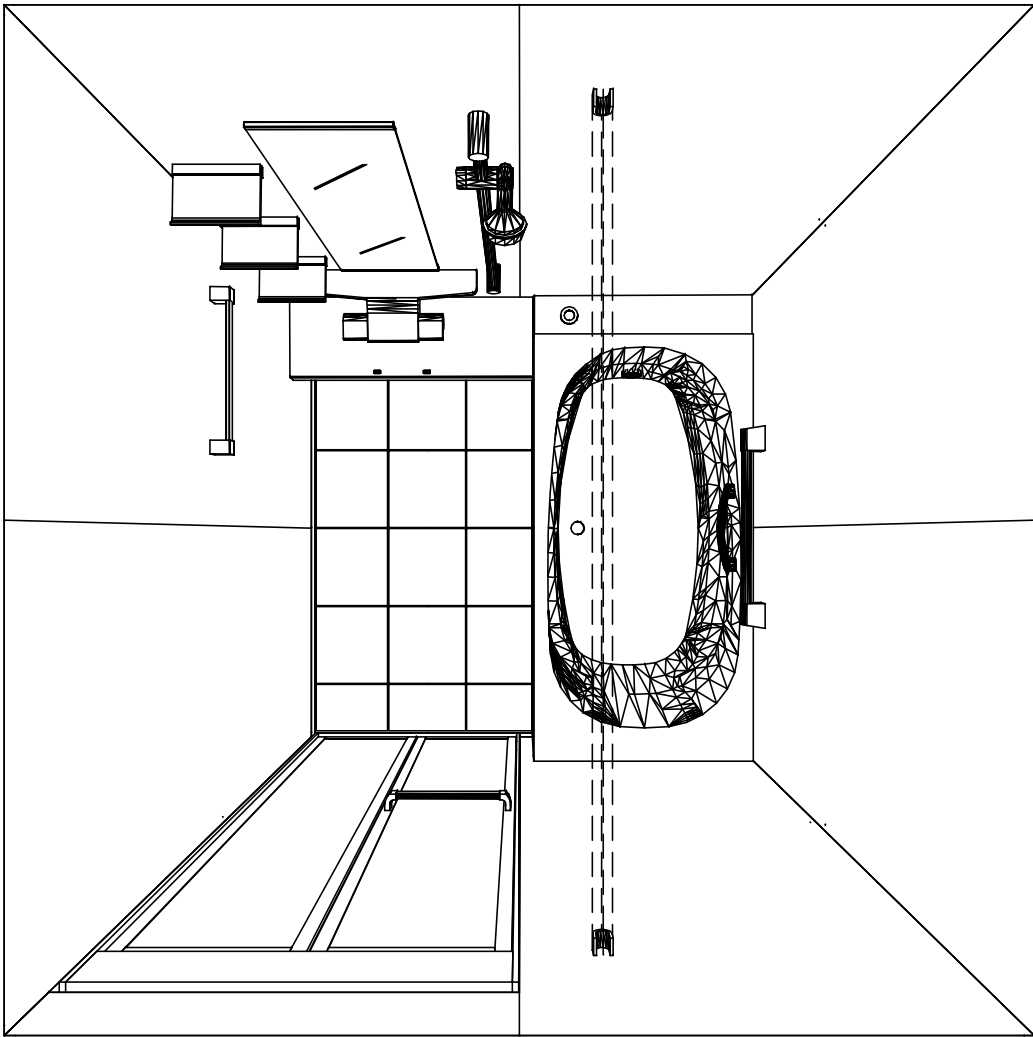

1616
鋳物ホーロー浴槽
高光沢フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・
納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認
して頂きますようお願い致します。

Takara standard タカラストANDARD株式会社	現場名称： 横浜-海老名SR SB3様邸	PREDENCIA プレデンスシア	姿図	
	現場番号： A6765202	プラン番号： 2714J-2103-0054T	作成日： 2021年3月8日	
	海老名ショールーム	担当営業： SB3	担当アドバイザー： プレデンスシア	

縮尺：A3サイズ等倍

カウンター面


洗場側面

浴槽側面


カウンター対面

■留意事項



※印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

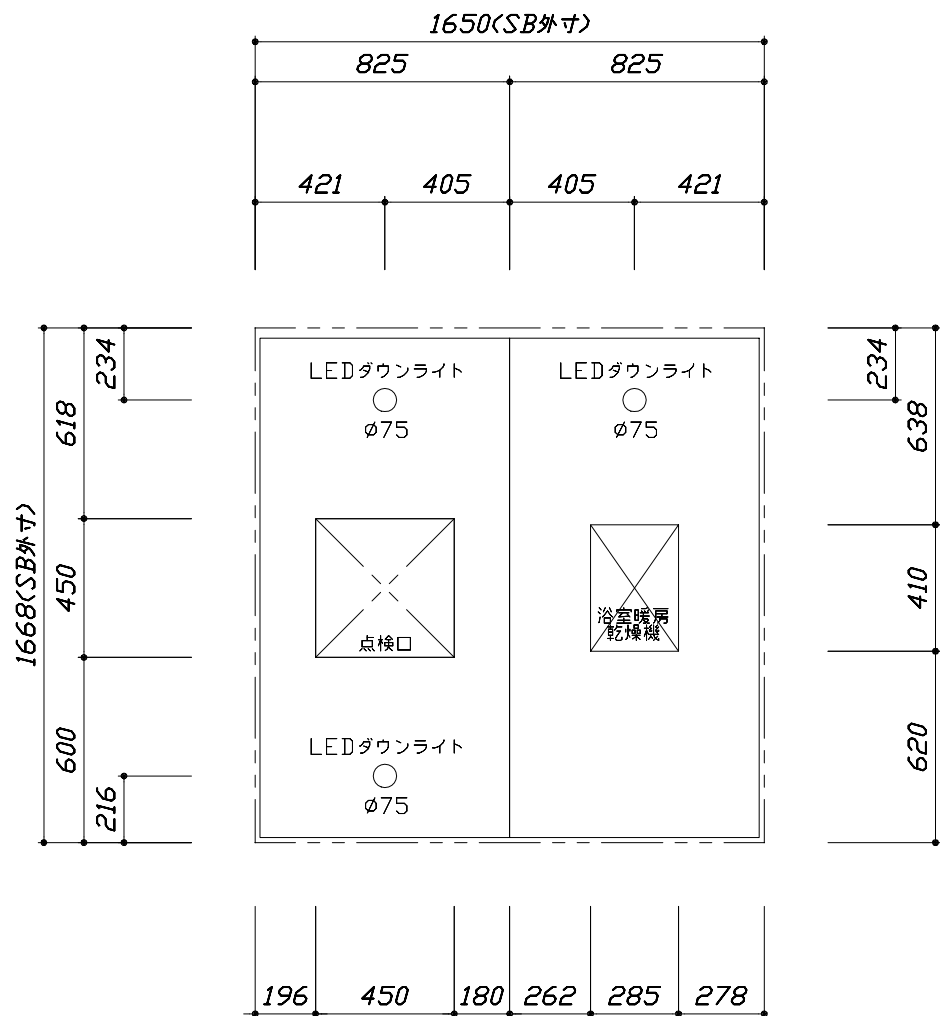

< 天井伏図 >

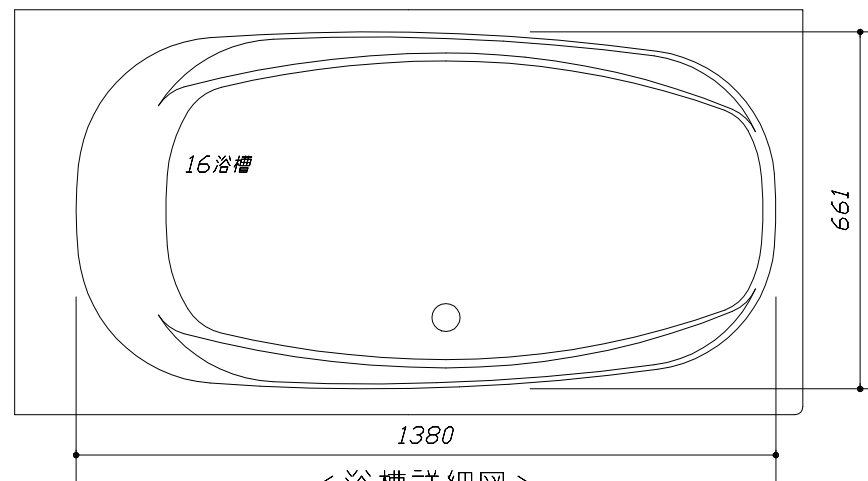



< 浴槽詳細図 >

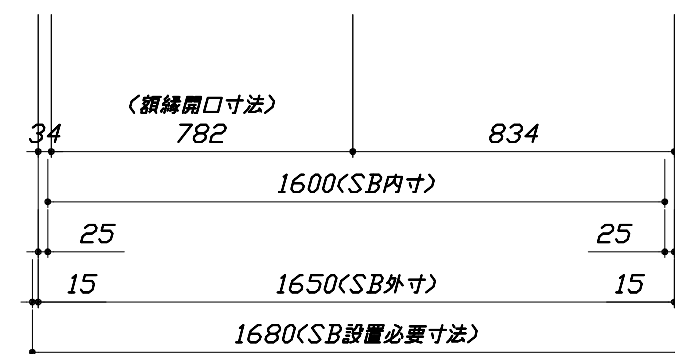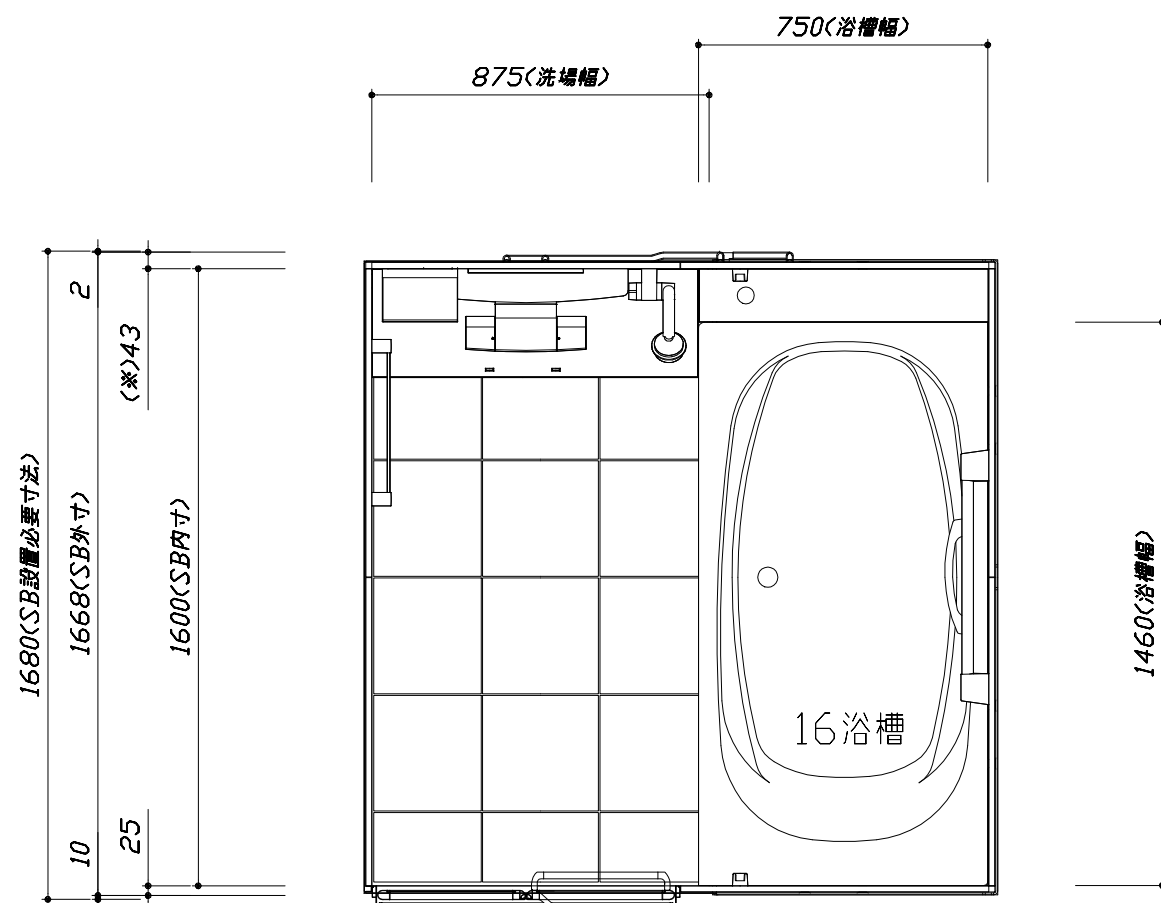

< 平面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認お願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

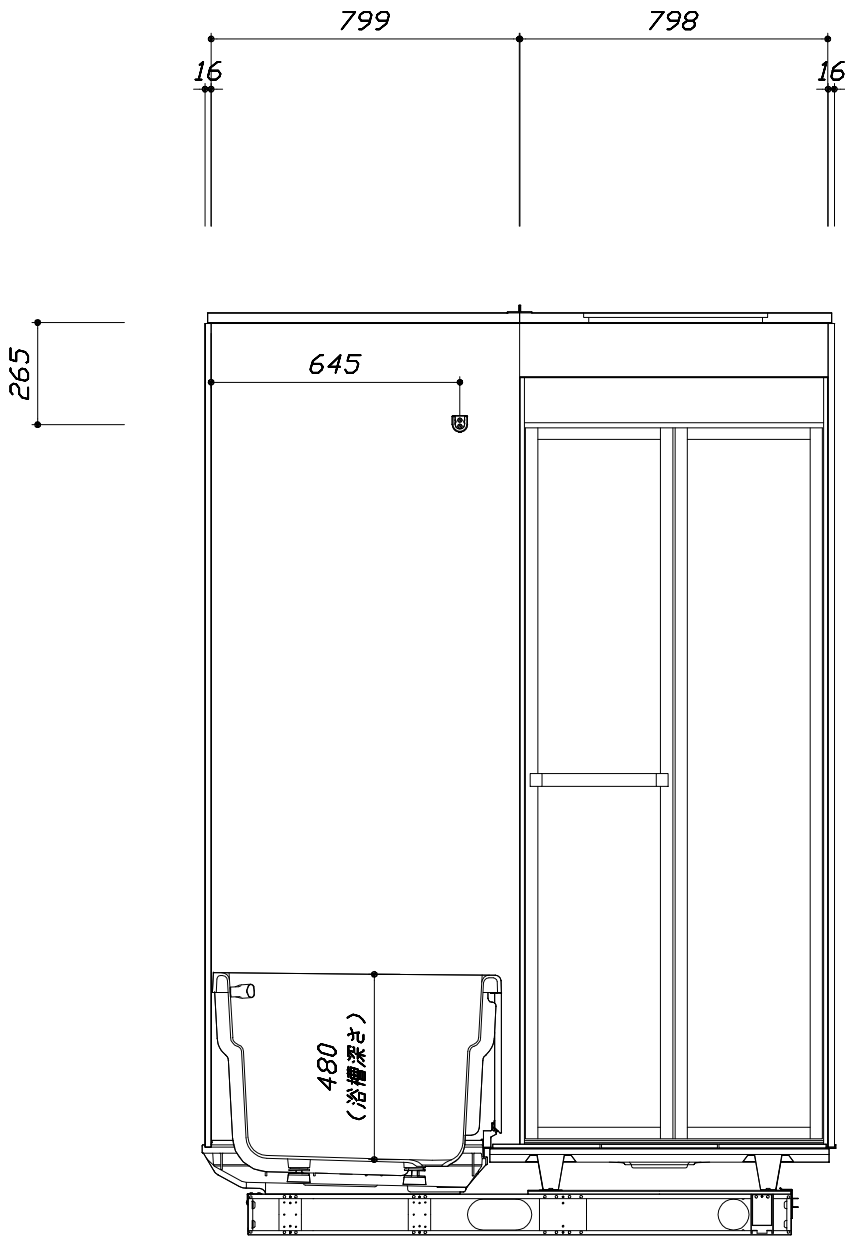

<カウンター対面図>



■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

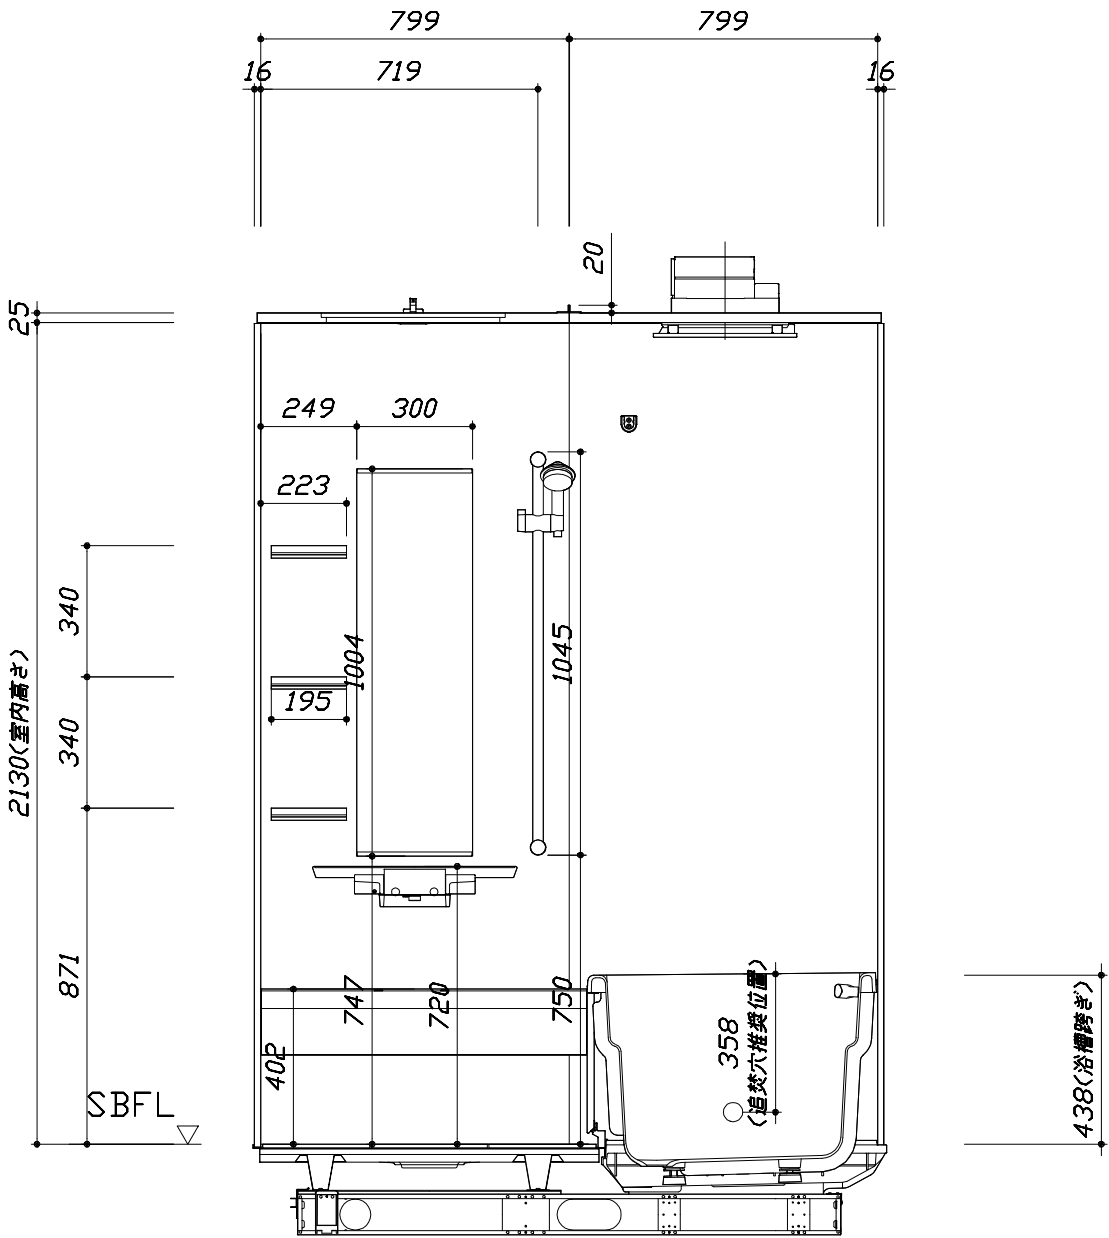

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

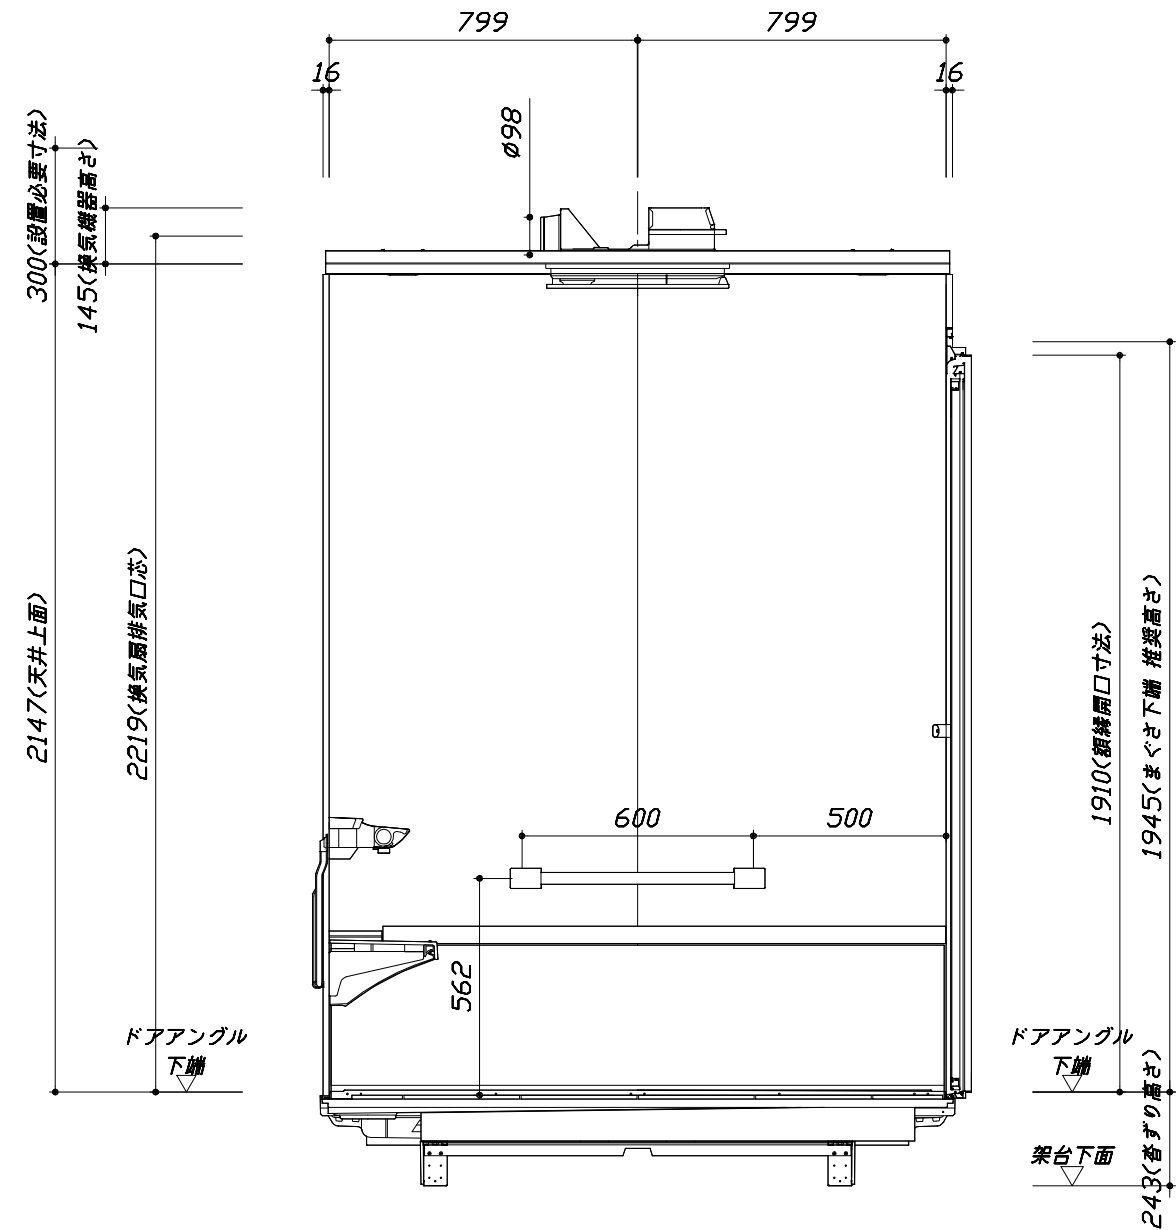

< 浴槽側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

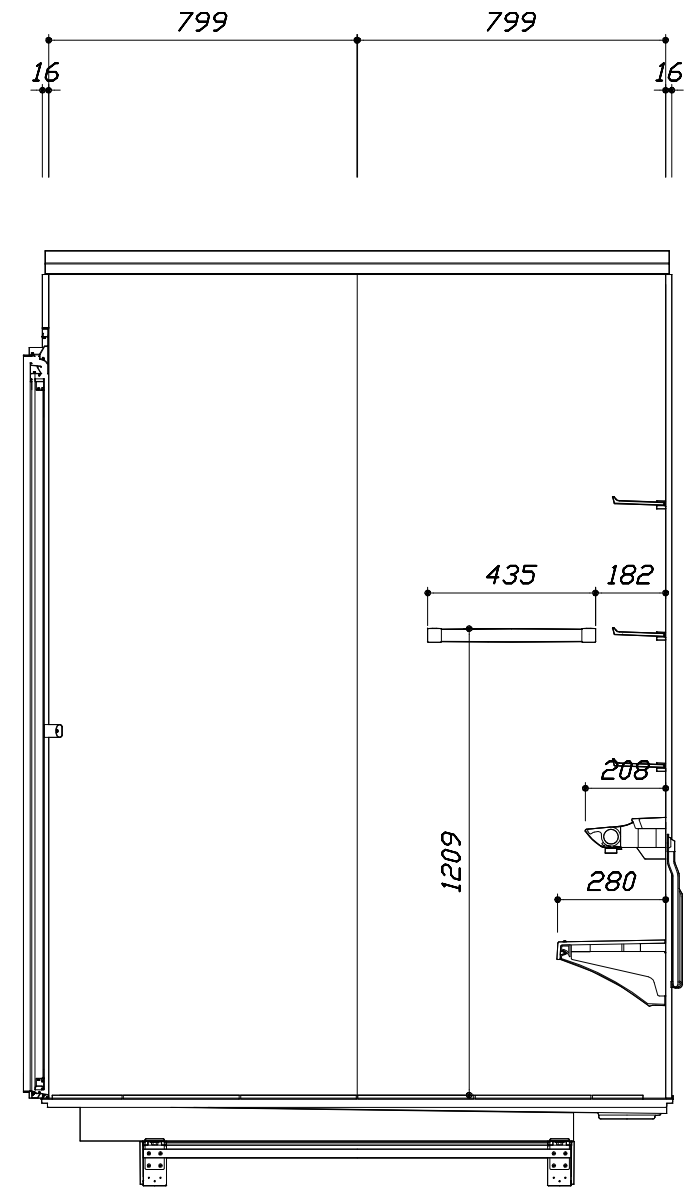

< 洗場側面図 >

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



現場名称： 横浜-海老名SR SB3様邸	PREDENCIA プレデンスシア	工事区分表	
現場番号： A6765202	プラン番号： 2714J-2103-0054T	作成日： 2021年3月8日	
海老名ショールーム	担当営業： SB3	担当アドバイザー： プレデンスシア	

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』


※【注記 1】 原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

※【注記 2】 製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する

※【注記 3】 浴室内の立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。







■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

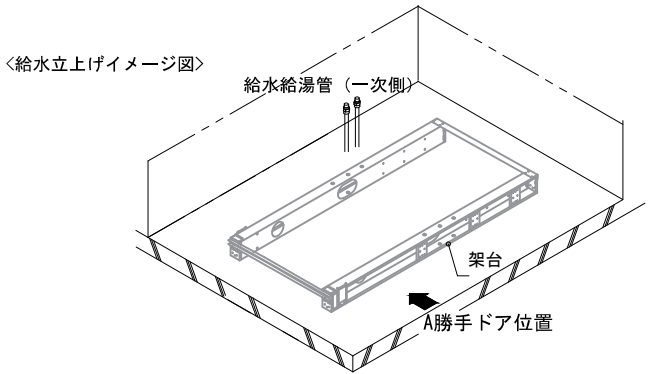


■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より 265mm 下がりで打設してください。

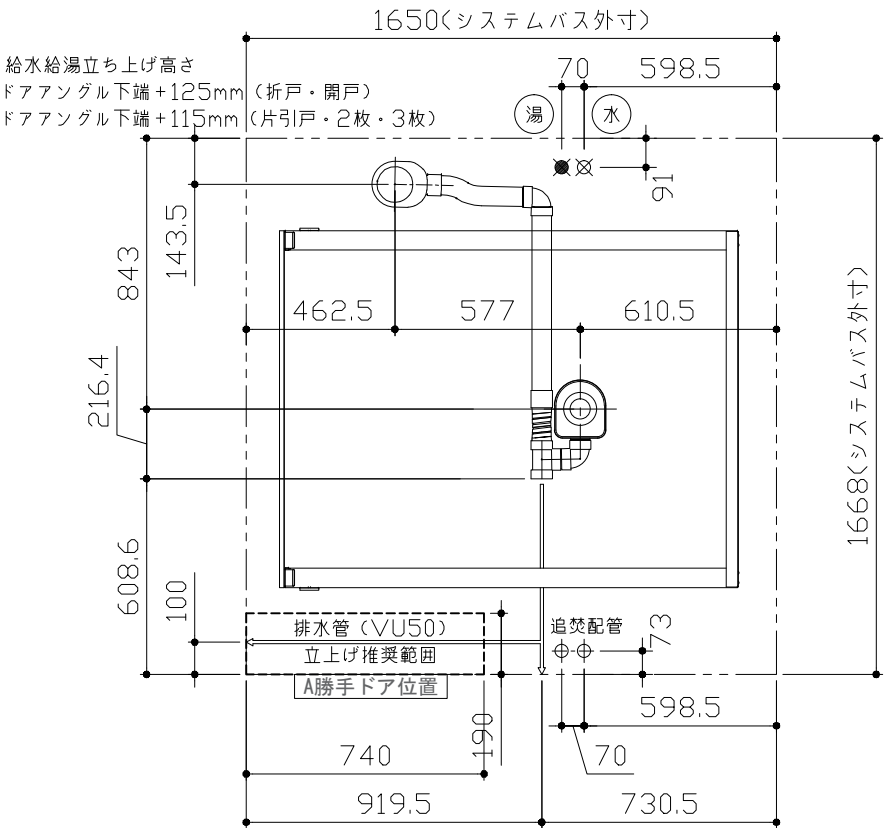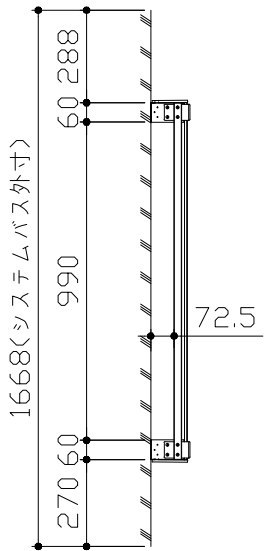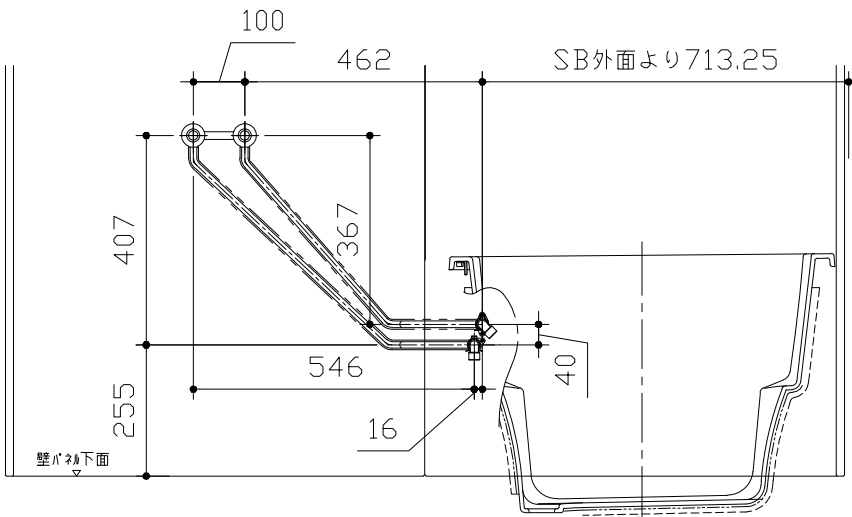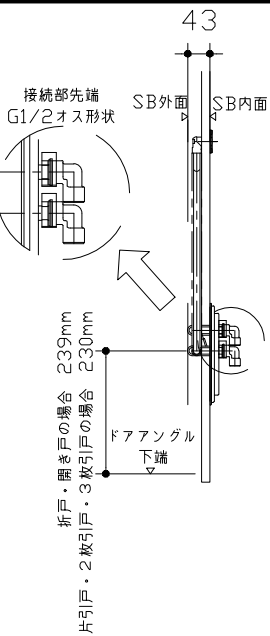

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置

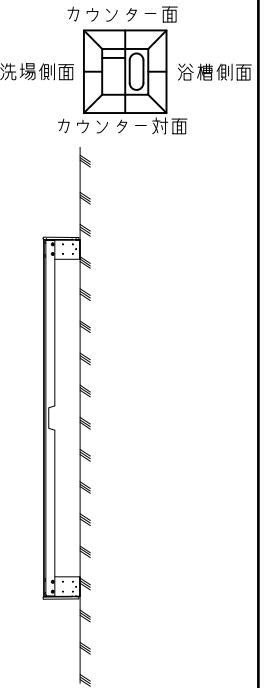

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉

Takara standard
タカラストANDARD株式会社

現場名称： 横浜－海老名SR SB3様邸
現場番号： A6765202
海老名ショールーム

PREDENCIA プレデンスシア
プラン番号： 2714J-2103-0054T
担当営業： SB3

排水配管図
作成日： 2021年3月8日
担当アドバイザー： プレデンスシア





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

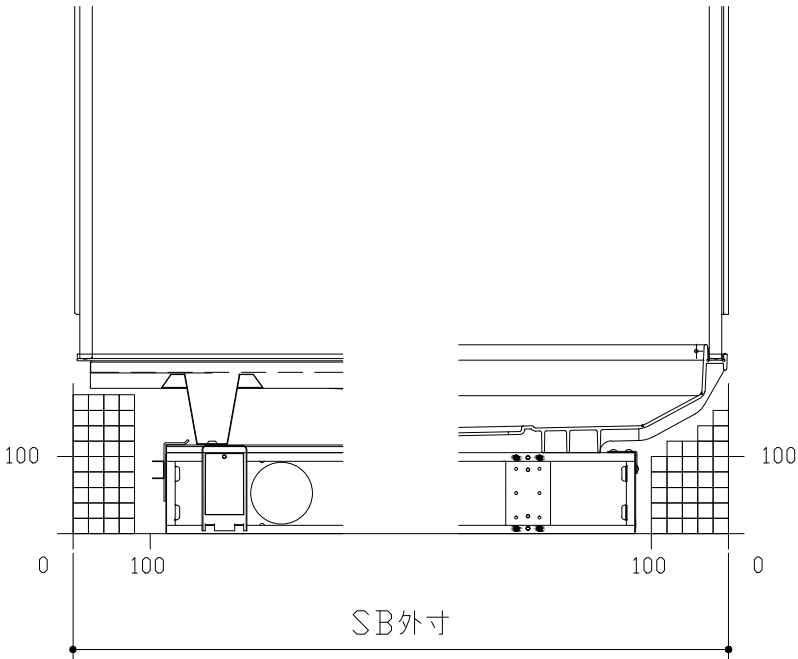


B矢視

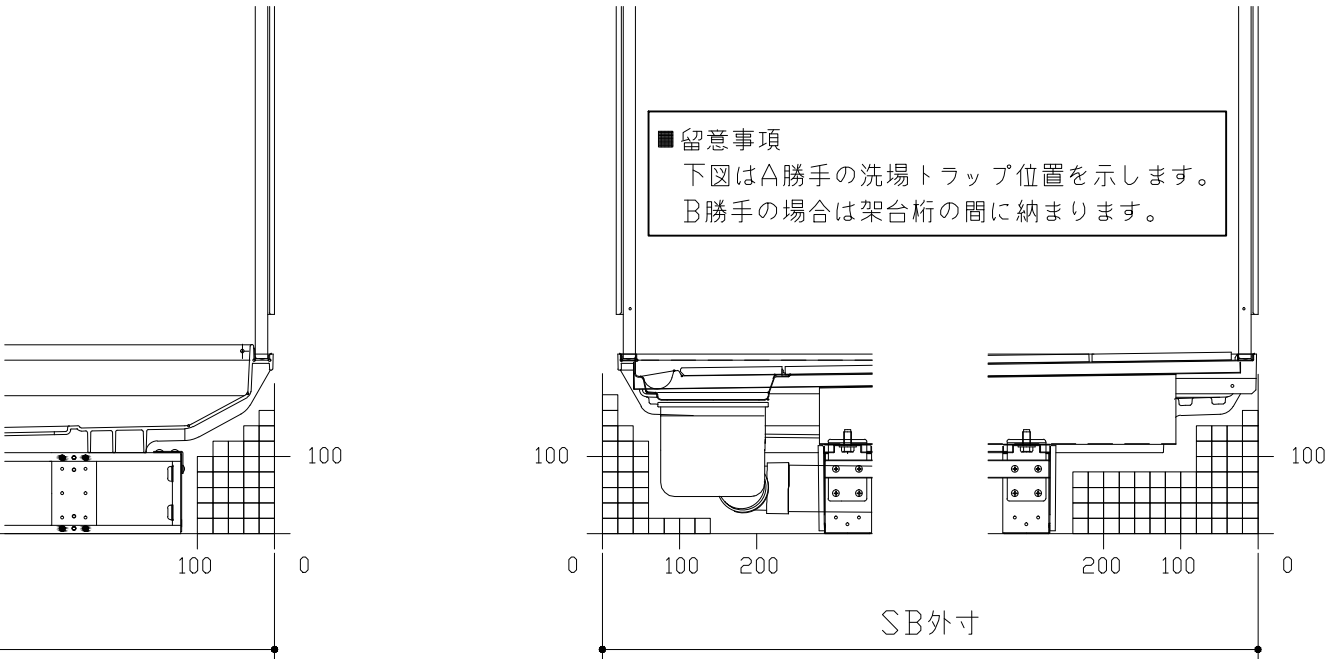


A矢視

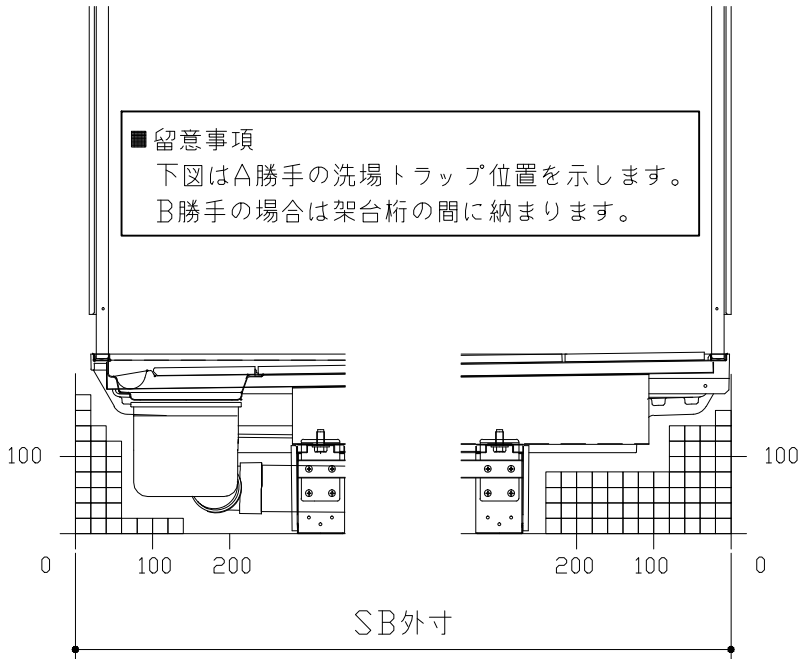


D矢視

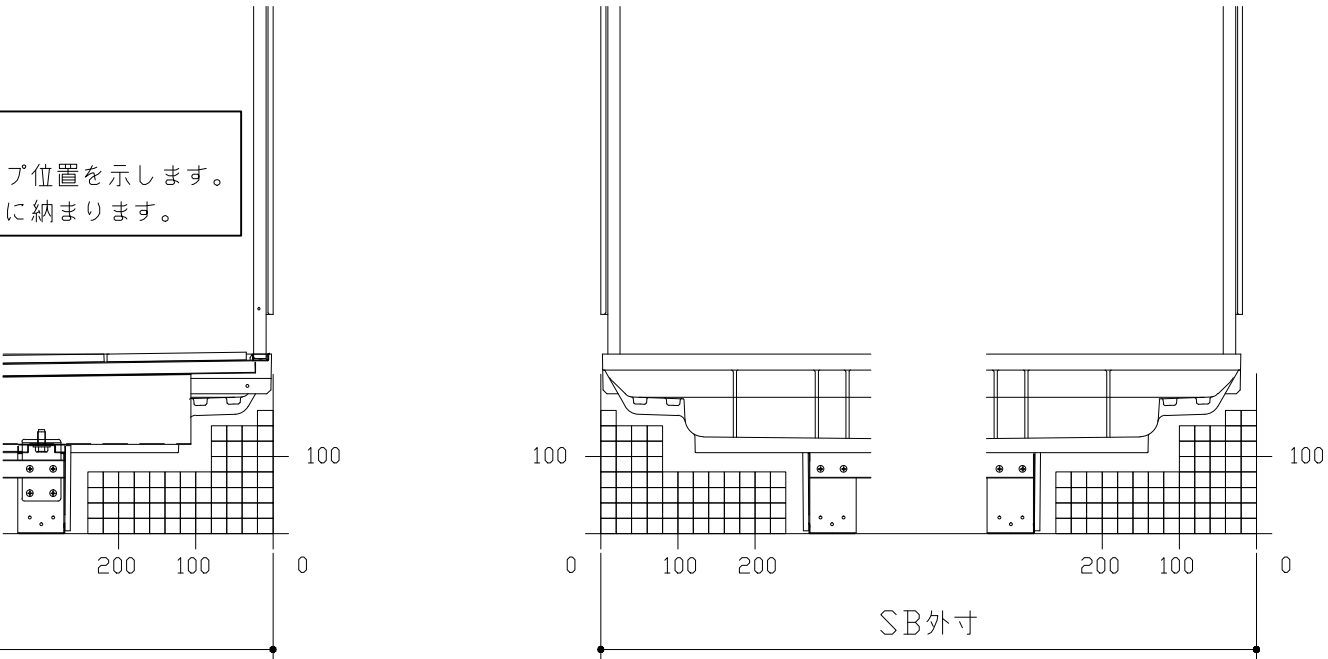

C矢視



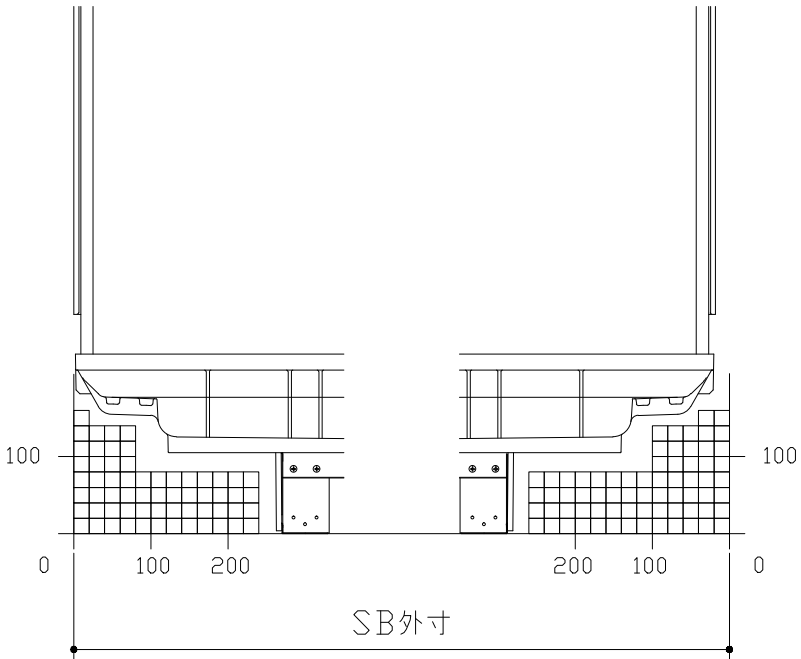


F矢視

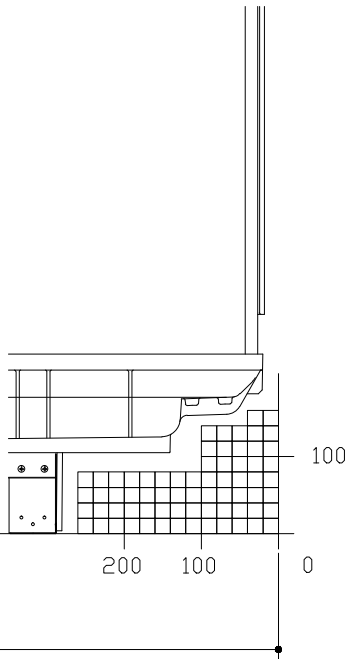


E矢視


キープクリーンドア：折戸・上部換気口

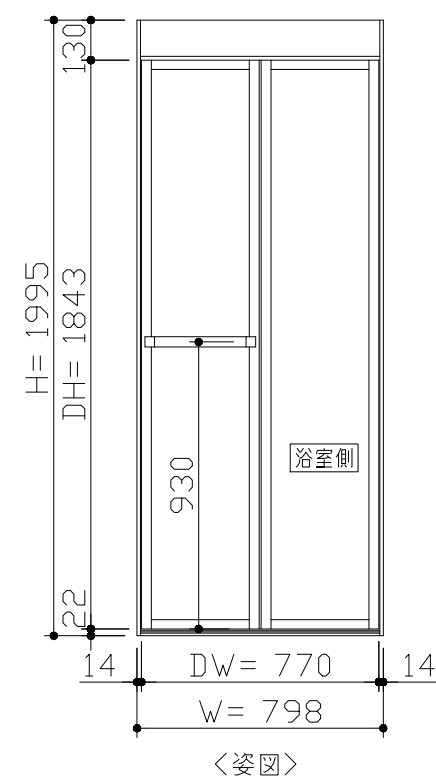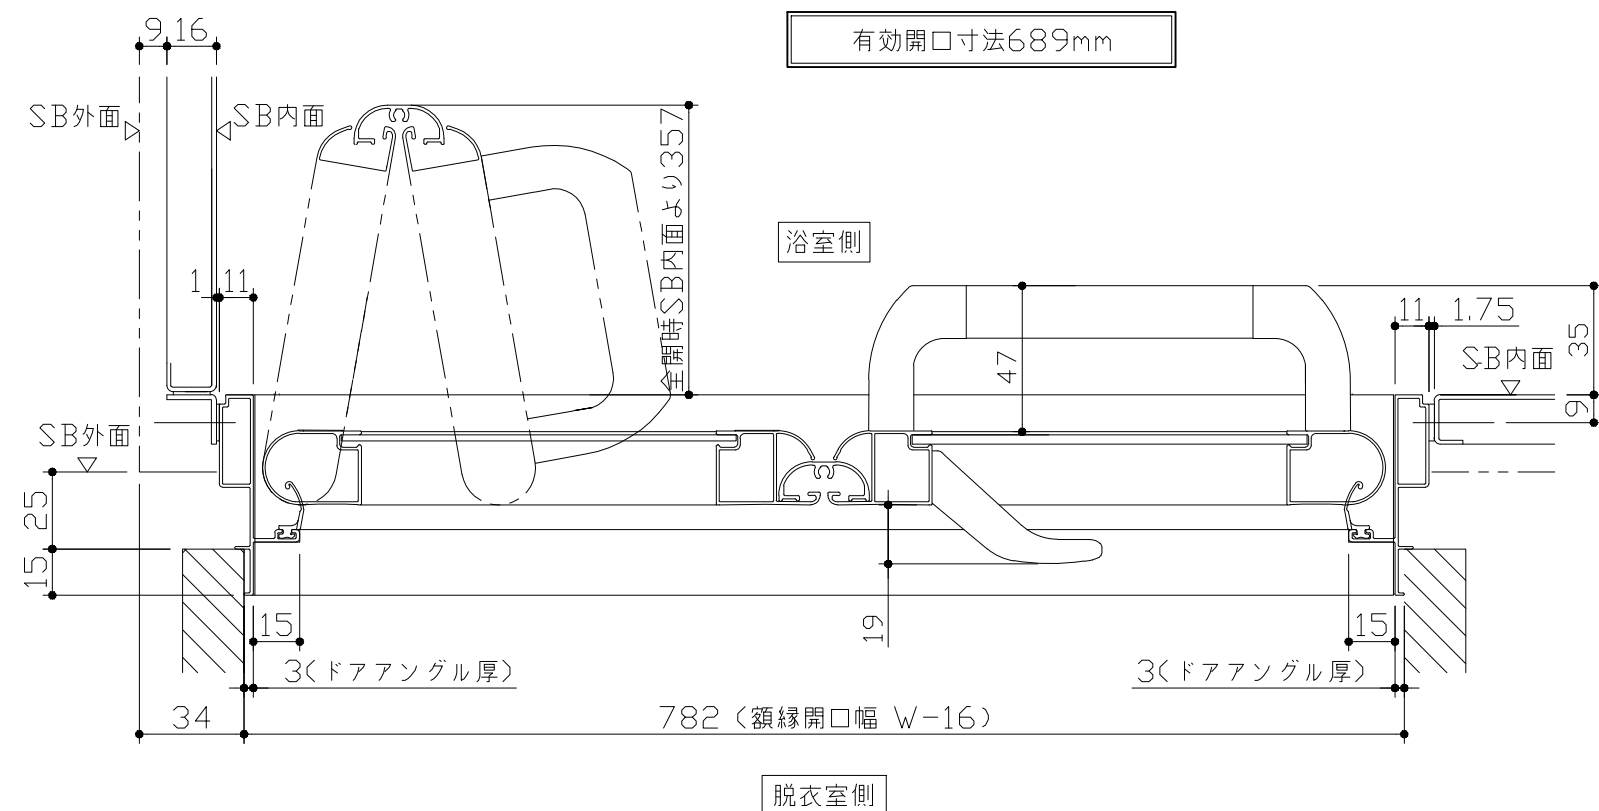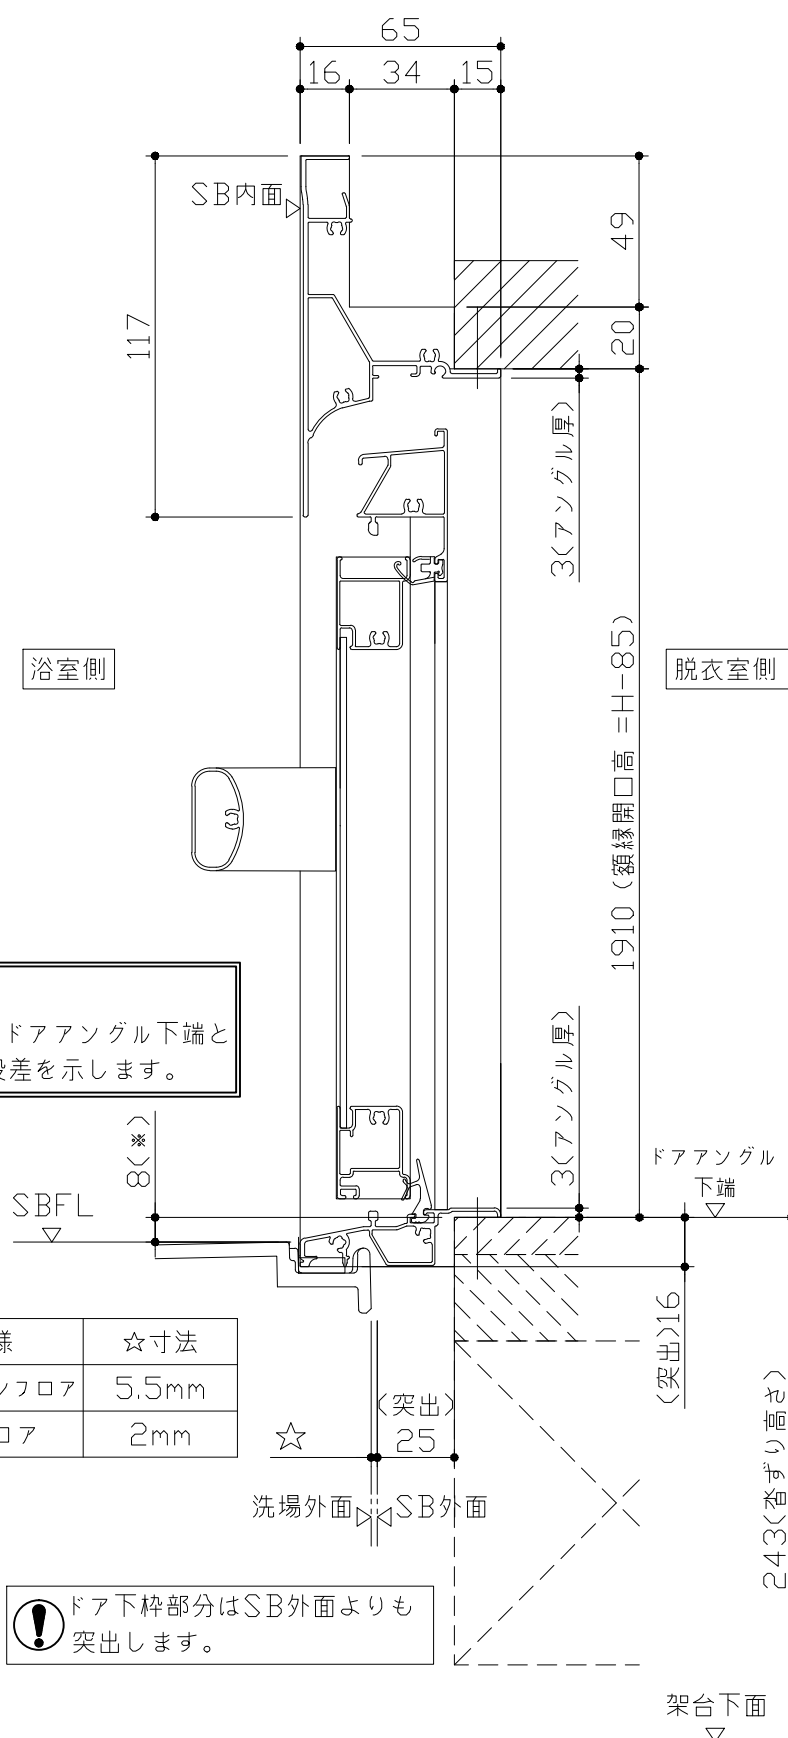

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。







〈参考寸法図〉



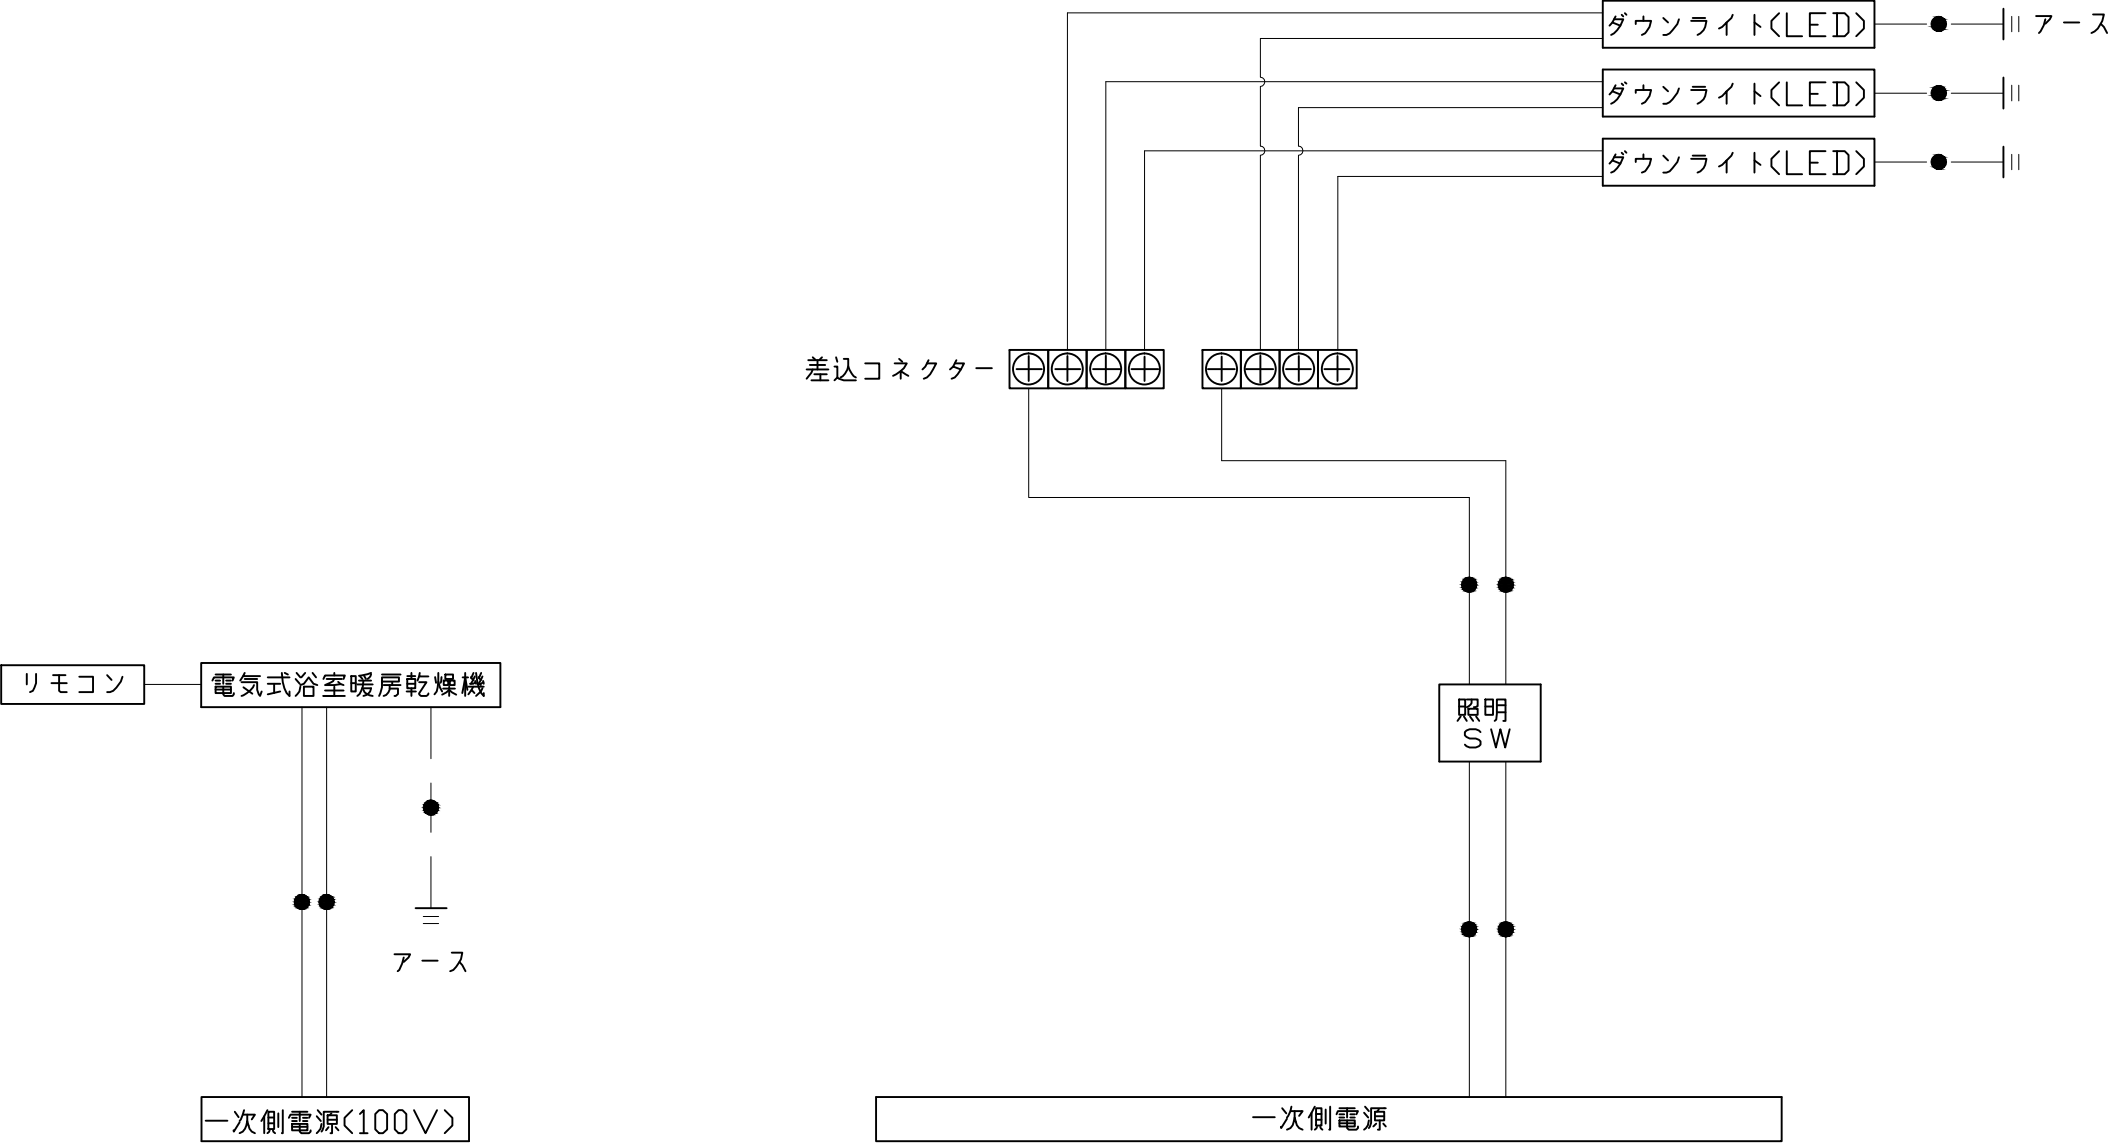


※浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。

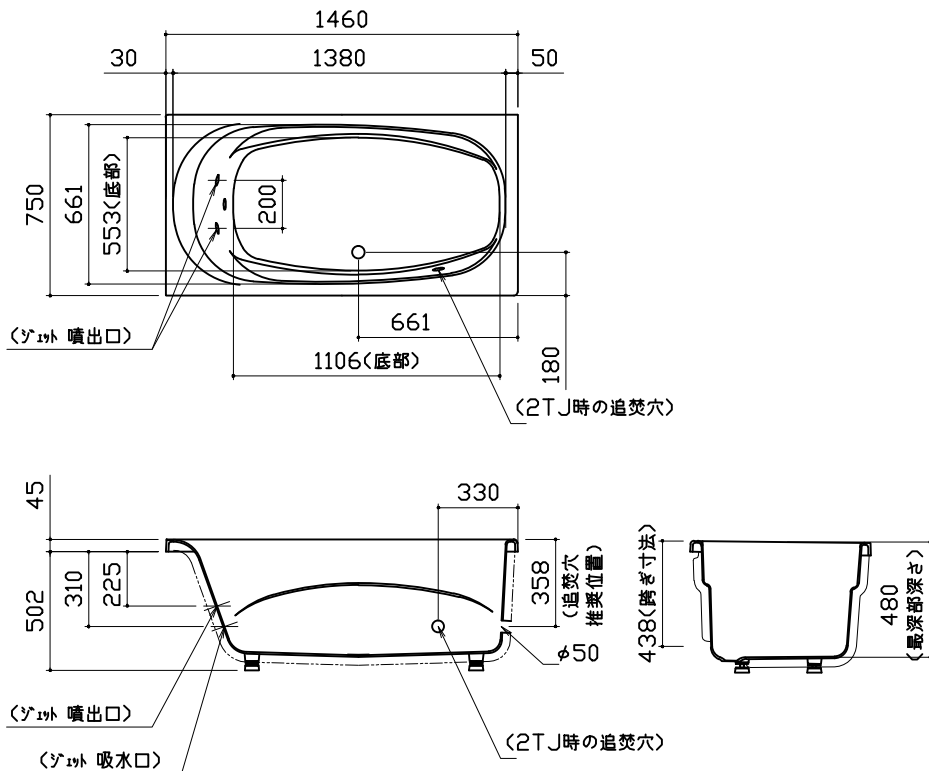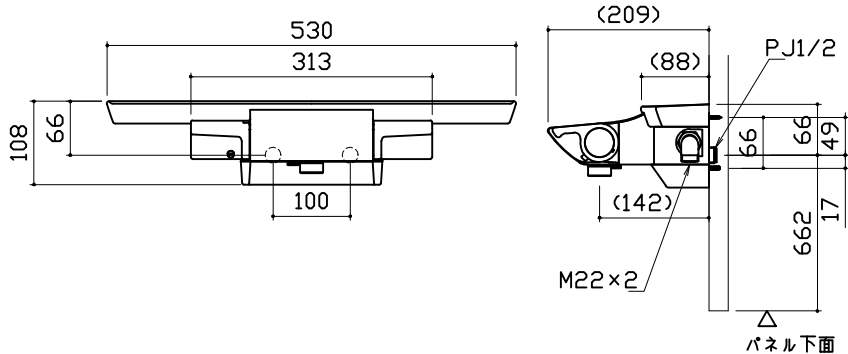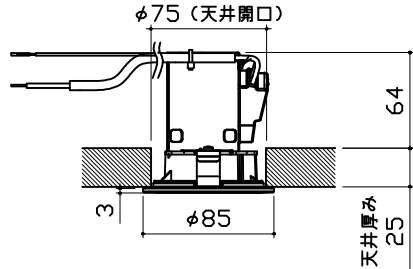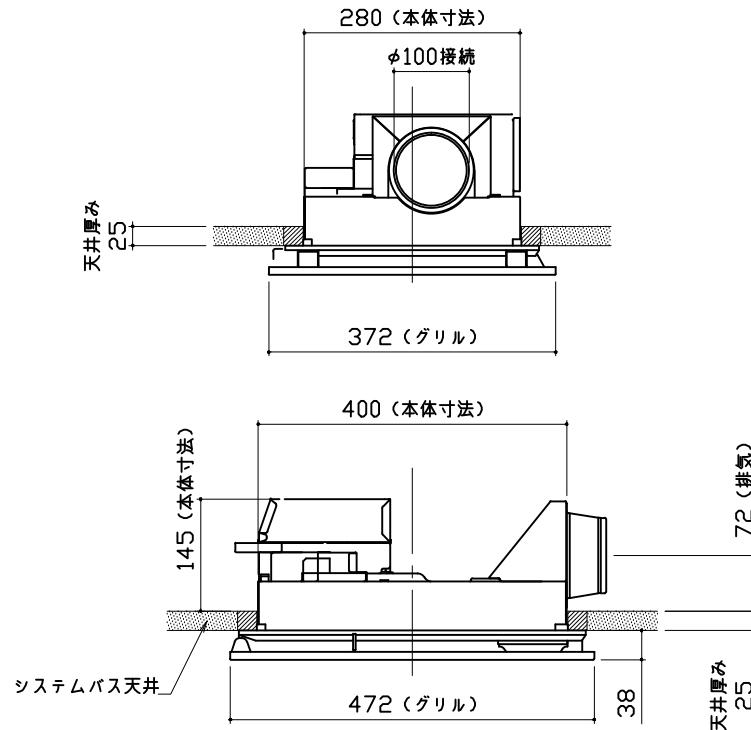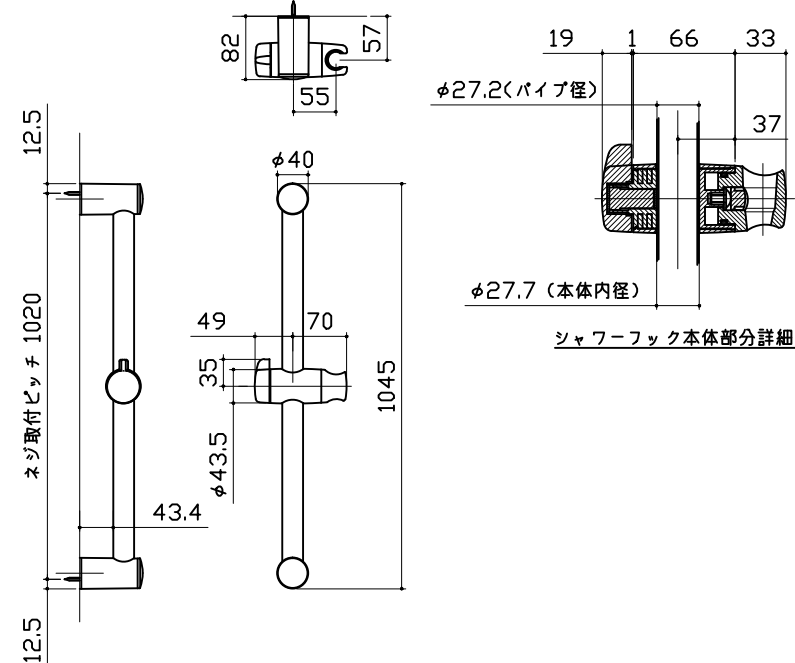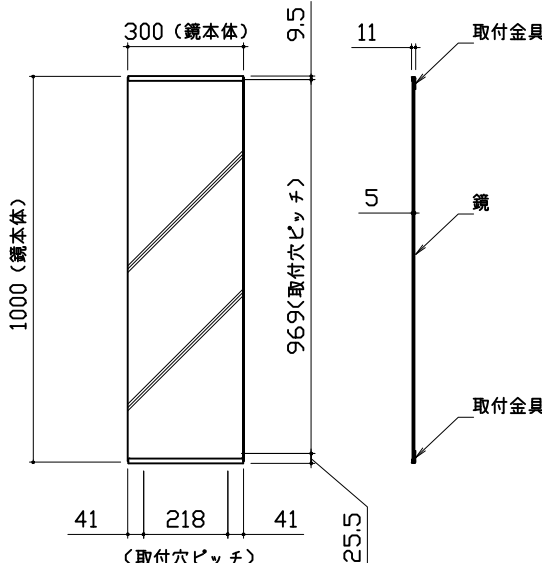浴槽		洗い場用水栓		照明	
				ダウンライト LED 4.1W (1灯あたり) 	
換気機器		シャワーフックスライダー		ミラー	
リモコンコード長さ：5m 外形：縦120mm×横116mm 管工事 				枠：SUS304 t0.8 ミラー：表面防曇コートあり（ロングクリアミラー-A） 表面防曇コートなし（ロングミラー-A） 	
Takara standard タカラストANDARD株式会社		現場名称： 横浜－海老名SR SB3様邸 現場番号： A6765202 海老名ショールーム		PREDENCIA プレデンスシア プラン番号： 2714J-2103-0054T 担当営業： SB3	
				部材詳細図	1/3 作成日： 2021年3月8日 担当アドバイザー： プレデンスシア

収納棚 本体：PMMA		タオル掛け 本体：PMMA ブラケット：ABS（クロムメッキ仕上げ）		ハンドバー支持部取合詳細図			
循環金具・フロアダプタ関連 追焚配管立上図		風呂蓋 707MDH-16YK 断面図		洗い場側排水トラップ			
Takara standard タカラストANDARD株式会社		現場名称： 横浜－海老名SR SB3様邸 現場番号： A6765202 海老名ショールーム		PREDENCIA プレデンスシア プラン番号： 2714J-2103-0054T 担当営業： SB3		部材詳細図 2 / 3 作成日： 2021年3月8日 担当アドバイザー： プレデンスシア	

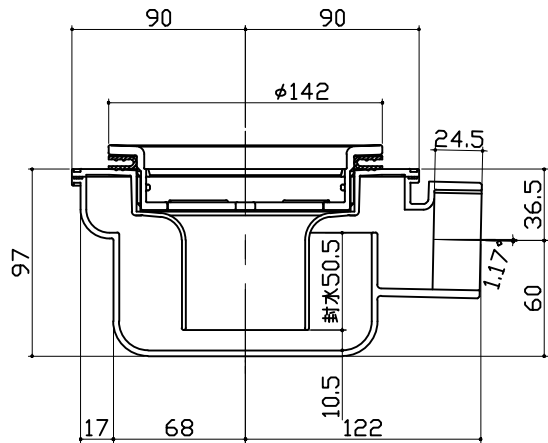浴槽側排水トラップ			
			
Takara standard タカスタンダード株式会社		現場名称： 横浜-海老名SR SB3様邸 現場番号： A6765202 海老名ショールーム	PREDENCIA プレデンスシア プラン番号： 2714J-2103-0054T 担当営業： SB3 部材詳細図 3/3 作成日： 2021年3月8日 担当アドバイザー： プレデンスシア

