

# システムバス 御見積書

御名前 静岡-富士SR SB1 様

業者 様

商品名 PREDECIA プレデンスシア

商品  
御見積金額 **¥1,175,200 (税込 ¥1,292,720)**

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

**(参考) 別途 商品組付費 ¥202,000 (税込 ¥222,200)**

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。  
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

## 御見積仕様

(システムバス)

ユニットサイズ 1620 (AR勝手)

洗い場仕様 キープクリーンフロア:プレミアムクラス

洗い場カラー グラングレー

浴槽材質 鋳物ホーロー

浴槽カラー プレシャスホワイト

浴槽形状 ラウンド浴槽

浴槽・風呂フタ 高断熱仕様

カウンター材質 アクリル人造大理石

カウンターカラー ラスターブラック

エプロン材質/カラー ステンレス / ブラック

浴室パネル材質 高品位ホーロー

パネルカラー(正面) ノルディックベージュ

パネルカラー(周辺) ホワイト

ガス種 / 周波数 LPG / 未定

## 御確認事項

作成日 2021年5月24日  
プラン番号 2310B-2011-0292T  
現場番号 A7835663

タカスタンダード株式会社  
富士ショールーム  
静岡県富士市入山瀬526-1

TEL 0545-72-2435 / FAX 0545-72-2438  
沼津営業所  
TEL 055-924-3670 / FAX 055-924-3671

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
渡辺	小林	小林

## 備考

No.\*

御名前 静岡-富士SR SB1

様

現場番号	A7835663	プラン番号	2310B-2011-0292T	作成日	2021/5/24
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1620サイズ		1	1,117,000	1,117,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)/樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
6	洗い場	キーブクリーンフロア(プレミアムクラス・グラングレー)	1	+20,000	+20,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(プレシャスホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
11	浴槽形状	ラウンド浴槽	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	浴槽ハンドグリップ	なし	1	-10,000	-10,000
14	ガス温水式床暖房	なし	1		
15	洗い場用水栓	棚付サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)KF9152H 水栓上部カウンター(チャコールグレー)	1		
16	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:KF9152HL/R	1		
17	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
18	カウンター	人大スクエアカウンター	1		
19	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	1	+5,200	+5,200
20	浴室パネル	プレミアムクラス(一面デザイン)(Kパネル)	1	+15,000	+15,000
21	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
22	天井	高光沢フラット天井	1		
23	換気機器	天井換気扇	1		
24	換気機器開口	工場開口	1		
25	照明	天井付スクエア照明+ダウンライト(1灯)(白色)	1		
26	天井照明開口	工場開口	1		
27	ミラー	ロングクリアミラー	1		
28	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
29	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-4,000	-4,000
30	ハンドバー	ステン I型600タイプ	1	+8,000	+8,000
31	収納棚	クリアタイプ ブラック(3段)	1		

御名前 静岡-富士SR SB1

様

現場番号	A7835663	プラン番号	2310B-2011-0292T	作成日	2021/5/24
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	どこでもラック	小物置きS + フック + タオルハンガー (チャコールグレー)	1	+4,400	+4,400
33	どこでもラック	風呂フタフック(チャコールグレー)	1	+2,100	+2,100
34	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500
35	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
36	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			36		¥1,175,200
商品総合計			36		¥1,175,200

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

**(参考) 別途 商品組付費**


システムバス商品組付費

¥202,000 ( 税込 ¥222,200 )


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格 &lt; 税率10% &gt; を表示しています。

パース

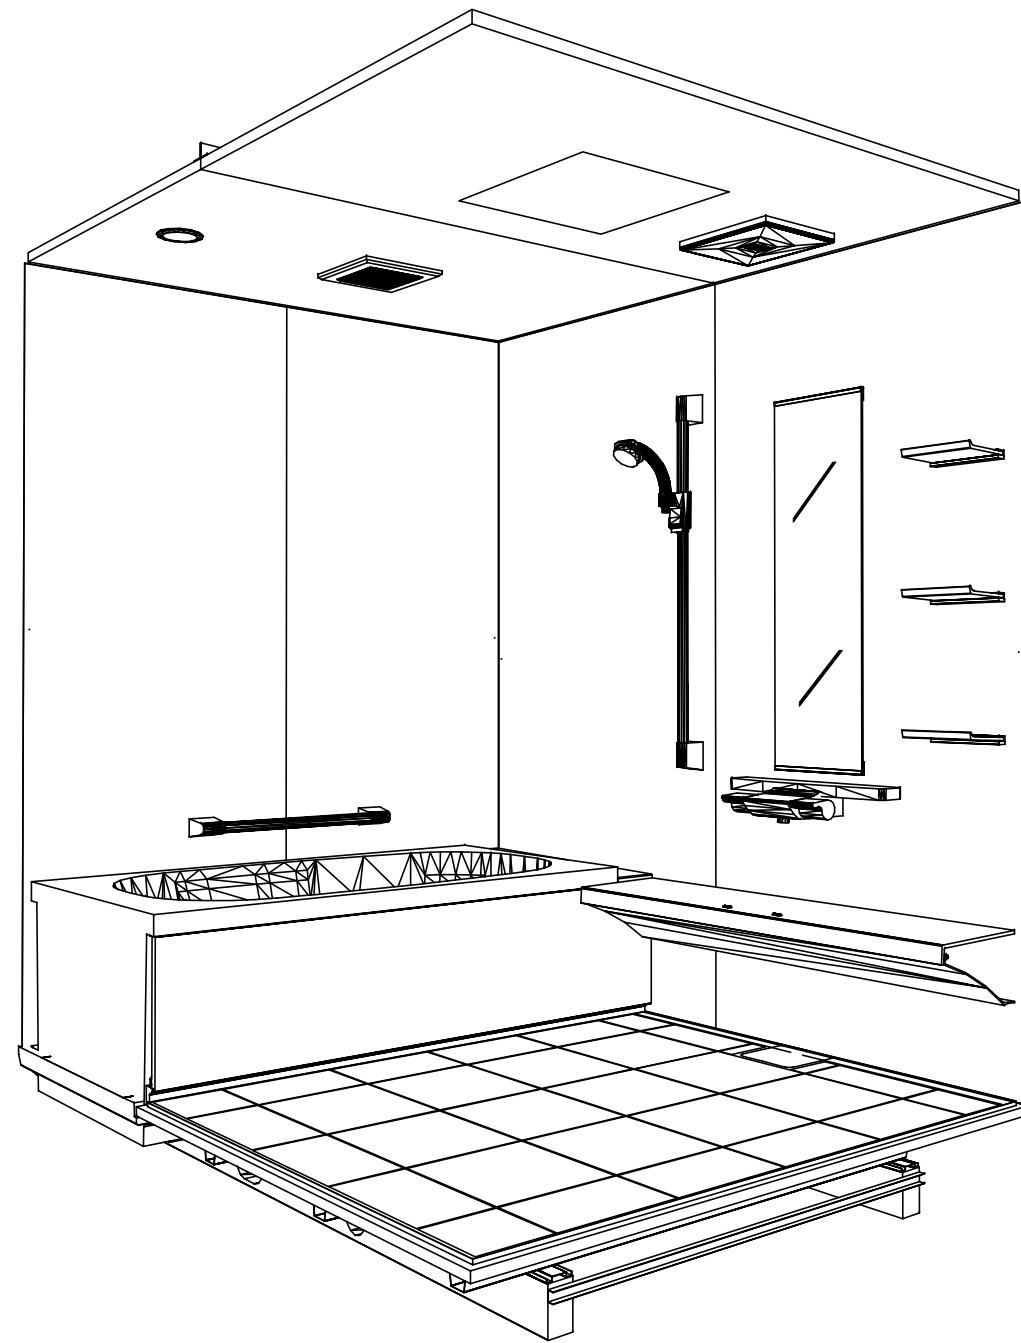


鳥瞰図

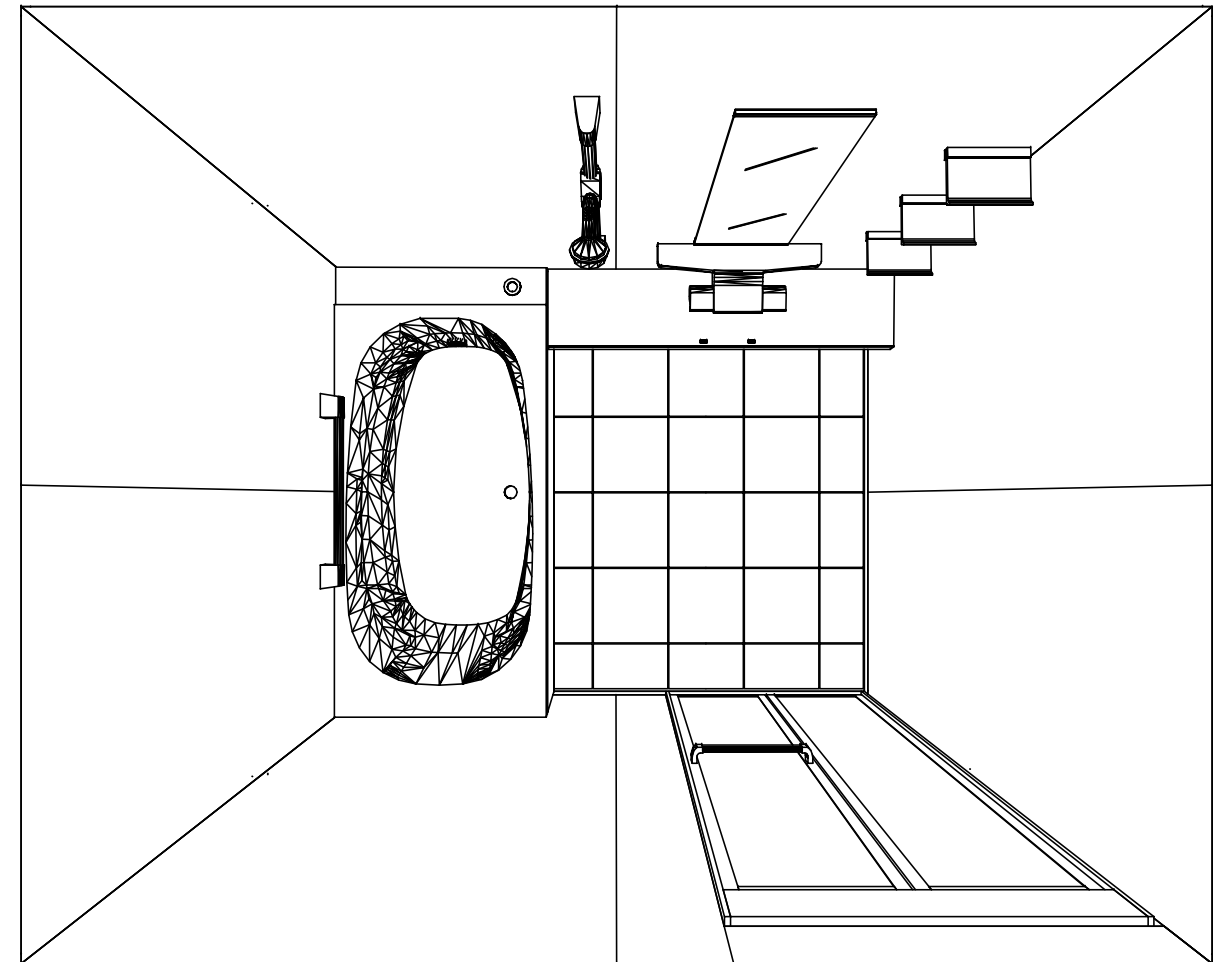


1620  
 鋳物ホーロー浴槽  
 高光沢フラット天井  
 天井換気扇



このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

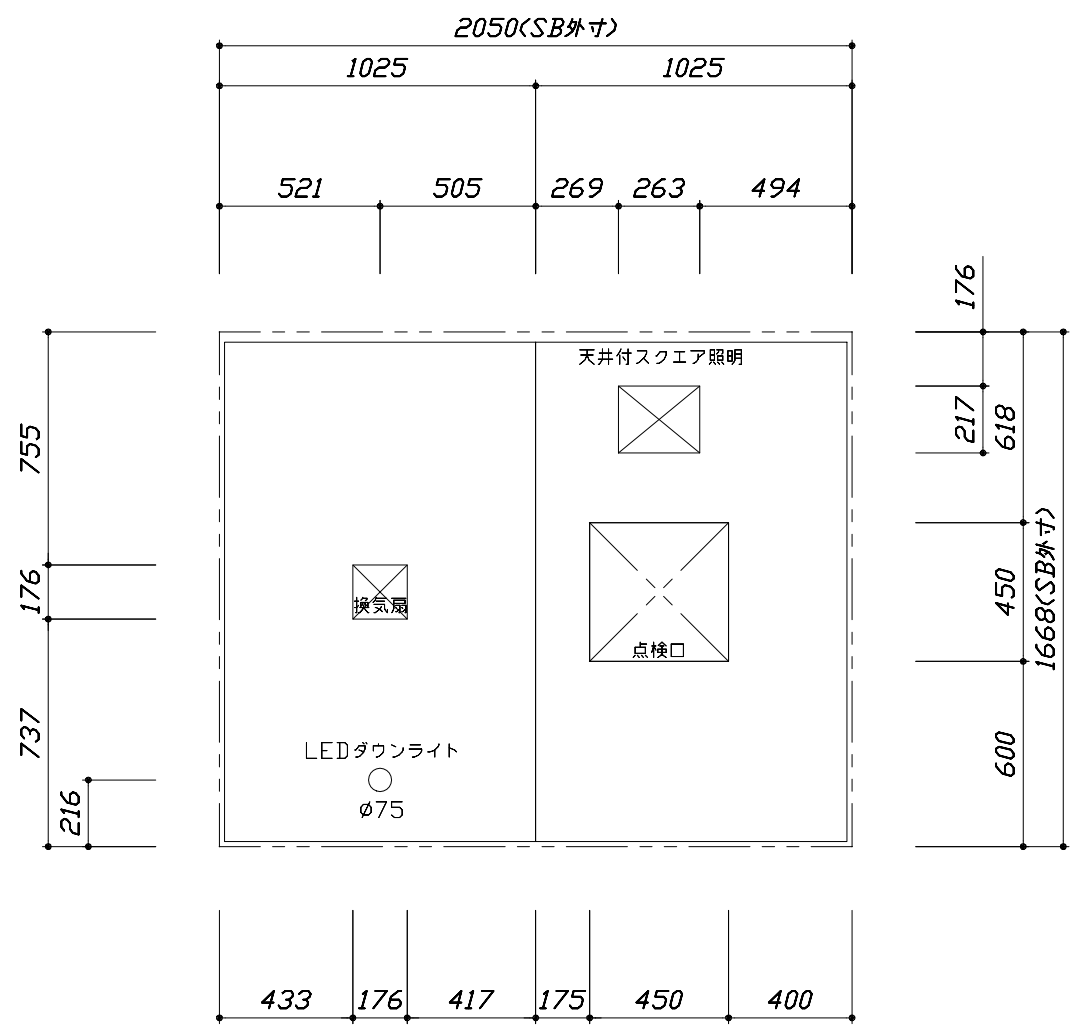

< 天井伏図 >

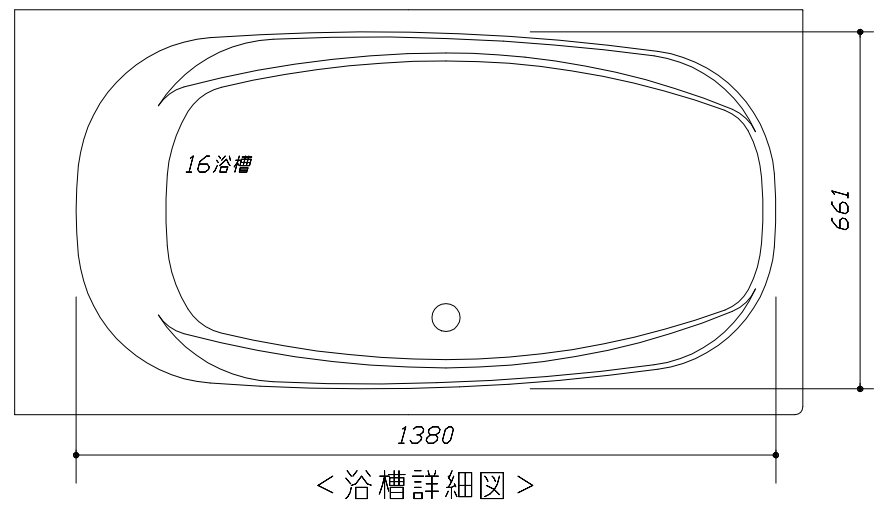



< 浴槽詳細図 >

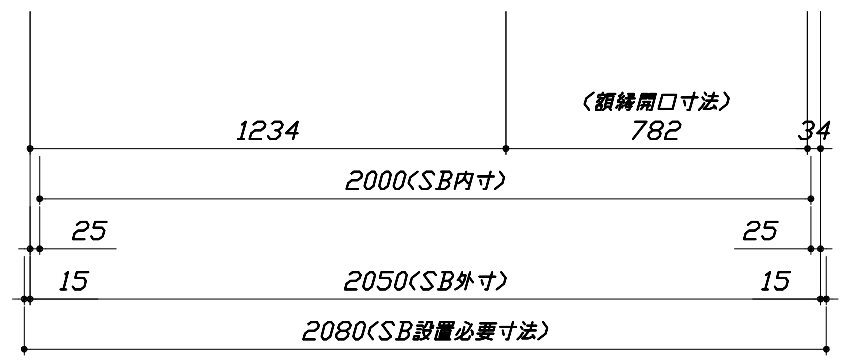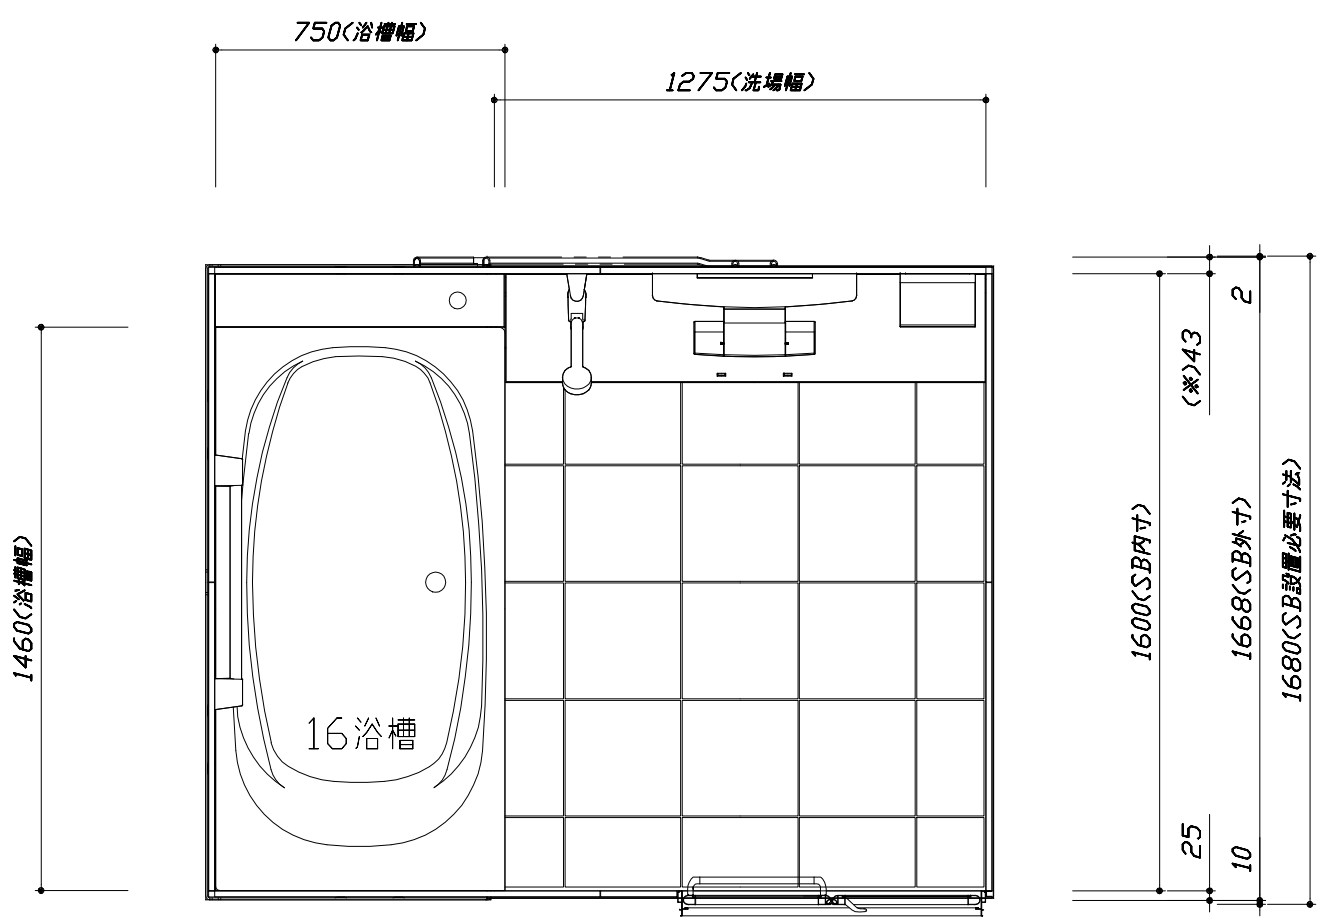


< 平面図 >

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

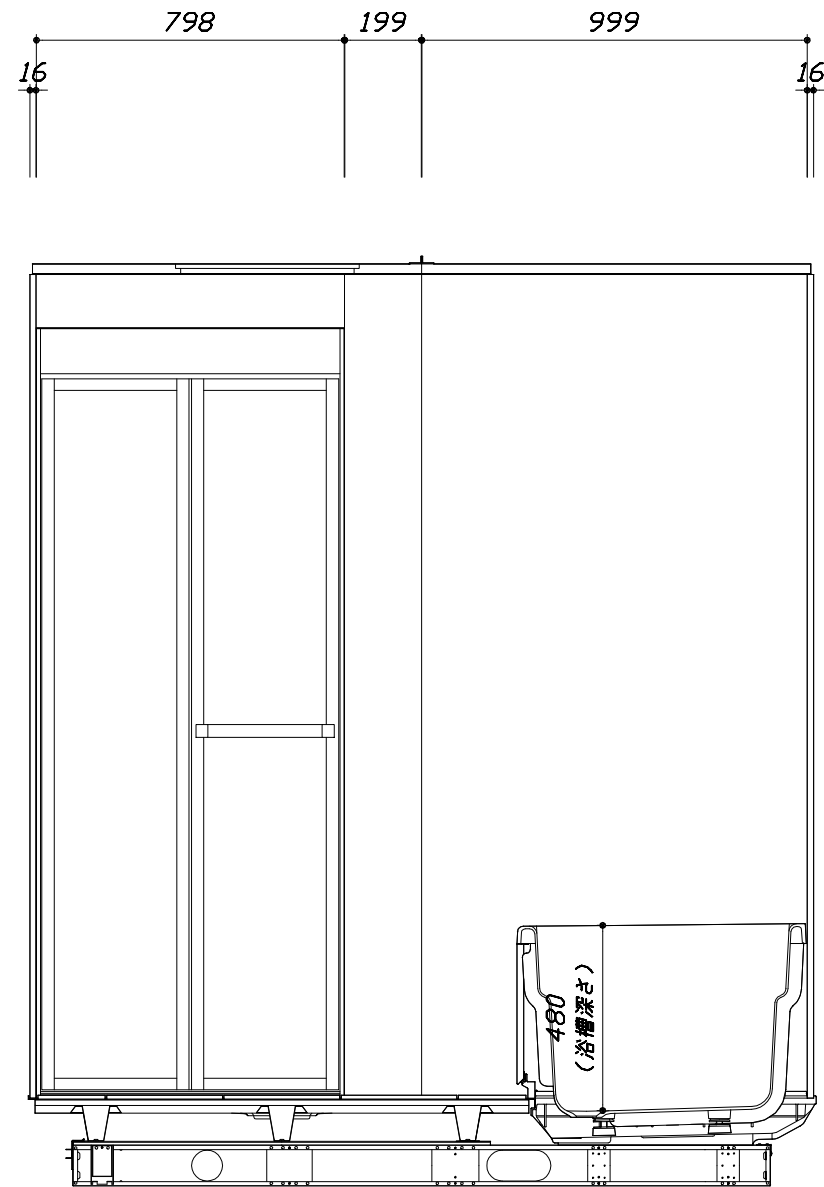

<カウンター対面図>

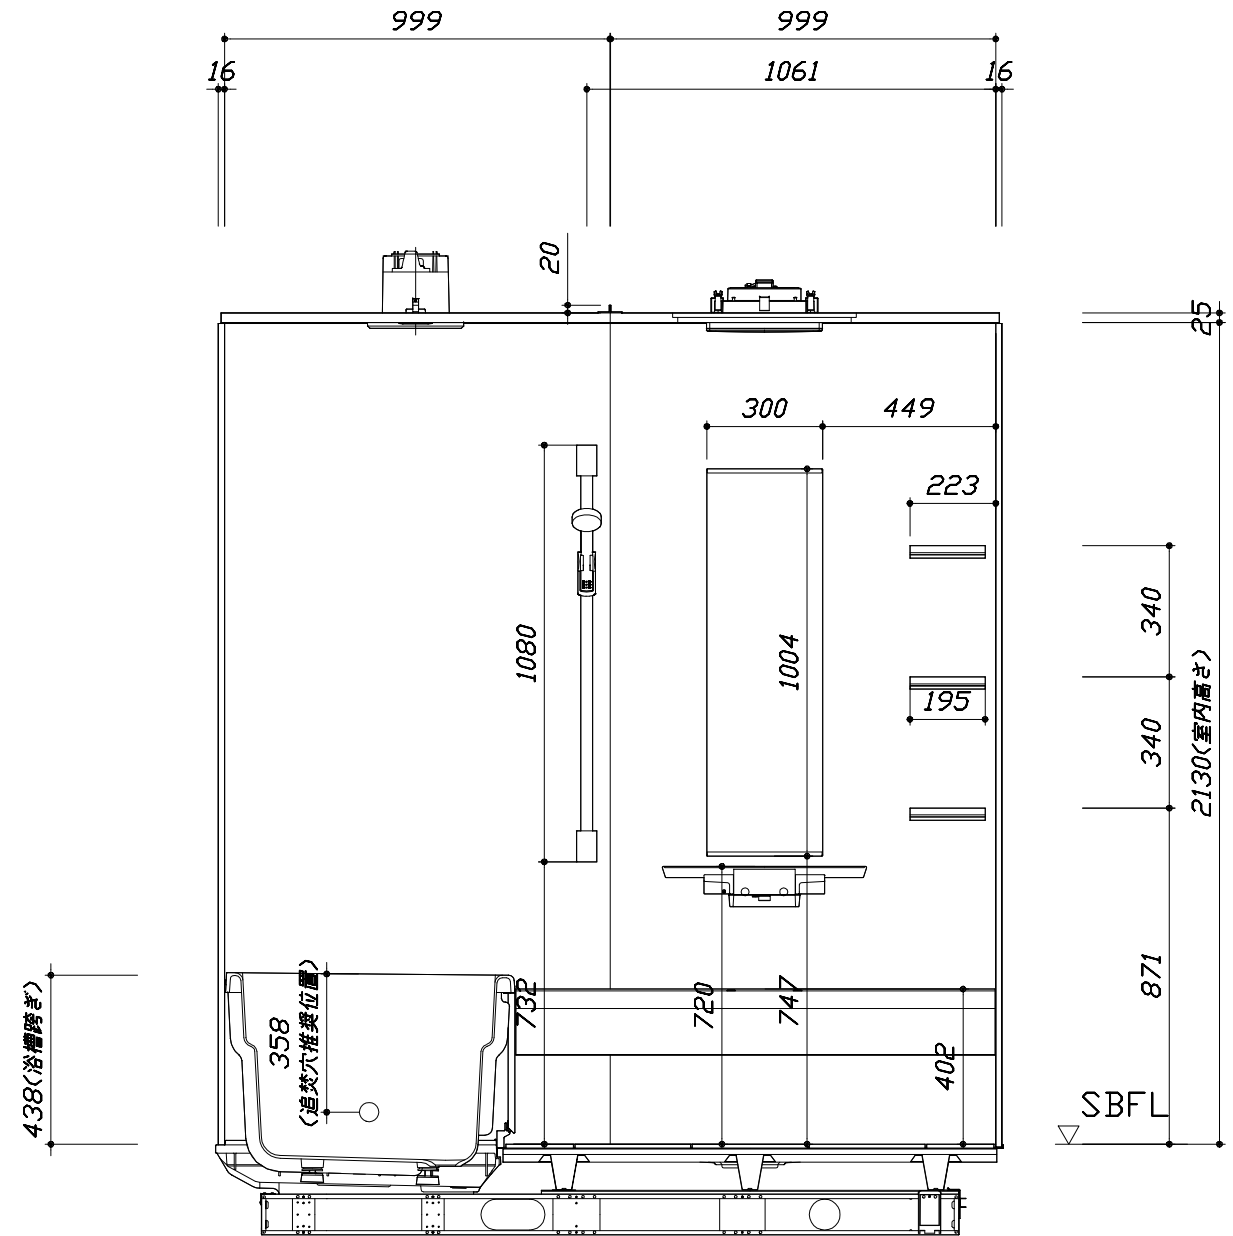


<カウンター面図>

■土間コン仕上げ寸法  
 ドアアングル下端より  
 265mm下がり  
 (クリア寸法含む)



# 基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。  
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。  
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。  
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

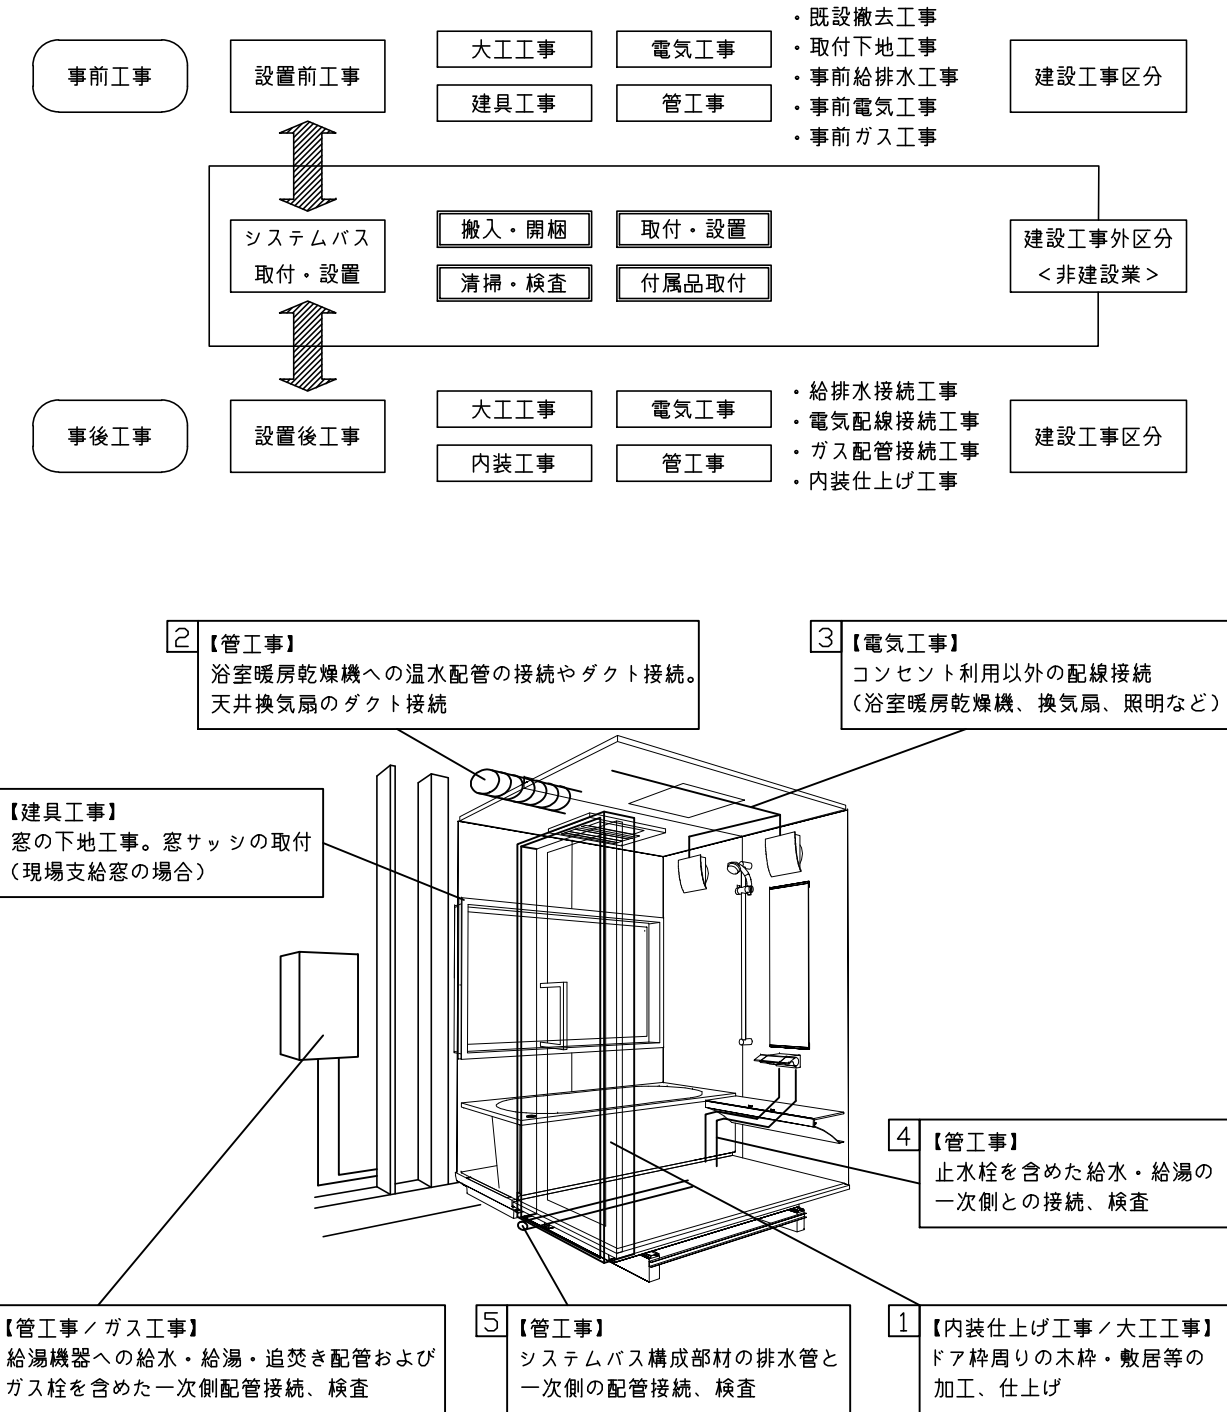

## ■システムバス 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』


工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置	
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
電気	給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事		
			浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□		浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置						□		洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置						□		浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置						□		天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置【注記 1】						□		カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付【注記 1】						□		水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付【注記 1】						□		浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
試運転・完成検査【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査			
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ		○					建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
	4 5 6	管	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事	
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事					○		給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
	1 3	電気 他	建築側排水配管との接続工事【注記 3】					○		浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
			給湯機器本体工事（試運転・確認）					○	□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
			内装仕上げ工事		○	○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
			浴室用電源配線、接続工事				○		浴室機器の事後電気工事		
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事				○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする  
 ※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する  
 ※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする




■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

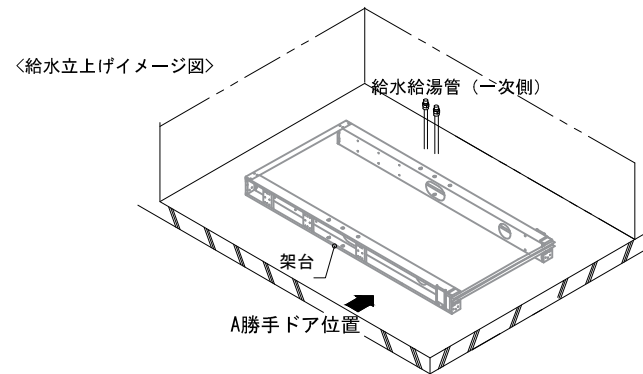


■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

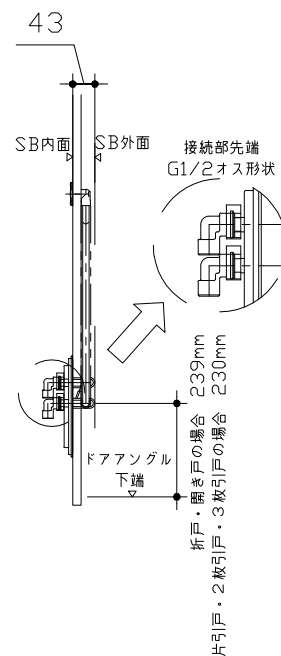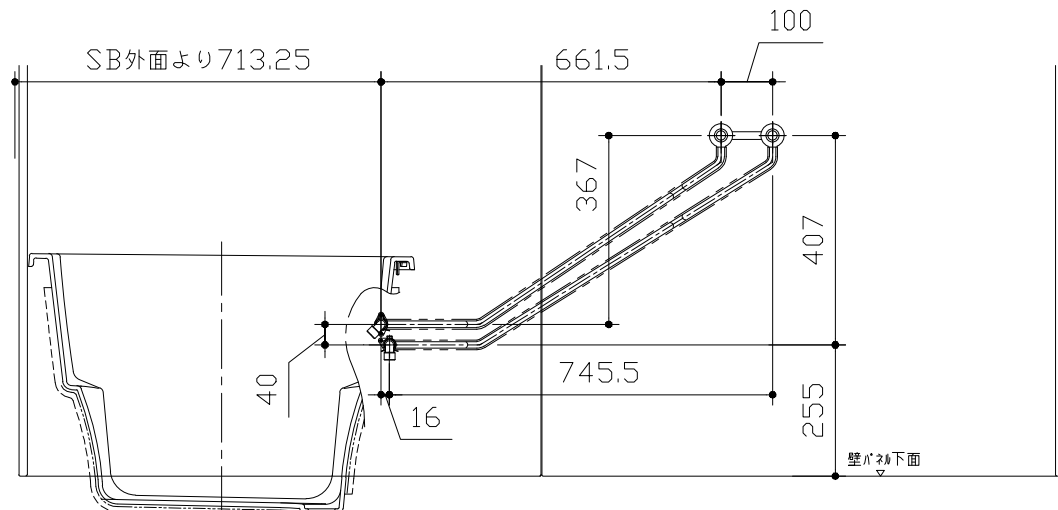

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置

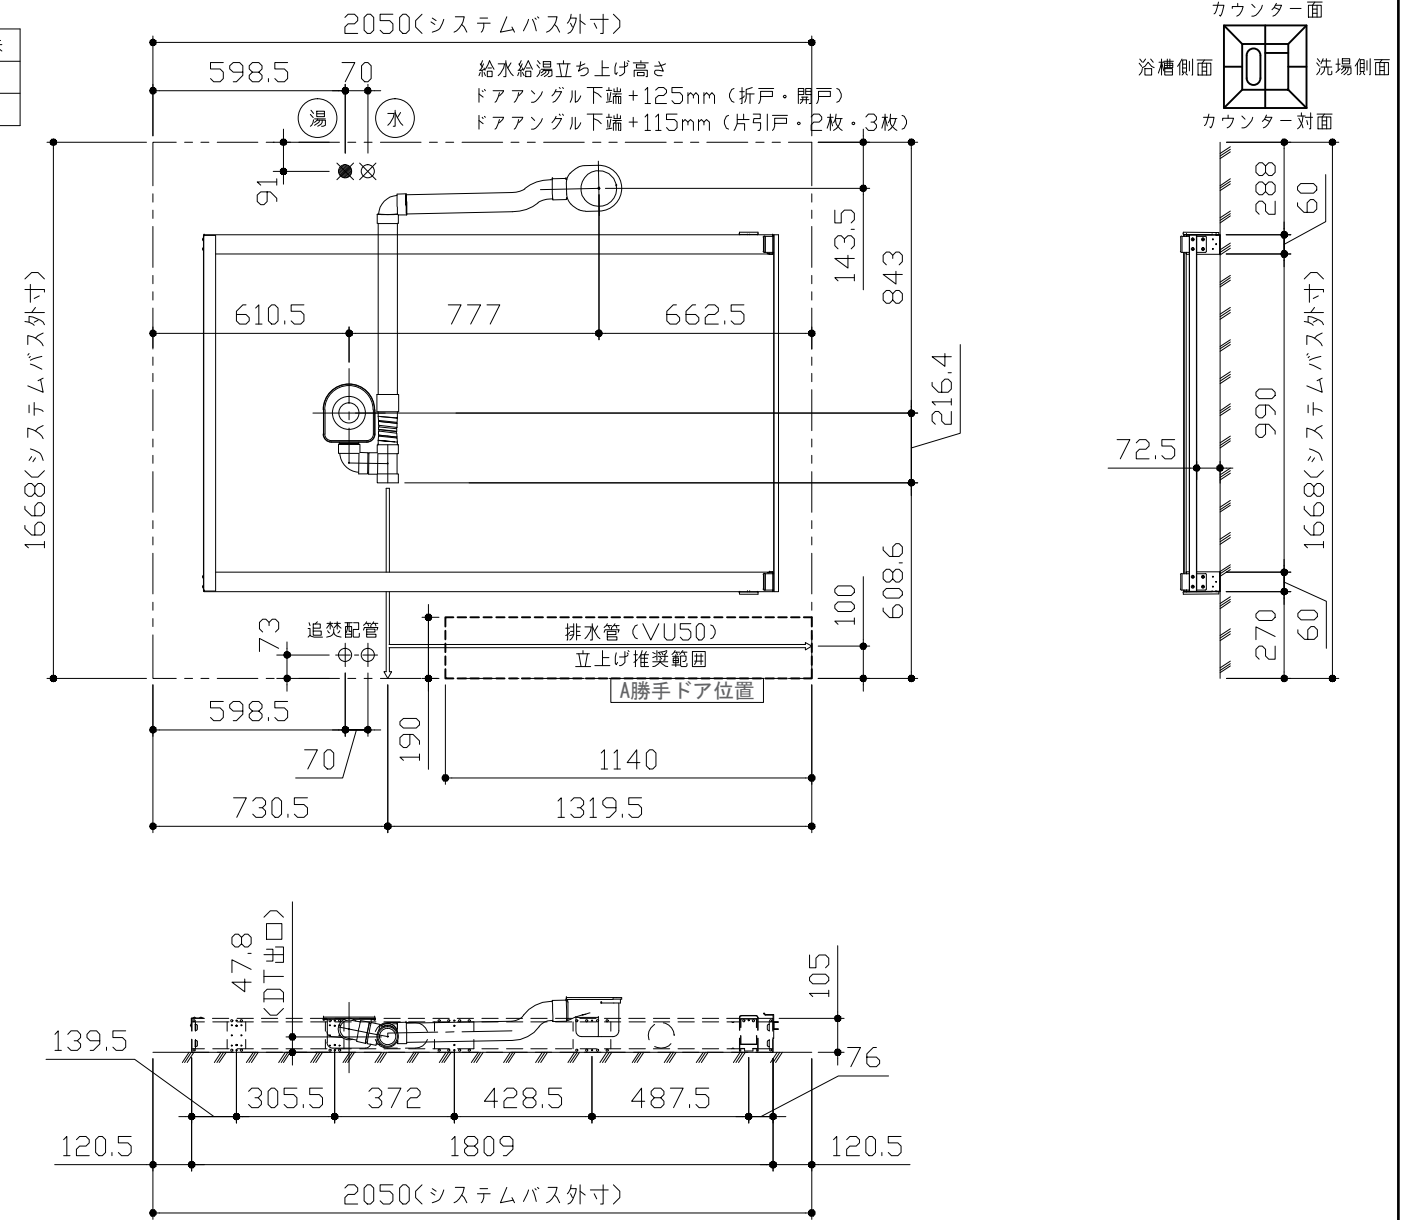

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。  
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

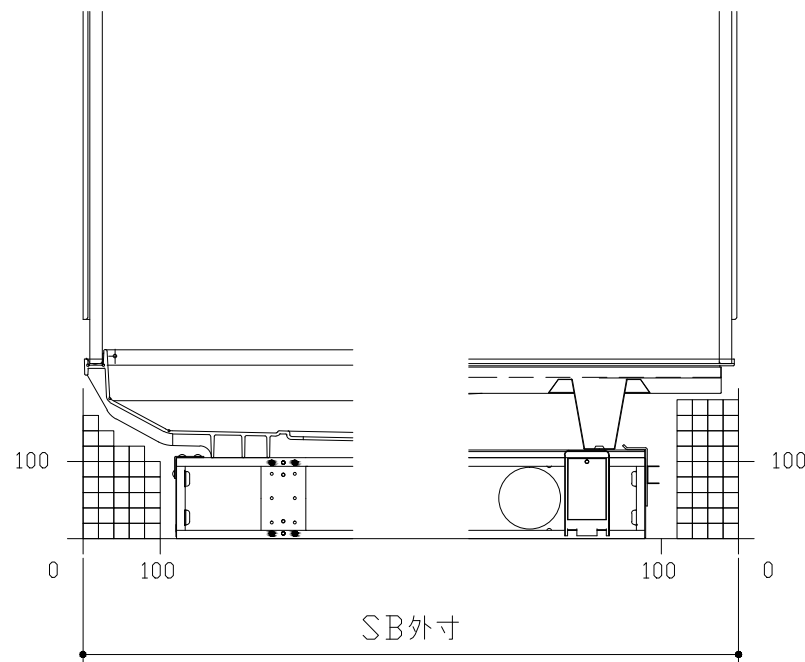


A矢視

B矢視

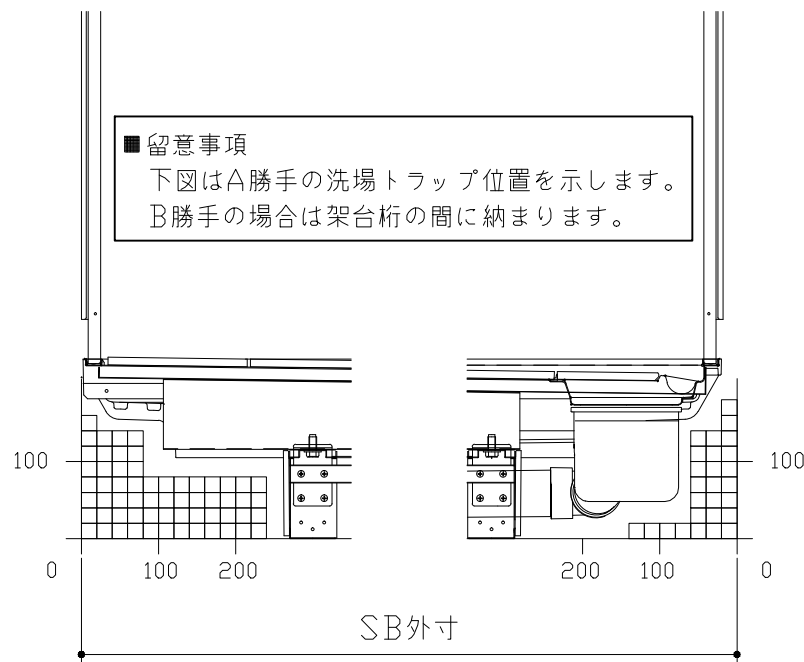

C矢視



D矢視

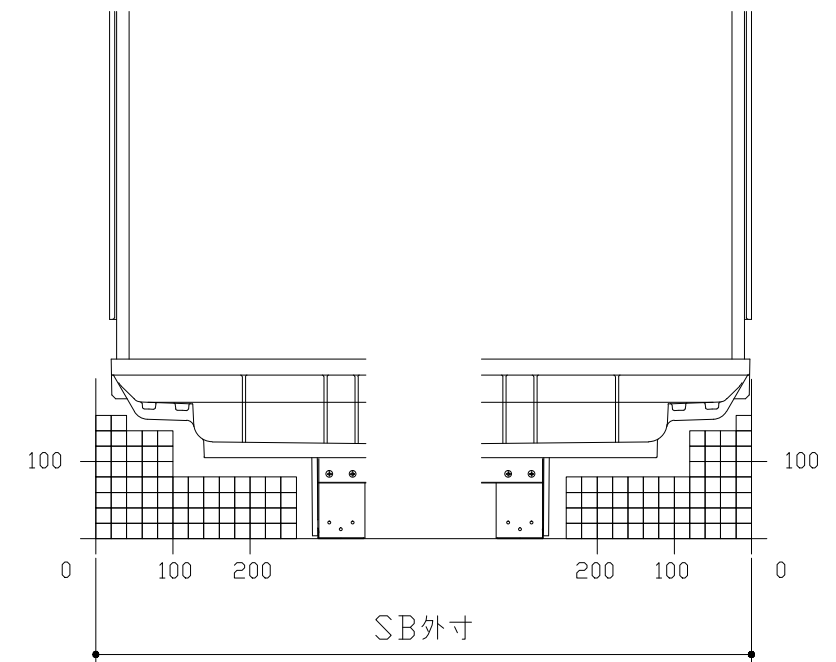

E矢視


F矢視



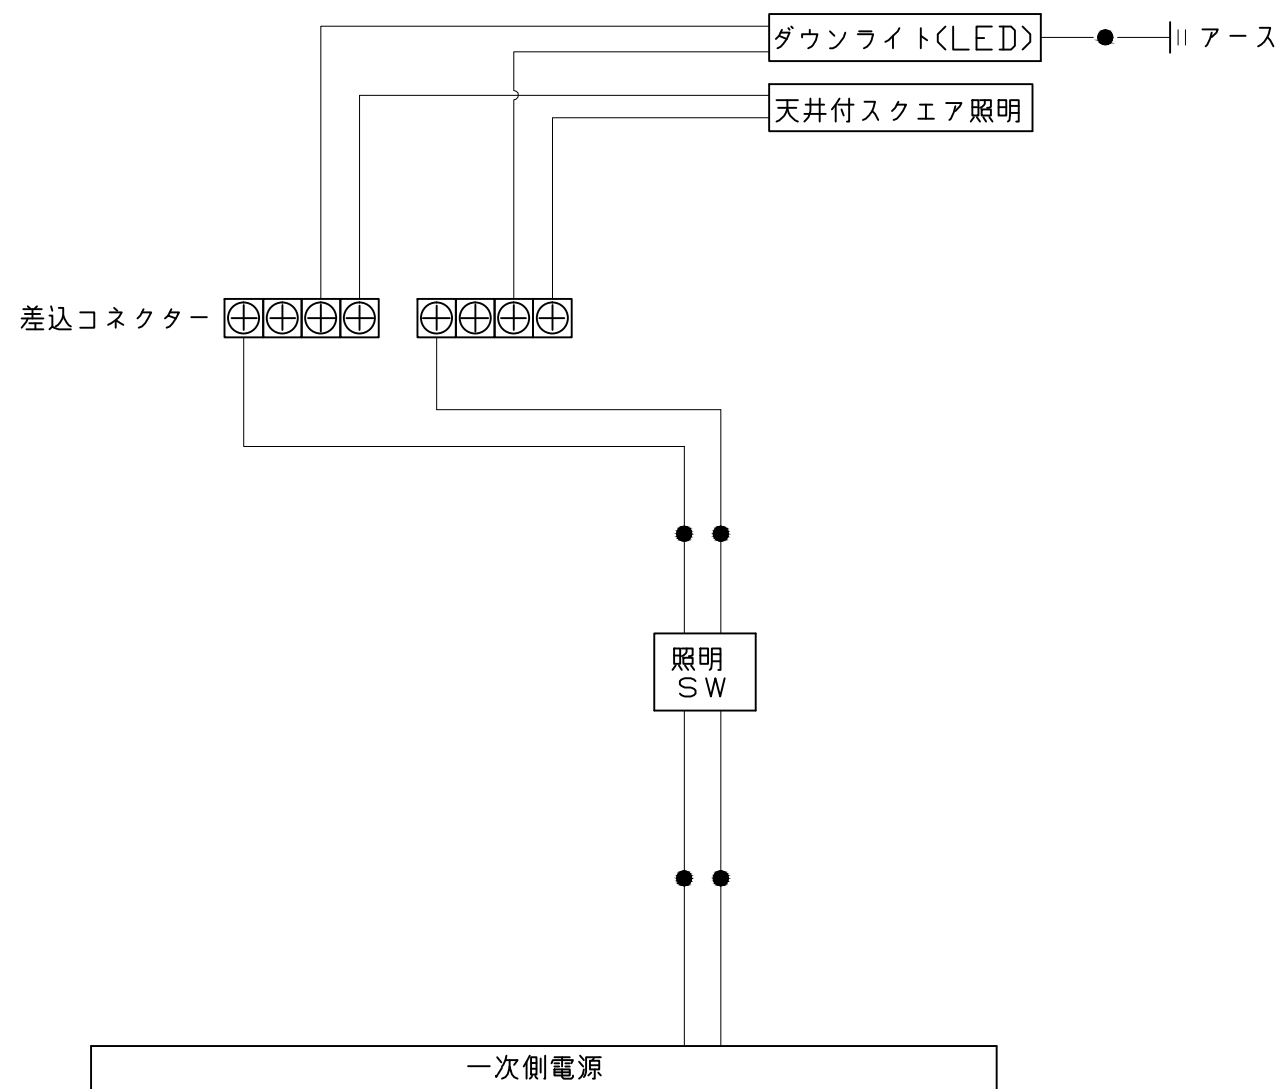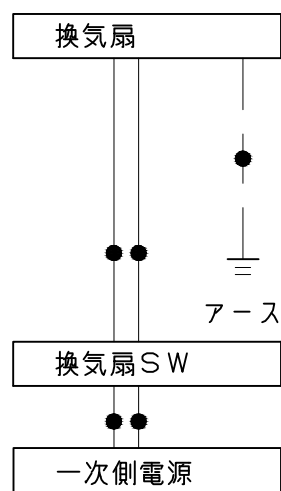


一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。

浴槽

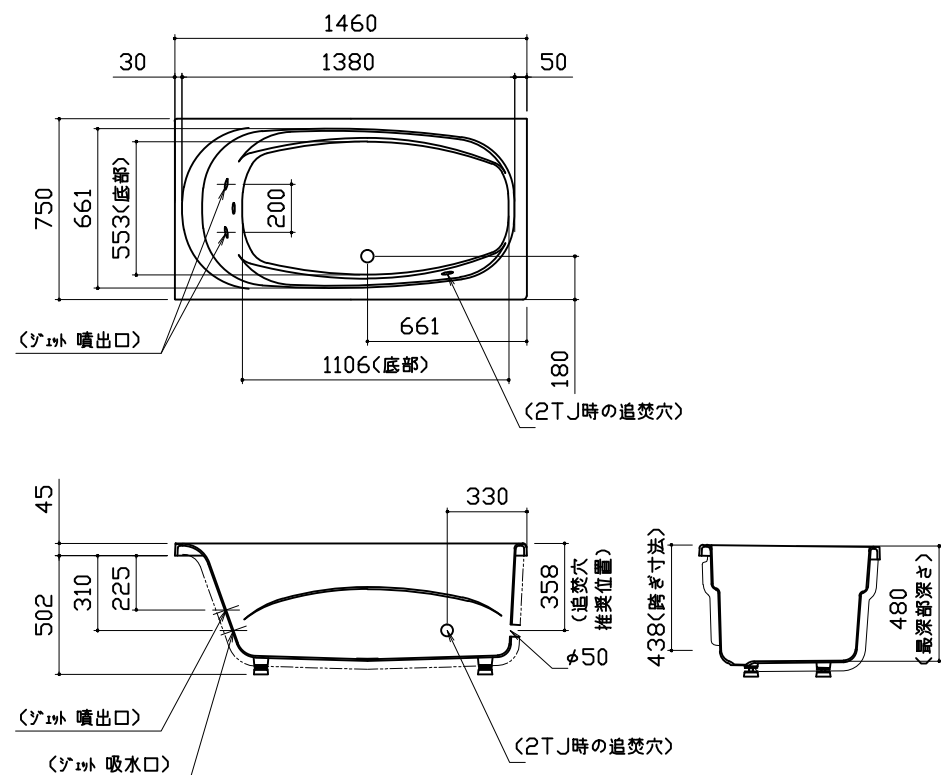


洗い場用水栓

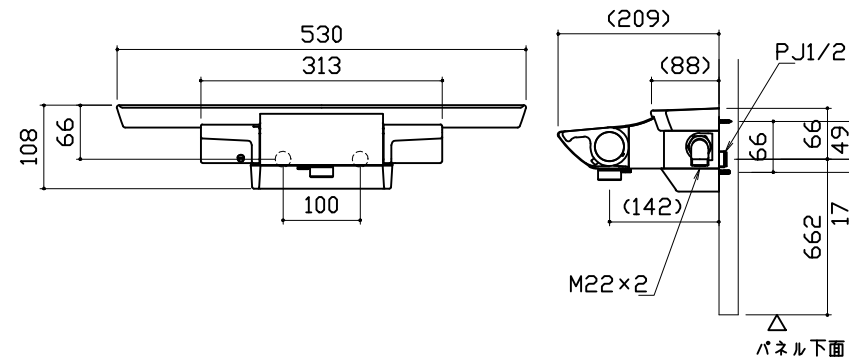


照明

天井付スクエア照明  
LED 11W (1灯あたり)

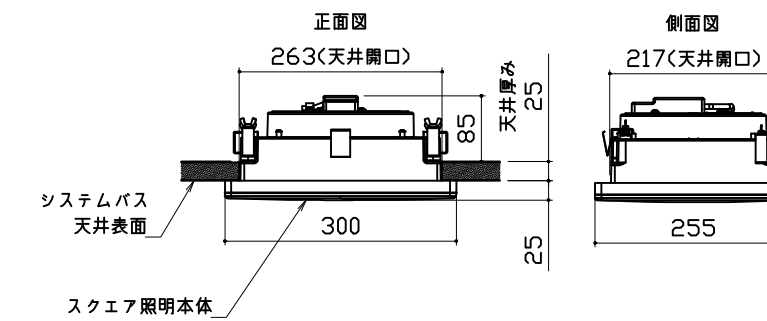


ダウンライト  
LED 4.1W (1灯あたり)

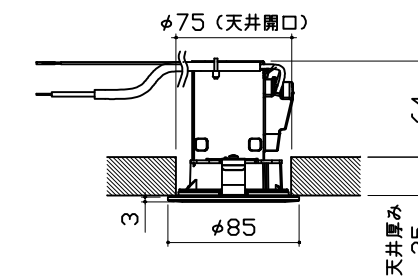


換気機器

管工事

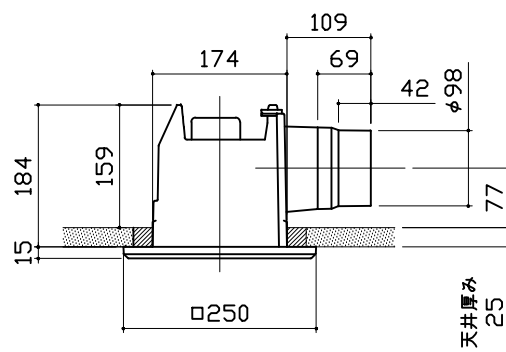


シャワーフックスライドバー

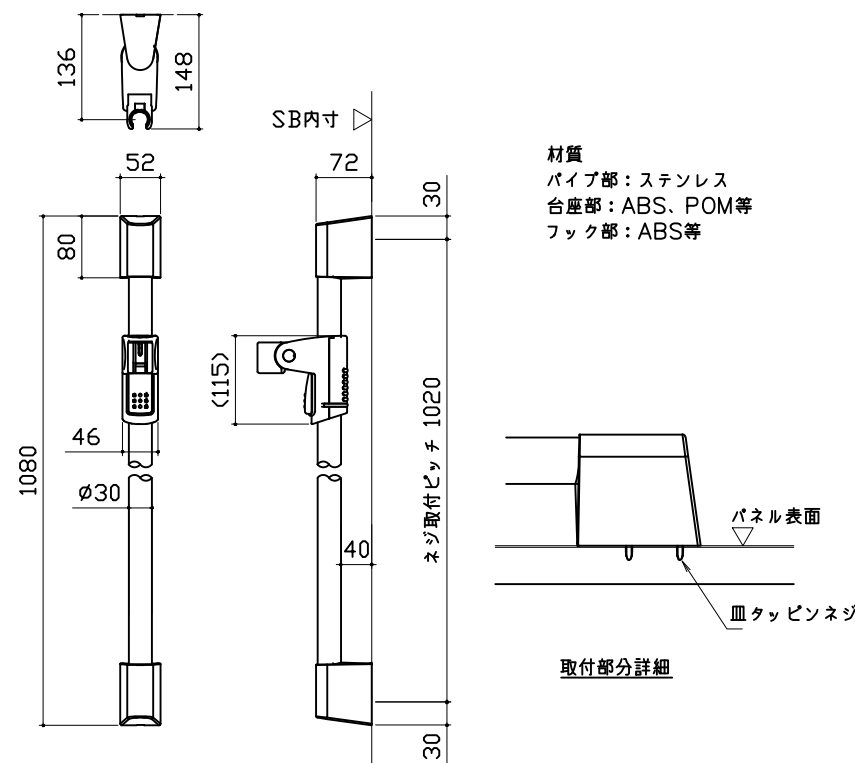


ミラー

枠: SUS304 t0.8  
ミラー: 表面防曇コートあり (ロングクリアミラー-A)  
表面防曇コートなし (ロングミラー-A)

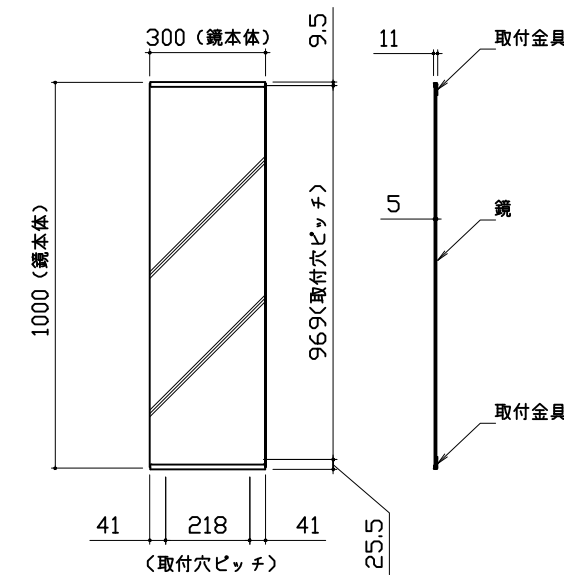


収納棚


本体：PMMA

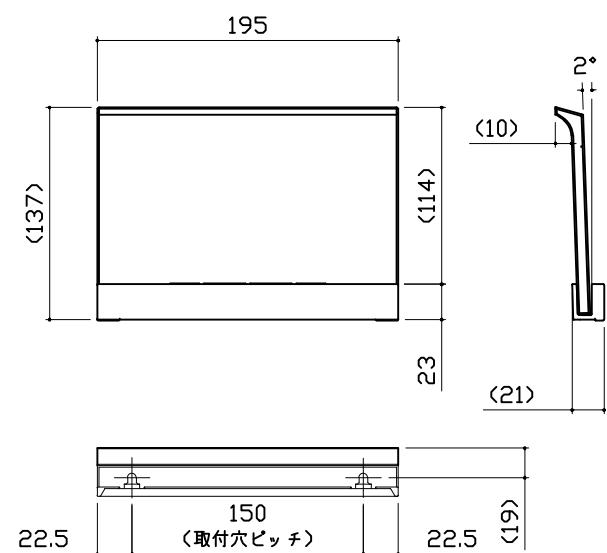


ハンドバー支持部取合詳細図

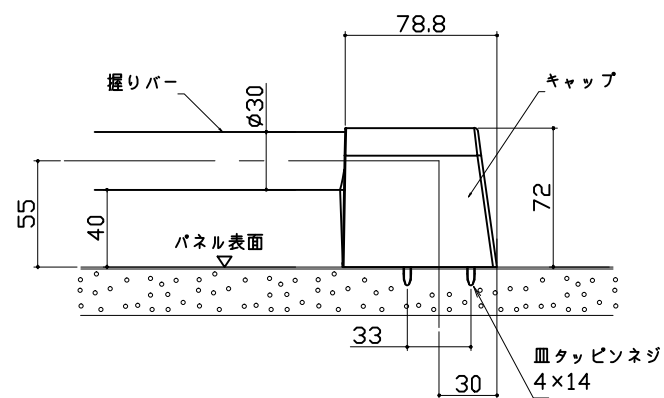


循環金具・フロアダプタ関連

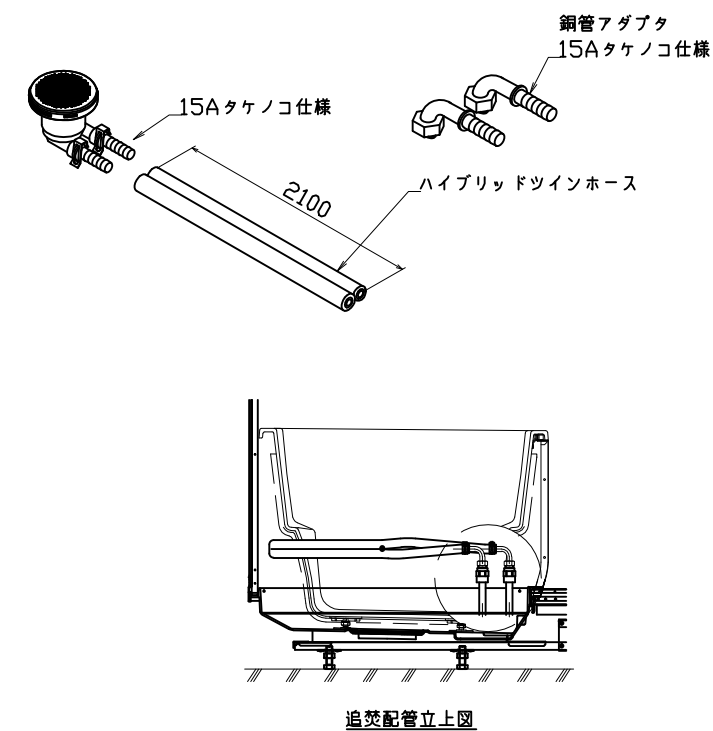


風呂蓋 707MDH-16YK



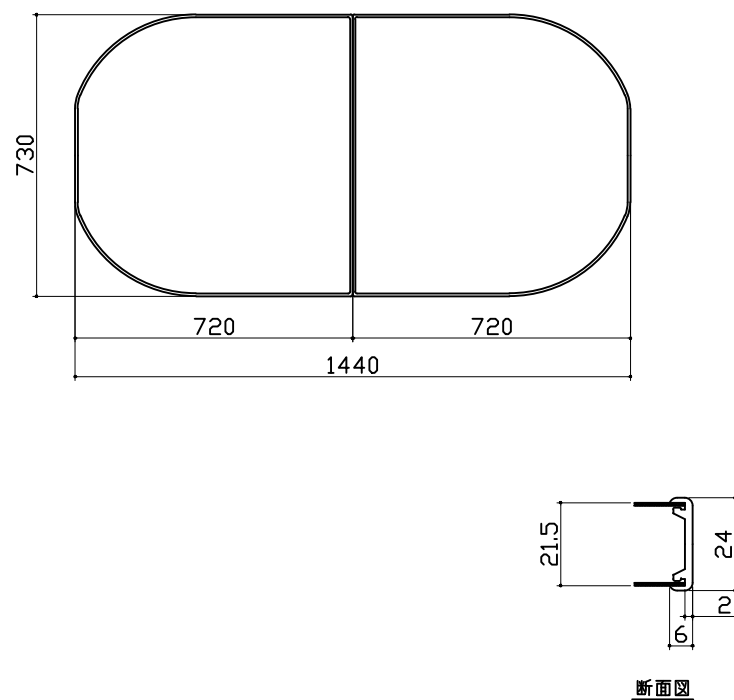


洗い場側排水トラップ

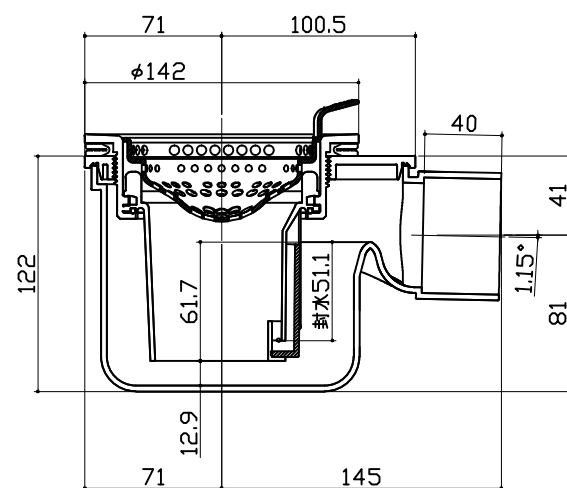

浴槽側排水トラップ

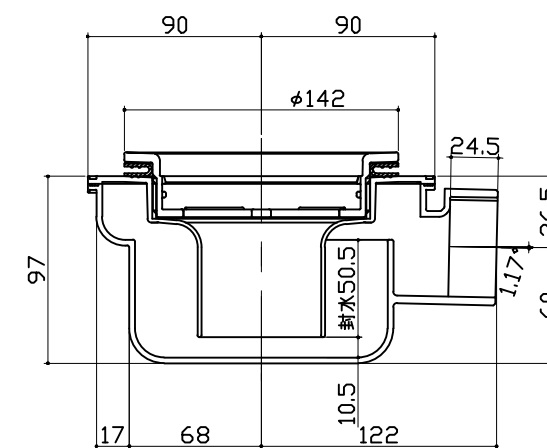

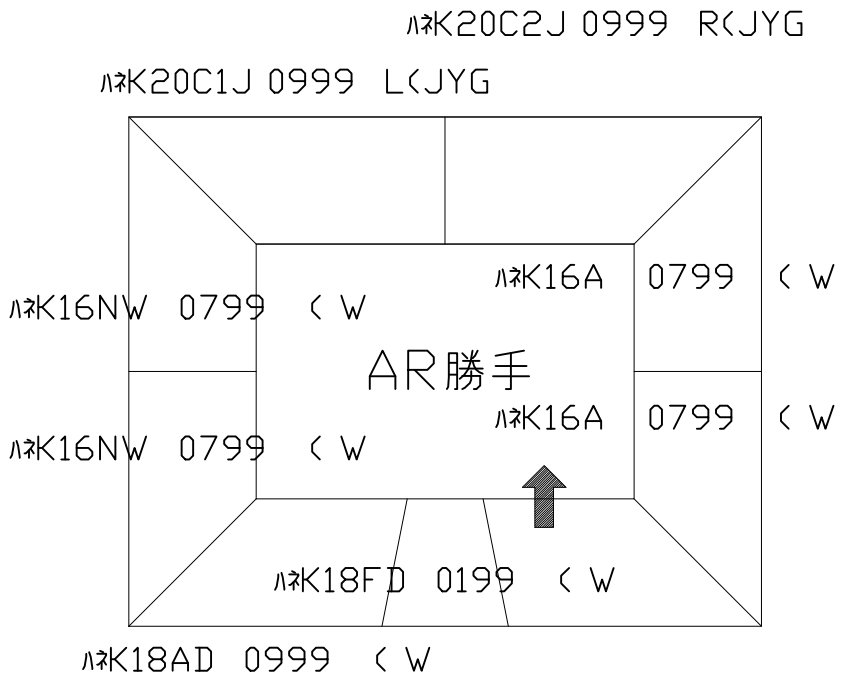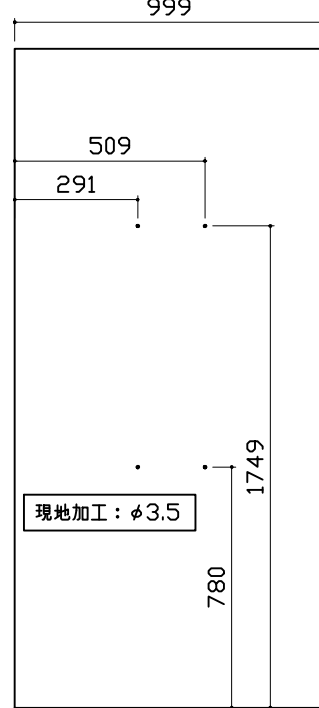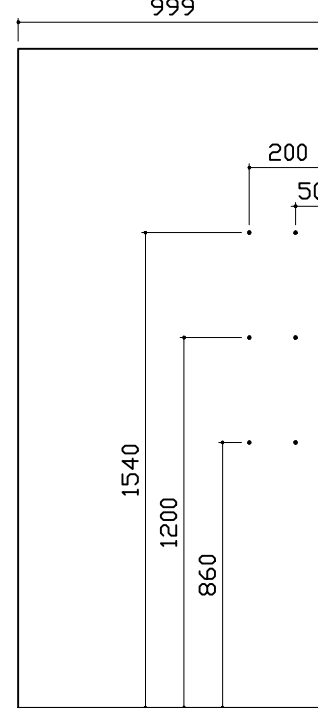パネル割図	ミラー	収納棚
<p>パネル割図</p> <p>ハネK20C2J 0999 R&lt;JYG</p> <p>ハネK20C1J 0999 L&lt;JYG</p> <p>ハネK16NW 0799 &lt; W</p> <p>ハネK16A 0799 &lt; W</p> <p>AR勝手</p> <p>ハネK16A 0799 &lt; W</p> <p>ハネK16NW 0799 &lt; W</p> <p>ハネK18FD 0199 &lt; W</p> <p>ハネK18AD 0999 &lt; W</p> 	<p>ミラー</p> <p>ハネK20C2J 0999 R&lt;JYG</p> <p>999</p> <p>509</p> <p>291</p> <p>1749</p> <p>780</p> <p>現地加工：φ3.5</p> 	<p>収納棚</p> <p>ハネK20C2J 0999 R&lt;JYG</p> <p>999</p> <p>200</p> <p>50</p> <p>1540</p> <p>1200</p> <p>860</p> <p>現地加工：φ3.5</p> 
シャワーフックスライドバー		
<p>シャワーフックスライドバー</p> <p>ハネK20C1J 0999 L&lt;JYG</p> <p>999</p> <p>33</p> <p>33</p> <p>43</p> <p>1774</p> <p>33</p> <p>754</p> <p>現地加工：φ3.5</p> 
