

システムバス 御見積書

御名前 横浜-藤沢SR SB4 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランspa

商品
御見積金額 ¥690,900 (税込 ¥759,990)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ¥132,500 (税込 ¥145,750)

《参考》別途 現場配送費 ¥8,000 (税込 ¥8,800)

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ 1616 (AR勝手)
洗い場仕様 キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー カームダークグレー
浴槽材質 FRP
浴槽カラー ホワイト
浴槽形状 ラウンド浴槽
カウンター材質 樹脂
カウンター/下カバーカラー チャコールグレー / -
浴槽前カウンターカラー -
エプロン材質/カラー 樹脂 / ホワイト
浴室パネル材質 高品位ホーロー
パネルカラー(正面) グレージュアッシュ
パネルカラー(周辺) グレージュアッシュ
ガス種 / 周波数 未定 / 50Hz

◆ 御確認事項

作成日 2025年8月21日
プラン番号 2710B-2508-0146T
現場番号 C3057599

タカラスタANDARD株式会社
◆藤沢営業所
神奈川県藤沢市石川1丁目1番地の17
TEL 0466-86-1800 / FAX 0466-86-1832

◆藤沢ショールーム
TEL 0466-86-1800 / FAX 0466-86-2195

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

御名前 横浜-藤沢SR SB4

様

現場番号	C3057599	プラン番号	2710B-2508-0146T	作成日	2025/8/21
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	769,000	769,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・周辺ハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームダークグレー)	1		
7	排水口カバー	ステンレス	1		
8	浴槽	FRP(高断熱浴槽)(ホワイト)	1	-85,000	-85,000
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	FRP浴槽用保温材なし(ホワイト)	1		
11	浴槽形状	FRPラウンド浴槽	1		
12	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
13	浴槽パン	なし	1		
14	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂ホース(メタル調)SB1811H 水栓上部カウンター(チャコールグレー)	1	+1,300	+1,300
15	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:SB1811H	1		
16	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
17	カウンター	ワイドカウンター	1	-46,000	-46,000
18	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>マットブラック(T1020S CK)	1	+9,000	+9,000
19	浴室パネル	ハイクラス(全面デザイン 周辺ハイクラス)(Kパネル)	1	+40,000	+40,000
20	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
21	天井	カラーフラット天井(ベージュ)	1		
22	換気機器	天井換気扇ホワイト	1		
23	換気機器開口	工場開口	1		
24	照明	ダウンライト照明(3灯)(白色)	1	-3,000	-3,000
25	天井照明開口	工場開口	1		
26	ミラー	ミラーなし	1	-18,000	-18,000
27	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
28	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
29	ハンドバー	マットブラック(アルミ製) I型600タイプ	1	+9,000	+9,000
30	収納棚	収納棚なし	1		
31	どこでもラック	風呂フタフック(チャコールグレー)	1	+2,100	+2,100

御名前 横浜-藤沢SR SB4 様

現場番号	C3057599	プラン番号	2710B-2508-0146T	作成日	2025/8/21
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	循環金具セット	ELX	1	+11,500	+11,500
33	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
34	トラップカバー	なし	1		
35	ブロック積用ボンド	2段用	1	+2,000	+2,000
システムバス合計			35		¥690,900

商品総合計	35	¥690,900
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費

¥132,500 (税込 ¥145,750)


《参考》別途 現場配送費

¥8,000 (税込 ¥8,800)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

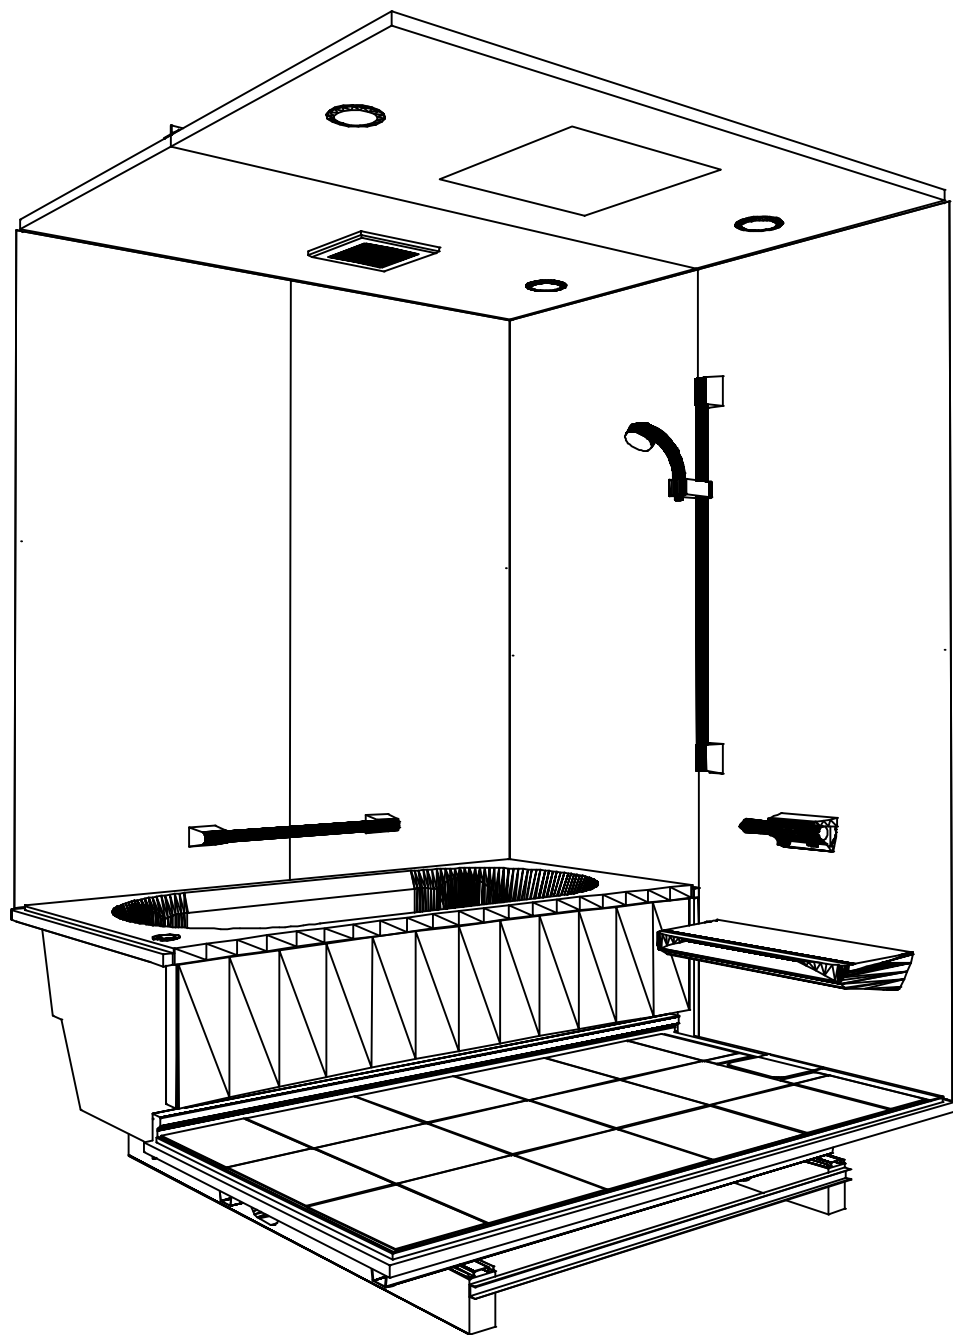

鳥瞰図

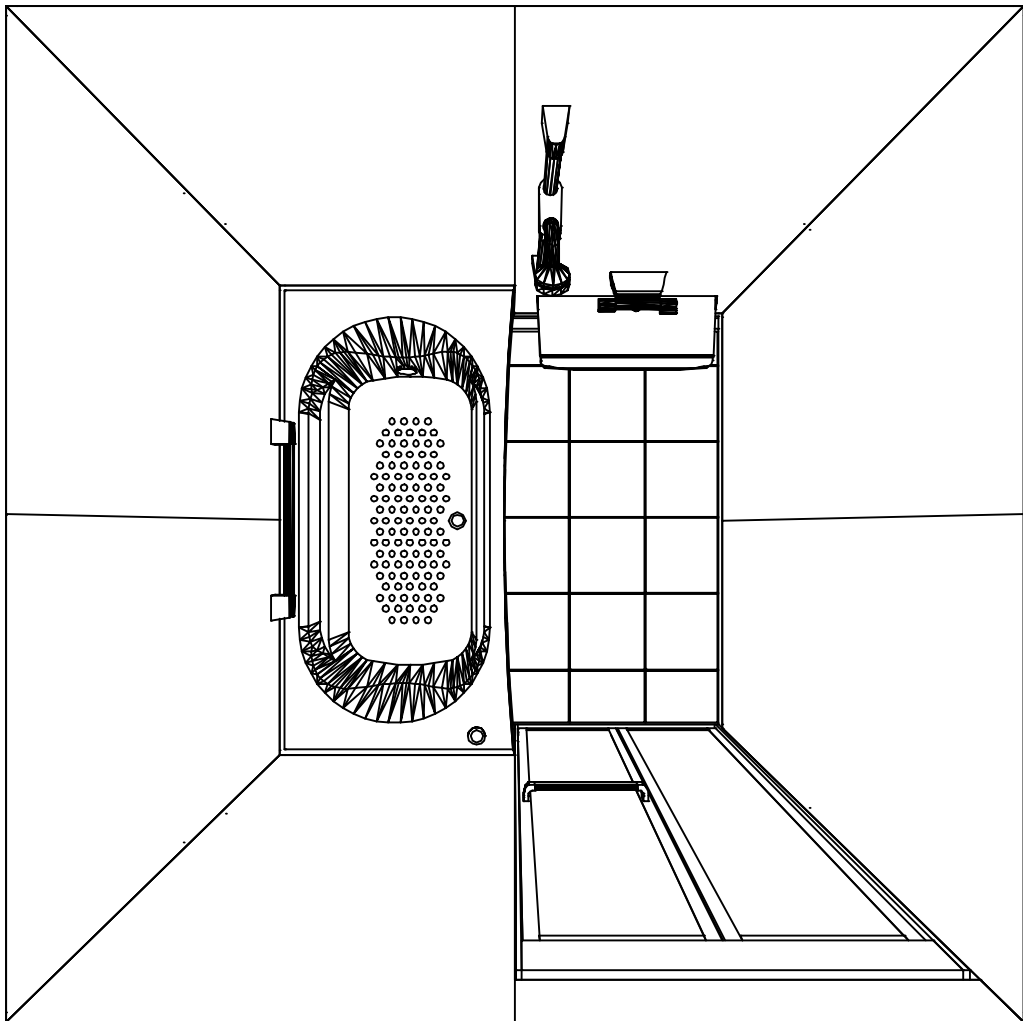

1616

フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： 横浜-藤沢SR SB4様邸	GRANSPA グランspa	姿図	
現場番号： C3057599	プラン番号： 2710B-2508-0146T	作成日： 2025年8月21日	
藤沢営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

カウンター面


浴槽側面

洗場側面


カウンター対面

■ 留意事項



* 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

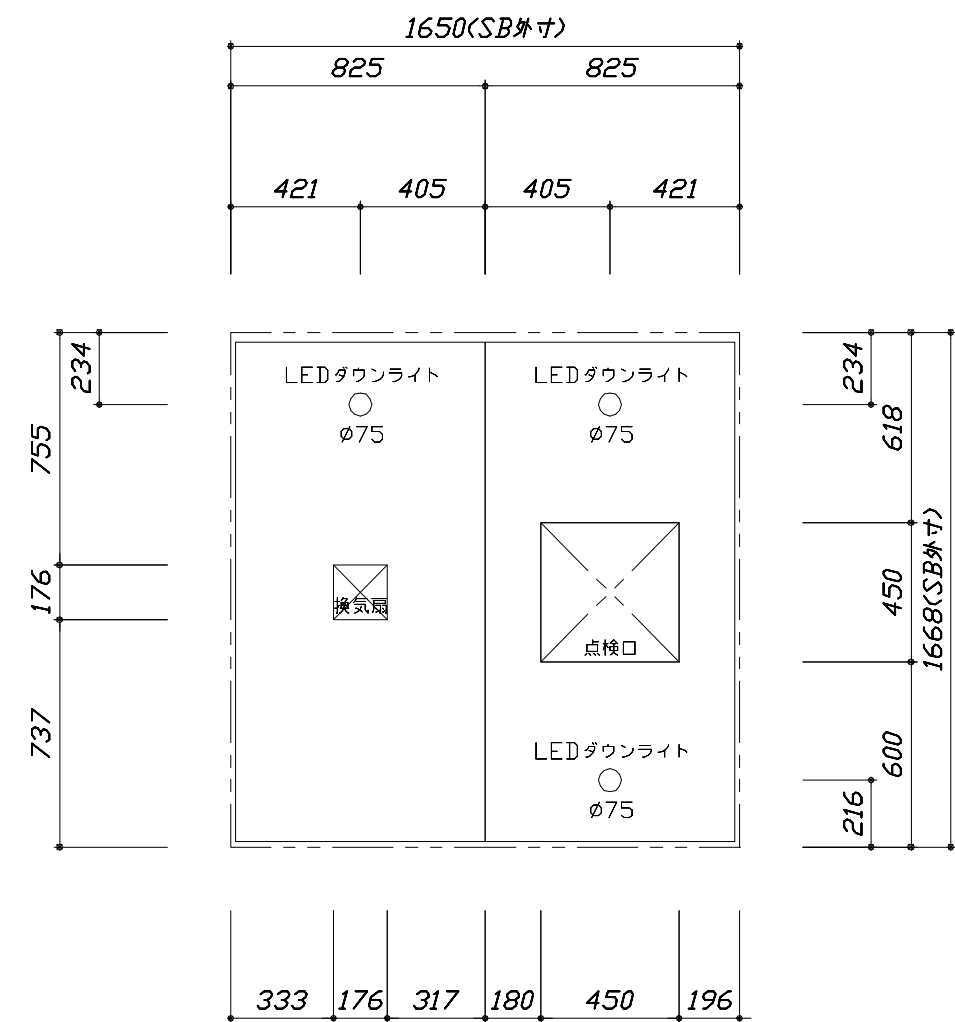

< 天井伏図 >

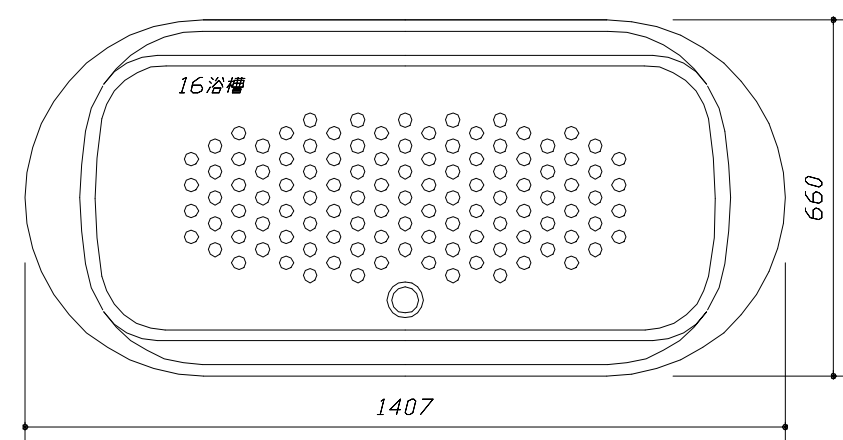


< 浴槽詳細図 >

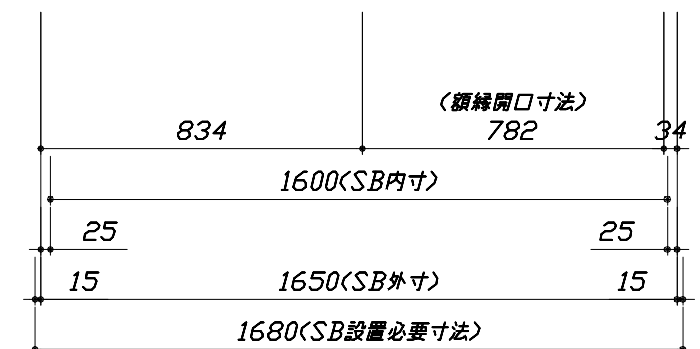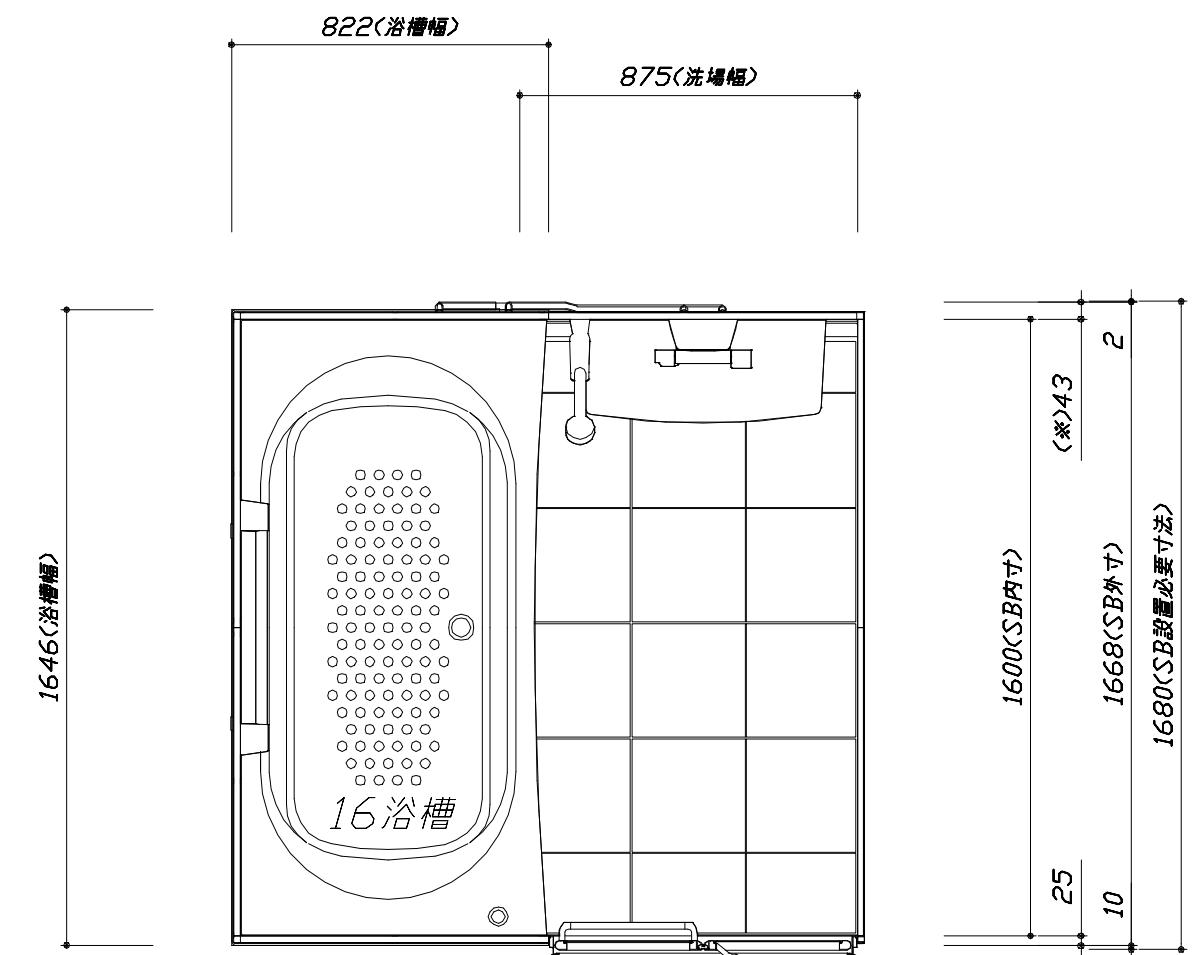


< 平面図 >

Diagram illustrating the layout of the bathtub area, showing the counter (カウンター面), side (浴槽側面), and opposite side (浴槽対面) views.

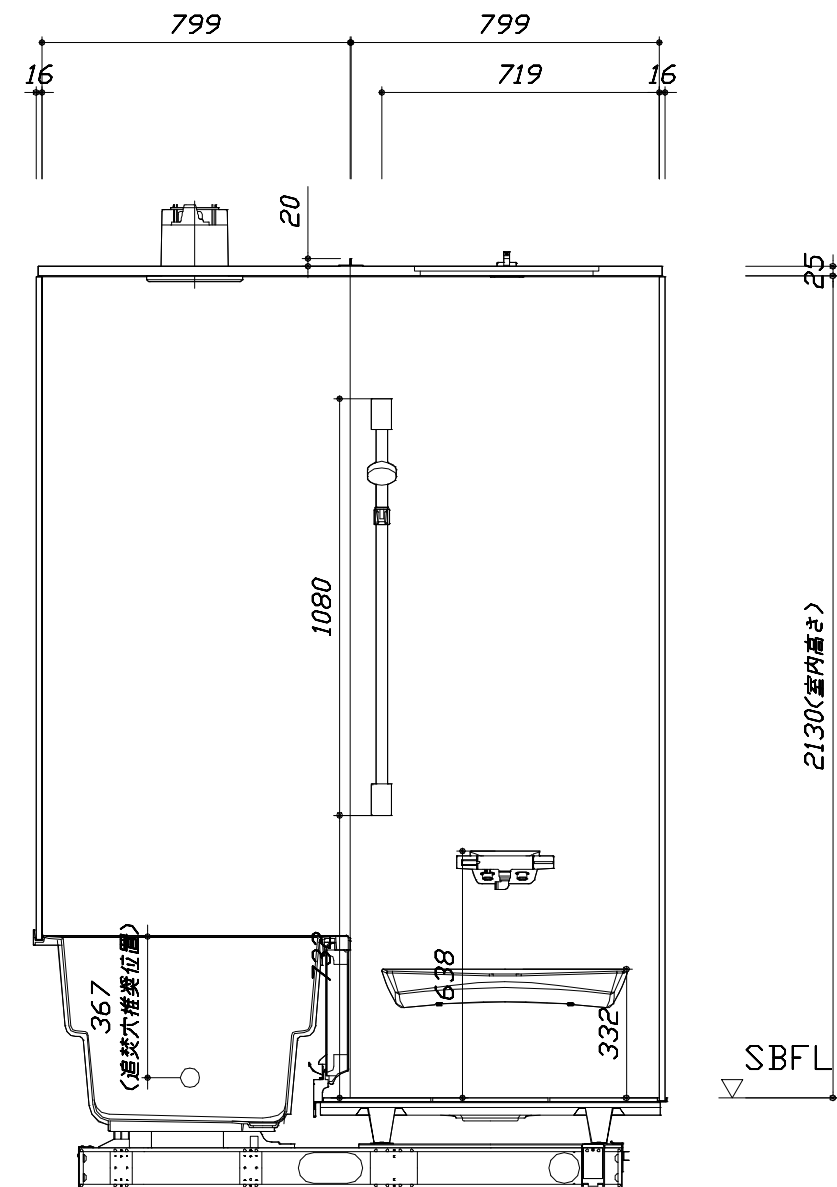

洗い場水上 (SBFL) からの浴槽跨ぎ
418

＜カウンタ一面図＞

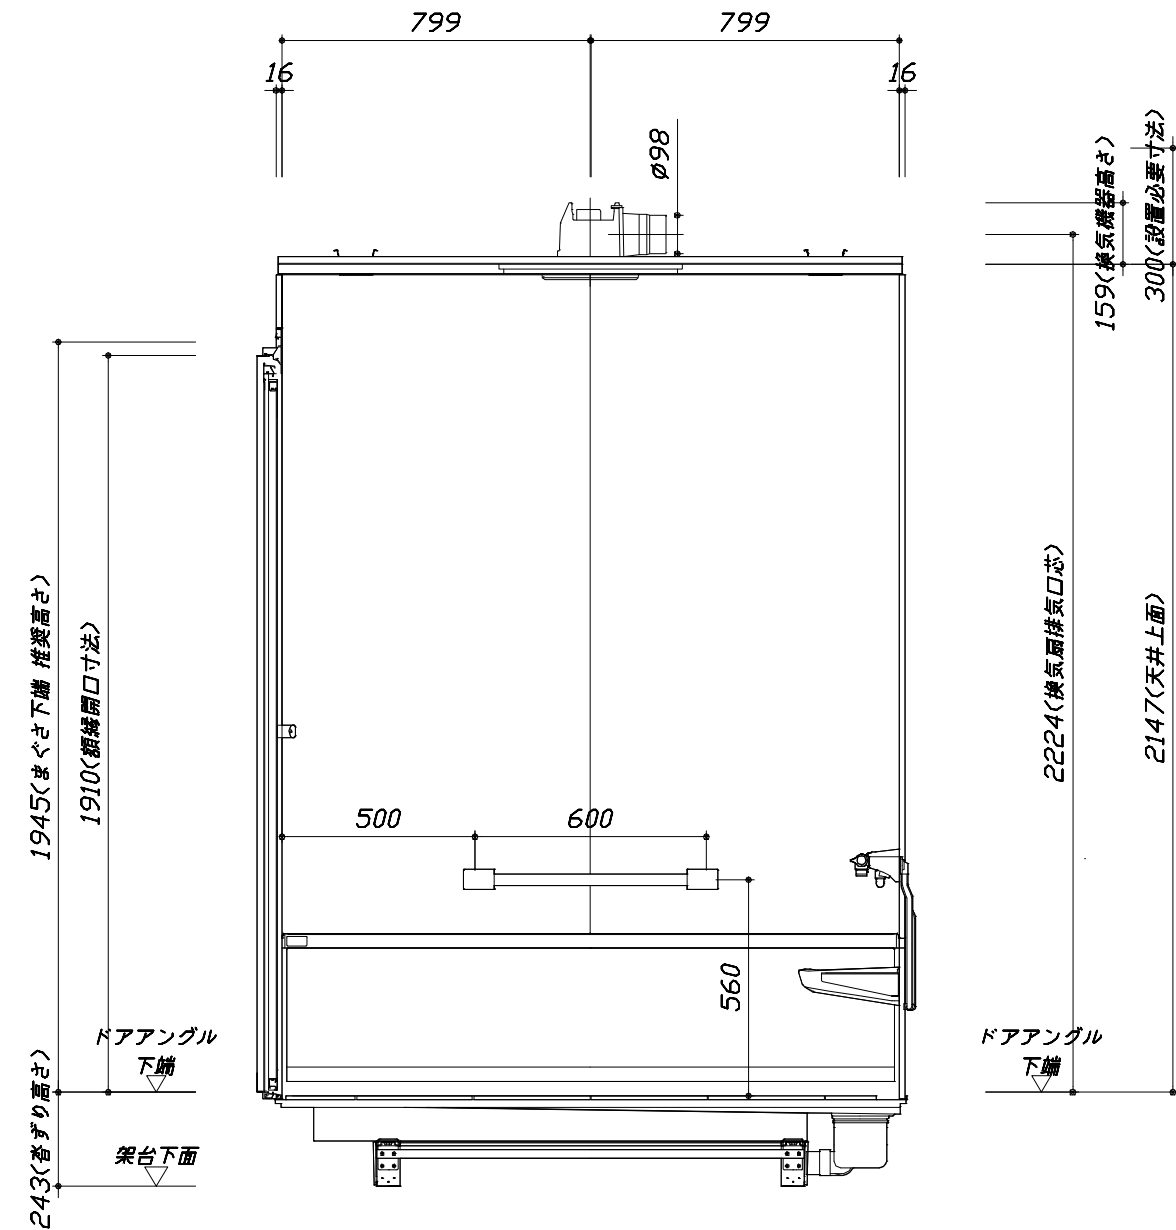

< 浴槽側面図 >

担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	AR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	ガラス繊維強化樹脂（FRP）裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ラウンド浴槽（310リットル）追い焚き穴:あり
浴槽パン	－
浴槽エプロン	A B S 樹脂
カウンター	ワイドカウンター：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし
天井	化粧サントイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア:19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	A B S 樹脂・封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	250kg

アクセサリ仕様表

ミラー	－
収納棚	－
タオル掛け	－
洗場側水栓	サーモスタット(SB1811H)（樹脂ホース:メタル調）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（スライドバー-T1020S CK）
照明	LEDダウンライト（LED 9.3W白色）（3灯）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W)（ダクト径φ98）ホワイト
フロフタ	組合せ式(アルミ複合板：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットELX：ホース先端部R1/2オスネジ仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	アルミ製 I型600タイプ マットブラック
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	W：ホワイト
カウンター	CG：チャコールグレー
パネル(カウンター面)	MFA：グレージュアッシュ
パネル(周辺・3面)	MFA：グレージュアッシュ
水栓上部カウンター	CG：チャコールグレー
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	HC：カームダークグレー
ドア / 天井	W：ホワイト / D：ベージュ
収納棚	－
タオル掛け	－
ランドリーセット	－

Takara standard タカラストانダード株式会社	現場名称： 横浜－藤沢SR SB4様邸	GRANSPA グランspa	仕様表	
	現場番号： C3057599	プラン番号： 2710B-2508-0146T	作成日： 2025年8月21日	
	藤沢営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分			参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』								
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査			
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事	
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
浴室用電源配線、接続工事							○		浴室機器の事後電気工事		
浴室天井裏の電源、スイッチ工事							○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。
- 貫通スリーブを使用する場合は45度エルボなどを接続し、バンドなどで固定してください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

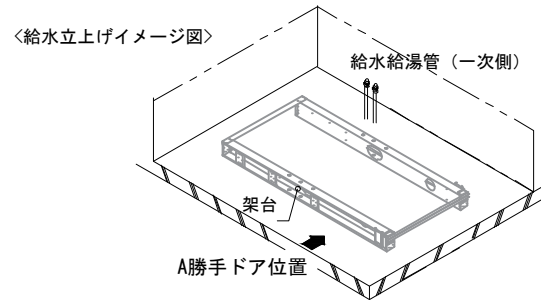

■ 土間コンクリート仕上げ寸法
ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。



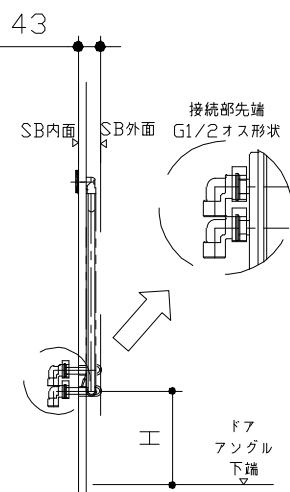
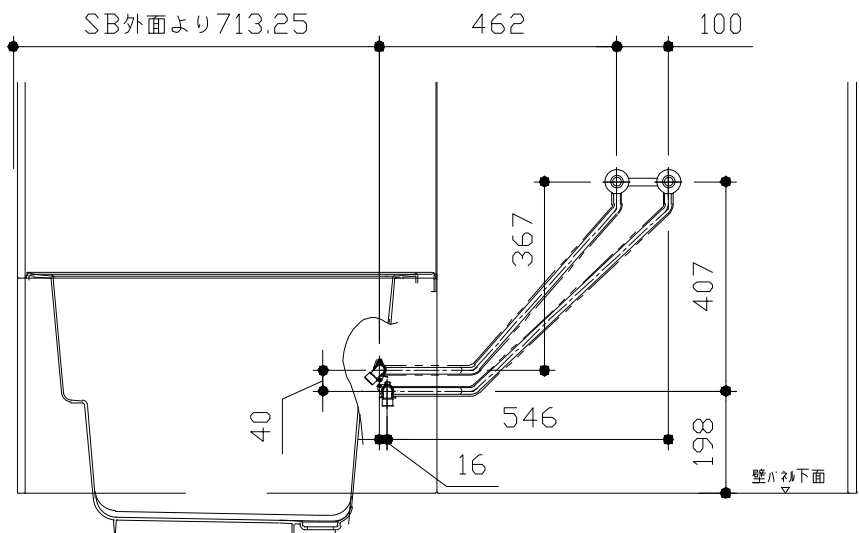


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	182
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	173

＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置

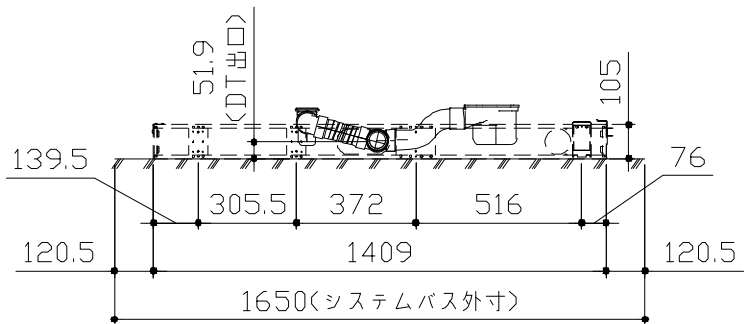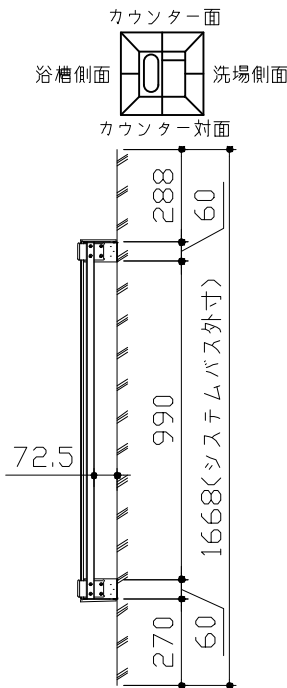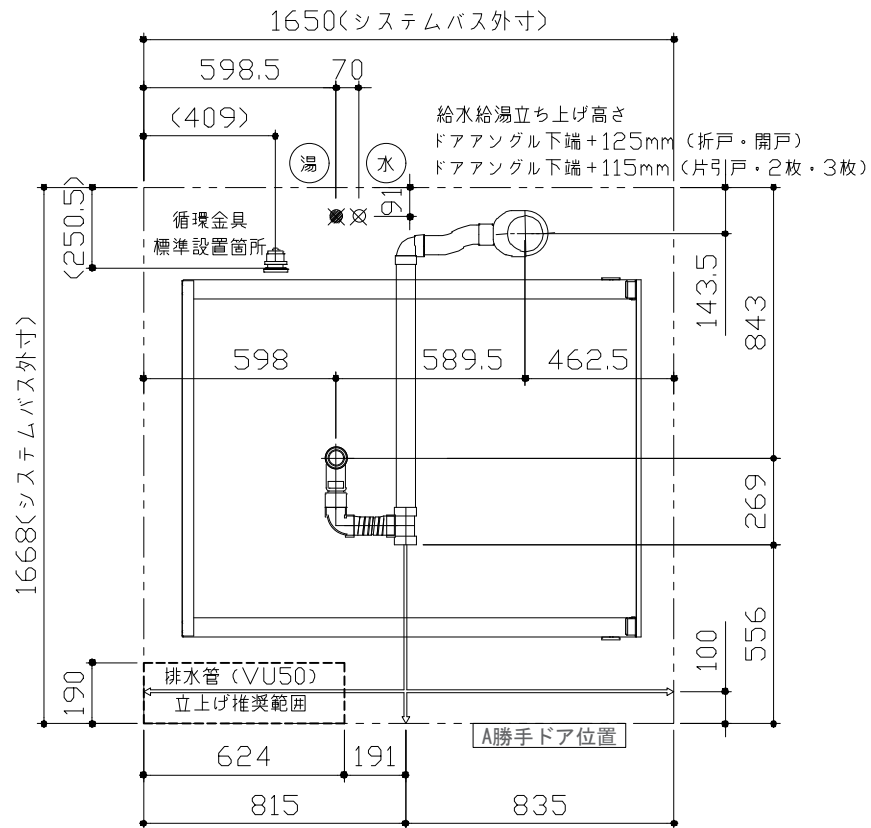

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞


■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・カウンター面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

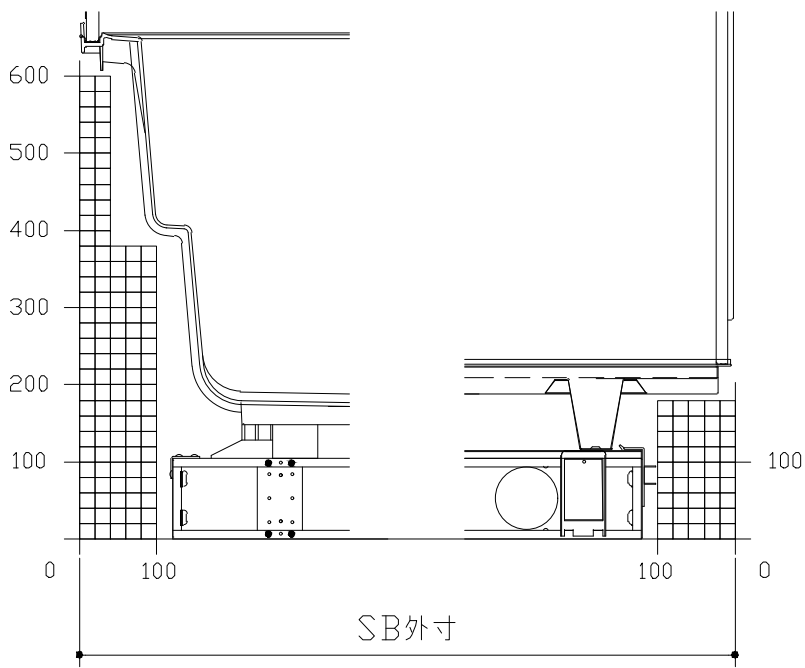


A矢視

B矢視

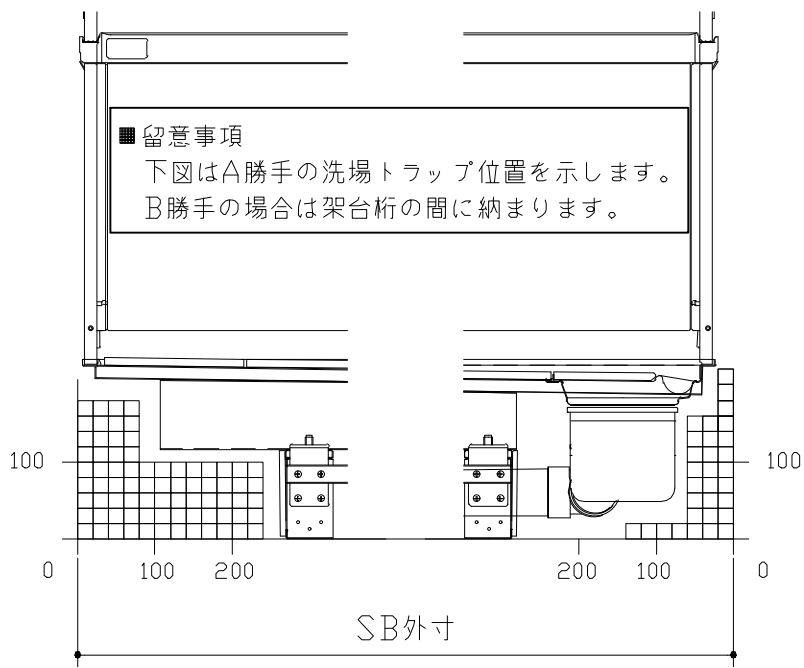

C矢視

D矢視




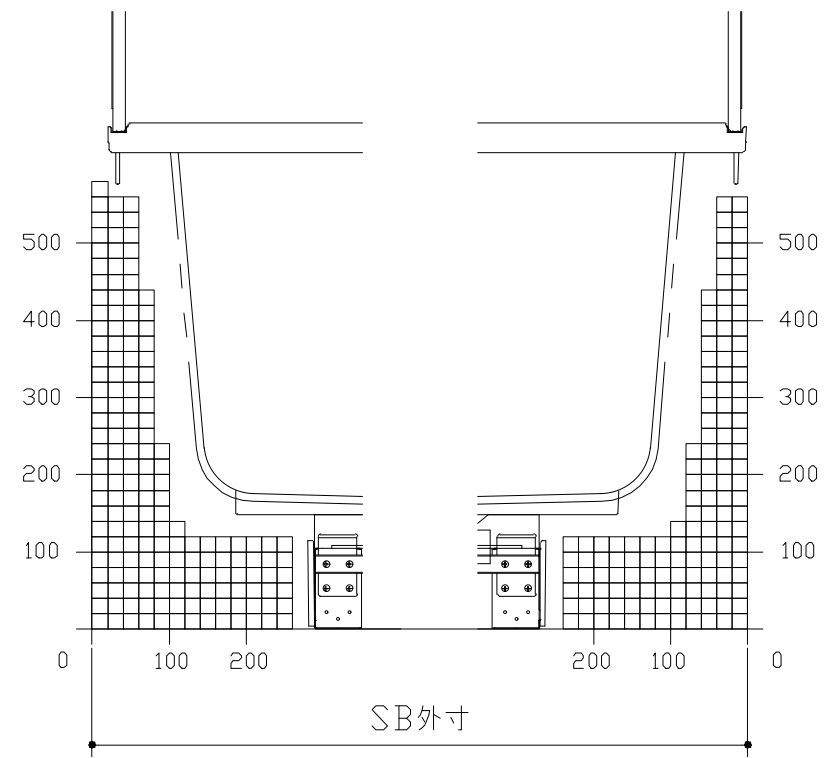


E矢視

F矢視

キープクリーンドア：折戸・上部換気口

有効開口寸法689mm

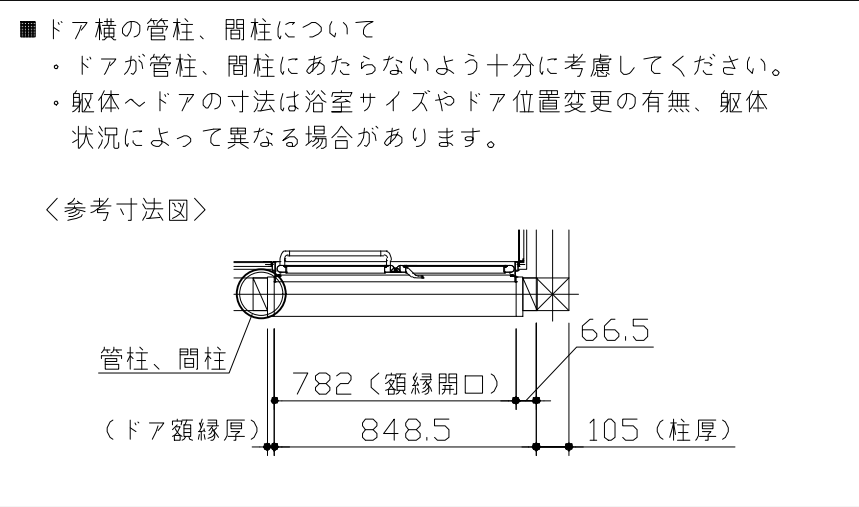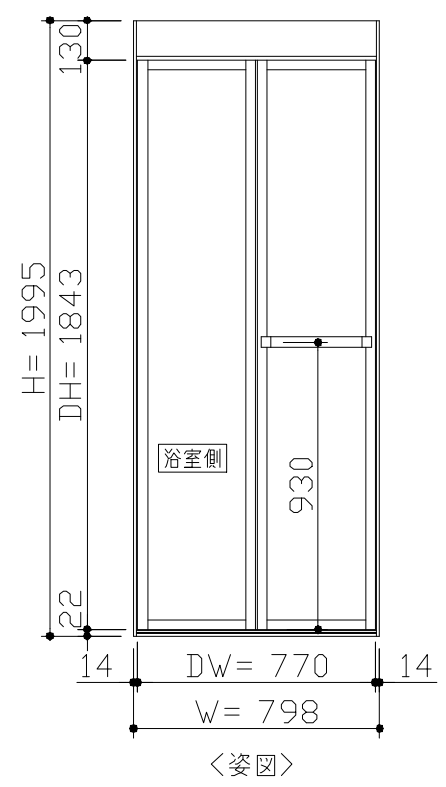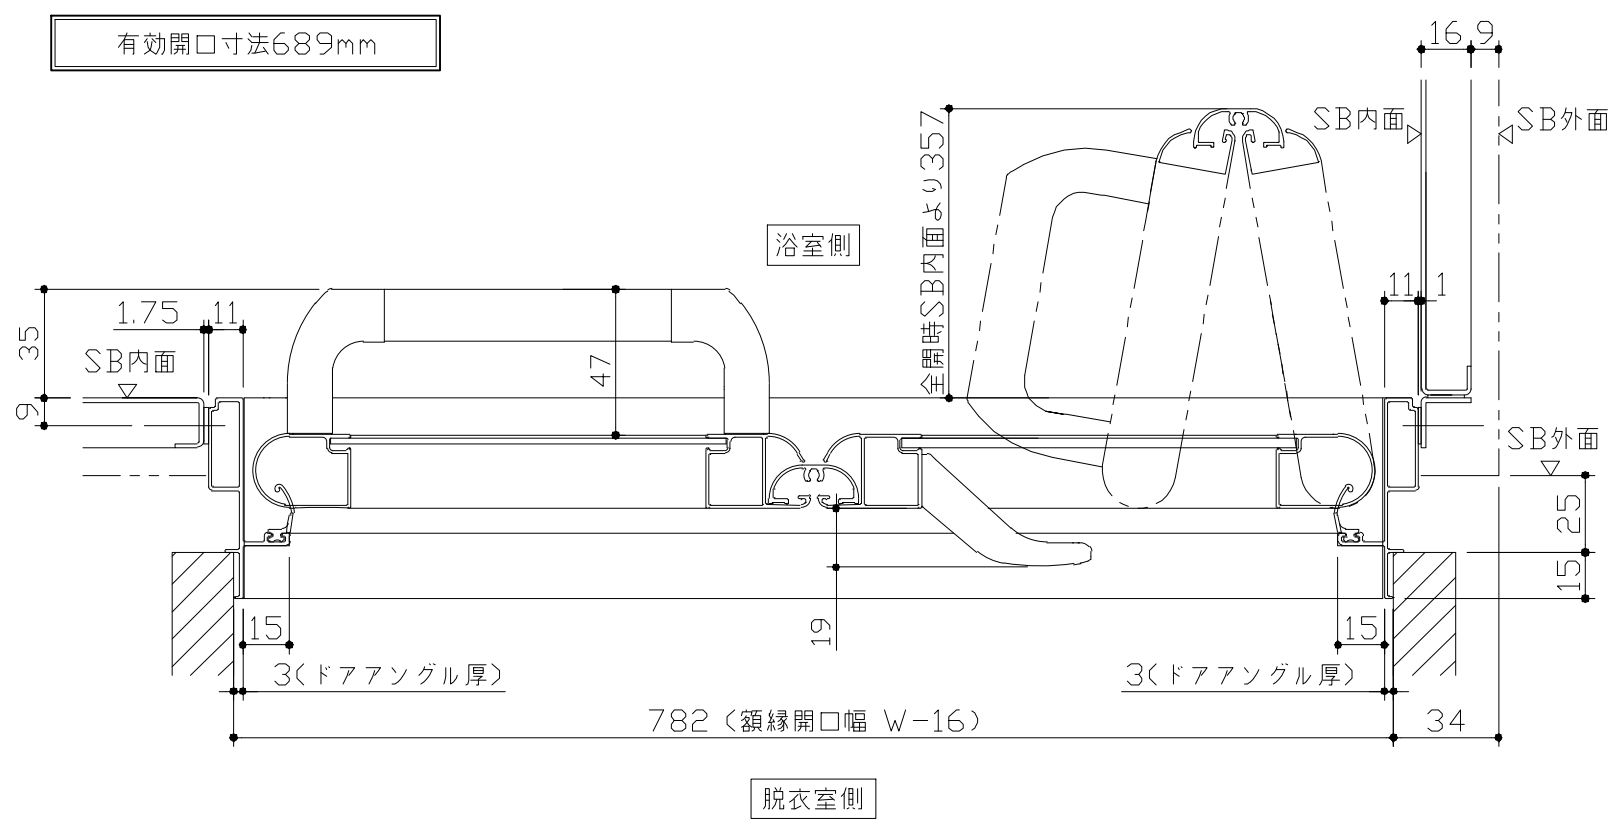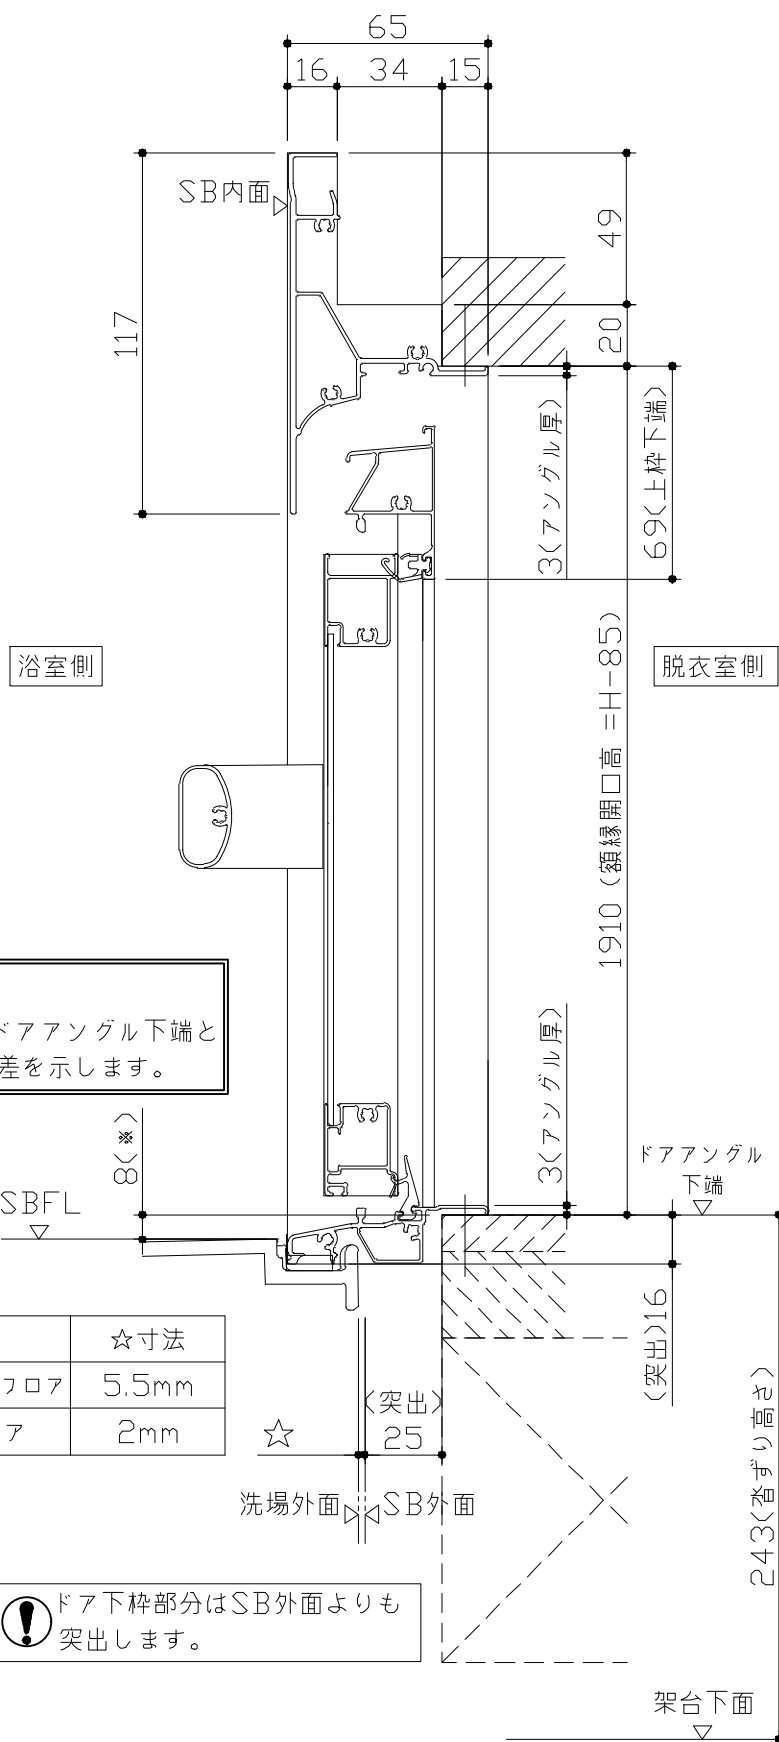


■ 留意事項
* 印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

❗ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。







Takara standard
タカラスタンダード株式会社






現場名称： 横浜-藤沢SR SB4様邸	GRANSPA グランSPA	ドア取合詳細図
現場番号： C3057599	プラン番号： 2710B-2508-0146T	作成日： 2025年8月21日
藤沢営業所	担当営業：	担当アドバイザー：

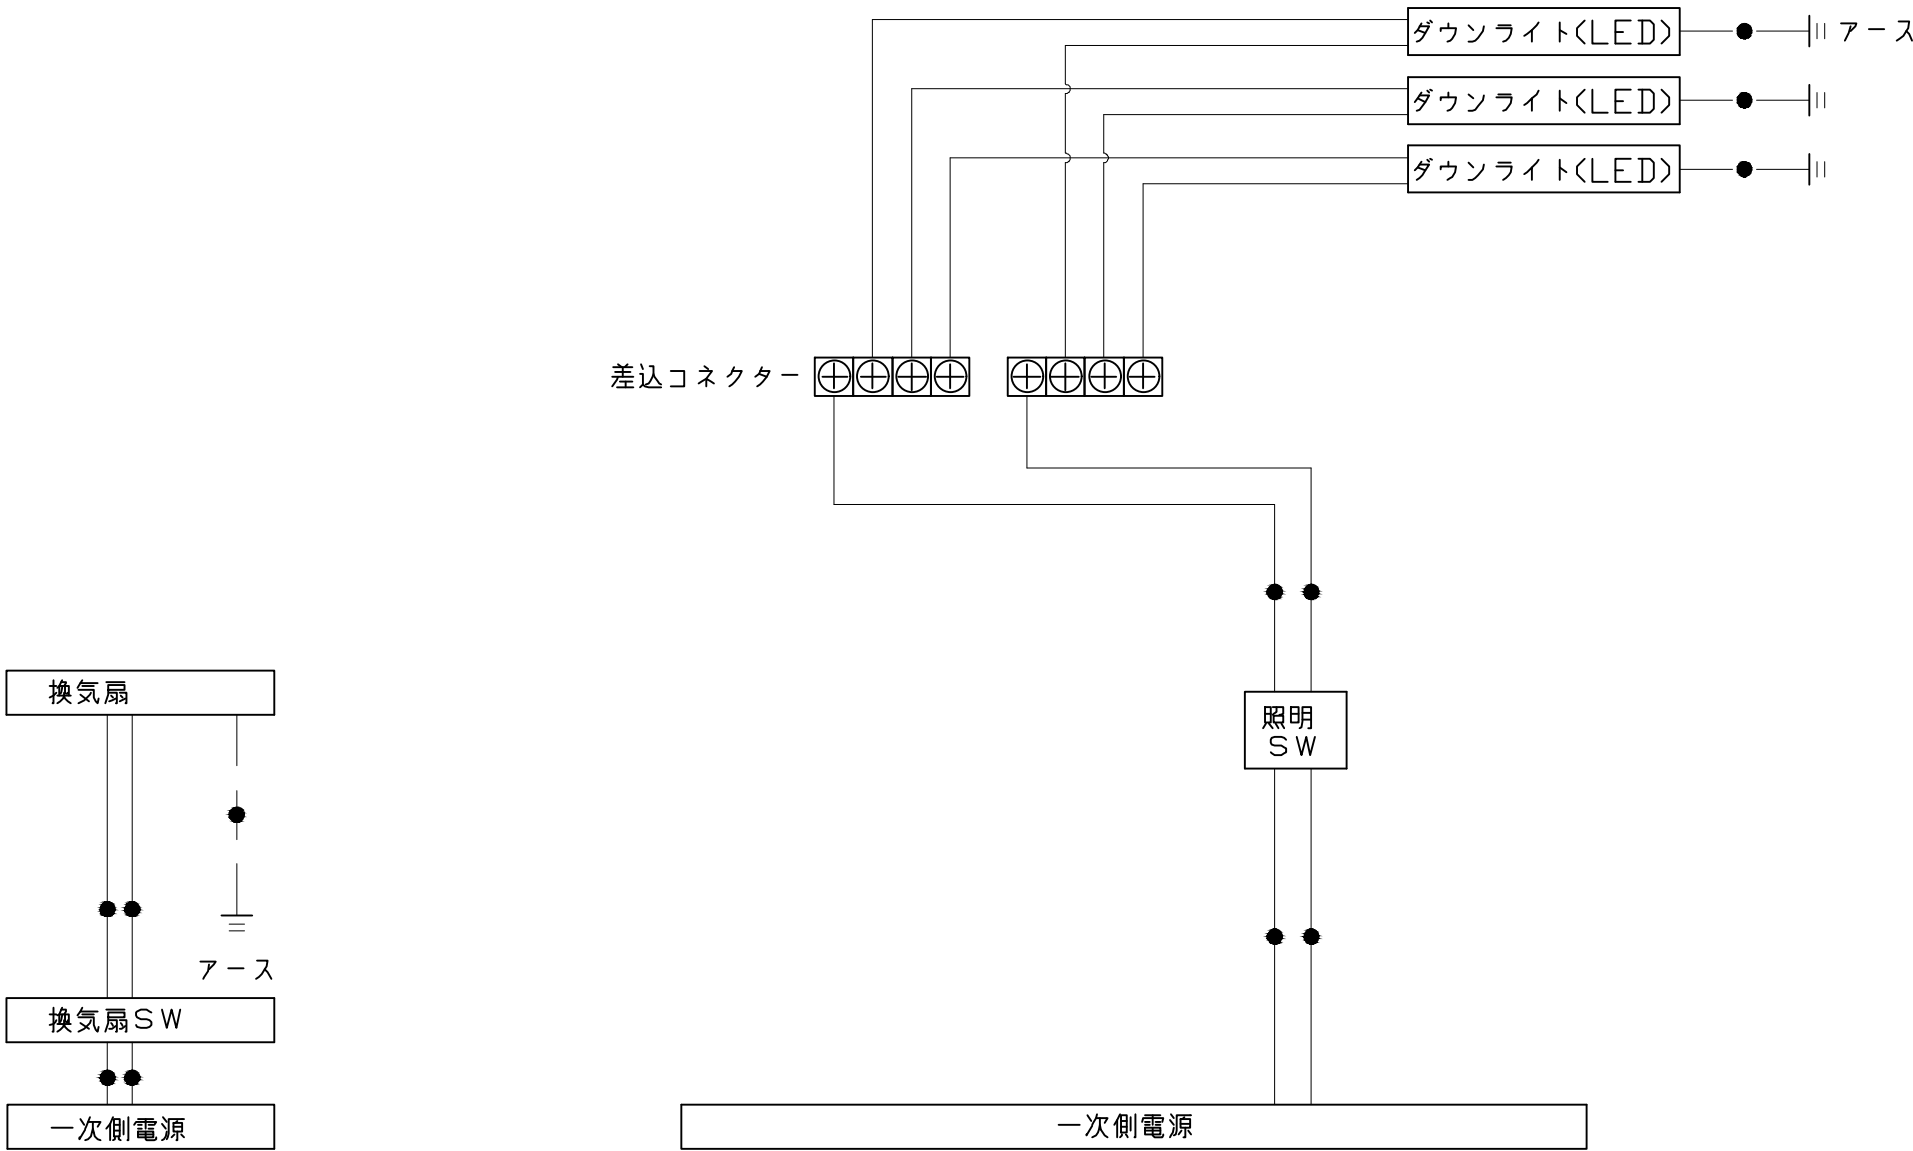

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

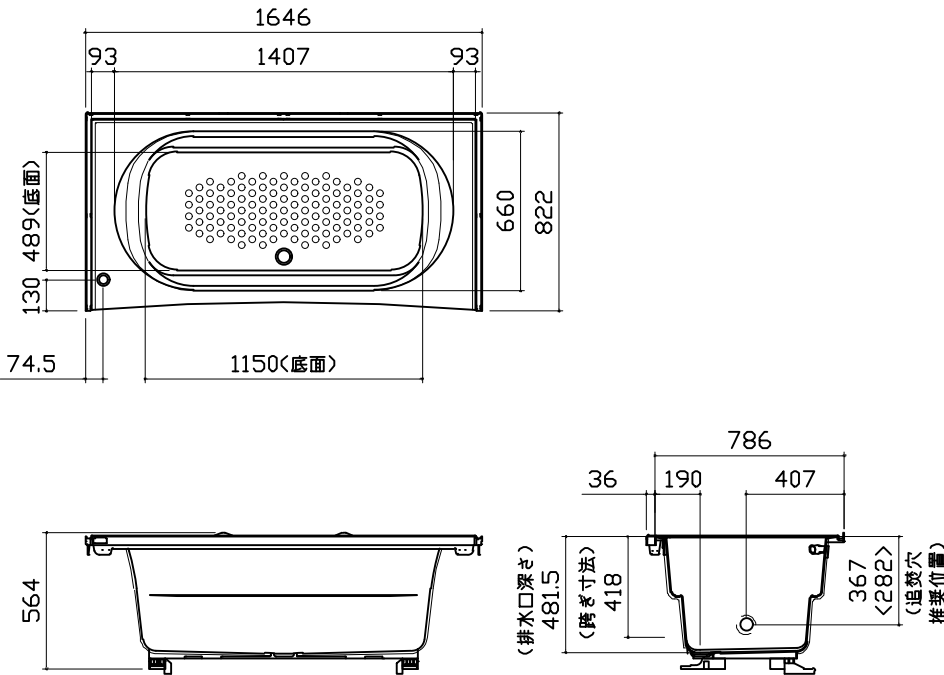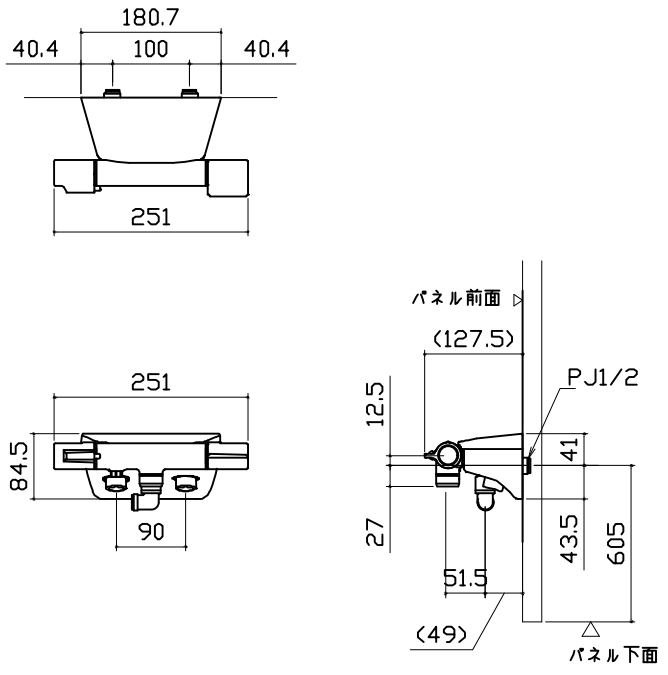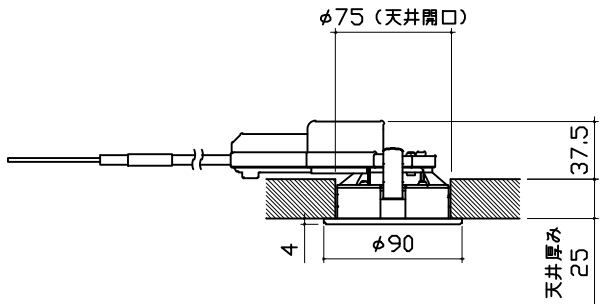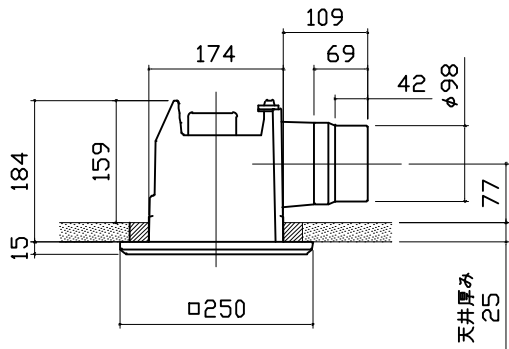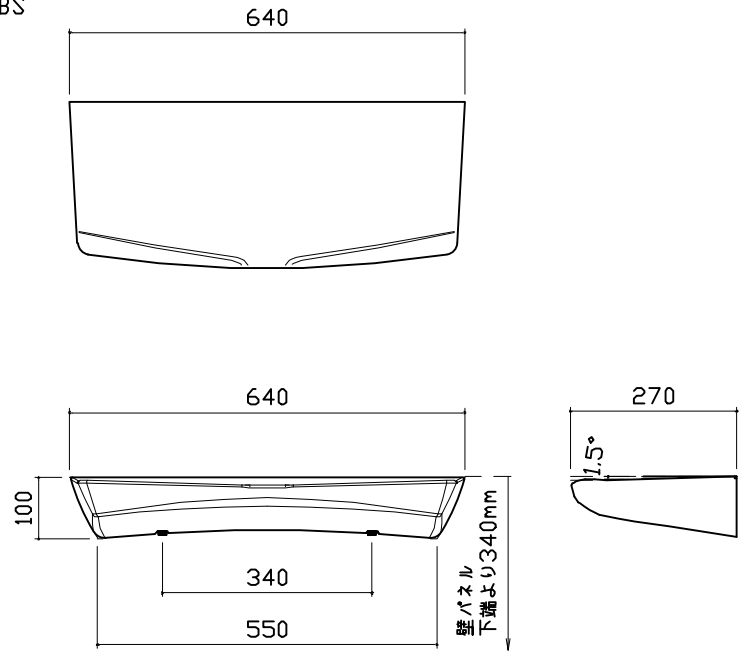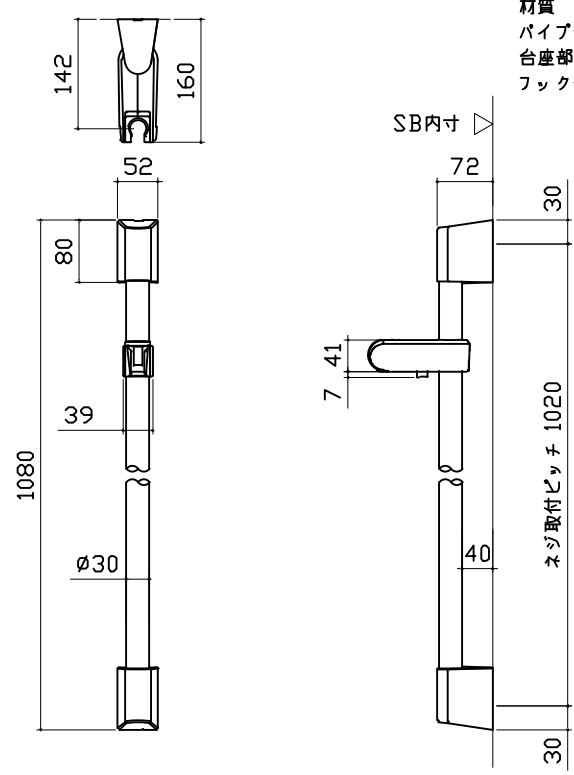浴槽		洗い場用水栓		照明	
 ※ 漏水受け仕様の場合は<>内寸法参照のこと				ダウンライト LED 3.1W (1灯あたり) 	
換気機器		カウンター		シャワーフックスライドバー	
管工事 		本体：ABS 		材質 パイプ部：ステンレス 台座部：ABS、POM等 フック部：ABS等 	
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 横浜－藤沢SR SB4様邸	GRANSPA グランspa	部材詳細図	1/2
現場番号： C3057599		現場番号： C3057599	プラン番号： 2710B-2508-0146T	作成日： 2025年8月21日	
藤沢営業所		担当営業	：	担当アドバイザー：	

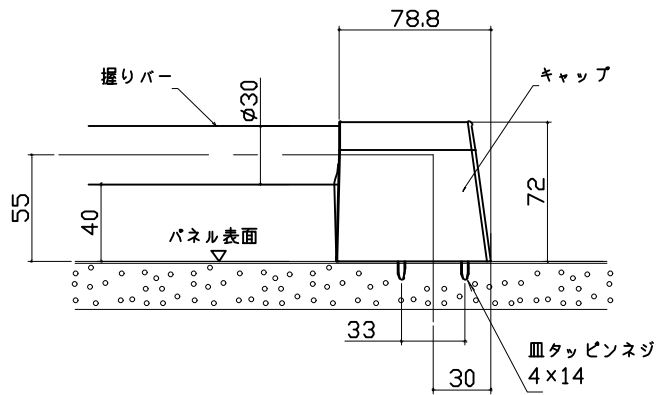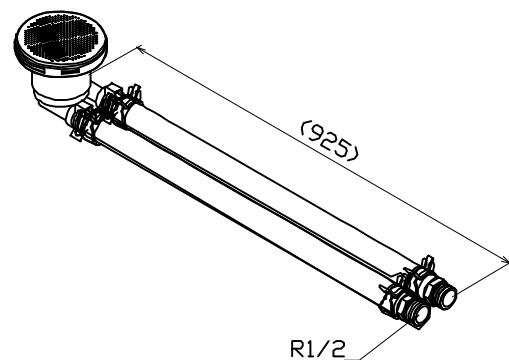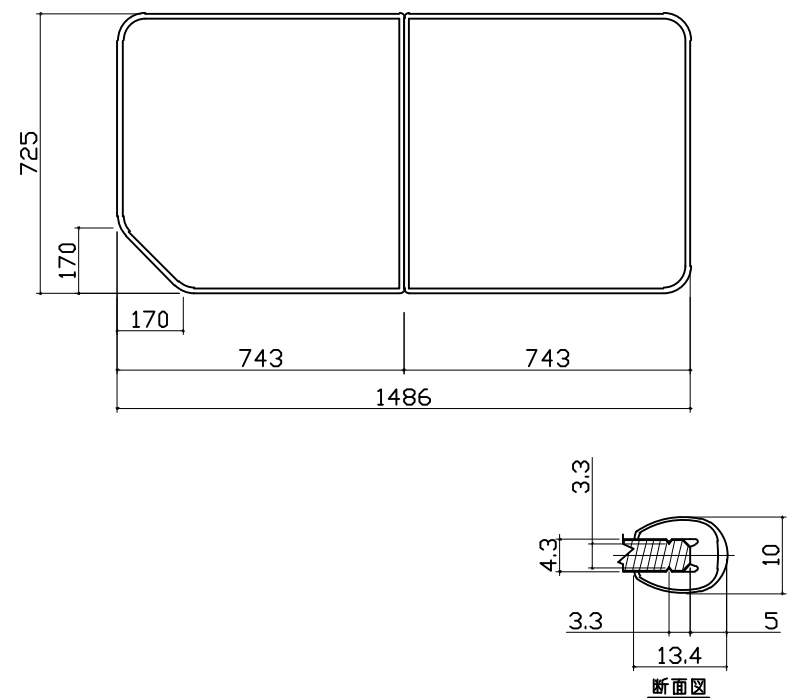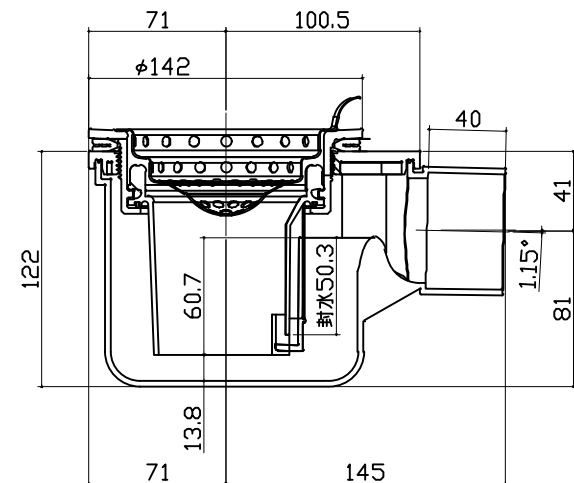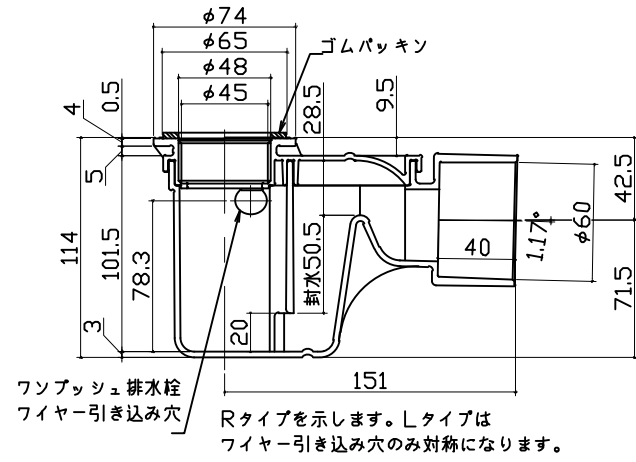ハンドバー 支持部取合詳細図	循環金具・フロアダプタ関連	風呂蓋 7077MZA-16RN		
				
洗い場側排水トラップ	浴槽側排水トラップ			
	 フンプッシュ排水栓 ワイヤー引き込み穴 Rタイプを示します。Lタイプは ワイヤー引き込み穴のみ対称になります。			
 タカスタンダード株式会社	現場名称： 横浜-藤沢SR SB4様邸	GRANSPA グランspa	部材詳細図	2/2
	現場番号： C3057599	プラン番号： 2710B-2508-0146T	作成日： 2025年8月21日	
	藤沢営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

パネル割図		シャーフックスライドバー			
ハネK16C2Z 0799 R<MFA ハネL16C1N 0799 <MFA ハネL16NW 0799P <MFA ハネL16NW 0799P <MFA ハネL16NW 0799P <MFA ハネK16A 0799 <MFA ハネK16A 0799 <MFA AR勝手 ↑		ハネK16C2Z 0799 R<MFA 799 64 33 33 33 33 754 1774 現地加工：φ3.5			
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜-藤沢SR SB4様邸		GRANSPA グランspa		穴開け指示図
	現場番号： C3057599		プラン番号： 2710B-2508-0146T		作成日： 2025年8月21日
	藤沢営業所		担当営業：		担当アドバイザー：
					1/1
