

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 横浜-新藤沢SR SB10 様

業者 様

商品名 伸びの美浴室

作成日 2021年3月18日
 プラン番号 2710B-2012-0016T
 現場番号 A7803260

タカスタンダード株式会社
 ◆藤沢営業所
 神奈川県藤沢市石川1丁目1番地の17
 TEL 0466-86-1848 / FAX 0466-86-1832

◆藤沢ショールーム
 TEL 0466-86-1800 / FAX 0466-86-2195

商品
 御見積金額 \449,000 (税込 \493,900)

() 内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 \120,000 (税込 \132,000)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1216 (BL勝手)
洗い場仕様	ガラス繊維強化樹脂<FRP>
洗い場カラー	グレーベージュ
浴槽材質	FRP
浴槽カラー	ホワイト
浴槽形状	セミスクエア浴槽
カウンター材質	樹脂
カウンターカラー	ホワイト
エプロン材質/カラー	樹脂 / ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー (正面)	ペイントブロック
パネルカラー (周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 50Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
SB10		

◆ 備考

--	--

No.*

御名前 横浜-新藤沢SR SB10

様

現場番号	A7803260	プラン番号	2710B-2012-0016T	作成日	2021/3/18
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	伸びの美浴室Pタイプ 1216サイズ		1	401,000	401,000
2	架台	低床タイプ ボルト脚架台	1		
3	ドア	開き戸<800幅> (ホワイト) / 樹脂ガラス (半透明) (19サイズ)	1	+11,500	+11,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドアオプション部材	ドア外タオル掛け (開き戸専用) / ブラケット: 樹脂 (白)	1	+5,000	+5,000
6	ドア位置変更	B勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
7	洗い場	FRP洗い場 (グレーベージュ)	1		
8	浴槽	FRP (高断熱浴槽) (ホワイト)	1	+3,000	+3,000
9	浴槽追い焚き穴	あり	1		
10	エプロン	保温材なし (ホワイト)	1		
11	浴槽形状	セミスクエア浴槽	1		
12	循環金具水受けトレーセット	なし	1		
13	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
14	浴槽パン	あり	1		
15	洗い場用水栓	サーモ水栓: 樹脂ホース (シルバー) KF3000TTKS	1		
16	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド	1		
17	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
18	カウンター	コンパクトカウンター	1	-10,000	-10,000
19	シャワーフック/スライドバー	シャワーフック	1		
20	浴室パネル	ハイクラス (一面デザイン) (Fパネル)	1	+15,000	+15,000
21	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
22	天井	フラット天井	1		
23	換気機器	天井換気扇	1		
24	換気機器開口	工場開口	1		
25	照明	天井付ミニ照明<電球色>	1		
26	天井照明開口	工場開口	1		
27	ミラー	横長ミラー	1	+8,000	+8,000
28	風呂フタ	シャッター式風呂フタ	1	+3,000	+3,000
29	タオル掛け	タオル掛けなし	1		
30	収納棚	収納棚なし	1		
31	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500

御名前 横浜-新藤沢SR SB10 様

現場番号	A7803260	プラン番号	2710B-2012-0016T	作成日	2021/3/18
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
33	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			33		\449,000

商品総合計	33	\449,000
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。


《参考》 別途 商品組付費

システムバス商品組付費 \120,000 (税込 \132,000)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

() 内の価格は税込価格＜税率10％＞を表示しています。

パース

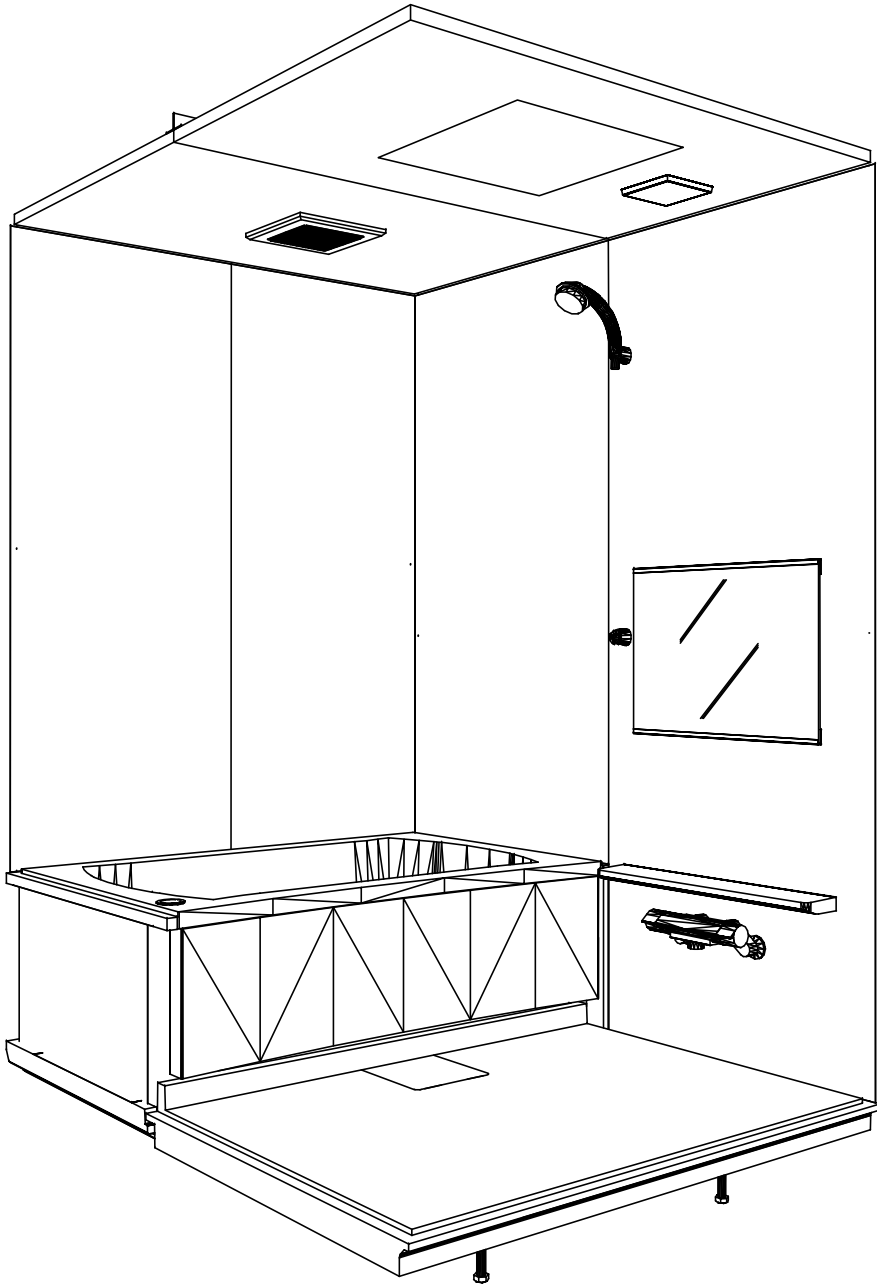

鳥瞰図

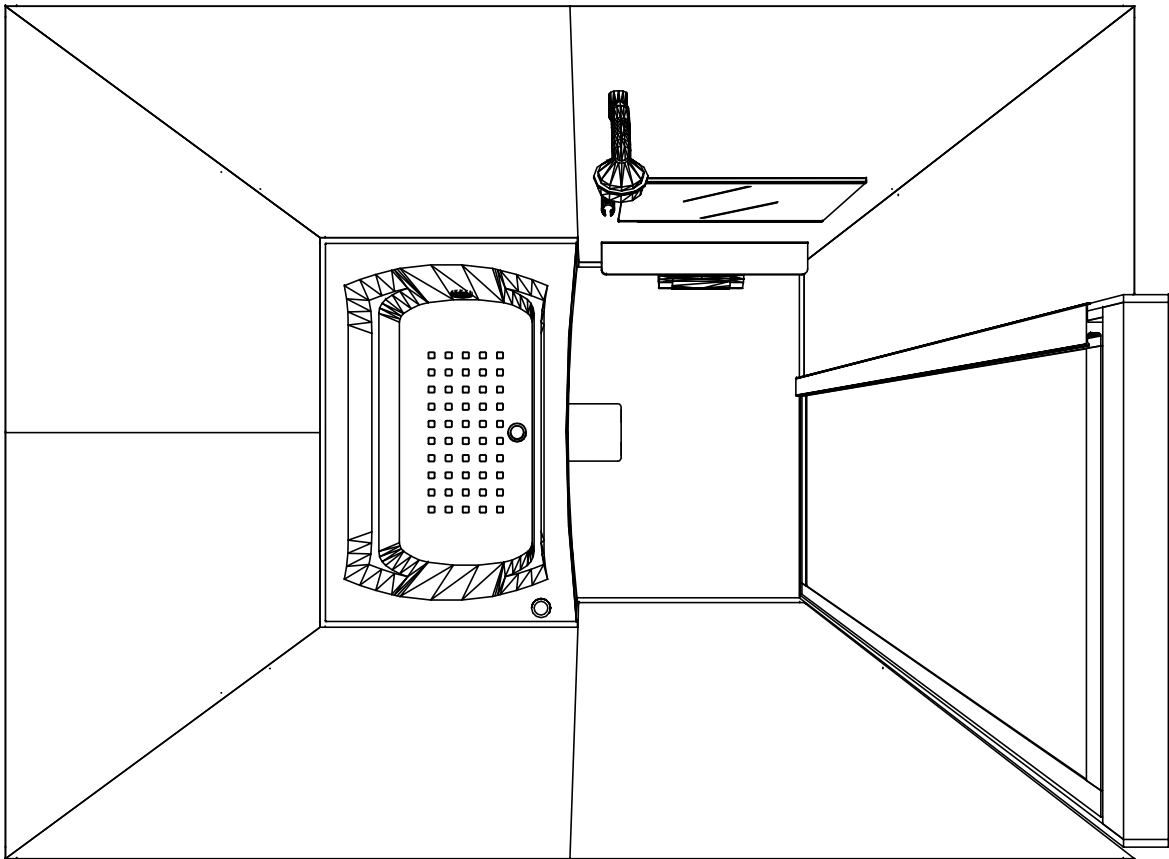

1216
ガラス繊維強化樹脂<FRP>浴槽
フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・
納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認
して頂きますようお願い致します。

Takara standard タカラストンダード株式会社	現場名称： 横浜-新藤沢SR SB10様邸	伸びの美浴室	姿図	
	現場番号： A7803260	プラン番号： 2710B-2012-0016T	作成日： 2021年3月18日	
	藤沢営業所	担当営業： SB10	担当アドバイザー：	

カウンター面


浴槽側面

洗場側面


カウンター対面

■留意事項


※印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

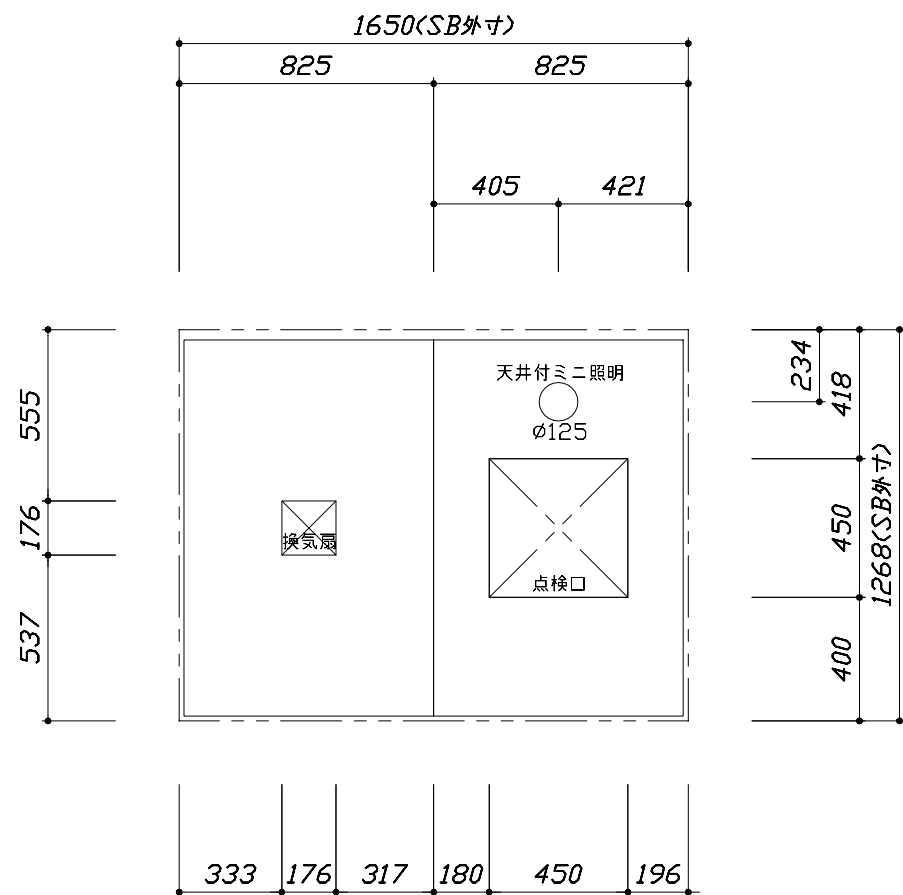

< 天井伏図 >

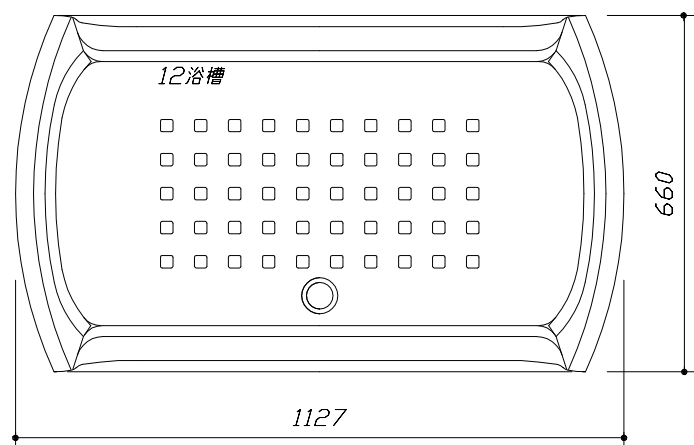



< 浴槽詳細図 >

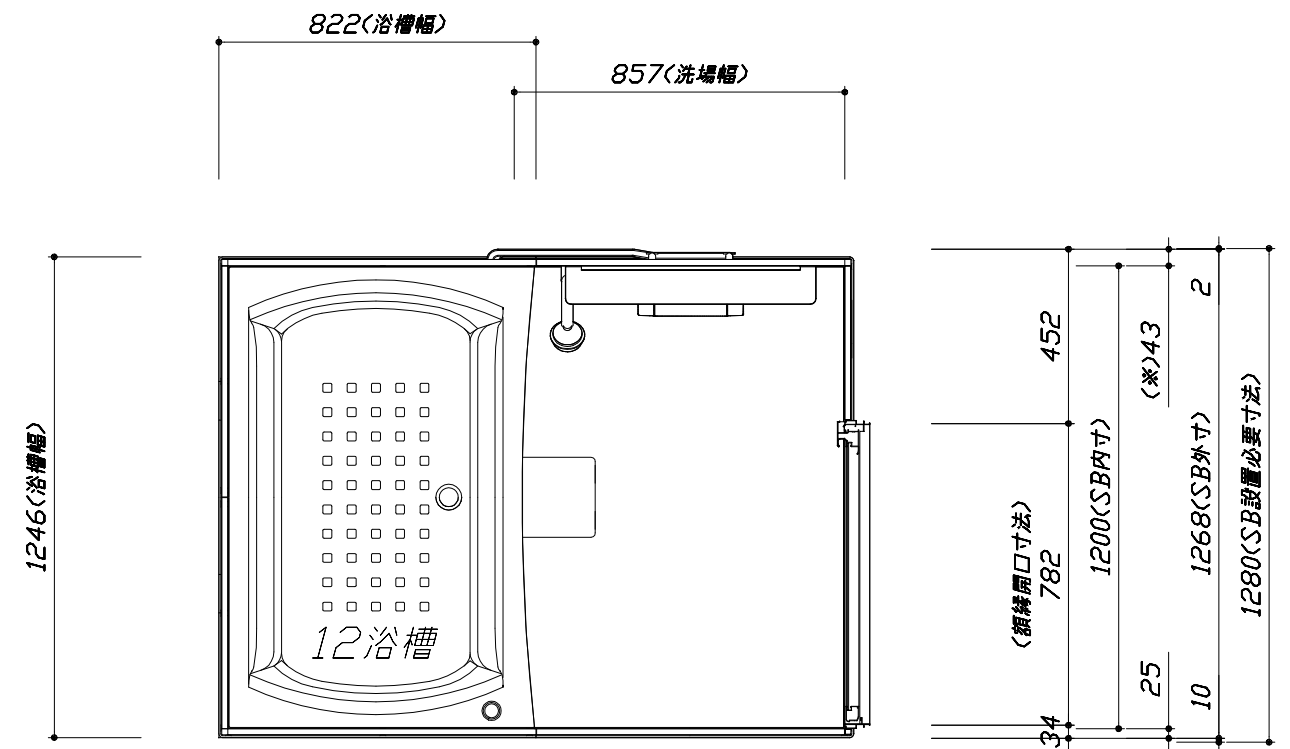

< 平面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・12方向での柱間との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との打ち合わせを十分おこなってください。
- ・外寸は突出部を含みます。

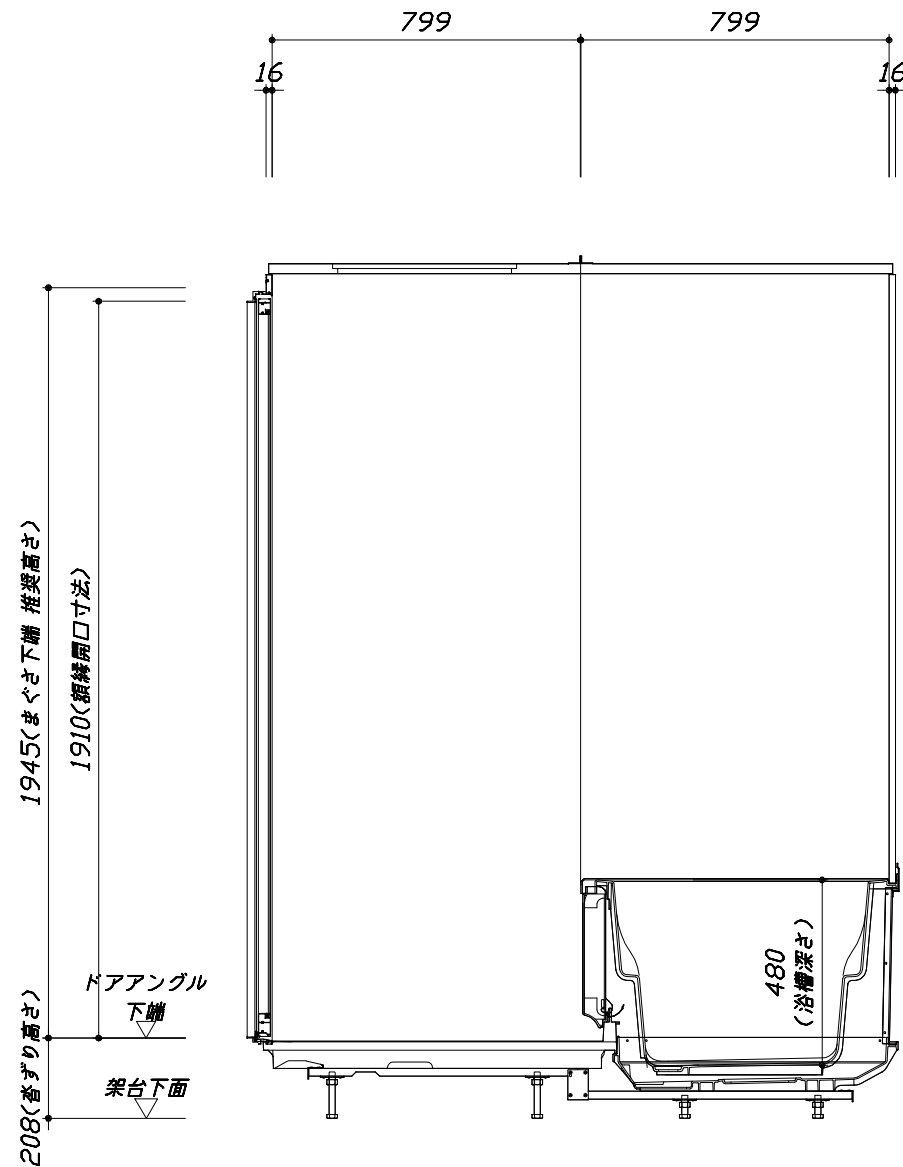

< カウンター対面図 >



■ボルト脚架台高さ寸法
各ずり高さに対して
-9 ~ +11 mm調整可能

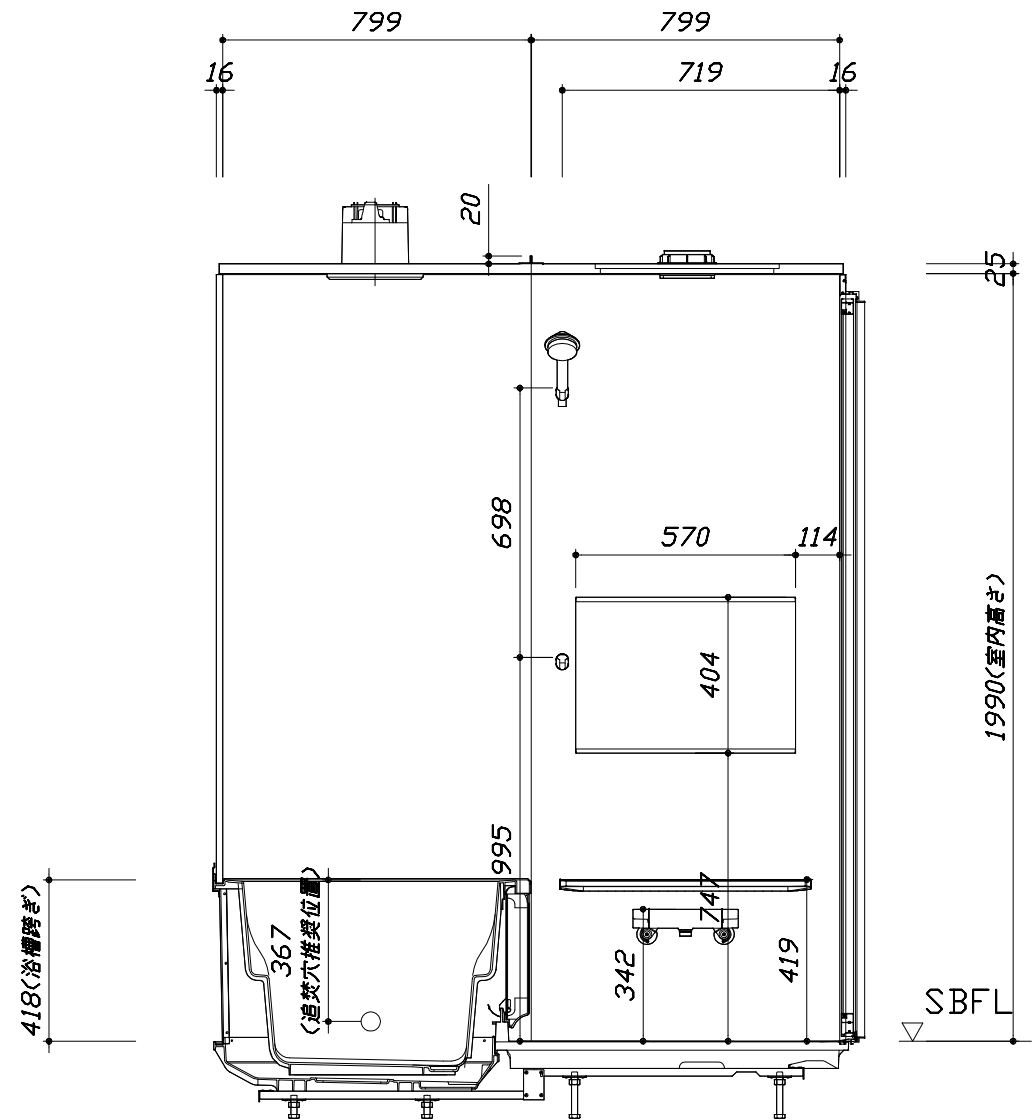

< カウンター面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認お願いします。
- ・12方向での柱間との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との打ち合わせを十分おこなってください。
- ・外寸は突出部を含みます。

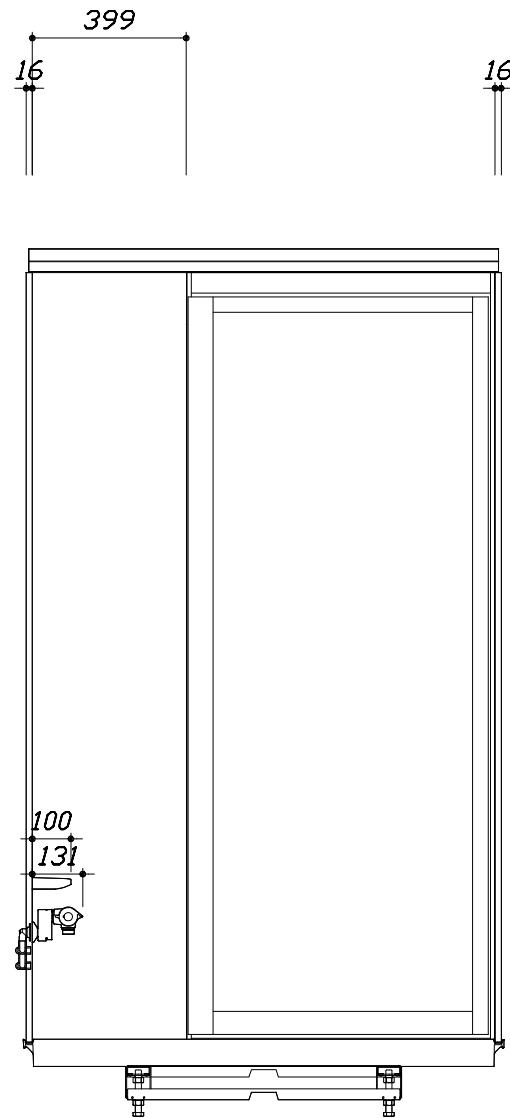

< 洗場側面図 >

■ボルト脚架台高さ寸法
各ずり高さに対して
-9 ~ +11mm調整可能

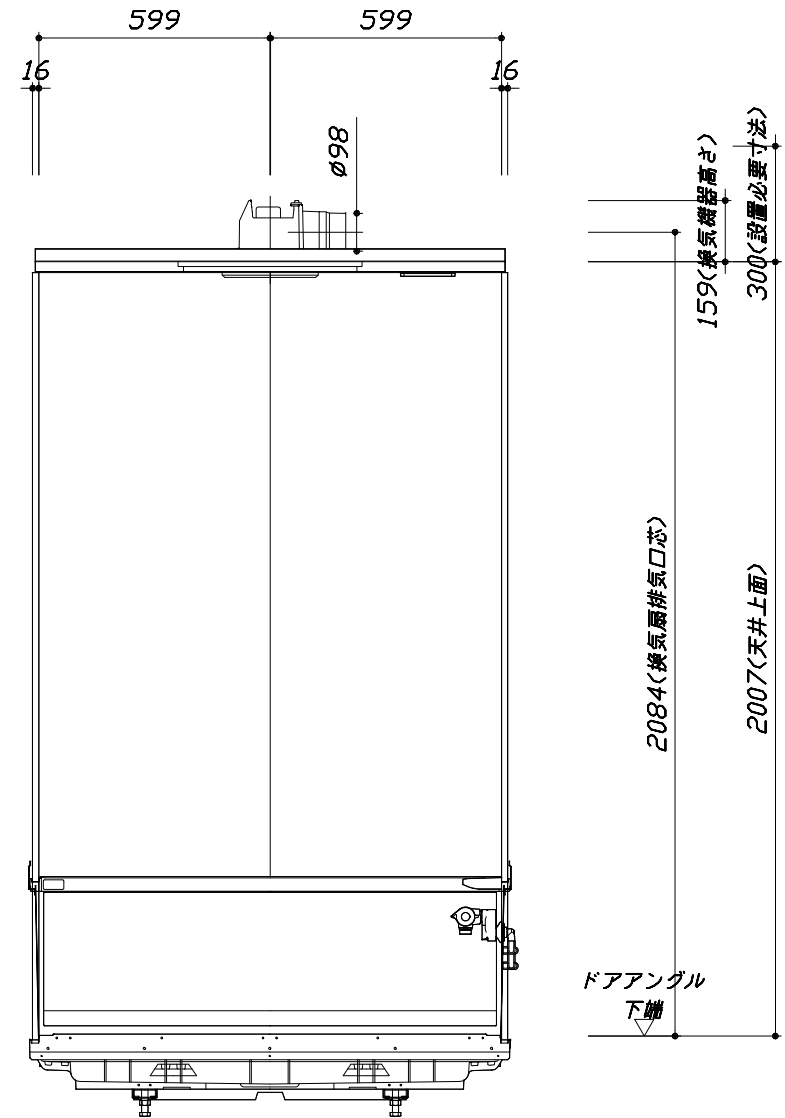

< 浴槽側面図 >

本体仕様表

浴室サイズ	1216サイズ(室内容量3.8立方メートル)
ドア勝手	BL勝手
架台	ボルト脚架台(低床タイプ)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽材質	ガラス繊維強化樹脂（FRP）裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	セミスクエア浴槽（12浴槽・255リットル）追い焚き穴：あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エプロン	A B S 樹脂
カウンター	コンパクトカウンター：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さFタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ開き戸(アルミ框/樹脂ガラス/ﾀﾞｲﾔﾑ型換気口/ﾄﾞｱ外ﾀﾞｲﾔﾑ掛け付)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	A S A 樹脂・封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VP50
製品重量	215kg

アクセサリ仕様表

ミラー	横長ミラー
収納棚	－
タオル掛け	－
洗場側水栓	サーモスタット(KF3000TTKS)（樹脂ホース：シルバー）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
スライドバー	－
照明	天井付ミニ照明（LED 6.9W電球色）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W)（ﾀﾞｲﾔﾑ径φ98）
フロフタ	シャッター式フロフタ（PP）
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	W：ホワイト
カウンター	W：ホワイト
パネル(カウンター面)	JPB：ペイントブロック
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カウンター	－
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	D：グレーベージュ
ドア	W：ホワイト
収納棚	－
タオル掛け	－
ランドリーセット	－

Takara standard タカラストANDARD株式会社	現場名称： 横浜－新藤沢SR SB10様邸	伸びの美浴室	仕様表	
	現場番号： A7803260	プラン番号： 2710B-2012-0016T	作成日： 2021年3月18日	
	藤沢営業所	担当営業： SB10	担当アドバイザー：	


基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

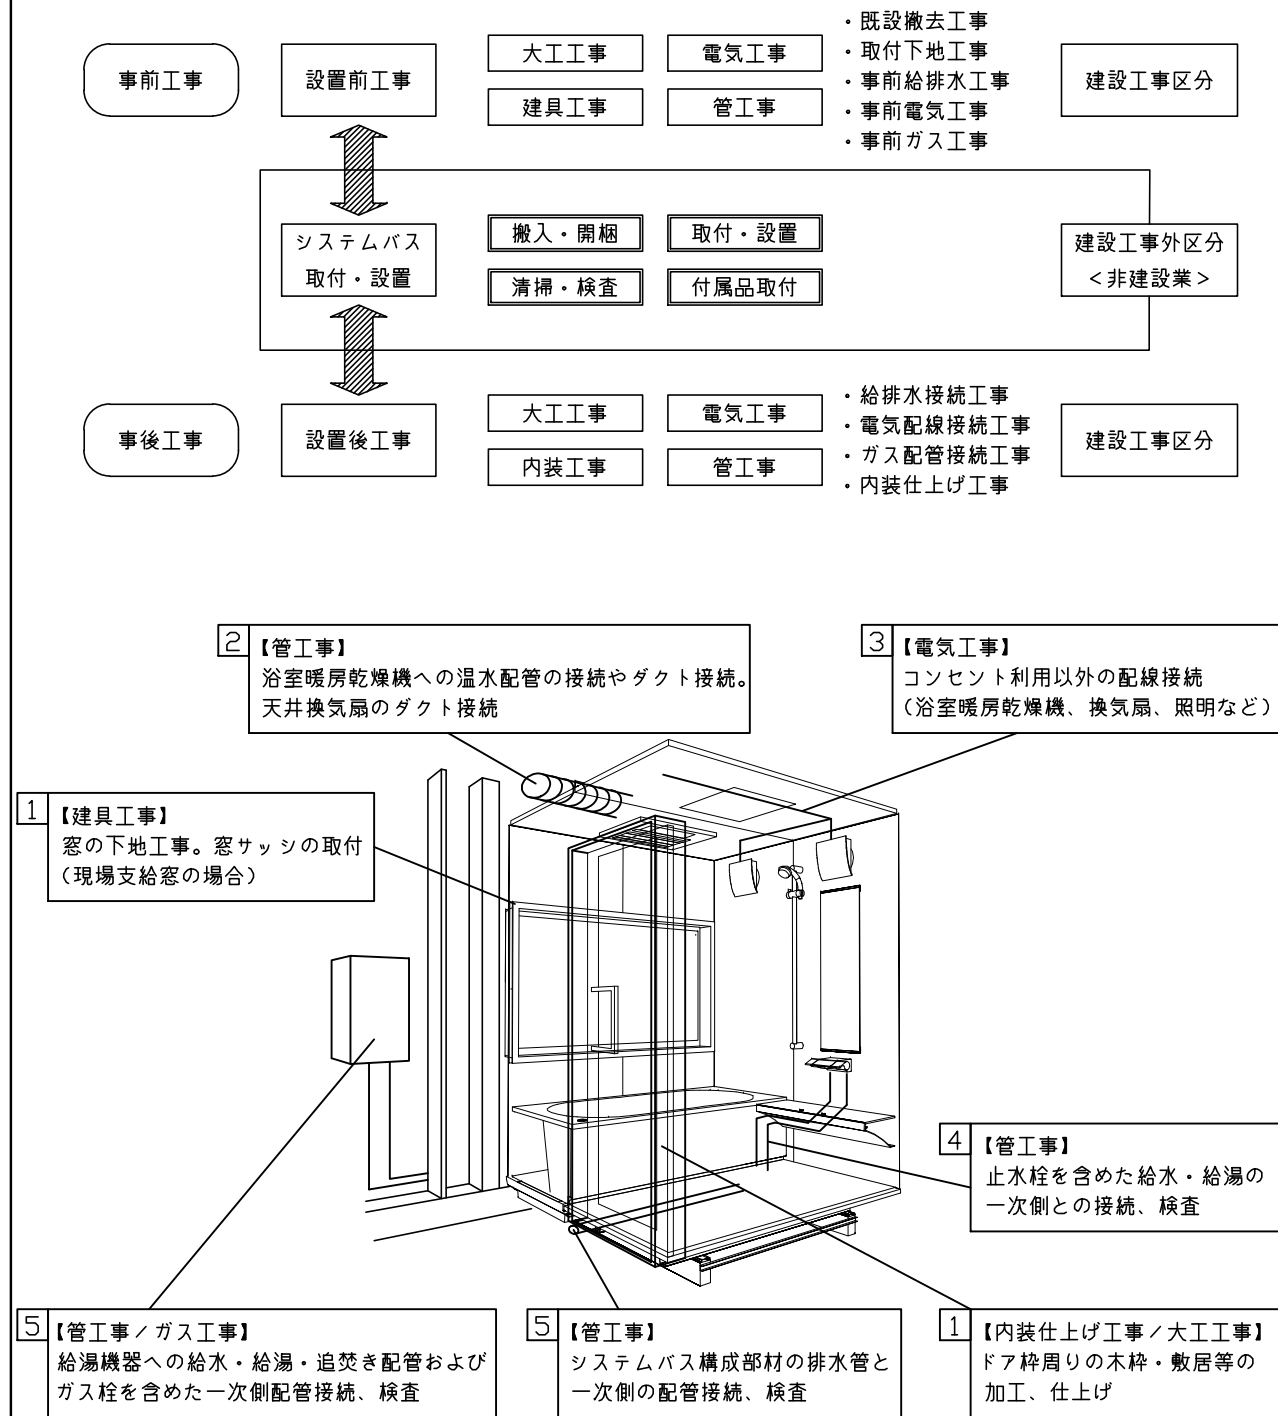

■システムバス 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置	
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
		電気	給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
			浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
		管	ウェザーカバーの外壁取付				○	○			建築の外装仕上げ工事
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
	1 3	電気 他	建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
			内装仕上げ工事	○		○					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
			浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する

※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする

Takara standard
タカラストANDARD株式会社

現場名称： 横浜－新藤沢SR SB10様邸

現場番号： A7803260

藤沢営業所

伸びの美浴室

プラン番号： 2710B-2012-0016T

担当営業： SB10


工事区分表

作成日： 2021年3月18日

担当アドバイザー：



■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。






■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

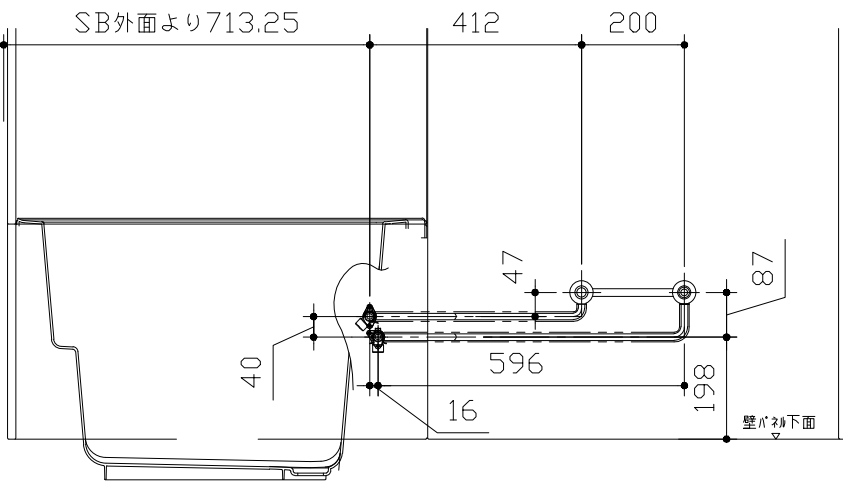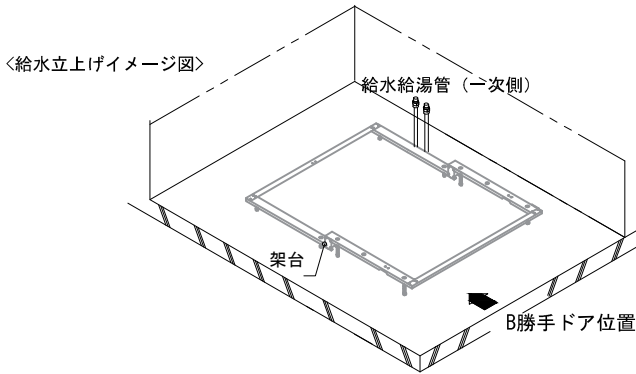

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置
■	排水管立上げ推奨範囲（VP50）

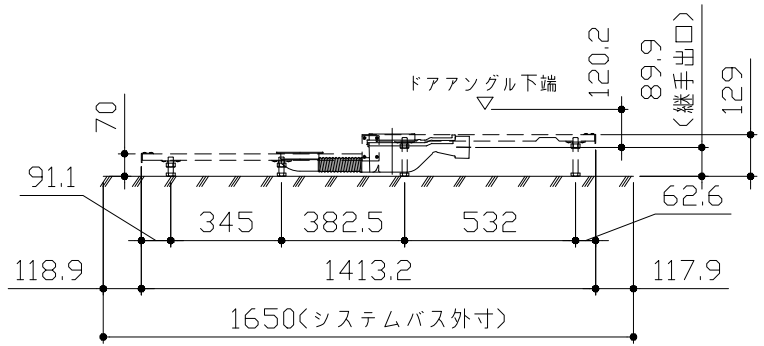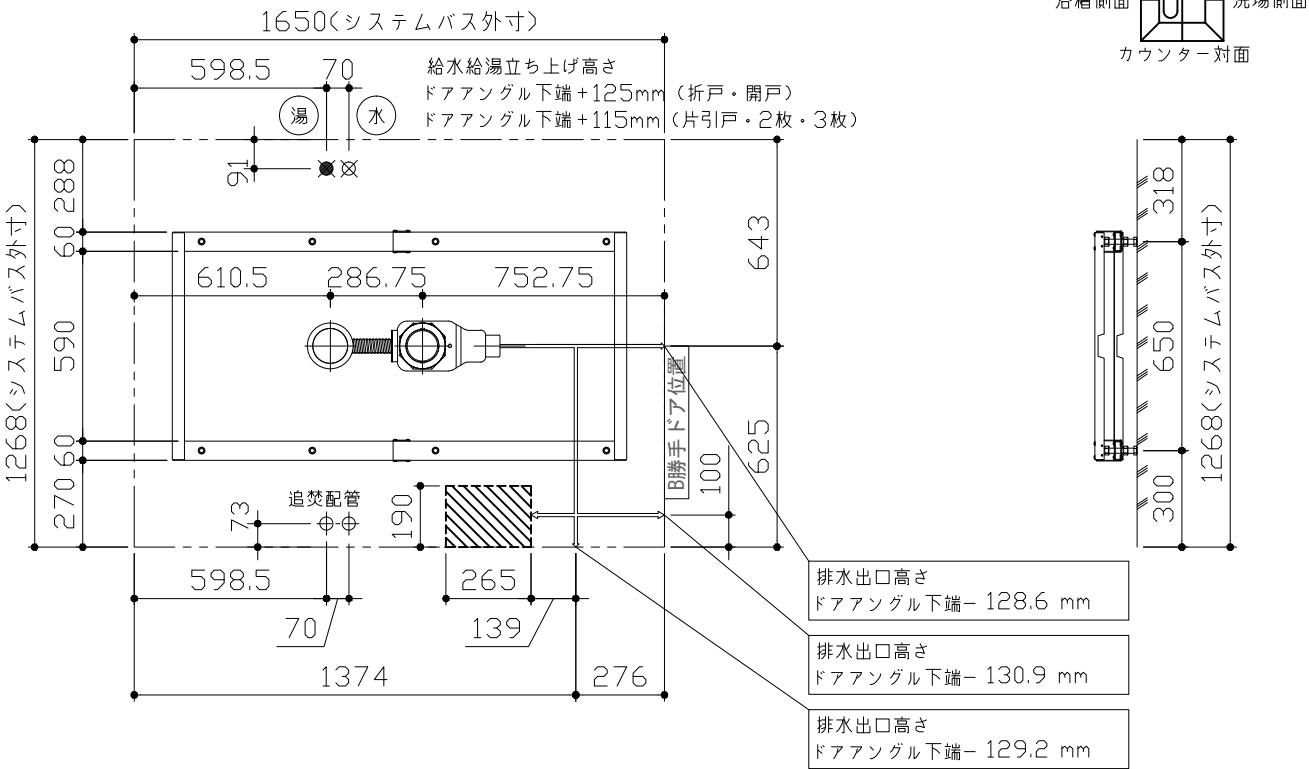

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

＜給水給湯管取合詳細図＞





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・浴槽パンの配管導入口下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

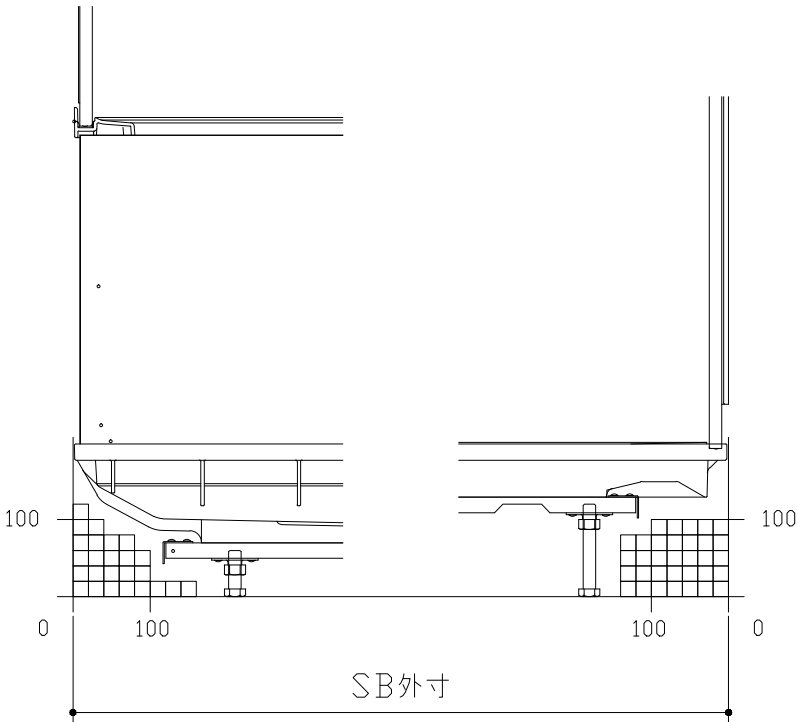


A矢視

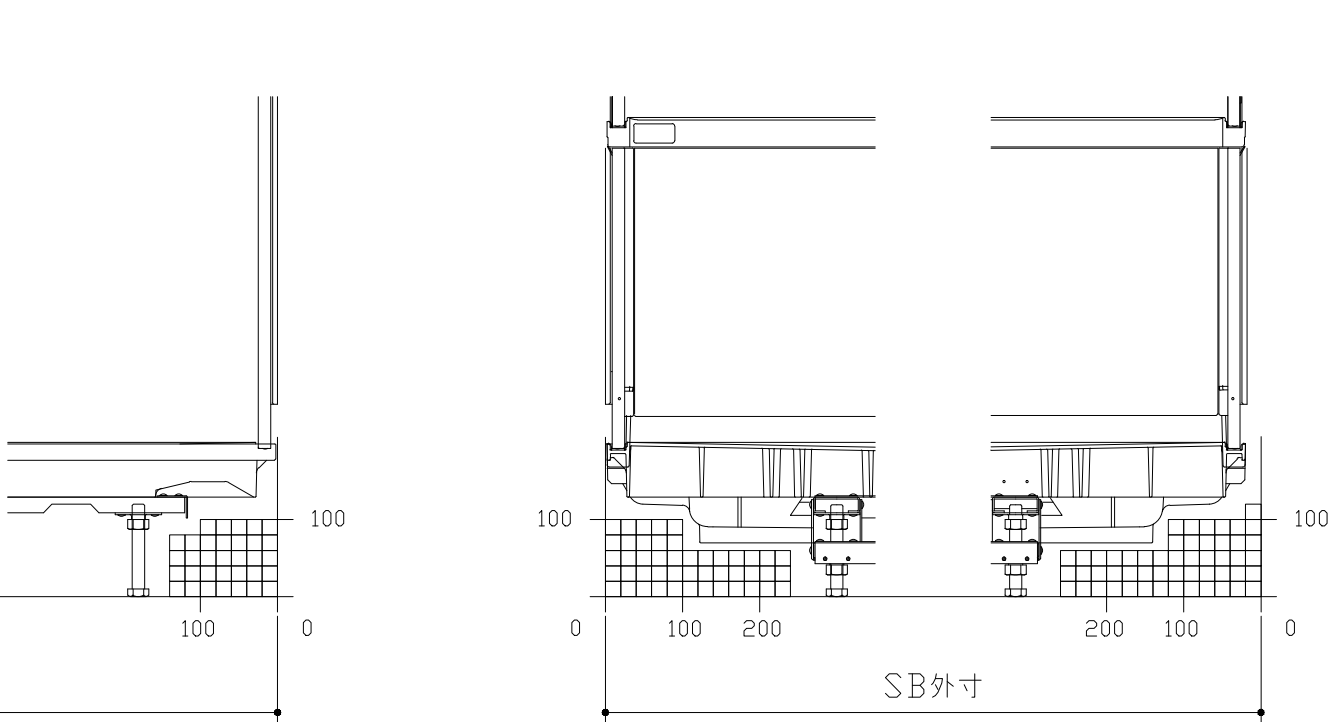


B矢視

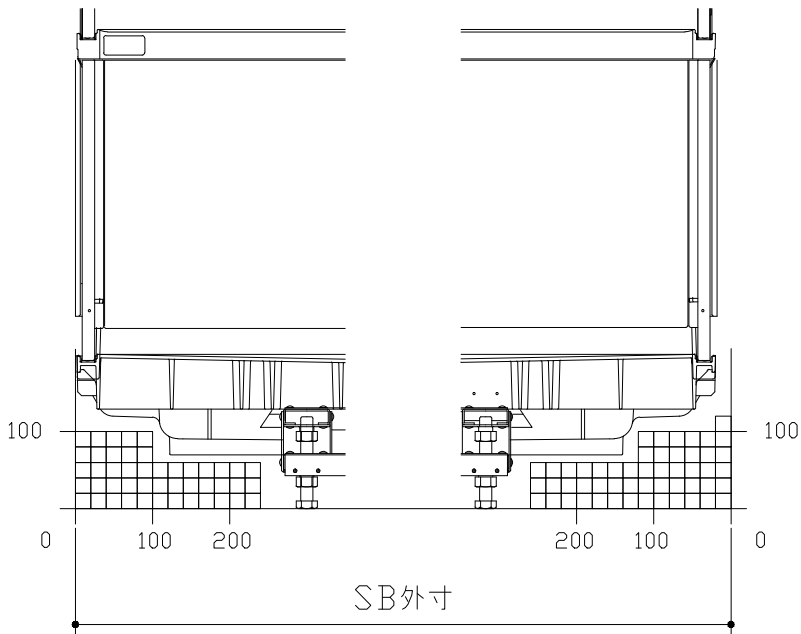


C矢視

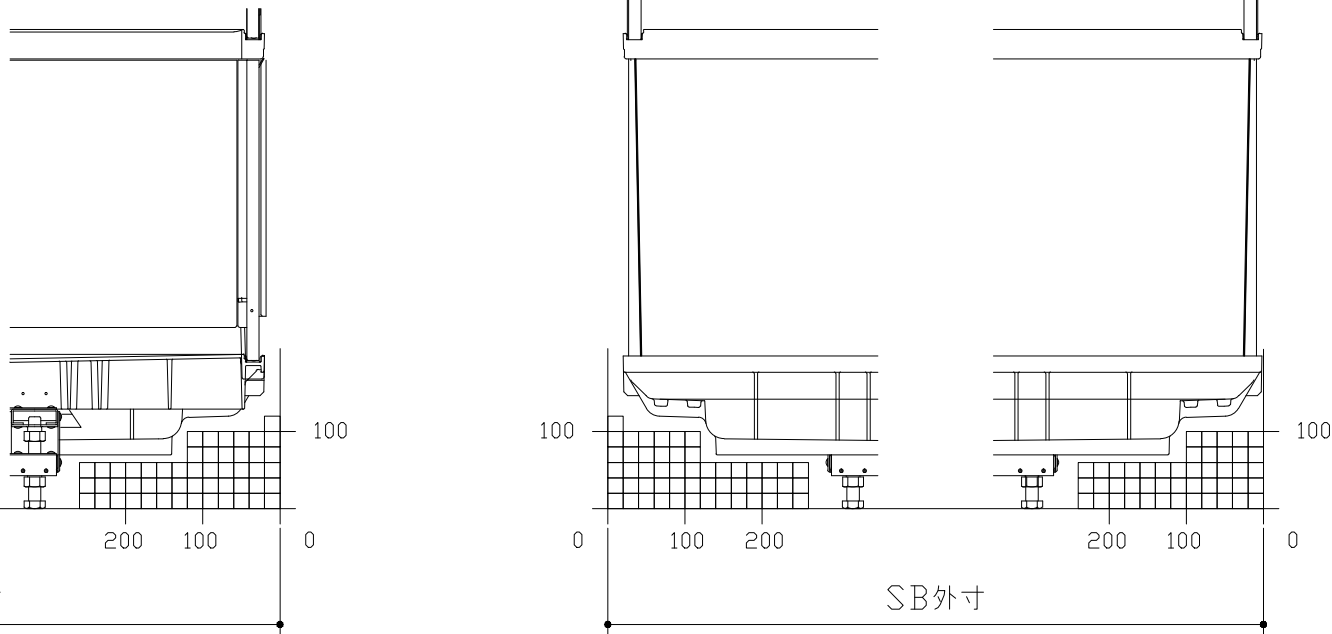

D矢視


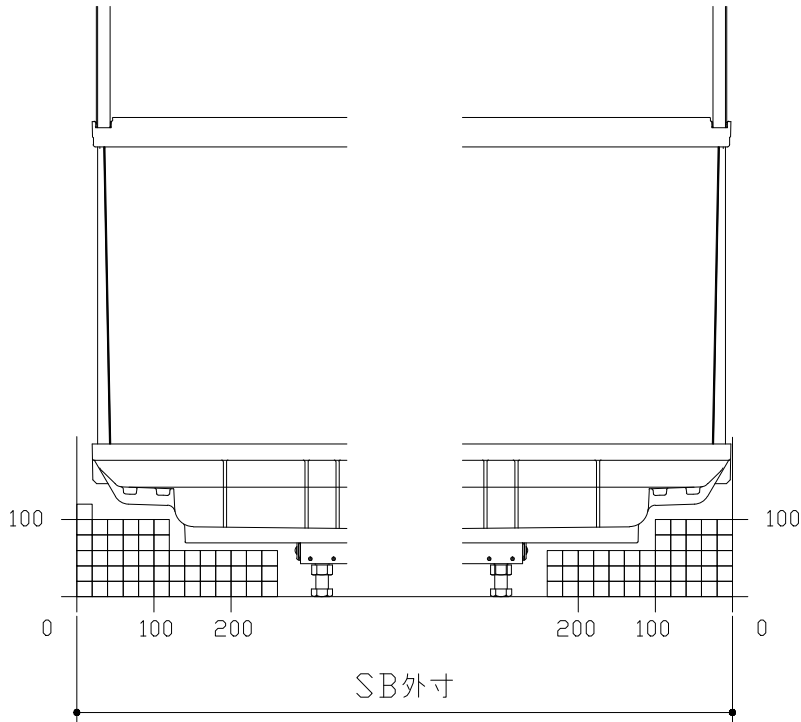


E矢視

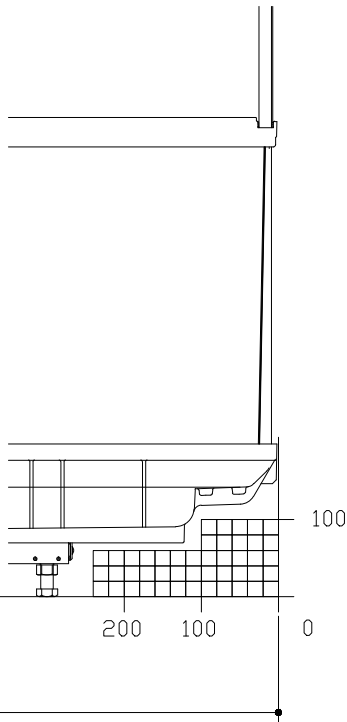


F矢視

キープクリーンドア：開き戸・タテ型換気口

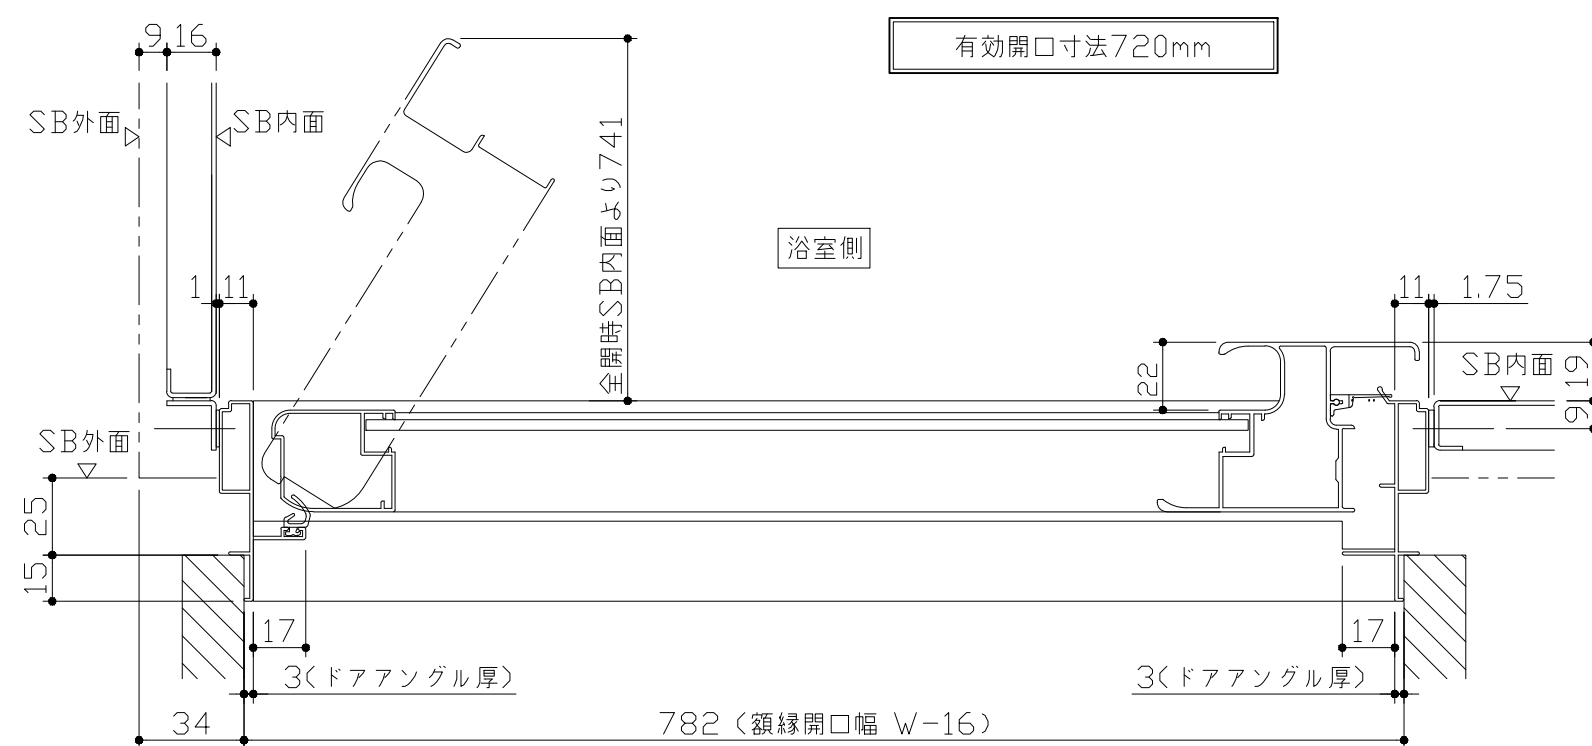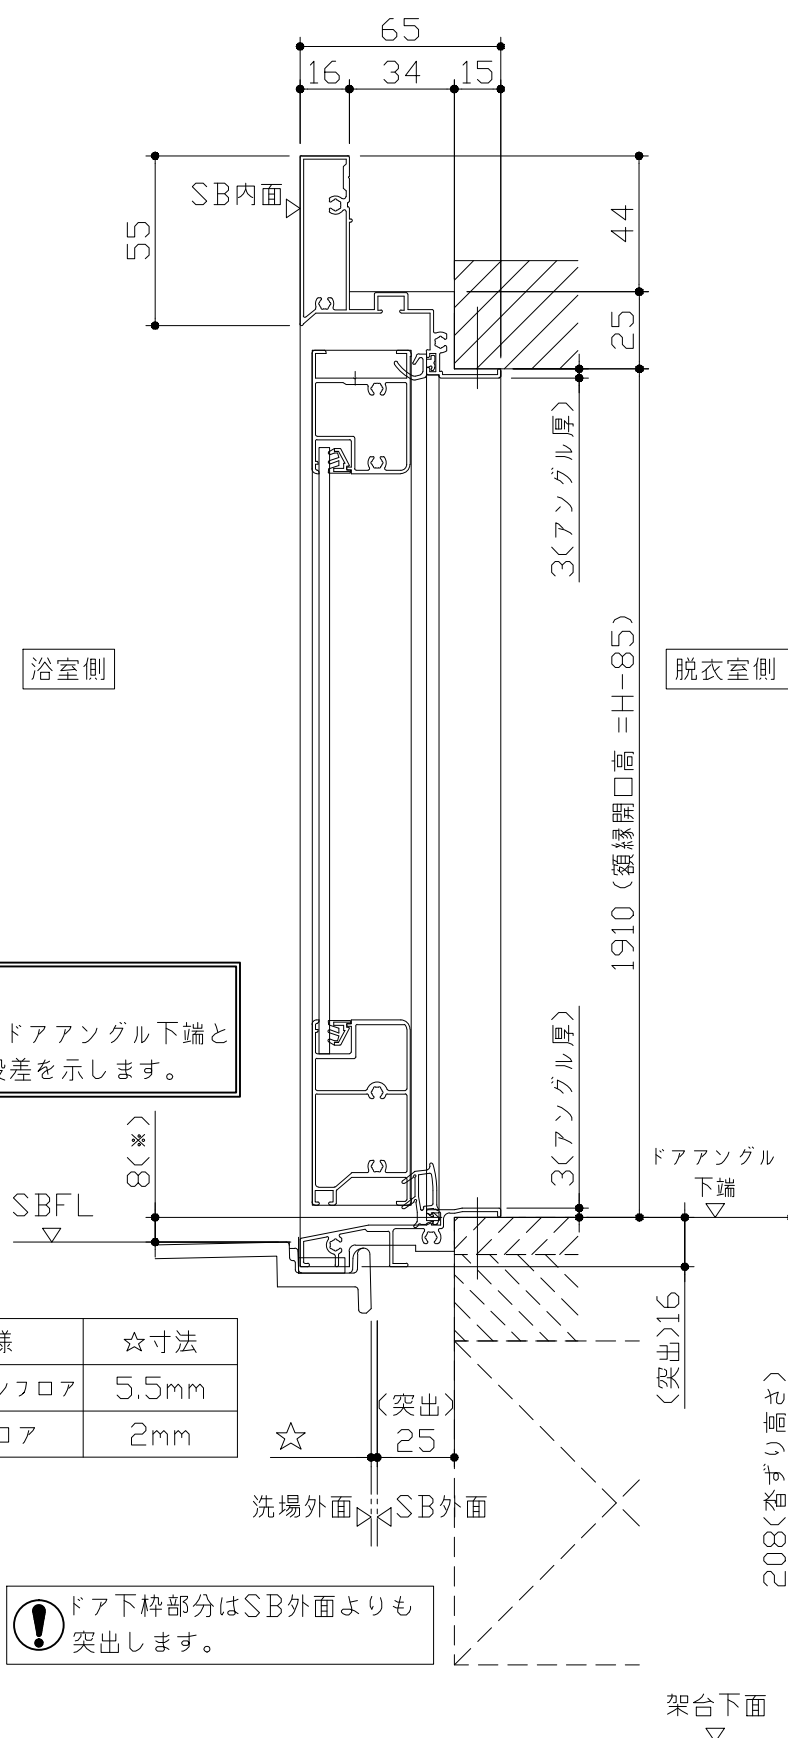



ドア開き角度65°以上でタオル掛けと
干渉の恐れがあります。





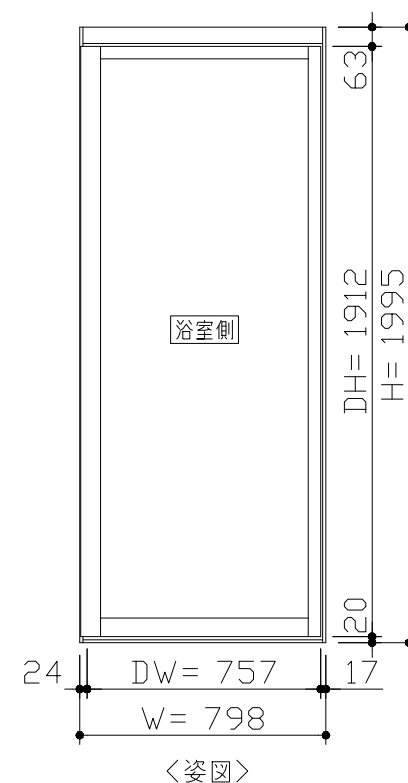







- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。




〈参考寸法図〉





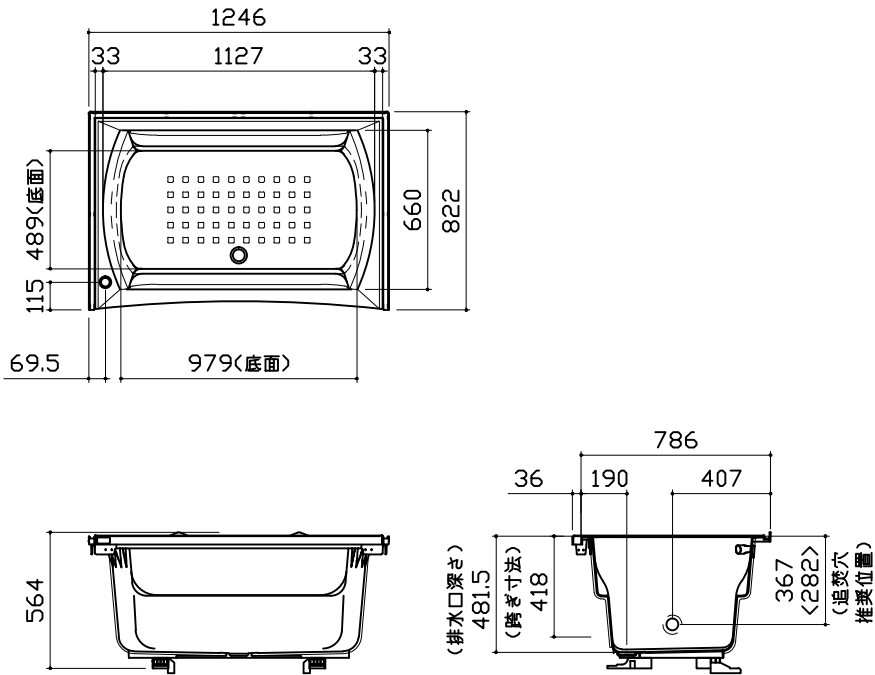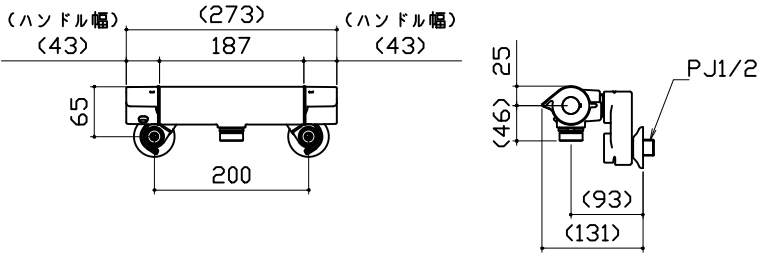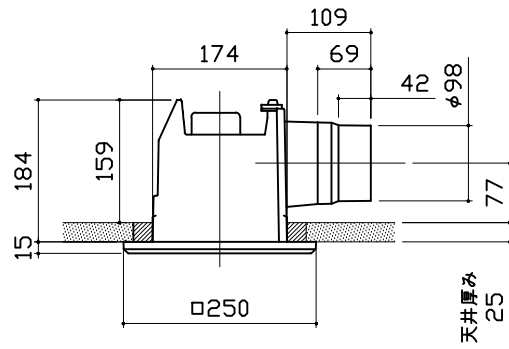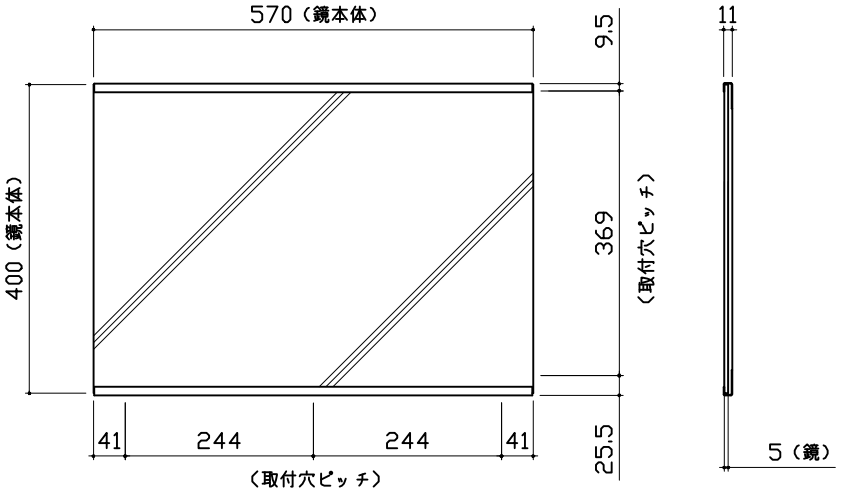浴槽	洗い場用水栓	照明		
 ※ 漏水受け仕様の場合は<>内寸法参照のこと		天井付ミニ照明 LED 6.9W (1灯あたり) 		
換気機器	カウンター	ミラー		
管工事 	本体：ABS 	枠：SUS304 t0.8 ミラー：表面防曇コートあり（横長クリアミラー） 表面防曇コートなし（横長ミラー） 		
Takara standard タカラストANDARD株式会社		現場名称： 横浜－新藤沢SR SB10様邸 現場番号： A7803260 藤沢営業所		伸びの美浴室 プラン番号： 2710B-2012-0016T 担当営業： SB10 部材詳細図 1/2 作成日： 2021年3月18日 担当アドバイザー：

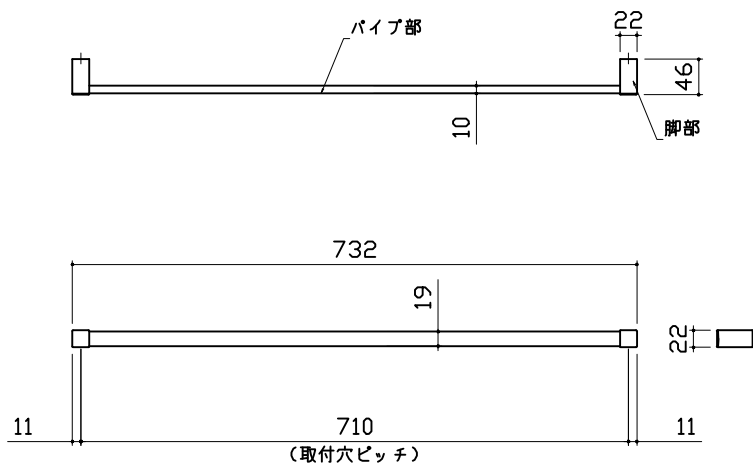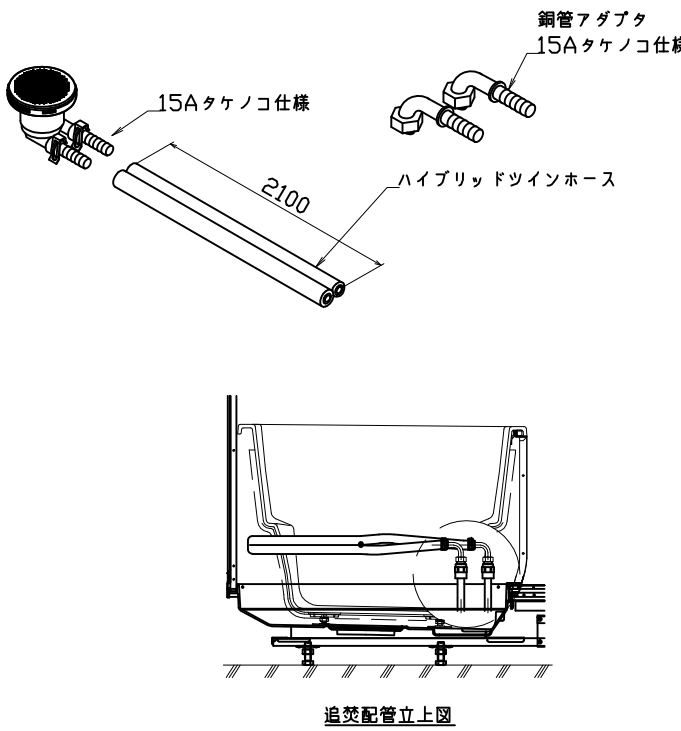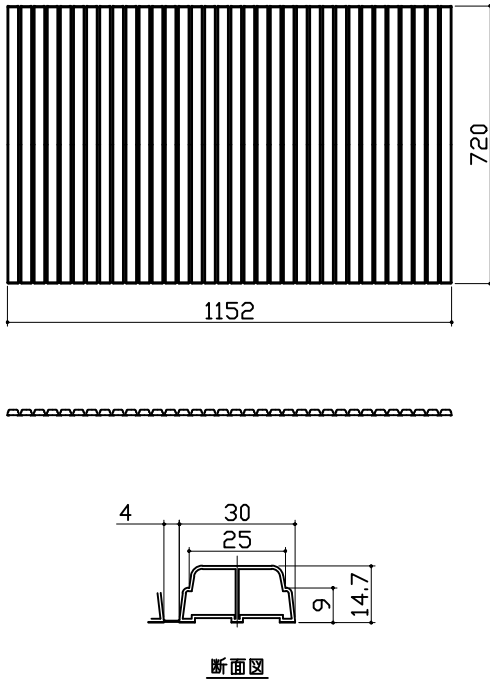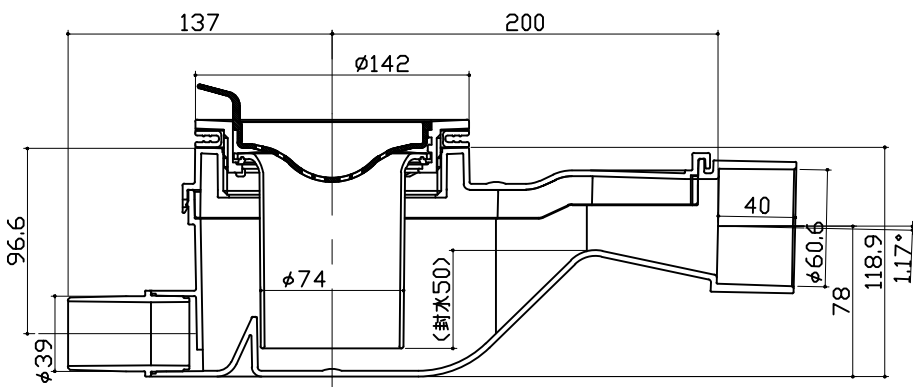ドア外タオル掛け パイプ部材質：ステンレス（ヘアライン仕上げ） 脚部材質：ABS 	循環金具・フロアダプタ関連 	風呂蓋 7077ZA-12 	
洗い場側排水トラップ 	浴槽側排水トラップ 		
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜－新藤沢SR SB10様邸 現場番号： A7803260 藤沢営業所	伸びの美浴室 プラン番号： 2710B-2012-0016T 担当営業： SB10	部材詳細図 2/2 作成日： 2021年3月18日 担当アドバイザー：

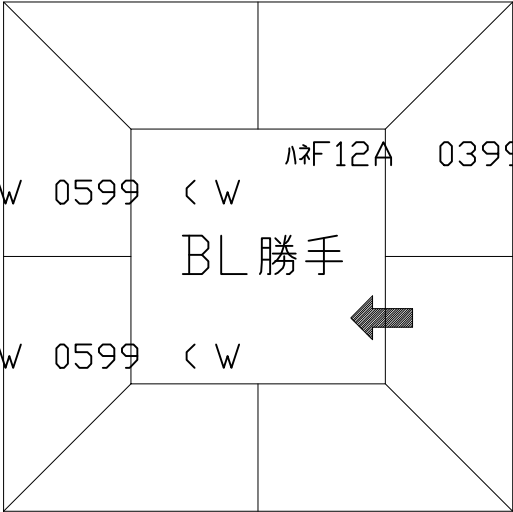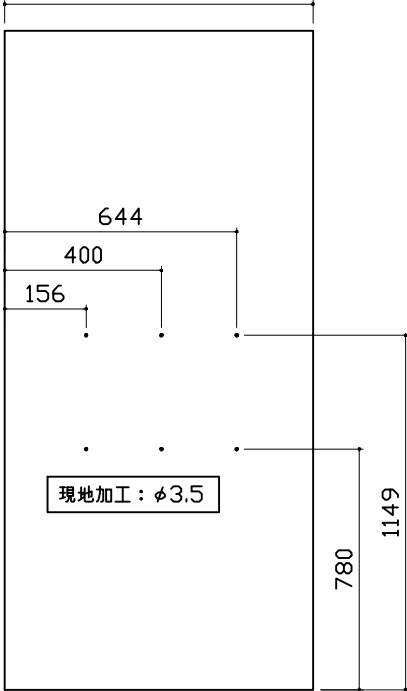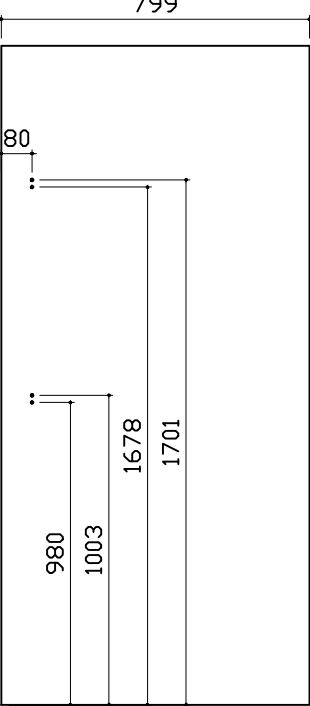パネル割図		ミラー	シャワーフックスライドバー		
ハF16C2C 0799 R<JPB ハM16C1N 0799 <JPB ハM12NW 0599 <W ハM12NW 0599 <W ハM16C1N 0799 <W ハF16A 0799 <W ハF12A 0399 <W BL勝手 		ハF16C2C 0799 R<JPB 799 644 400 156 現地加工：φ3.5 780 1149 	ハF16C2C 0799 R<JPB 799 80 980 1003 1678 1701 現地加工：φ3.5 		

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜-新藤沢SR SB10様邸	伸びの美浴室	穴開け指示図	1/1
	現場番号： A7803260	プラン番号： 2710B-2012-0016T	作成日： 2021年3月18日	
	藤沢営業所	担当営業： SB10	担当アドバイザー：	
