

システムバス 御見積書

御名前 UGS-7-18(WN) SB7 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランSPA

作成日 2025年8月23日
プラン番号 1817C-2508-0038T
現場番号 C3377259

タカラスタANDARD株式会社
◆平城京営業所
奈良県奈良市三条大路3丁目444番地の1
TEL 0742-32-5290 / FAX 0742-36-2180

◆平城京ショールーム
TEL 0742-35-0568 / FAX 0742-35-0616

商品
御見積金額 **¥909,500 (税込 ¥1,000,450)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥164,500 (税込 ¥180,950)**
《参考》別途 現場配送費 **¥0 (税込 ¥0)**

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
平城京SR	平城京SR	平城京SR

◆ 備考

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1418 (AR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームダークグレー
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	クリスタルパールホワイト
浴槽形状	ラウンド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ダークグレー / ブラック
浴槽前カウンターカラー	—
エプロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ジオマーブルアイボリー
パネルカラー(周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 60Hz

◆ 御確認事項

御名前 UGS-7-18(WN) SB7

様

現場番号	C3377259	プラン番号	1817C-2508-0038T	作成日	2025/8/23
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1418サイズ		1	797,000	797,000
2	架台	低床タイプ ボルト脚架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・1面デザイン/周辺レギュラークラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームダークグレー)	1		
7	排水口カバー	ステンレス	1		
8	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(クリスタルパールホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
11	浴槽形状	人大ラウンド浴槽(ベンチ付)	1		
12	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
13	うるぽか湯	なし	1		
14	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
15	浴槽パン	あり	1		
16	洗い場用水栓	タッチ水栓:樹脂製ホース(メタル調)FTB230K 水栓上部カウンター(ダークグレー)	1	+91,000	+91,000
17	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:KVK FTB230K	1		
18	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
19	カウンター	人造大理石カウンター	1		
20	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
21	浴室パネル	プレミアムクラス(一面デザイン)(Fパネル)	1	+15,000	+15,000
22	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
23	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
24	換気機器	天井換気扇ブラック	1	+3,000	+3,000
25	換気機器開口	工場開口	1		
26	照明	ダウンライト照明(3灯)(白色)	1	-3,000	-3,000
27	天井照明開口	工場開口	1		
28	ミラー	横長ミラー	1	-7,500	-7,500
29	風呂フタ	風呂フタなし	1	-15,500	-15,500
30	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
31	ハンドバー	メタル I型400タイプ	1	+8,000	+8,000

御名前 UGS-7-18(WN) SB7 様

現場番号	C3377259	プラン番号	1817C-2508-0038T	作成日	2025/8/23
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	収納棚	収納棚なし	1		
33	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
34	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
システムバス合計			34		¥909,500
商品総合計			34		¥909,500

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費

¥164,500 (税込 ¥180,950)


《参考》別途 現場配送費

¥0 (税込 ¥0)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

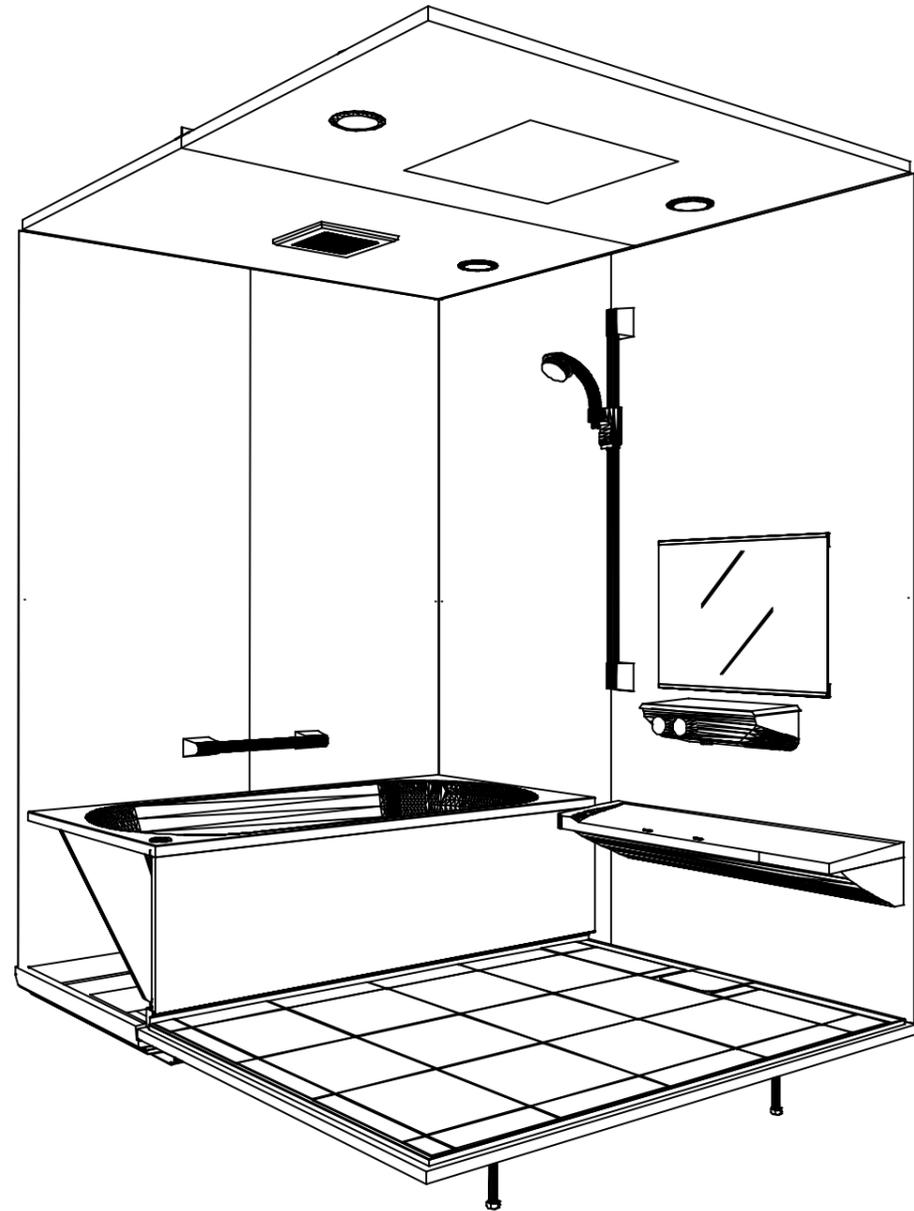


鳥瞰図

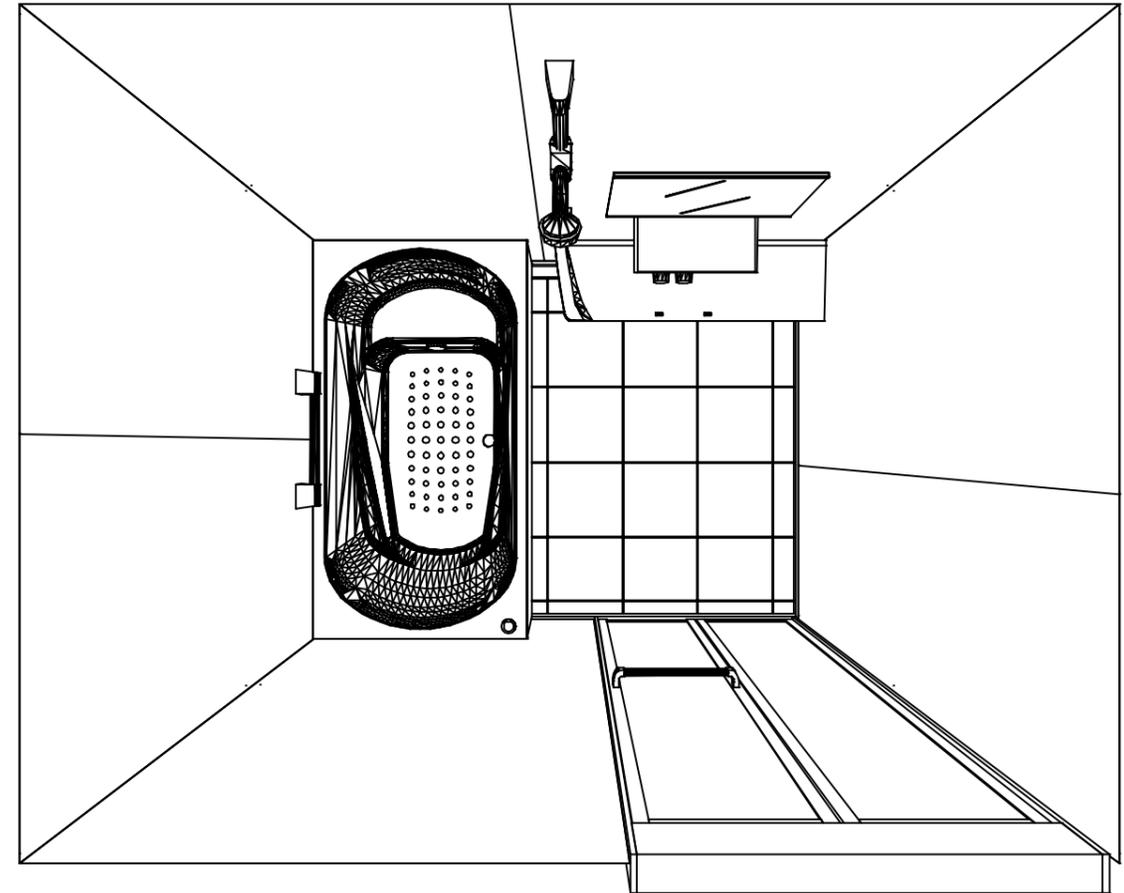


1418

フラット天井
天井換気扇



このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

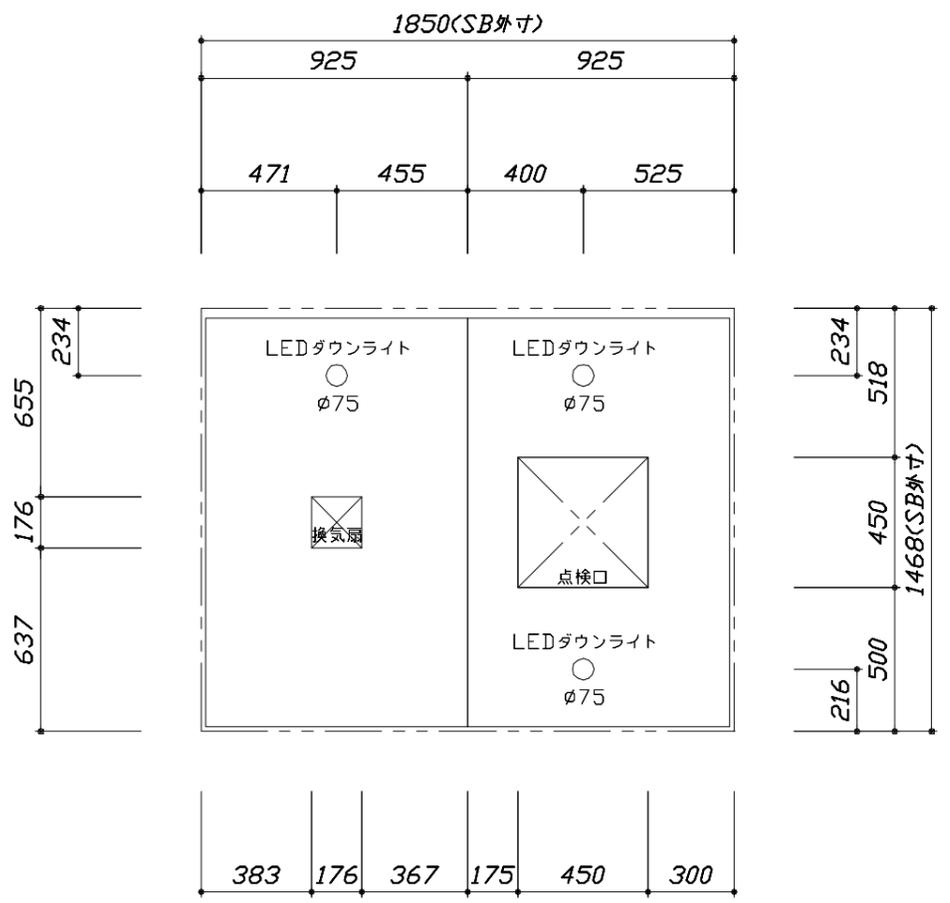

<天井伏図>

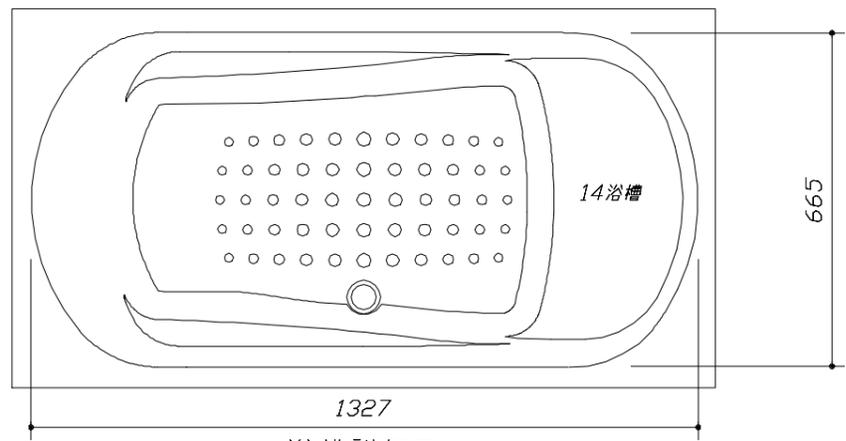

<浴槽詳細図>

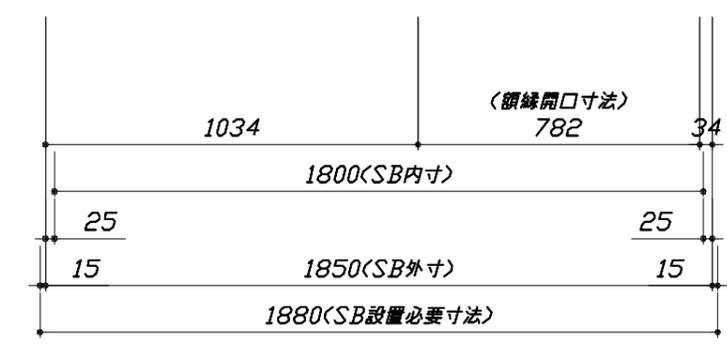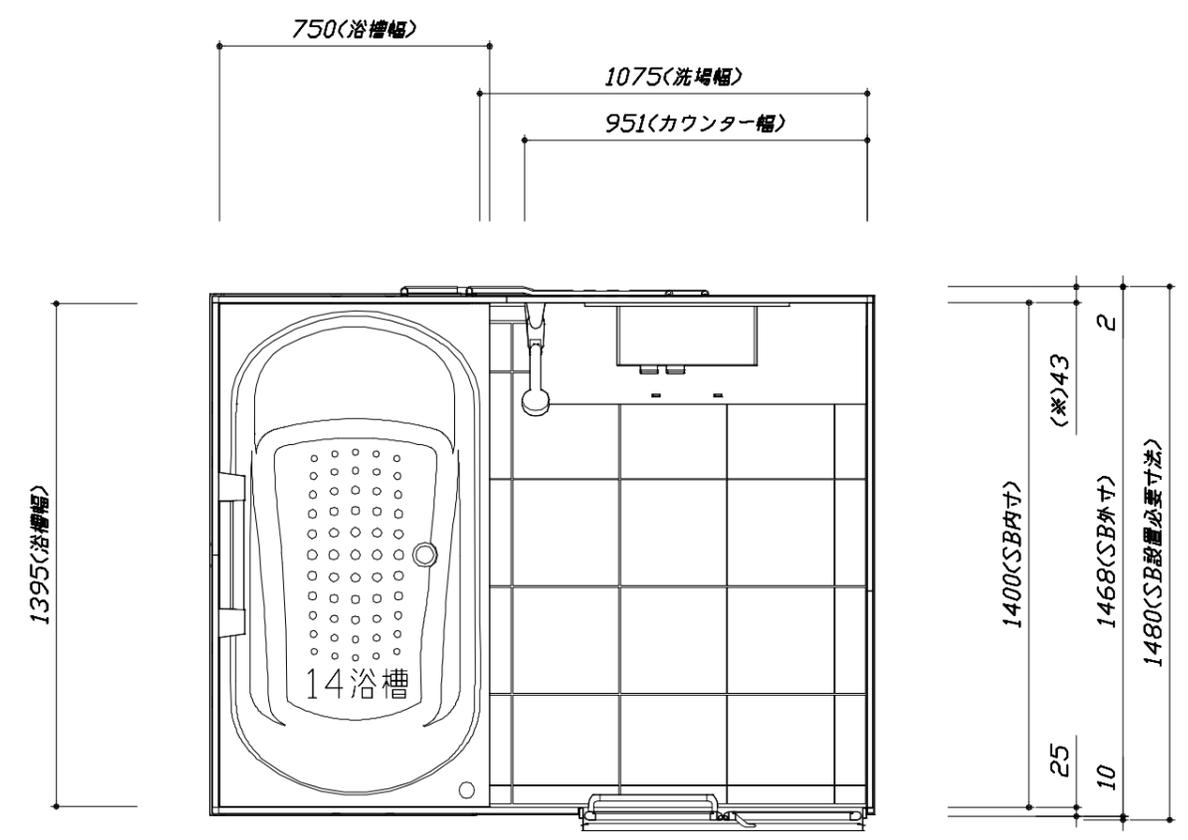

<平面図>

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称：UGS-7-18(WN) SB7様邸
現場番号：C3377259
平城京営業所



GRANSPA グランspa
プラン番号：1817C-2508-0038T
担当営業：平城京SR

施工図1 縮尺：1:25,20
作成日：2025年8月23日
担当アドバイザー：平城京SR


縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

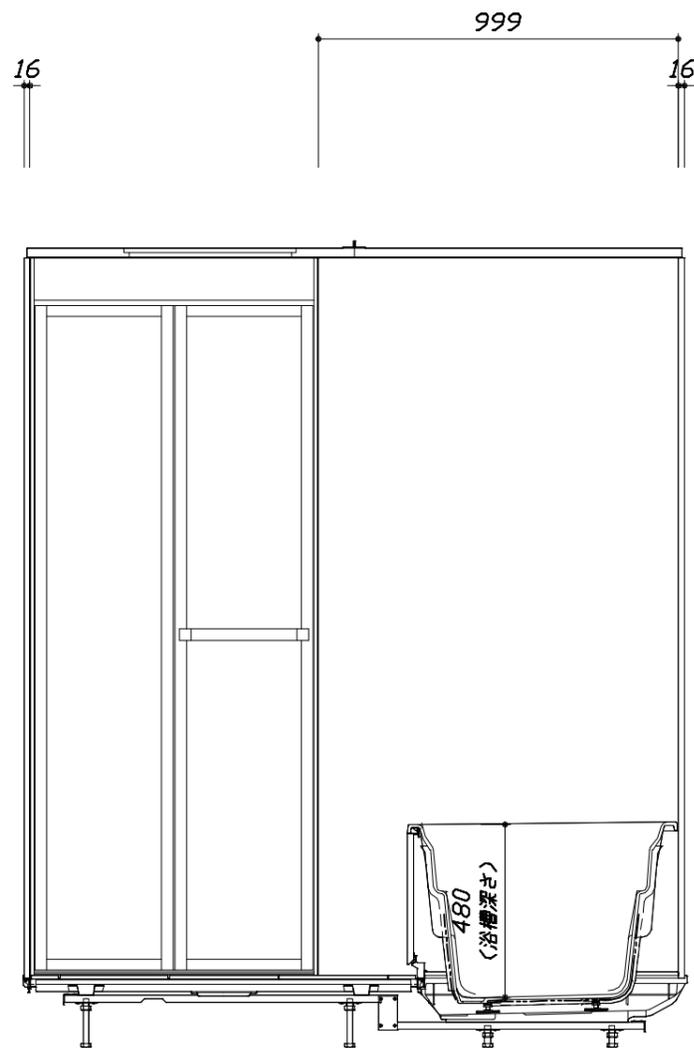

<カウンター対面図>


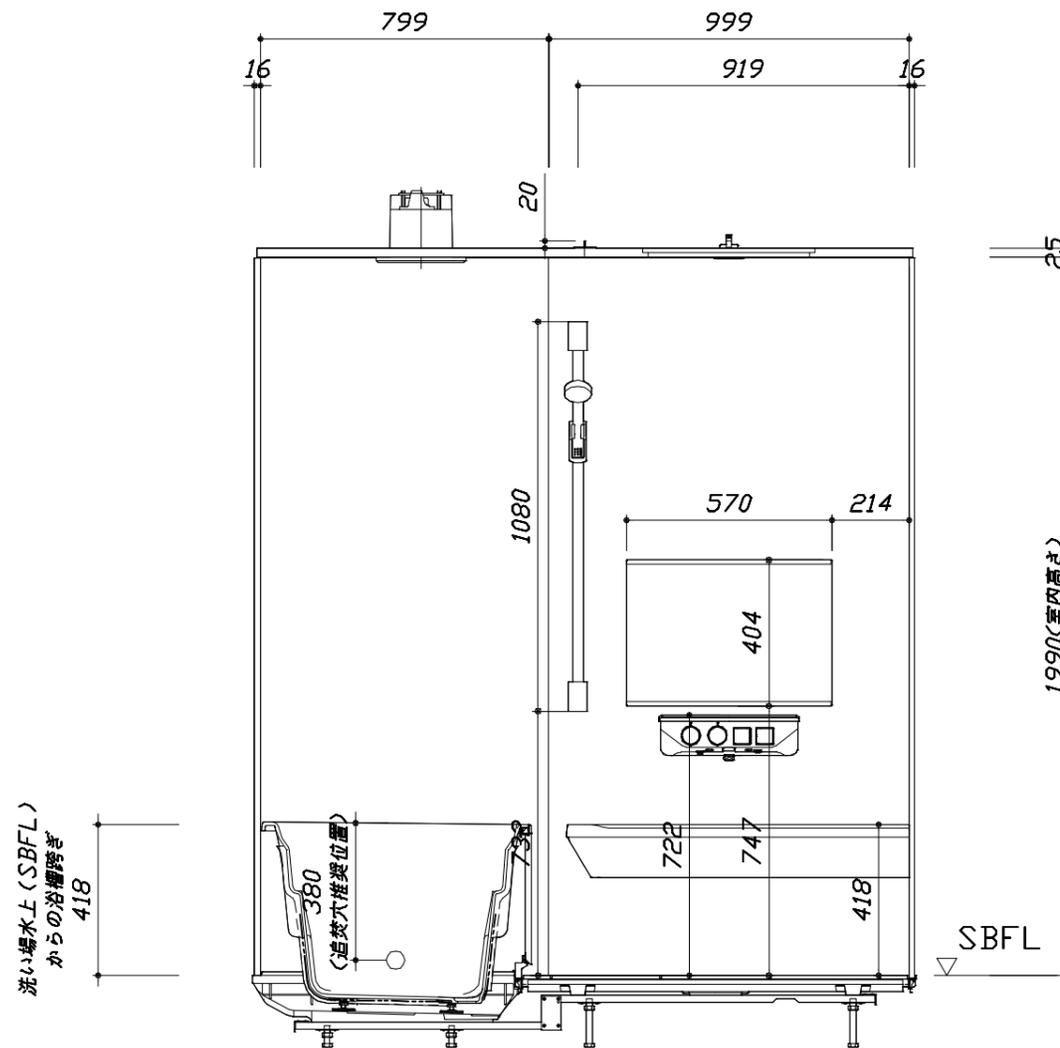


<カウンター面図>


■ボルト脚架台高さ寸法
 各ずり高さに対して
 -9~+11mm調整可能

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

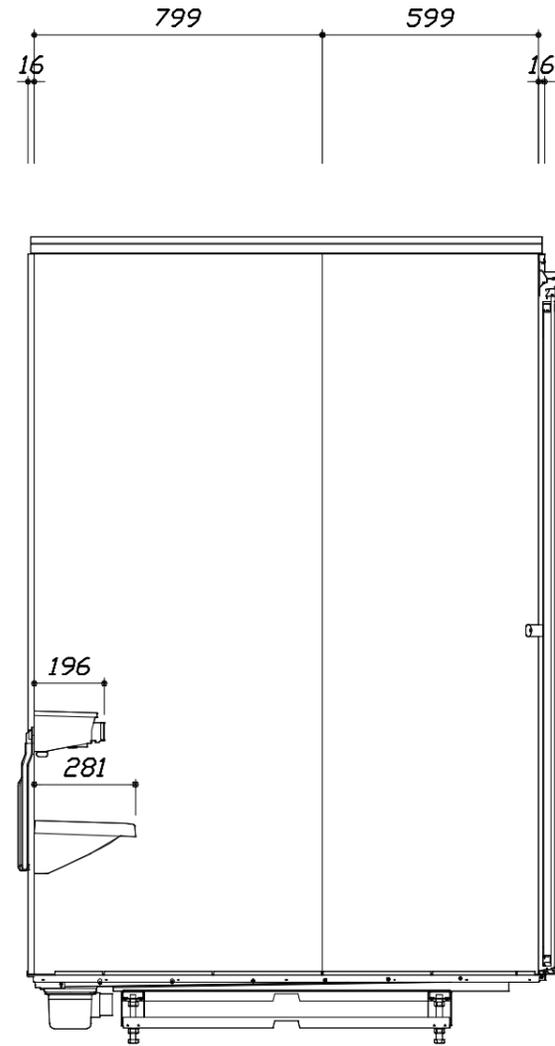

< 洗場側面図 >

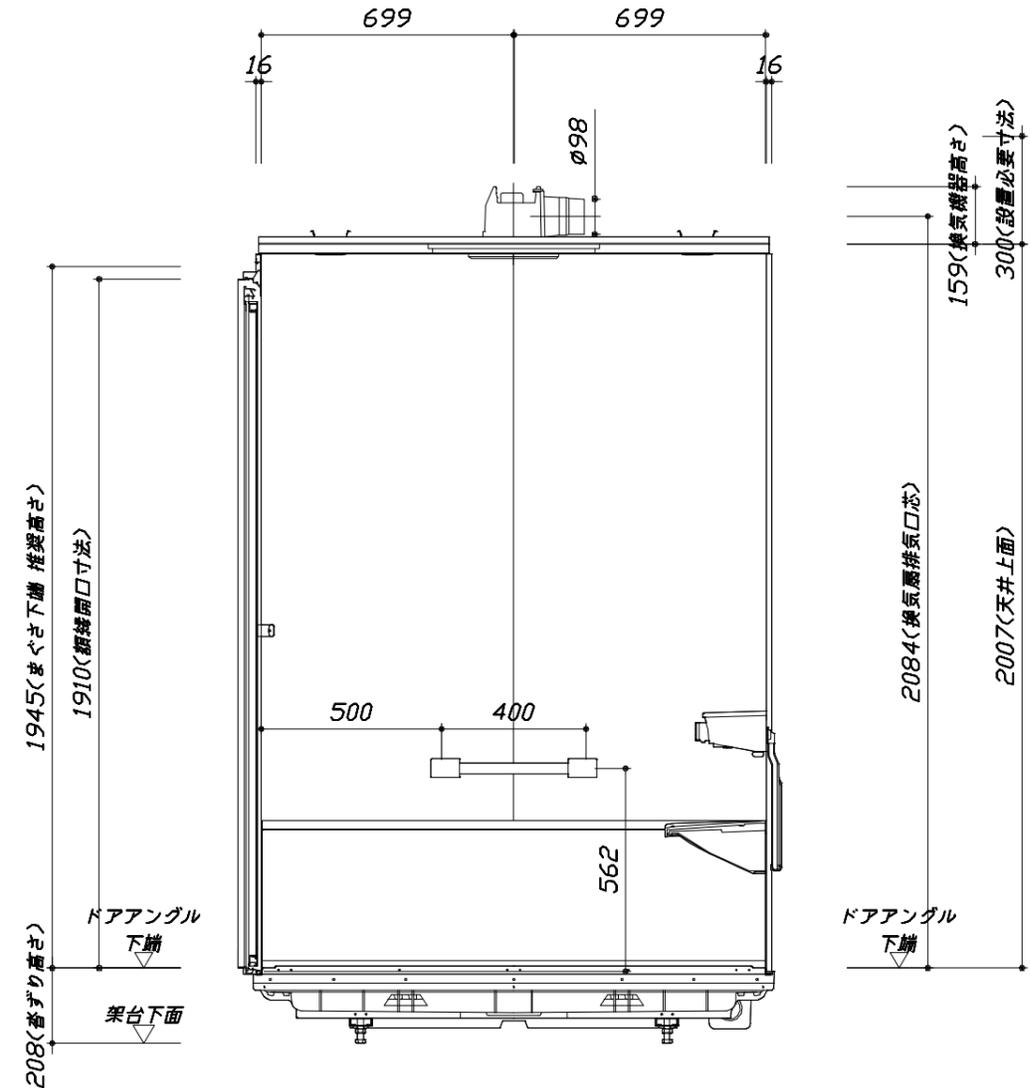

< 浴槽側面図 >

■ボルト脚架台高さ寸法
杓すり高さに対して
-9~+1mm調整可能

Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： UGS-7-18(WN) SB7様邸
現場番号： C3377259
平城京営業所

GRANSPA グランspa
プラン番号： 1817C-2508-0038T
担当営業： 平城京SR

施工図3
縮尺： 1:20
作成日： 2025年8月23日
担当アドバイザー： 平城京SR

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1418サイズ(室内容量5.0立方メートル)
ドア勝手	AR勝手
架台	ボルト脚架台(低床タイプ)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>裏面保温材・高断熱仕様(発泡ウレタン)
浴槽形状	ラウンド浴槽(ベンチ付)(14浴槽・275リットル) 追い焚き穴：あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂(FRP)
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材(発泡ポリエチレン)
カウンター	人造大理石カウンター：人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さFタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	化粧サッシ付パネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓1	—
窓2	—
窓枠1	—
窓枠2	—
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂 浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VP50
製品重量	280kg

アクセサリ仕様表

ミラー	横長ミラー
収納棚	—
タオル掛け	—
洗場側水栓	プッシュ式・サーモスタット(KVK FTB230K)(樹脂ホース：メタル調)
浴槽側水栓	—
兼用水栓	—
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)(スライドバー-T1020S MH)
照明	LEDダウンライト(LED 9.3W白色)(3灯)
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W)(ダクト径φ98)ブラック
フロフタ	—
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	—
ハンドバー②	—
ハンドバー③	—
ハンドバー④	ステンレス製 I型400タイプ メタル
ハンドバー⑤	—
ハンドバー⑥	—
ハンドバー⑦	—

本体カラー

浴槽	WN：クリスタルパールホワイト
カウンター	KA：ダークグレー
パネル(カウンター面)	JDS：ジオマーブルアイボリー
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カウンター	KA：ダークグレー
浴槽エプロン	K：ブラック
洗場	HC：カームダークグレー
ドア / 天井	W：ホワイト / B：チャコールブラック
収納棚	—
タオル掛け	—
ランドリーセット	—

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置	
設置前工事	1 2 3	大工 土 建 具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
電気	給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事		
	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事		
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□		浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置						□		洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置						□		浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置						□		天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置【注記1】						□		カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付【注記1】						□		水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付【注記1】						□		浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付【注記1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付						□		浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付【注記1】						□		電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付						□		システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付【注記1】						□		システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付【注記1】						□		システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填						□		接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査【注記2】						□		完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ		○						建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事					○			浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事					○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査
	4 5 6	管	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付					○	○		建築の外装仕上げ工事
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事					○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
	1 3	電気 他	建築側排水配管との接続工事【注記3】					○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）					○	□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
			内装仕上げ工事		○	○					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
			浴室用電源配線、接続工事						○		浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○		浴室全体の電気器具、配線接続工事	

※【注記1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
 ※【注記2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
 ※【注記3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。



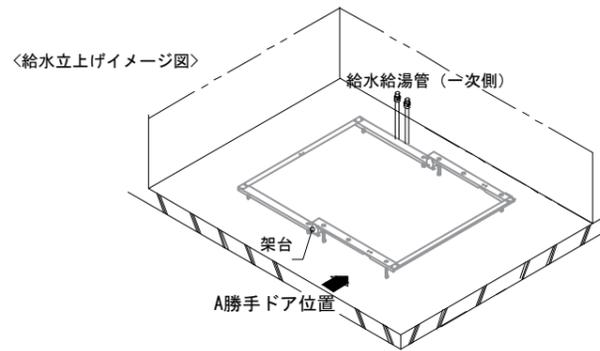


■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置
▨	排水管立上げ推奨範囲 (VP50)

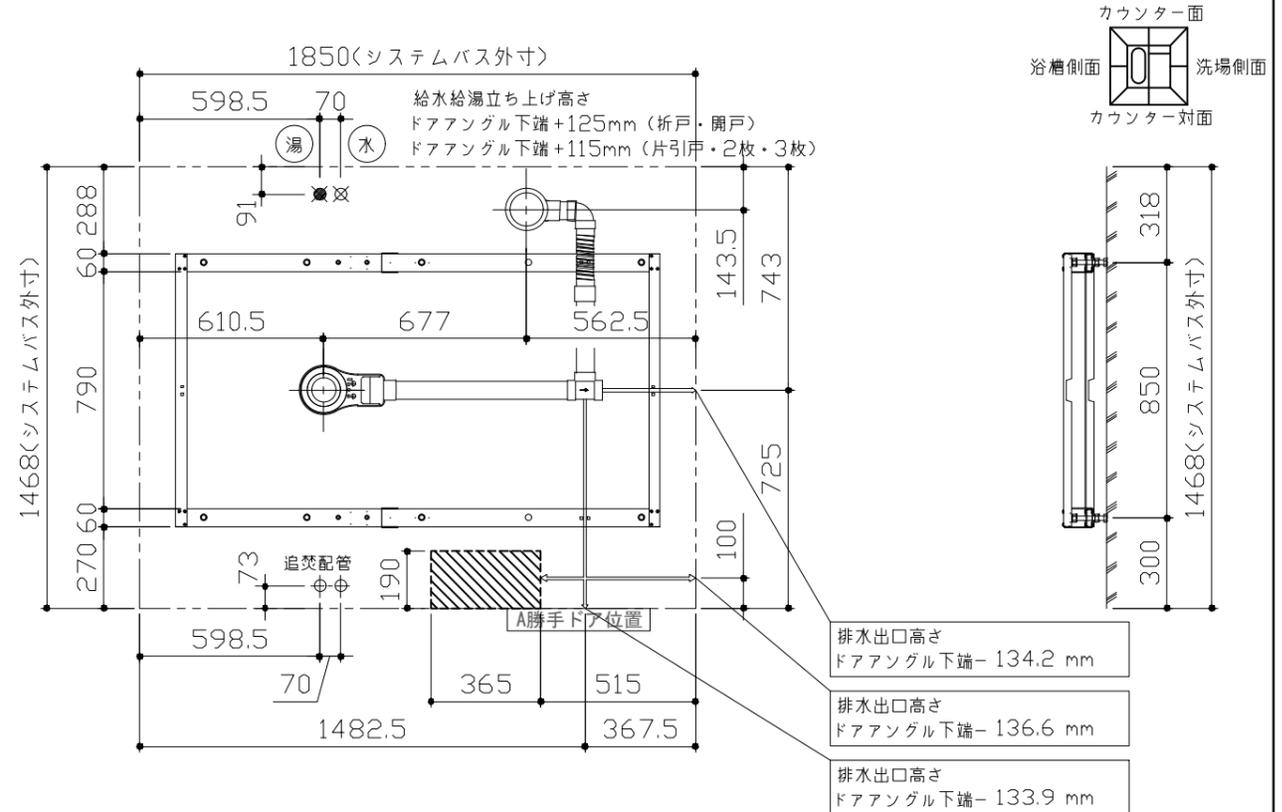

排水出口高さ ドアアングル下端- 134.2 mm
排水出口高さ ドアアングル下端- 136.6 mm
排水出口高さ ドアアングル下端- 133.9 mm

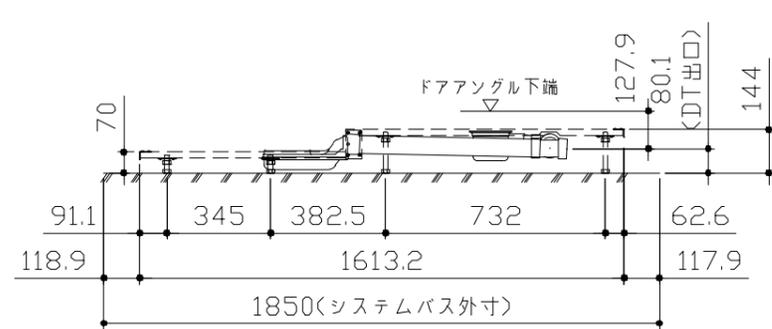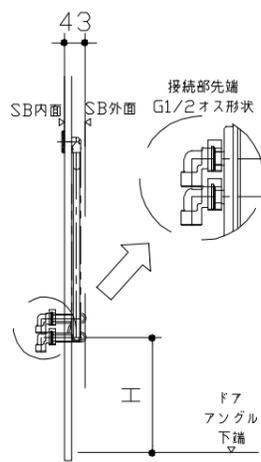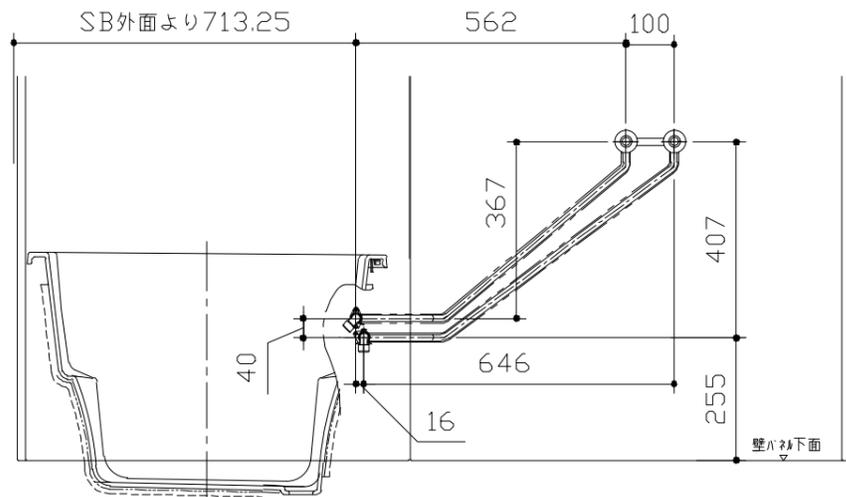

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉

ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230




■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・浴槽パンの配管導入口下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水柱・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

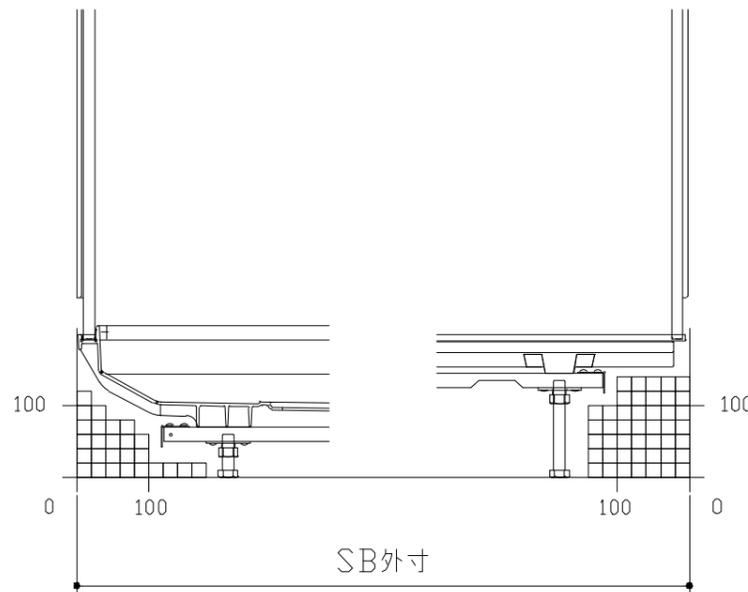


A矢視

B矢視

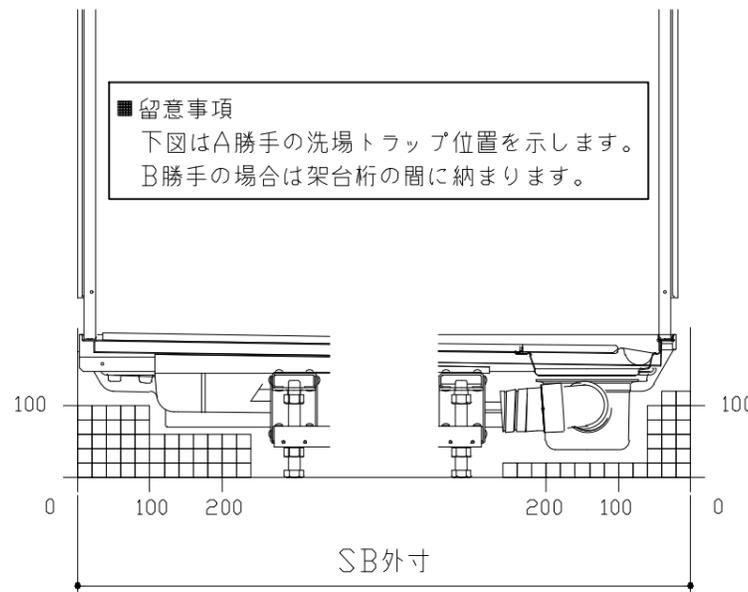


C矢視

D矢視

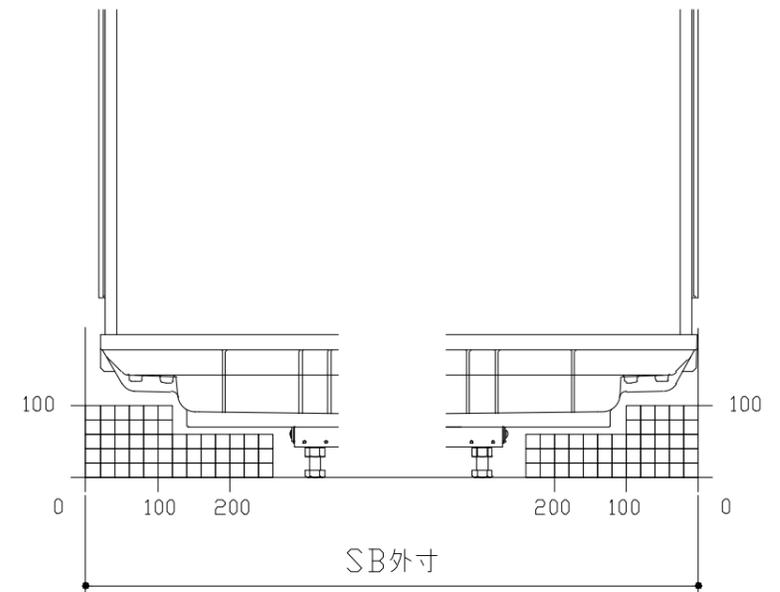

E矢視


F矢視

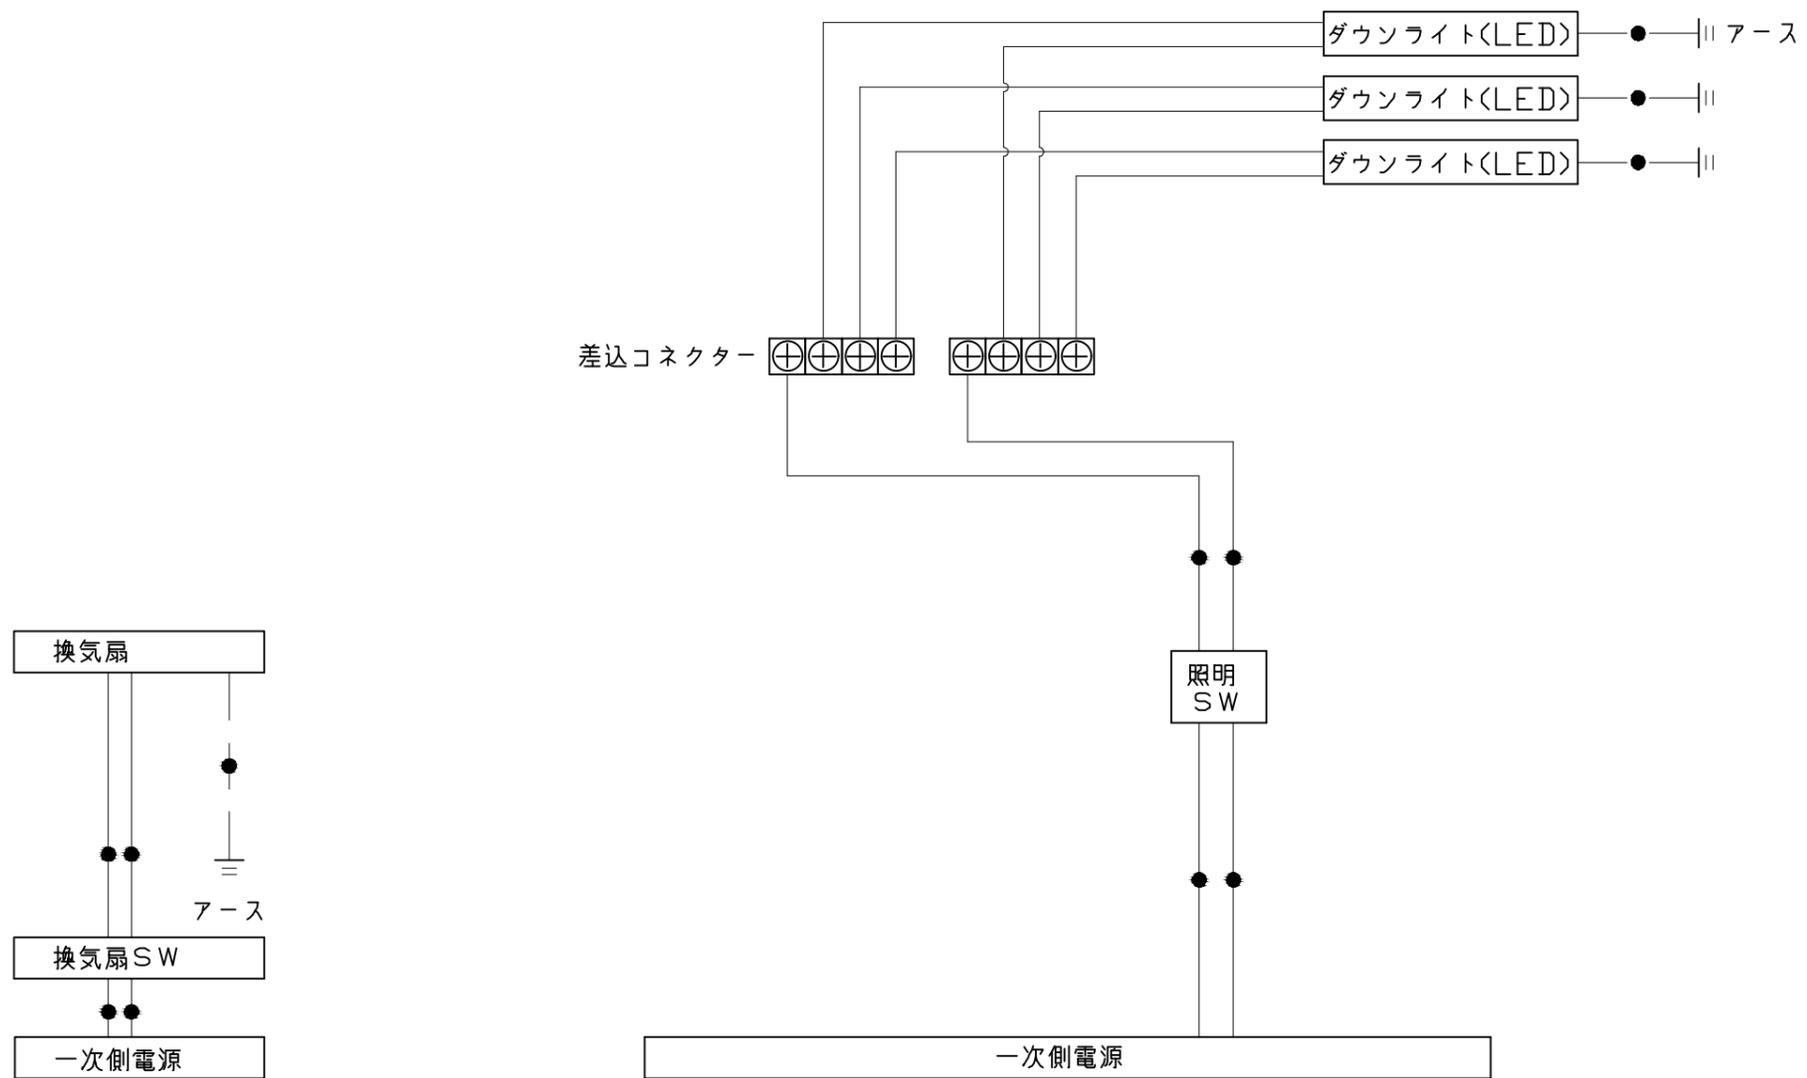


一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。


浴槽

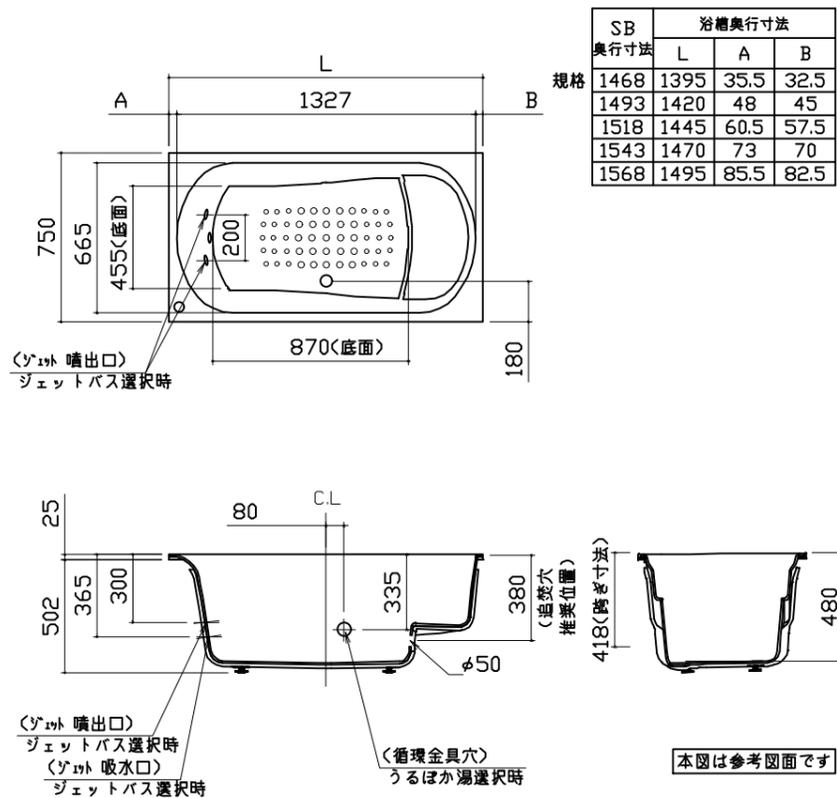


洗い場用水栓

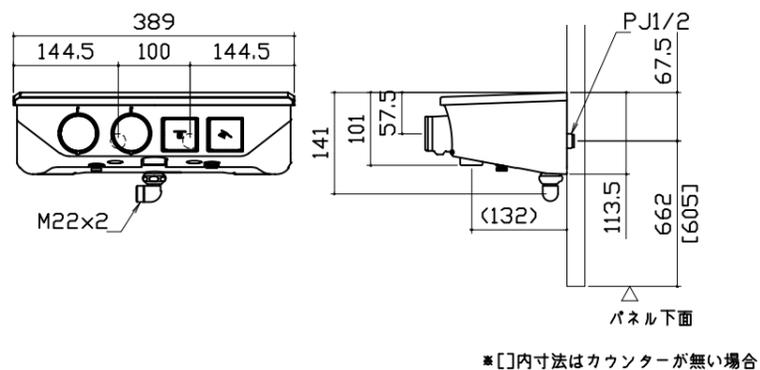


照明

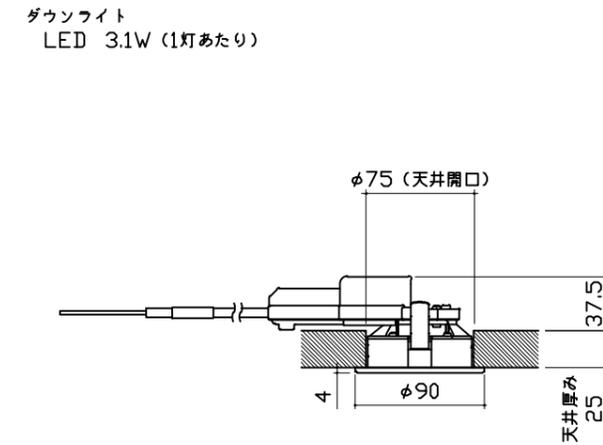


換気機器

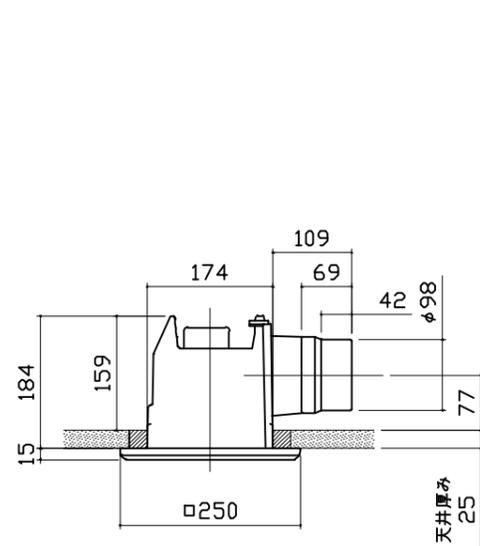


シャワーフックスライドバー

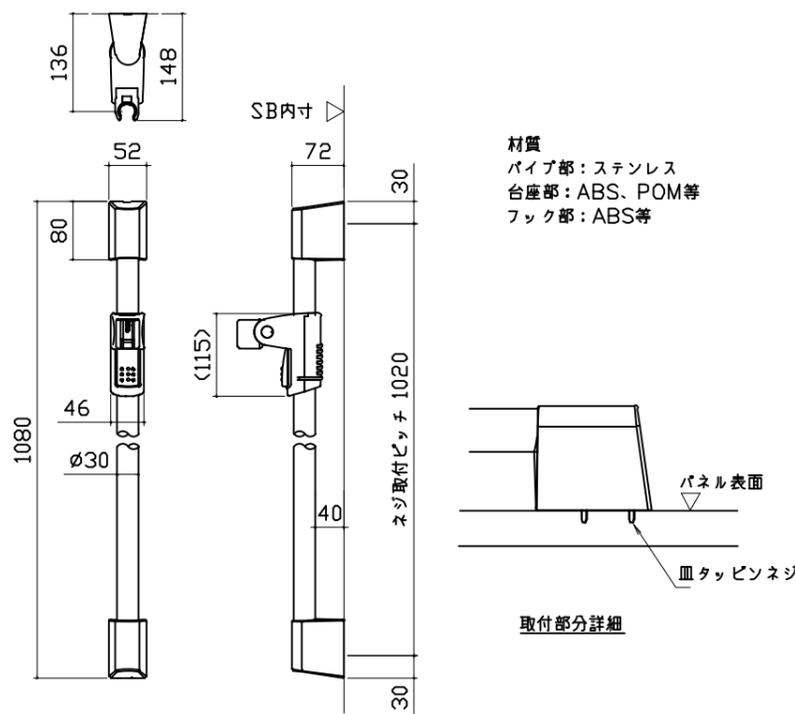


ミラー

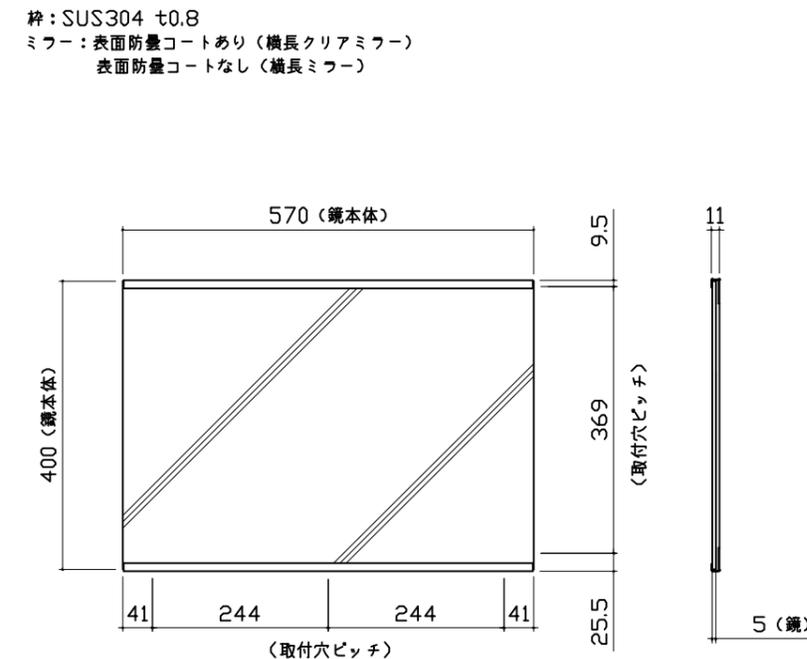


ハンドバー支持部取合詳細図

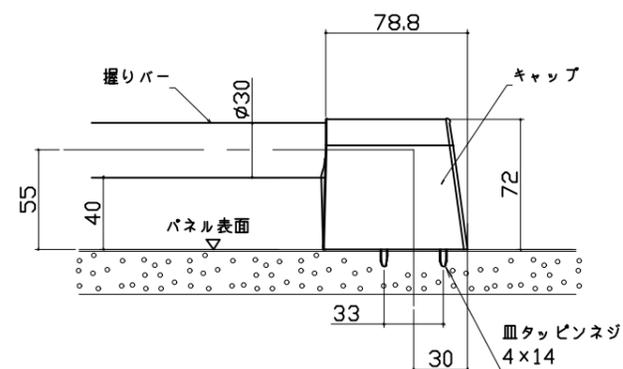

循環金具・フロアダプタ関連

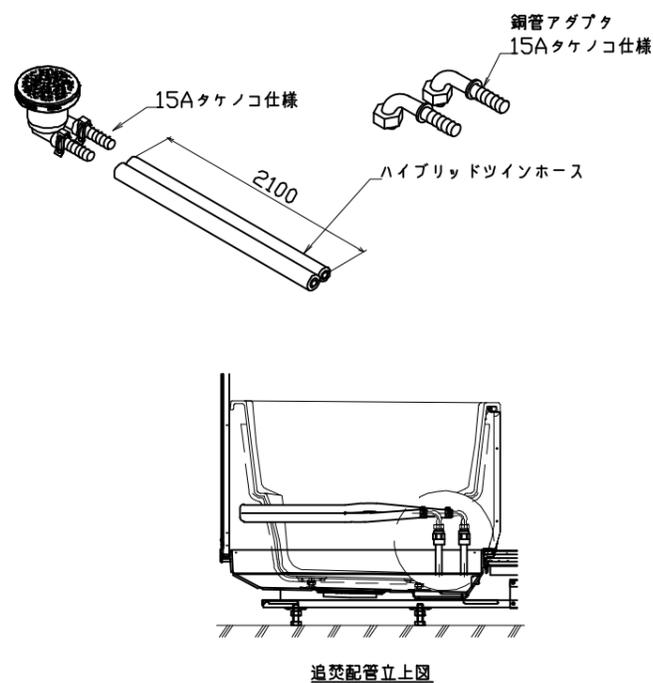

洗い場側排水トラップ

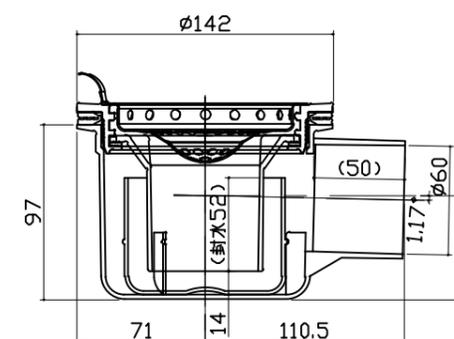

浴槽側排水トラップ

