システムバス 御見積書

		144			N-9 1/3
即名前 レラUVEM	/-1-12(GN) 追加分	樣	作成日	2020年12月15日	タカラスタンダード株式会社
€者		様	プラン番号	1817C-2012-0230T	平城京営業所
<u> </u>		<u> 12K</u>	現場番号	A6602027	奈良県奈良市三条大路3丁目444番地の
新品名 RELAG	Ε レラージュ		22.79 田 つ	7.0002027	TEL 0742-32-5290 / FAX 0742-36-2180
					平城京ショールーム
	¥661,200 (税込 ¥727,3	20.)			TEL 0742-35-0568 / FAX 0742-35-0616
1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1					
(内の価格は税込価格<税率10%>を表示して 5品組付費 ¥120,000 (税込 ¥132,0				担当営業 担当アドバイザー プラン作成者
1岁气/ 加速 6	初加紐刊員 +120,000 (机込 +132,0	30)			12日日来 12日71 ハイケープラフトが、日
	金額には商品組付費は含まれておりません。				
商品組付費!	は現場の状況により変動する事があります。 湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。				レラージュ 1216
御見積仕様					備考
(システムバス)					
ユニットサイズ					
洗い場仕様	キープ クリーンフロア(ハイクラス)				
浴槽材質					
カラー	シュガーライトグレー				
 形状					
カウンター材質	アクリル人造大理石				
カラー	シュガーライトグレー				
エプロン材質	ステンレス(カラーコーティング)				
カラー	ホワイト				
浴室パネル材質	高品位ホーロー				
カラー	ブリックグレー				
ガス種	13A				
*****	60Hz				
周波数	00112				

この御見積書の有効期間は30日間です。

現場番号 A6602027 プラン番号 1817C-2012-0230T 作成日 2020/12/15

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕樣	数量	単価	金額
1	レラージュ S1216サイズ		1	612,000	612,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	キープクリーンドア: 折戸 < 800mm幅 > (ホワイト) (19サイズ)	1		
4	洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームホワイト)	1		
5	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> (高断熱浴槽)	1		
6	排水口カバー	ステンレス	1		
7	浴槽追焚き穴	あり	1		
8	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)	1		
9	浴槽形状	セミスクエア浴槽	1		
10	ヘルシージェット	なし	1		
11	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
12	ガス温水式床暖房	なし	1		
13	洗い場用水栓	サーモ水栓(メタルホース)SB181-5UT	1		
14	洗い場用水栓	エコシャワー(節水+手元止水)	1	+6,500	+6,500
15	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
16	カウンター	人大スクエアカウンター	1		
17	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー (TN-116)	1		
18	浴室パネル	ハイクラス(一面デザイン)	1		
19	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
20	天井	高光沢フラット天井	1		
21	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V規格)	1	+41,000	+41,000
22	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
23	換気機器開口	工場開口	1		
24	照明	天井付スクエア照明(電球色)	1		
25	天井照明開口	工場開口	1		
26	ミラー	ロングミラー	1	-6,500	-6,500
27	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
28	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,500	-1,500
29	収納棚	クリアタイプB(3段)	1	+5,000	+5,000
30	どこでもラック	タオルハンガー L (ホワイト)	1	+2,800	+2,800
31	どこでもラック	小物置きM(ホワイト)	1	+1,900	+1,900

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
33	トラップカバー	なし	1		
	システムバス合計		33		¥661,200

商品総合計 33 ¥661,200

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費

システムバス商品組付費


¥120,000 (税込 ¥132,000)


樣

商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。

パース

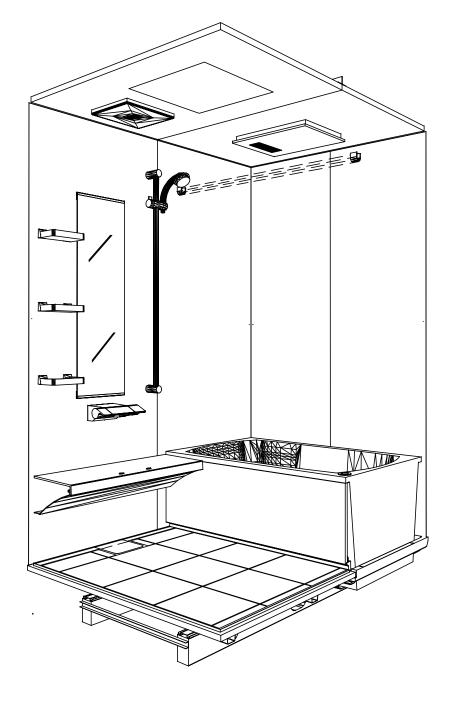

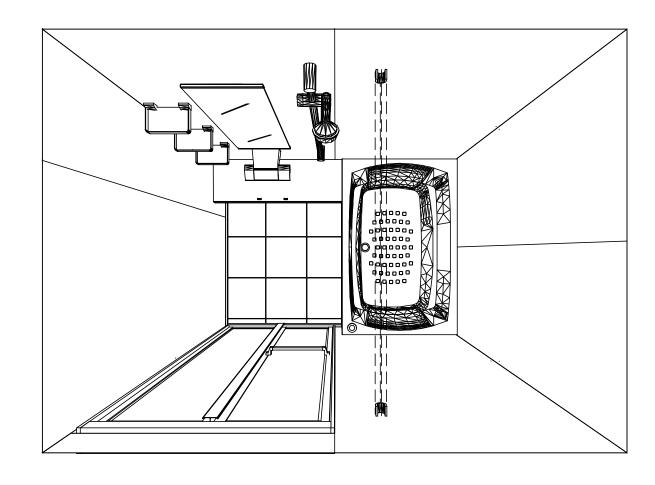


鳥瞰図

S1216 キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 高光沢フラット天井 電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・ 納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認 して頂きますようお願い致します。

Takara standard
タカラスタンダード株式会社


現場名称: レラU∨EM−1−12(GN) 追加分様邸	RELAGE レラージュ	姿図
現場番号: A6602027	プラン番号: 1817C-2012-0230T	作成日: 2020年12月15日
平城京営業所	担当営業 : レラージュ	担当アドバイザー: 1216




■留意事項 ※印寸法は給水給湯管の 突出寸法18mmを含みます。

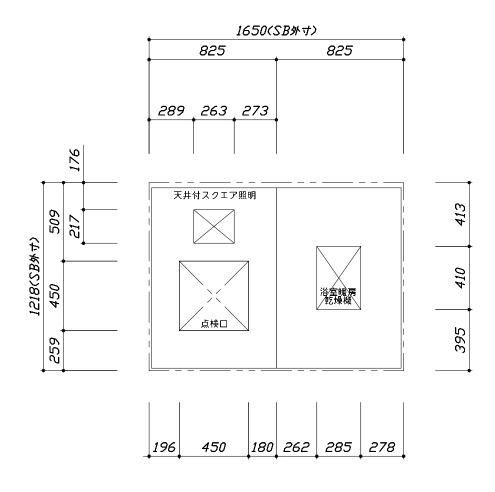

< 天井伏図 >

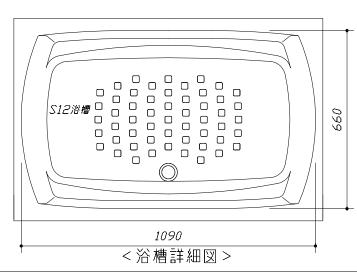

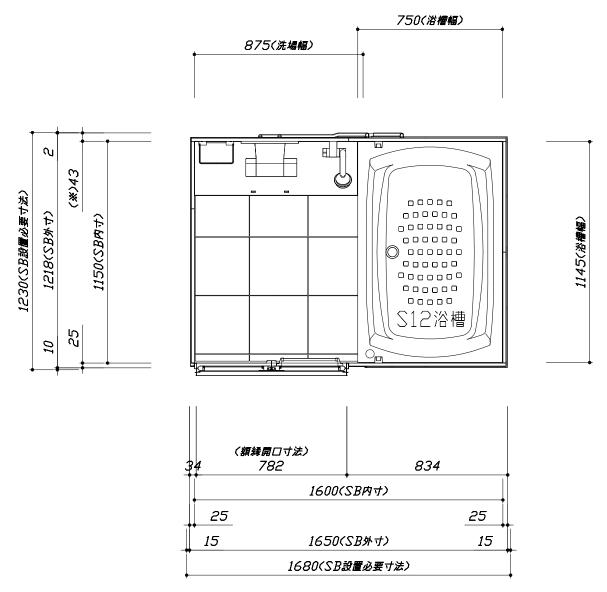


<平面図>


Takara standard
タカラスタンダード株式会社


現場名称: レラU∨EM-1-12(GN) 追加分様邸	RELAGE レラージュ	施工図1	縮 尺: 1:25,20
現場番号: A6602027	プラン番号: 1817C-2012-0230T	作成日: 2020年12	月15日
平城京営業所	担当営業 : レラージュ	担当アドバイザー: 1	.216

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に

- ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドファングル下端とSBFLの段差は8mmになります。 ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認お願いします。
- ・12方向での柱間との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との
- 打ち合わせを十分おこなってください。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意 下さい。



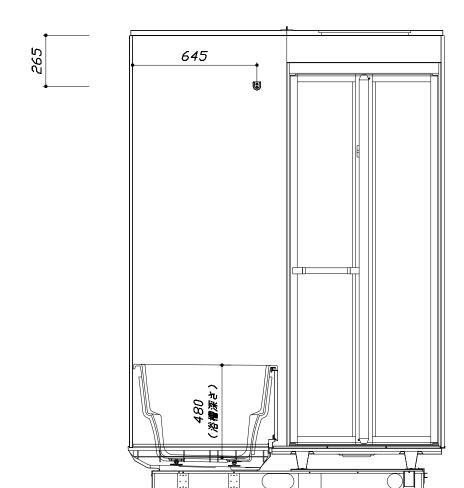

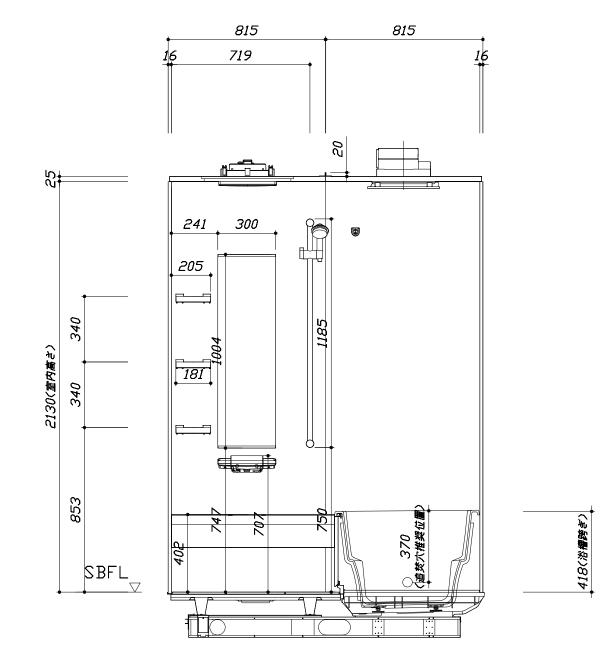

■土間コン仕上げ寸法 ドアアングル下端より 265mm下がり (クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

<カウン	ター面図:	>
------	-------	---





現場名称: レラU∨EM-1-12(GN) 追加分様邸	RELAGE レラージュ	施工図2	縮 尺: 1:20
現場番号: A6602027	プラン番号: 1817C-2012-0230T	作成日: 2020年12	月15日
平城京営業所	担当営業 : レラージュ	担当アドバイザー: 1	216


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に

- ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。







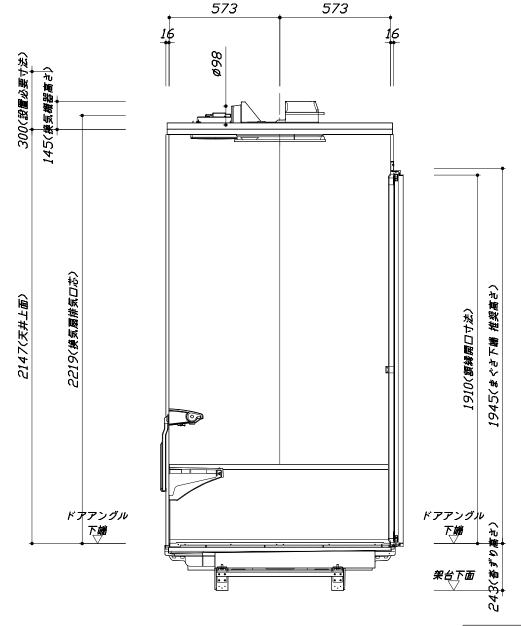









<洗場側面図>

Jakara standard タカラスタンダード株式会社

現場名称: レラU∨EM-1-12(GN) 追加分様邸	RELAGE レラージュ	施工図3	縮 尺: 1:20
現場番号: A6602027	プラン番号: 1817C-2012-0230T	作成日: 2020年12	月15日
平城京営業所	担当営業 : レラージュ	担当アドバイザー: 1	.216

縮尺:A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	S1216サイズ(室内容量3.9立方メートル)
ドア勝手	AL勝手
架台	一体架台(戸建用): 亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア:ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽〈アクリル人造大理石〉裏面保温材・高断熱仕様(発泡ウレタン)
浴槽形状	セミスクエア浴槽 (S12浴槽・240リットル) 追い焚き穴:あり
浴槽パン	ガラス強化繊維樹脂 (FRP)
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材 (発泡ポリエチレン)
カウンター	スクエアカウンター:アクリル人造大理石 カウンター下カバー:ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ:鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし
天井	高光沢フラット天井:高光沢サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口:あり 天井照明開口:あり
ドア	キープクリーンドア:19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス)
窓 1	
窓 2	-
窓枠1	_
窓枠2	_
排水トラップ	洗い場: ABS樹脂, 浴槽: ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	235kg

アクセサリー仕様表

ミラー	ロングミラー
収納棚	クリアタイプB: AS樹脂製 (3段)
タオル掛け	
洗場側水栓	サーモシャワー付(メタルホース仕様・SB181-5UTAB)
浴槽側水栓	
兼用水栓	
スライドバー	TN-116
照明	天井付スクエア照明(LED 11W電球色)
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V·最大消費電力1250W)(ダクト径φ98)(常時換気対応品)
フロフタ	組合せ式(アルミ複合板:2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	
ハンドバー①	
ハンドバー②	
ハンドバー③	
ハンドバー④	
ハンドバー⑤	-
ハンドバー⑥	
ハンドバー⑦	

本体カラー

浴槽	GN:シュガーライトグレー
カウンター	GN:シュガーライトグレー
パ ネル (カウンター面)	CI:ブリックグレー
パネル(周辺・3面)	W: ホワイト
浴槽エプロン	W: ホワイト
洗場	HW:カームホワイト
ドア	W: ホワイト
収納棚	クリアタイプB
タオル掛け	
ラント゛リーセット	ホワイト


Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: レラU∨EM-1-12(GN) 追加分様邸	RELAGE レラージュ	一
現場番号: A6602027	プラン番号: 1817C-2012-0230T	作成日: 2020年12月15日
平城京営業所	担当営業 : レラージュ	担当アドバイザー: 1216

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事〔給排水〕、建具工事などと区別して説明しています。建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

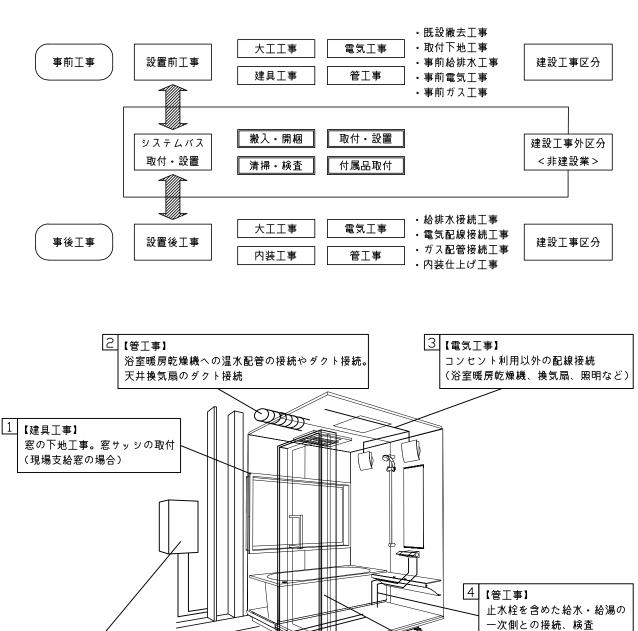

5【管工事】

システムバス構成部材の排水管と

一次側の配管接続、検査

1 【内装仕上げ工事/大工工事】

加工、仕上げ

ドア枠周りの木枠・敷居等の

■システムバス 丁事区分

参考:キッチン・バス丁業会『丁事区分ガイドライン』

<u>■システム/</u>	バス	工事区分				考:	キッ	チ <u>:</u>	ソ・バス工業会『工事区分ガイドライン』		
				建設工事			建設工事外				
工事区分	部位(図)	業種区分	作業名称(区分)	大工工事	とび土工工事	建具工事	管工事	電気工事	給湯機器設備	システムバス設置	作業内容
		大王	設置基礎、設置床の工事	0	0						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
		土工 建具	浴室ドア、窓サッシの下地工事	0		0					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
	1		給排水配管事前工事				0				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
設置前工事	2	管	換気機器のダクト配管事前工事				0	0			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
	3		給湯機器専用配管事前工事				0				風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
		電気	浴室専用電気配線事前工事					0			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
			架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置								浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置	1							洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置								浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置								天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1:								カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1)								水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1)								浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
システムバス		建設工事	風呂追焚き部品の取付 【注記 1)								循環追焚き金具の取付
本体取付・設置	2	外区分	浴室内給湯機器用リモコンの取付								専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
本体状的・改造		71 (2.7)	浴室照明器具の取付								浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1)								電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付								システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1)								システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1)								システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充塡								接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充塡
			試運転・完成検査 【注記 2.	+							完成後の試運転、性能確認検査
	_		建築外壁の穴あけ	10			0				建築壁の躯体加工作業
		管	排気ダクトの敷設工事				0				浴室換気機器のダクト敷設工事
	2	大工	浴室換気機器と排気ダクト接続工事				0				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
	3	電気	浴室換気機器の電気・アース接続工事					0			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付				0	0			建築の外装仕上げ工事
設置後工事			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				0				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
	5	管	建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				0		<u> </u>		浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
	[6]		給湯機器本体工事(試運転・確認)	<u> </u>			0		Ш		機器の設置工事(ガス、電気工事を含む)
	1	電気	内装仕上げ工事	10		0					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
	3	他	浴室用電源配線、接続工事					0			浴室機器の事後電気工事
	لتّل	_	浴室天井裏の電源、スイッチ工事					0			浴室全体の電気器具、配線接続工事

- *【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- *【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
- *【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする

Takara standard タカラスタンダード株式会社

給湯機器への給水・給湯・追焚き配管および


ガス栓を含めた一次側配管接続、検査

5【管工事/ガス工事】

現場名称: レラU∨EM-1-12(GN) 追加分様邸	RELAGE レラージュ	工事区分表
現場番号: A6602027	プラン番号: 1817C-2012-0230T	作成日: 2020年12月15日
平城京営業所	担当営業 : レラージュ	担当アドバイザー: 1216


■ 排水配管工事注意事項


- ●雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を 使用してください。
- ●2重トラップにしないでください。
- ●配管途中で配管径を狭めないでください。
- ●排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- ●排水管(横引き管・エルボ)は打設する土間コンクリートの上に露出しない 高さにて配管してください。
- ●立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項


- ●給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- ●給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- ●給水給湯管の止水プラグ(テストプラグ)の径を27mm以下にしてください。





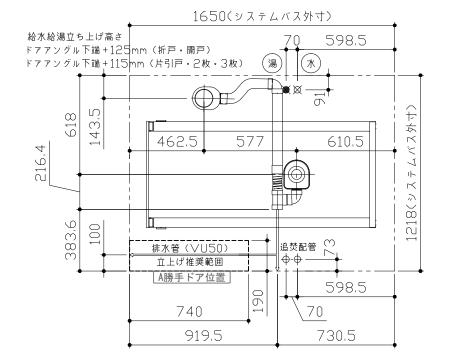









■土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より<u>265mm</u>下がりで打設してください。

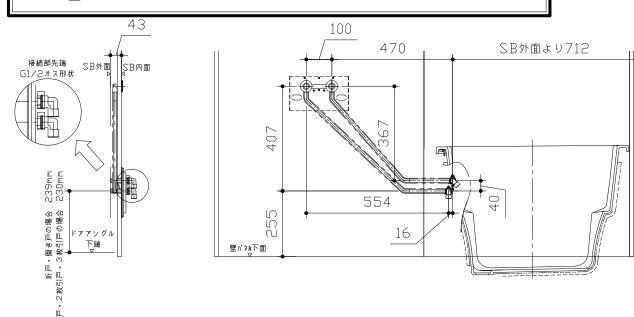



〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉

Takara Standard タカラスタンダード株式会社

	現場名称: レラU∨EM-1-12(GN) 追加分様邸	RELAGE レラージュ	排水配管図	
	現場番号: A6602027	プラン番号: 1817C-2012-0230T	作成日: 2020年12月15日	
平城京営業所		担当営業 : レラージュ	担当アドバイザー: 1216	


■必ずご確認ください


(1)図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示:ロ=20mm角


(2)留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意して ください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に 外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。 詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。








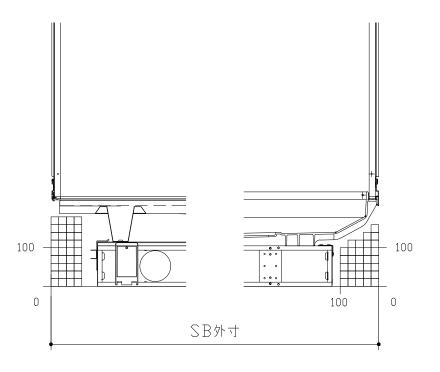

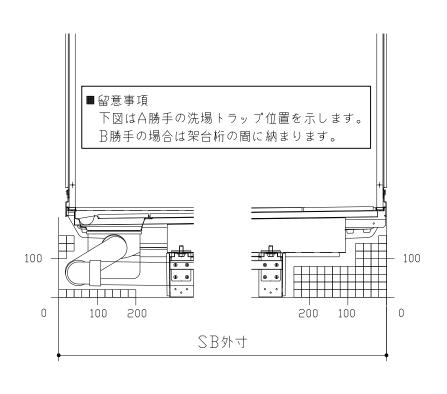

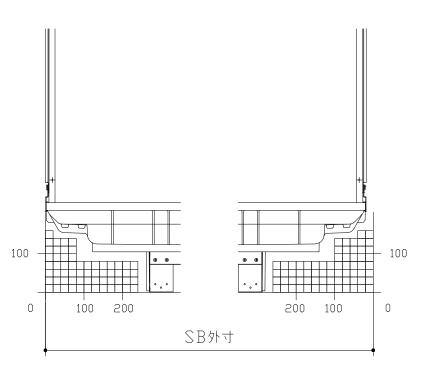

B矢視


A 矢視 D矢視


C矢視


F矢視

E矢視

Takara standard タカラスタンダード株式会社 現場名称: レラUVEM-1-12(GN) 追加分様邸RELAGE レラージュ床下空間図現場番号: A6602027プラン番号: 1817C-2012-0230T作成日: 2020年12月15日平城京営業所担当営業 : レラージュ担当アドバイザー: 1216

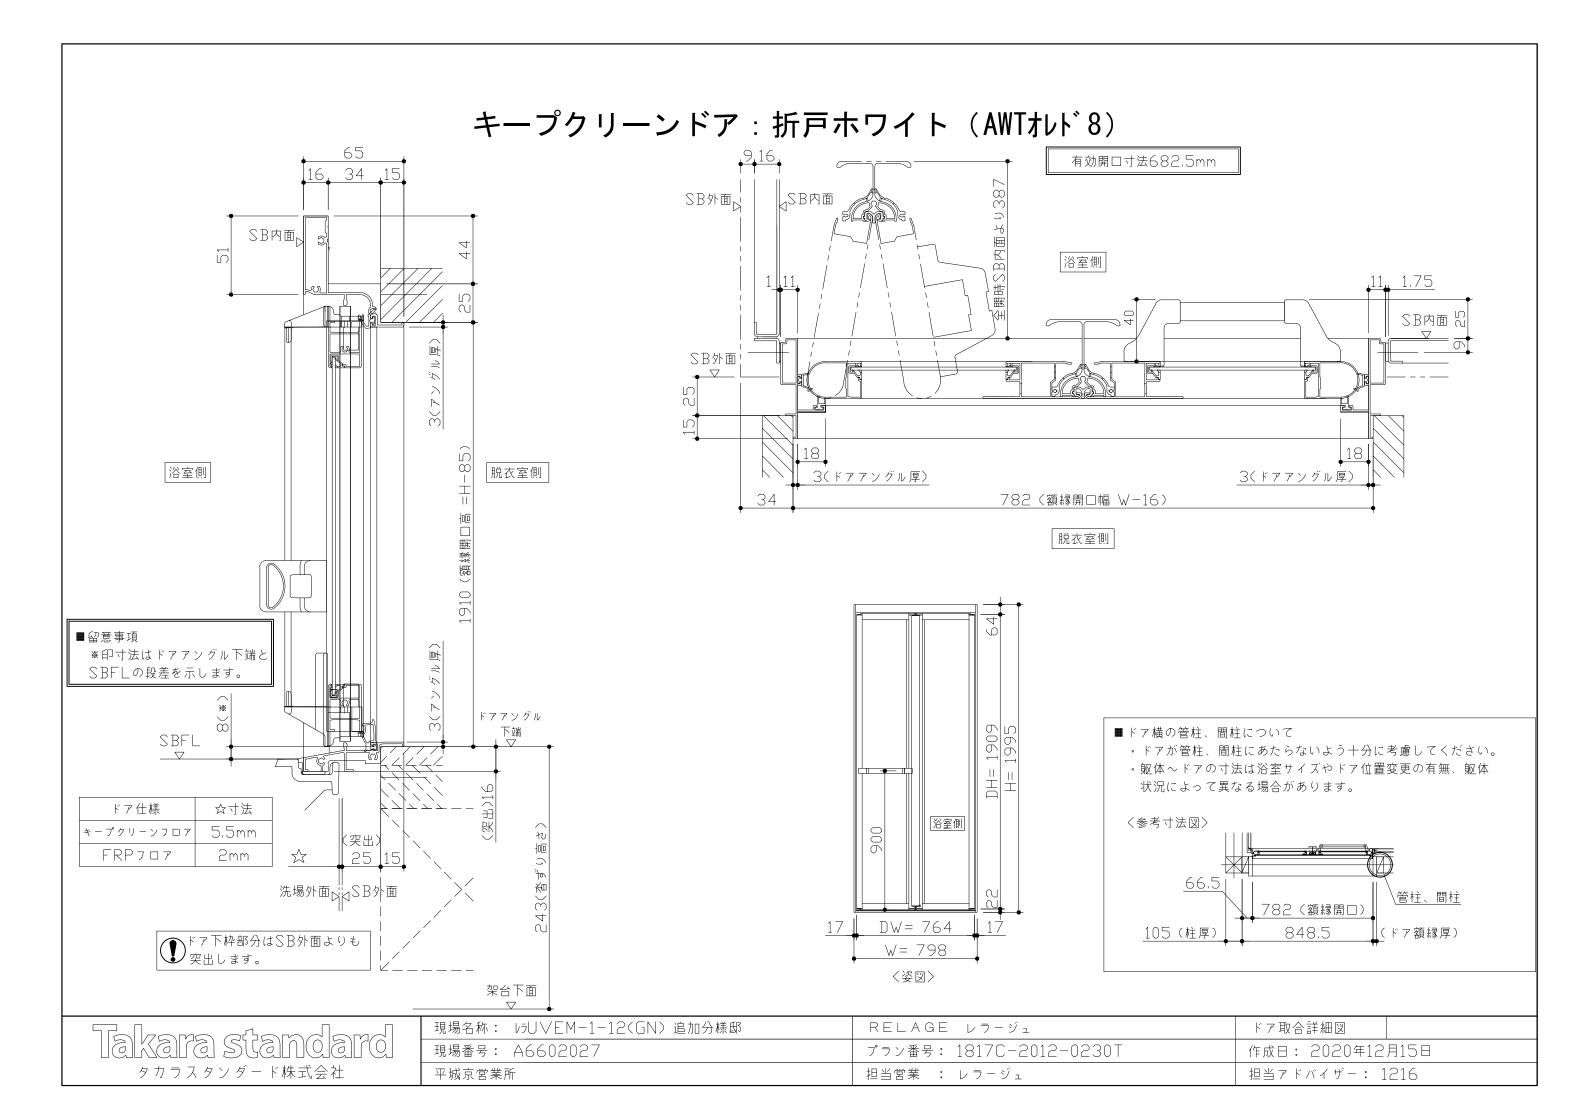

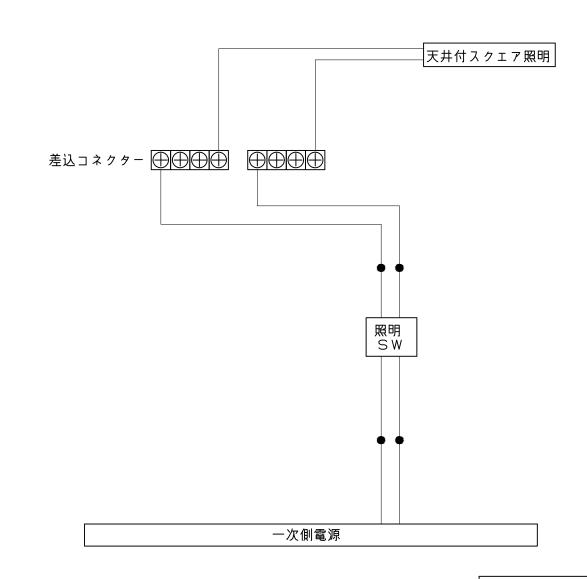

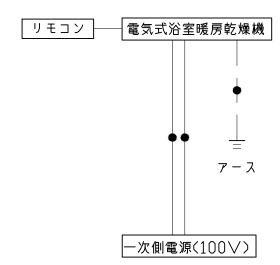

*浴室暖房機の一次電源には専用の ブレーカーを設けてください。

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事 (●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に 基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

	現場名称: レラU∨EM-1-12(GN) 追加分様邸	RELAGE レラージュ	電気配線図	
現場番号: A6602027 平城京営業所		プラン番号: 1817C-2012-0230T	作成日: 2020年12月15日	
		担当営業 : レラージュ	担当アドバイザー: 1216	

