

システムバス 御見積書

御名前 神戸-姫路SR SB9 様

業者 様

商品名 PREDENCIA プレデンシア

商品
御見積金額 ￥1,371,000 (税込 ￥1,508,100)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 別途
《参考》別途 現場配送費 ￥0 (税込 ￥0)

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616 (AR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	チェッポビアンコ
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	プレシャスホワイト
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ホワイト / ホワイト
浴槽前カウンターカラー	ホワイト
エブロン材質/カラー	ステンレス / ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ホワイトオニキス
パネルカラー(周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 60Hz

◆ 御確認事項

☆取付費別途の見積りです。

作成日 2025年7月22日
プラン番号 5505C-2507-0253T
現場番号 C3394423

タカラスタANDARD株式会社
◆姫路営業所
兵庫県姫路市飾磨区中野田1丁目66番
TEL 079-262-6915 / FAX 079-234-4721

◆姫路ショールーム
TEL 079-262-6860 / FAX 079-234-4660

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
2025.7	部材入替	田中(麻)

◆ 備考

--	--

No.*

御名前 神戸-姫路SR SB9

様

現場番号	C3394423	プラン番号	5505C-2507-0253T	作成日	2025/7/22
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1616サイズ		1	1,227,000	1,227,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)/樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・1面デザイン/周辺レギュラークラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・チェッポビアンコ)	1	+29,000	+29,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(プレシヤスホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ホワイト)	1		
11	浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付)	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
16	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB182-H	1		
17	洗い場用水栓	ヒロカルシャワー:SB182-HB1HK	1		
18	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
19	カウンター	人造大理石カウンター	1		
20	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
21	浴室パネル	プレミアムクラス(一面デザイン)(Kパネル)	1	+15,000	+15,000
22	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴あり	1		
23	天井	高光沢フラット天井	1		
24	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ホワイト	1	+45,500	+45,500
25	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
26	換気機器開口	工場開口	1		
27	照明	ダウンライト照明(3灯)(白色)	1	-3,000	-3,000
28	天井照明開口	工場開口	1		
29	ミラー	ラウンドクリアミラー	1	+15,000	+15,000
30	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
31	タオル掛け	クリアタイプ クリア	1		

御名前 神戸-姫路SR SB9 様

現場番号	C3394423	プラン番号	5505C-2507-0253T	作成日	2025/7/22
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	ハンドバー	メタル 1型600タイプ	1	+9,000	+9,000
33	収納棚	クリアタイプ クリア(2段)	1	-4,000	-4,000
34	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
35	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
36	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			36		¥1,371,000

商品総合計	36	¥1,371,000
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費

別途


《参考》別途 現場配送費

¥0 (税込 ¥0)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

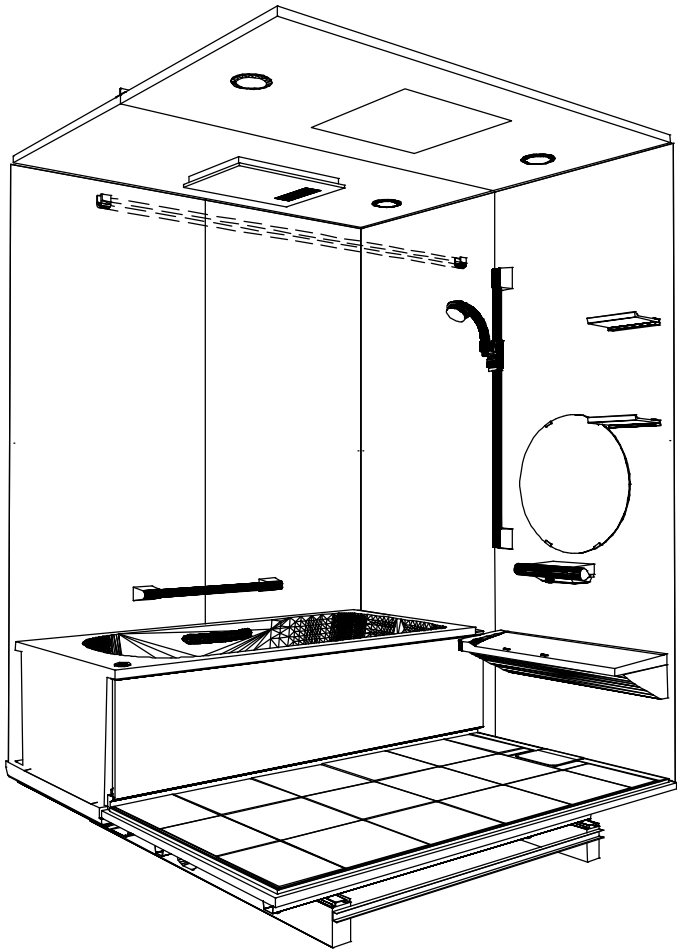

鳥瞰図

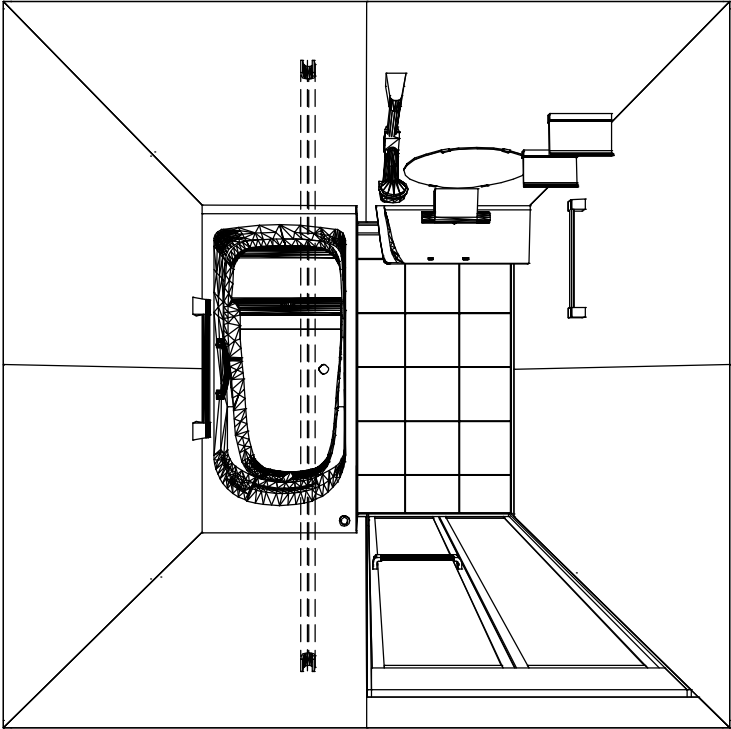


1616


高光沢フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。


Takara standard タカスタンダード株式会社	現場名称： 神戸-姫路SR SB9様邸	PREDENCIA プレデンシア	姿図	
	現場番号： C3394423	プラン番号： 5505C-2507-0253T	作成日： 2025年7月22日	
	姫路営業所	担当営業： 2025.7	担当アドバイザー： 部材入替	





■注意事項
*印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。

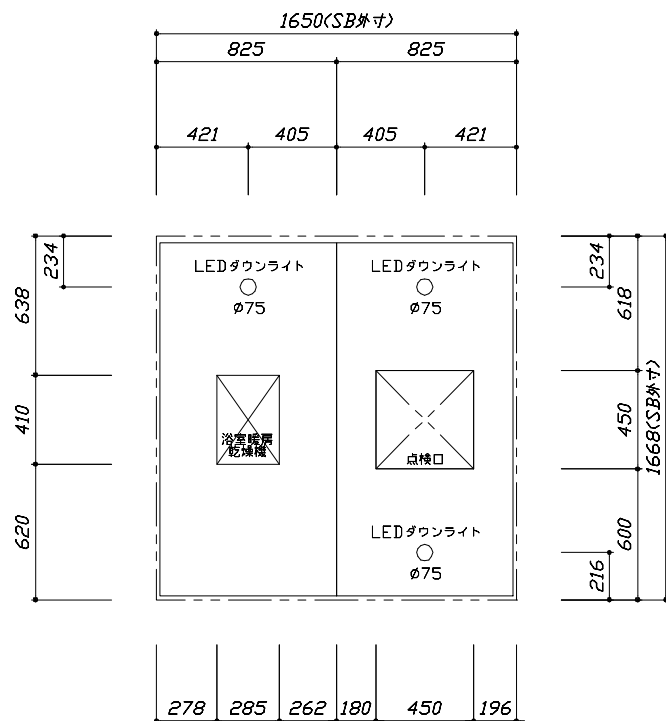

<天井伏図>

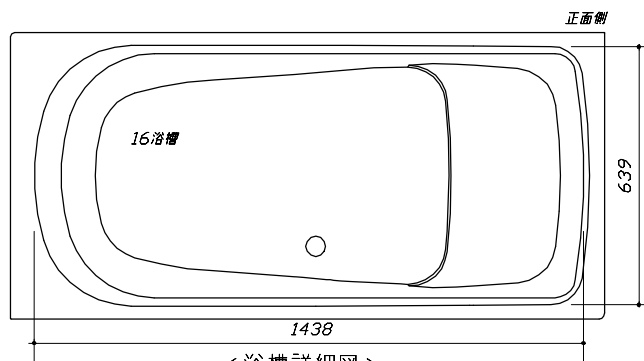

<浴槽詳細図>

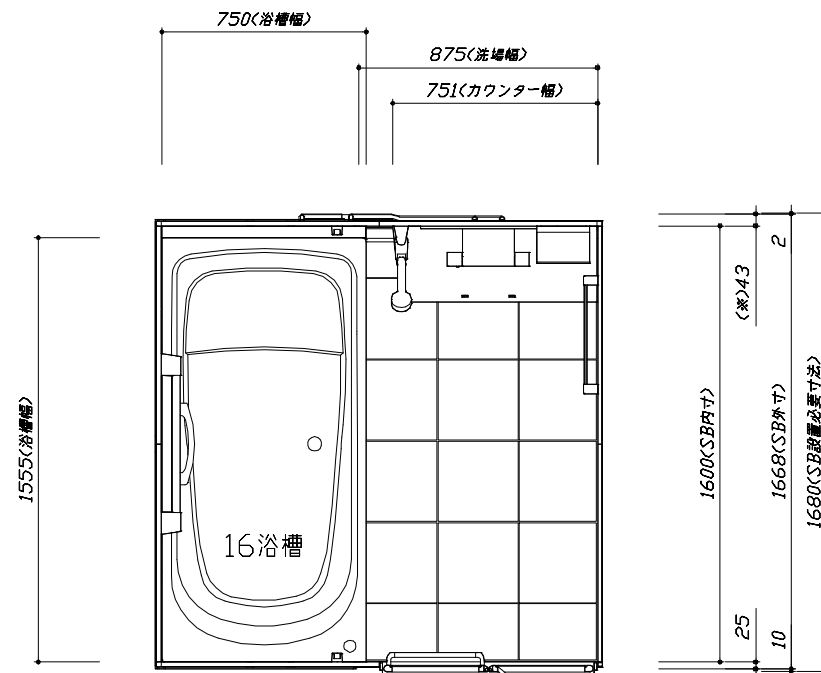

<平面図>

Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： 神戸-姫路SR SB9様邸
現場番号： C3394423
姫路営業所



PREDENCIA プレデンス
プラン番号： 5505C-2507-0253T
担当営業： 2025.7

施工図1
縮尺： 1:25,20
作成日： 2025年7月22日
担当アドバイザー： 部材入替

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間：架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行き・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

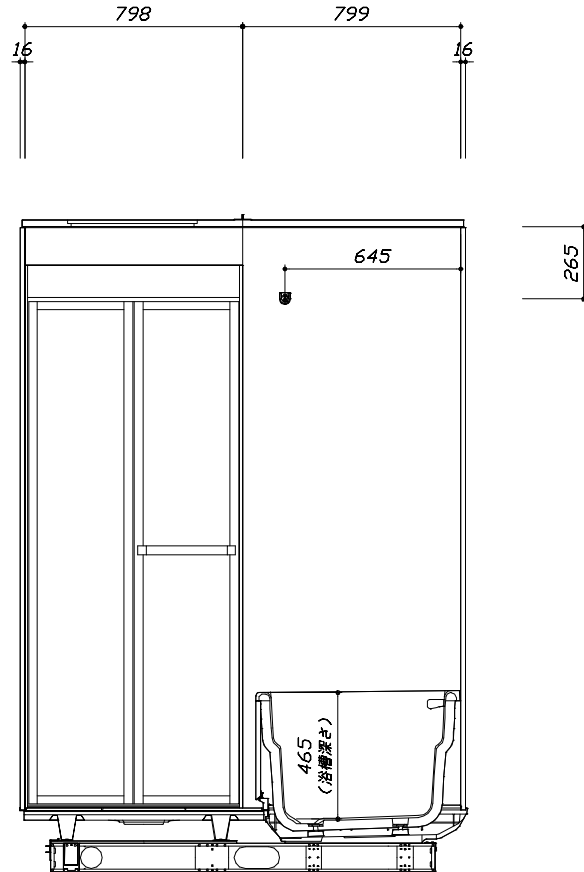

<カウンター対面図>

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

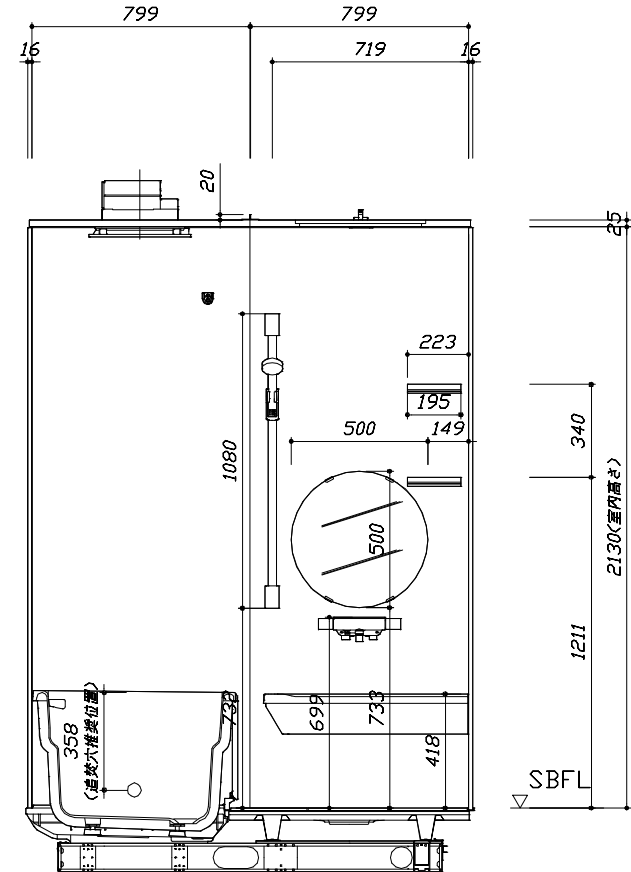

<カウンター面図>

Takara standard
タカラストانダード株式会社

現場名称： 神戸-姫路SR SB9様邸
現場番号： C3394423
姫路営業所



PREDENCIA プレデンスシア
プラン番号： 5505C-2507-0253T
担当営業： 2025.7

施工図2
縮尺： 1:20
作成日： 2025年7月22日
担当アドバイザー： 部材入替

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

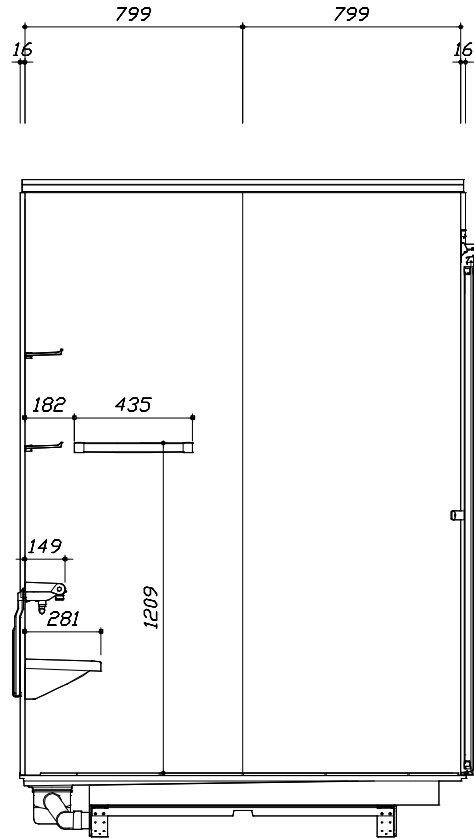

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

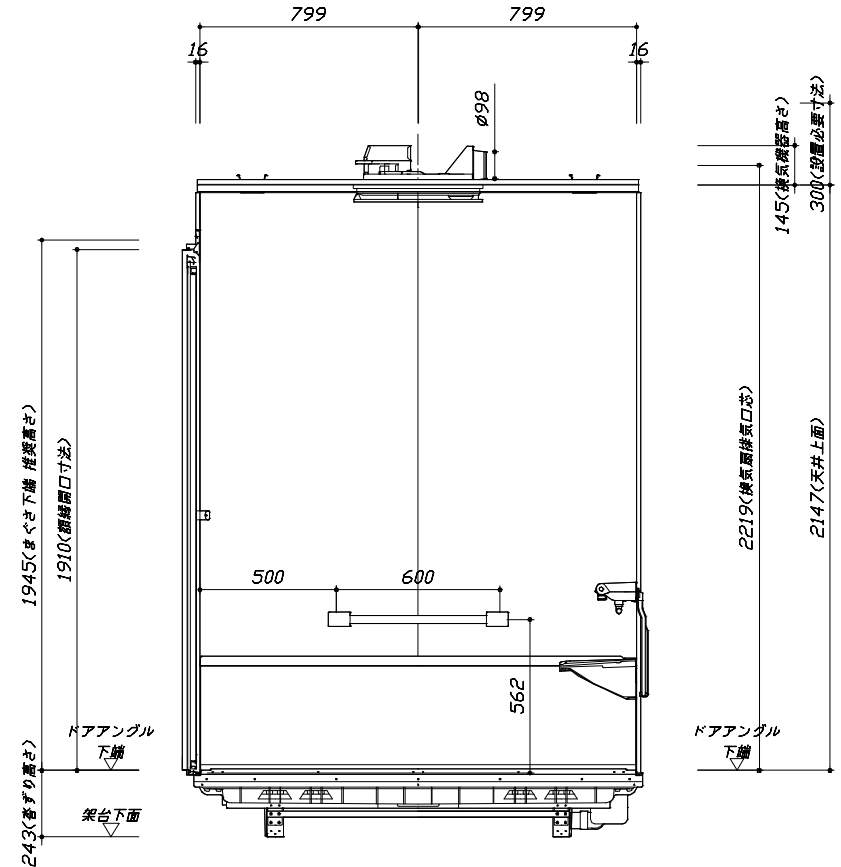

< 浴槽側面図 >

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	AR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	鋳物ホーロー 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付) グリップ付（290リットル）追い焚き穴：あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エブロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	人造大理石カウンター：人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：あり
天井	高光沢サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓1	－
窓2	－
窓枠1	－
窓枠2	－
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂 浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	410kg

アクセサリ仕様表


ミラー	ラウンドクリアミラー
収納棚	クリアタイプ：アクリル樹脂製（2段）
タオル掛け	クリアタイプ：アクリル樹脂製
洗場側水栓	サーモスタット(SB182-HB1HK)（樹脂ホース：メタル調）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライトバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（スライトバー-T1020S MH）
照明	LEDダウンライト（LED 9.3W白色）（3灯）
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V・最大消費電力1250W)（ダクト外径φ98）（常時換気対応品）ホワイト
フロタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	ステンレス製 I型600タイプ メタル
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	WP：プレシヤスホワイト
カウンター	WA：ホワイト
パネル(カウンター面)	JWX：ホワイトオニキス
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カウンター	－
浴槽エブロン	W：ホワイト
洗場	XW：チェッポビアンコ
ドア / 天井	W：ホワイト / HW：ホワイト
収納棚	クリアタイプ(クリア)
タオル掛け	クリアタイプ(クリア)
ランドリースェット	ホワイト

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

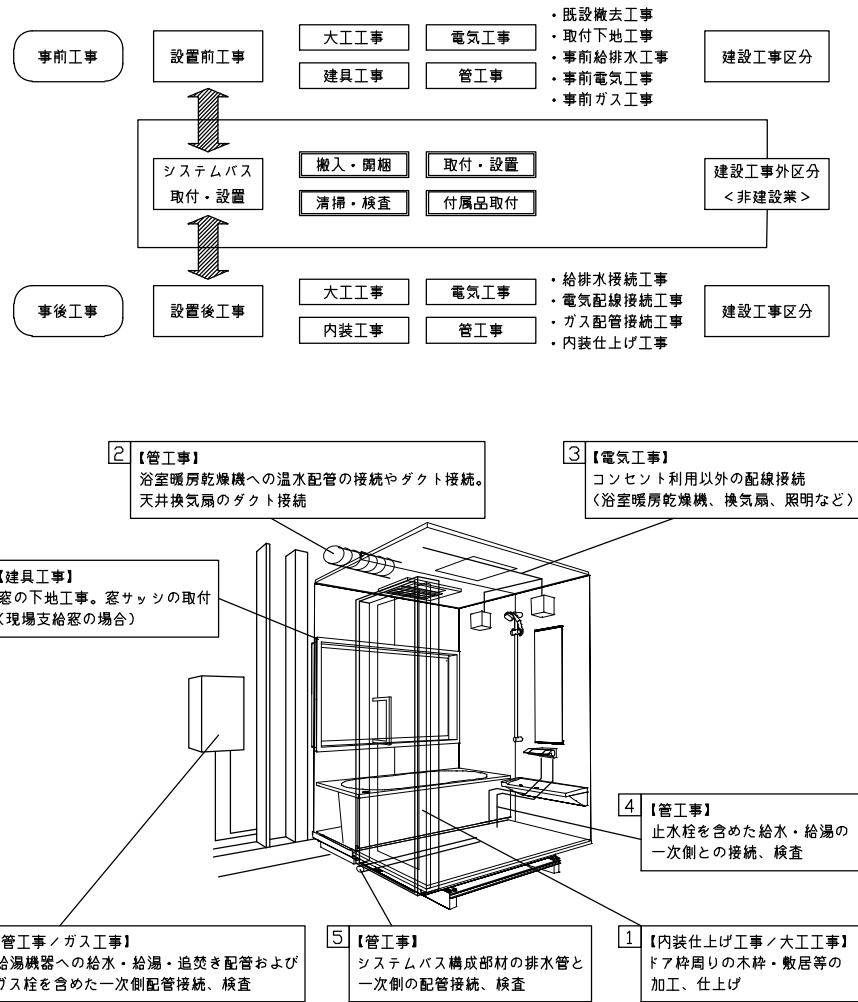


■システムバス 工事区分		参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』									
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工工事	とび土工工事	建具工事	管工事	電気工事	給湯機器設備	システムバス設置	
設置前工事	1 2 3	大工 土 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
システムバス 本体取付・設置			給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
	建設工事 外区分		架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トロッパ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トロッパ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
		大工	浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
	4 5 6	電気	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付					○	○		建築の外装仕上げ工事
		管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
	1 2 3	電気 他	内装仕上げ工事	○	○						床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
			浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。




給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

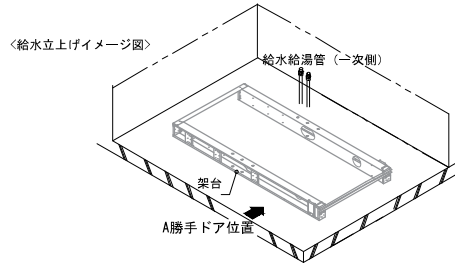

土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりて打設してください。



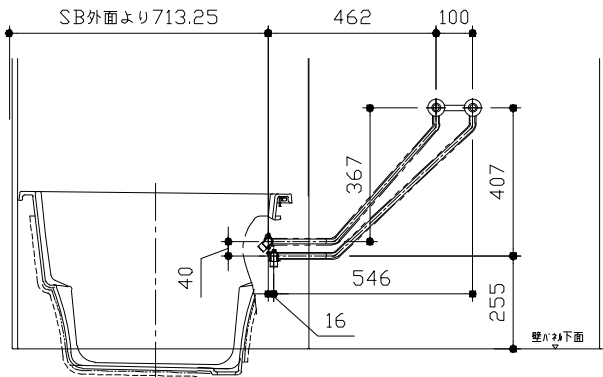


給水給湯管取合詳細図

ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230

設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置

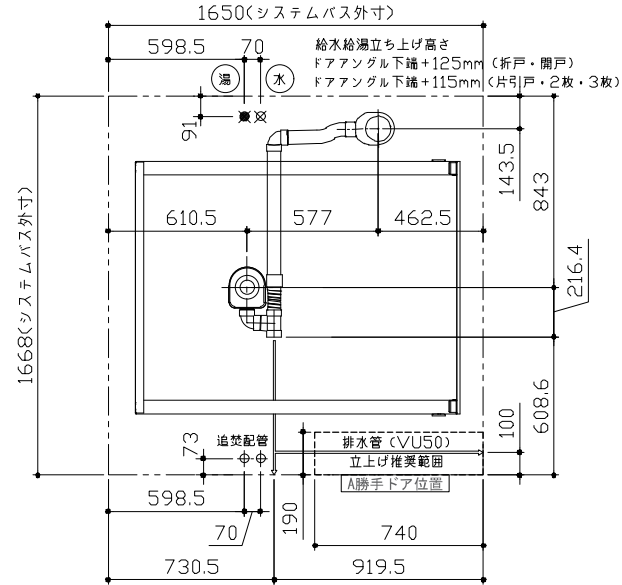

架台排水配管・給排水立上げ位置図

Takara standard
タカラストANDARD株式会社

現場名称：神戸-姫路SR SB9様邸
現場番号：C3394423
姫路営業所

PREDENCIA プレデンスシア
プラン番号：5505C-2507-0253T
担当営業：2025.7

排水配管図
作成日：2025年7月22日
担当アドバイザー：部材入替





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

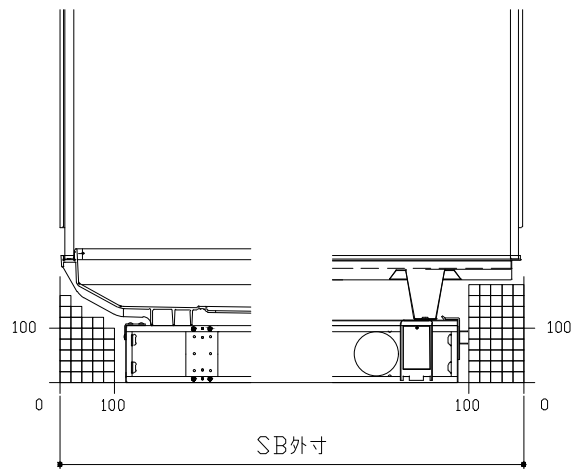


A矢視

B矢視

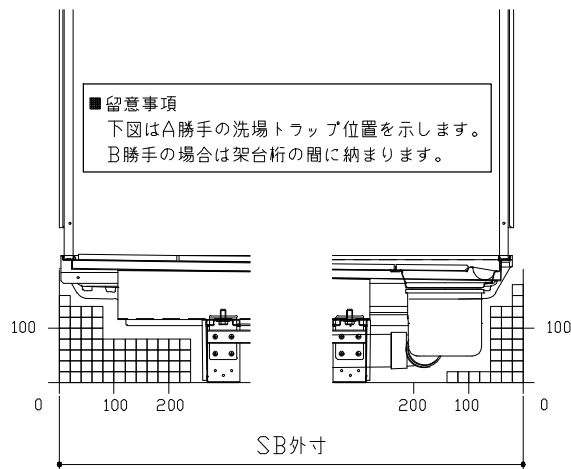

C矢視




D矢視

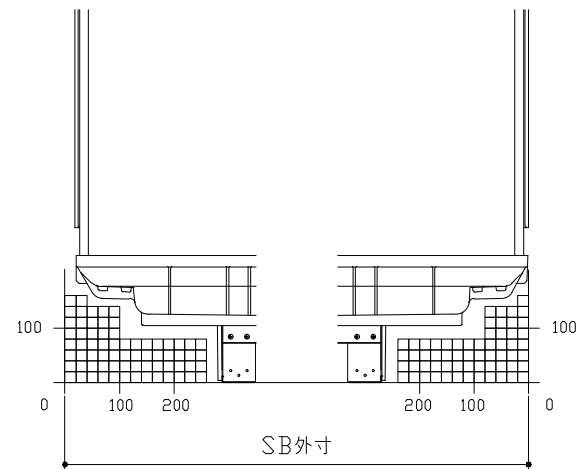

E矢視



F矢視

キープクリーンドア：折戸・上部換気口

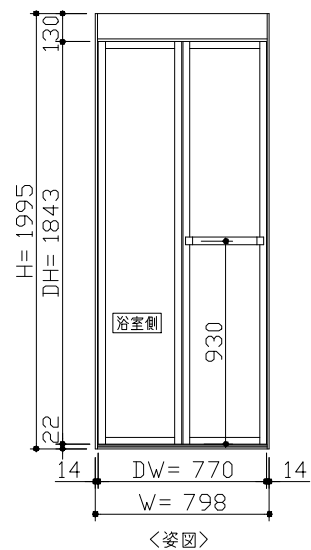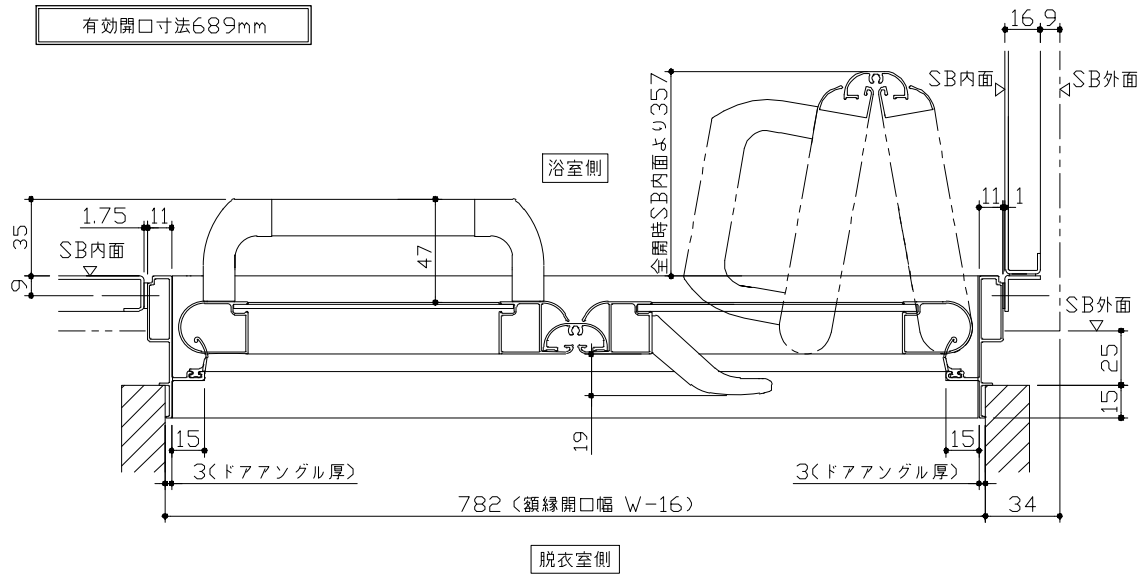

- ・ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- ・躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉

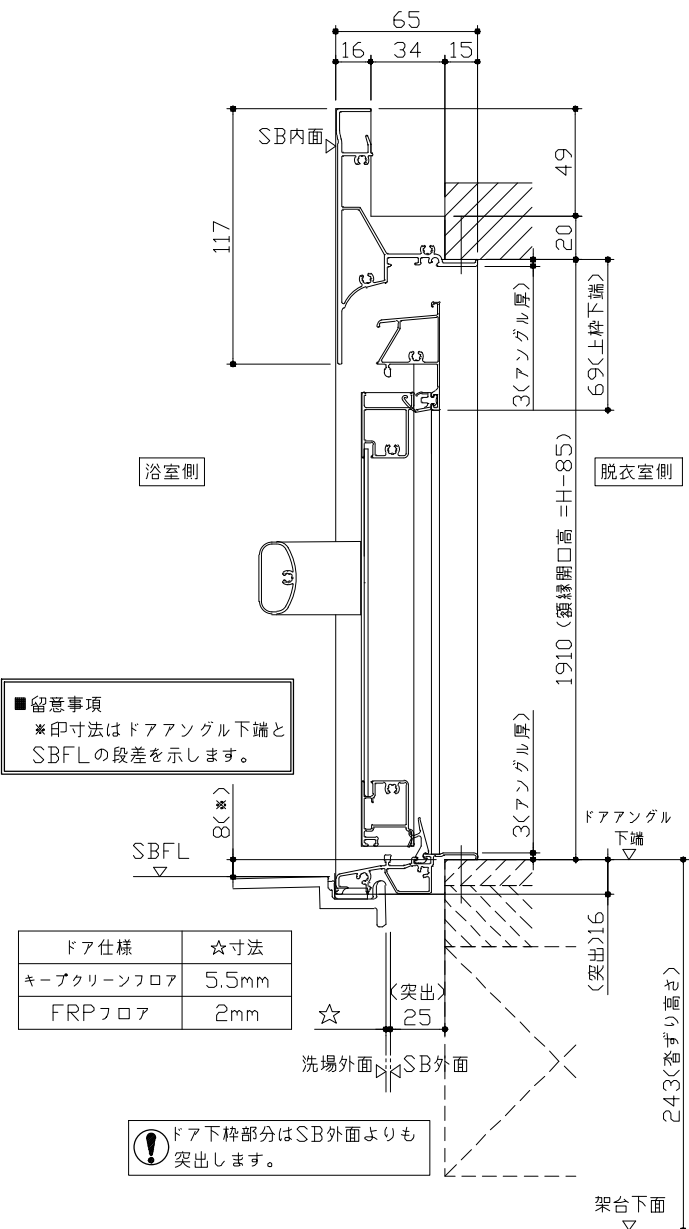


Takara standard

タカラスタンダード株式会社

現場名称： 神戸-姫路SR SB9様邸
現場番号： C3394423
姫路営業所

PRENOCIA プレデンシア
プラン番号: 5505C-2507-0253T
担当営業 : 2025.7

ドア取合詳細図	
作成日： 2025年7月22日	
担当アドバイザー： 部材入替	






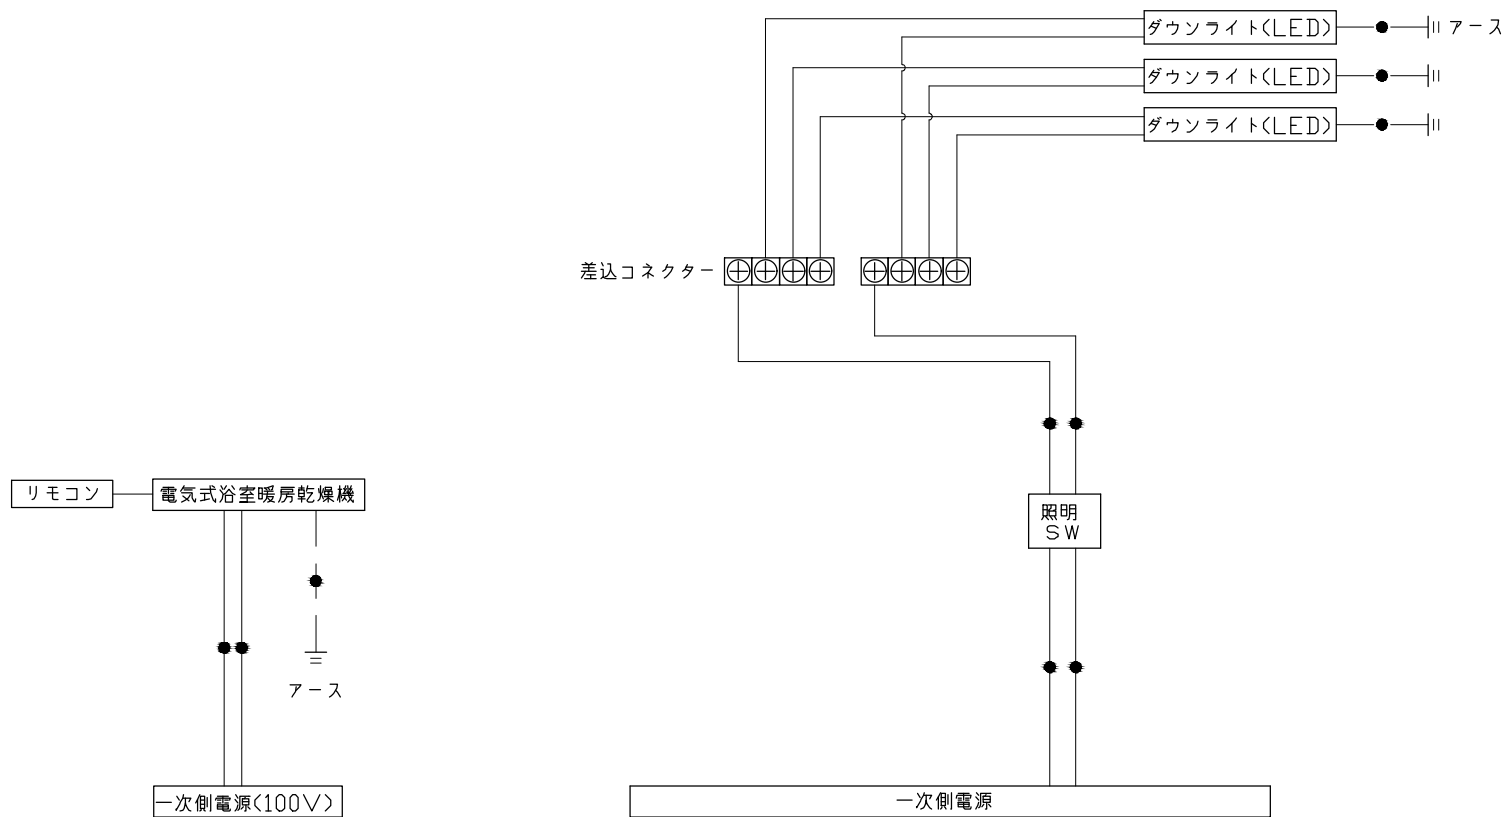


* 浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。


一次側電源から差し込みコネクタ及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

浴槽 (シャワー噴出口) ジェットバス選択時 (シャワー噴出口) ジェットバス選択時 (シャワー吸水口) ジェットバス選択時 (循環金具穴) つるぽか湯選択時 本図は参考図面です	洗い場用水栓 G1/2 P J1/2 パネル下面 *[]内寸法はカウンターが無い場合	照明 ダウンライト LED 3.1W (1灯あたり) φ75 (天井開口) 37.5 4 φ90 天井厚み 25	
換気機器 リモコンコード長さ: 5m 外形: 縦120mm×横116mm 管工事 280 (本体寸法) φ100接続 天井厚み 25 372 (グリル) 400 (本体寸法) 145 (本体寸法) 72 (排気) システムバス天井 472 (グリル) 38 天井厚み 25	シャワーフックスライドバー 136 148 52 80 46 30 1080 30 40 30 SB内寸 72 1020 ネジ取付ピッチ 材質 バイブ部: ステンレス 台座部: ABS、POM等 フック部: ABS等 パネル表面 皿タップピンネジ 取付部分詳細	ミラー 取付金具: SUS304 t0.8 ミラー: 表面防曇コートあり φ500 (鏡本体) 32.5 429 38.5 141 218 141 (取付穴ピッチ) 鏡厚 5 鏡 取付金具 取付金具	
Takara standard タカラストANDARD株式会社	現場名称: 神戸-姫路SR SB9様邸 現場番号: C3394423 姫路営業所	PREDENCIA プレデンスシア プラン番号: 5505C-2507-0253T 担当営業: 2025.7	部材詳細図 作成日: 2025年7月22日 担当アドバイザー: 部材入替

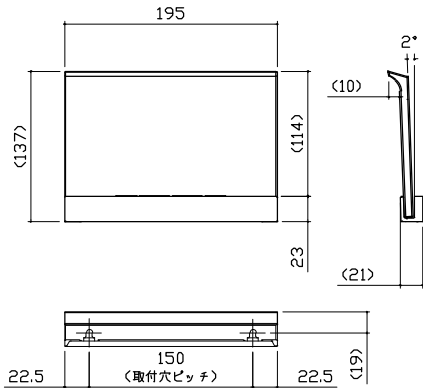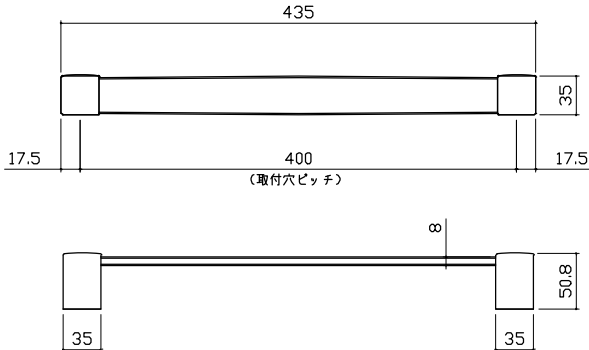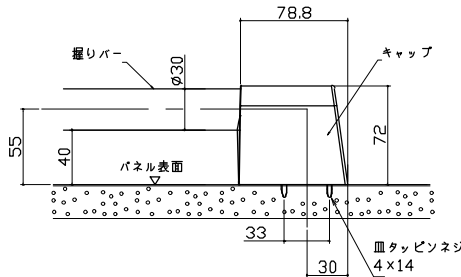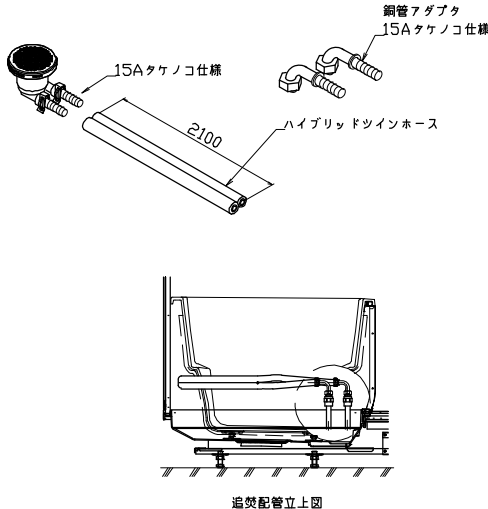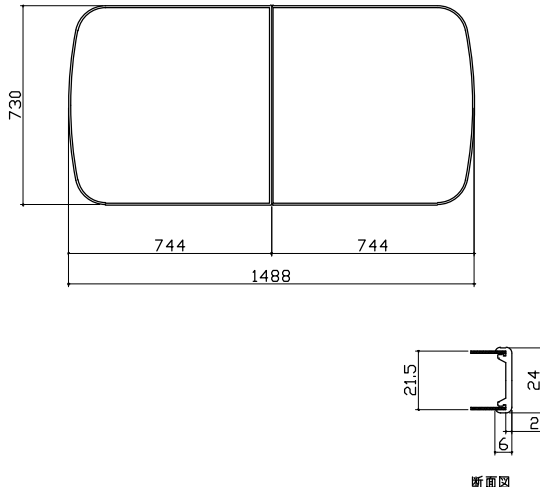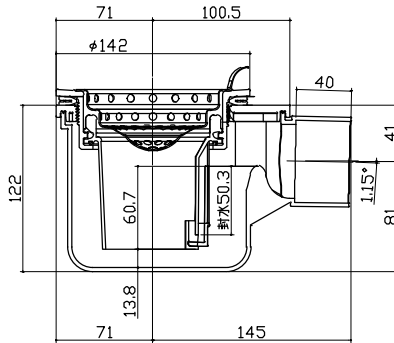収納棚 本体：PMMA 	タオル掛け 本体：PMMA ブラケット：ABS（クロムメッキ仕上げ） 	ハンドバー支持部取合詳細図 	
循環金具・フロアダプタ関連 	風呂蓋 707MDH-16YK 	洗い場側排水トラップ 	
Takara standard タカラストANDARD株式会社	現場名称： 神戸-姫路SR SB9様邸 現場番号： C3394423 姫路営業所	PREDENCIA プレデンスシア プラン番号： 5505C-2507-0253T 担当営業： 2025.7	部材詳細図 2/3 作成日： 2025年7月22日 担当アドバイザー： 部材入替

浴槽側排水トラップ

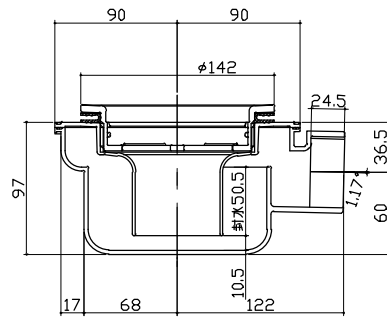

パネル割図	ミラー	収納棚
↑ AR勝手 ハズK16C2B 0799 R<JWX ハズK16C1G 0799 L<JWX ハズK16NW 0799 < W ハズK16NW 0799 < W ハズK16A T 0799 < W ハズK16A 0799 < W ハズK16AD 0799 < W	ハズK16C2B 0799 R<JWX 799 509 291 1209 780 現地加工：φ3.5	ハズK16C2B 0799 R<JWX 799 200 50 1540 1200 現地加工：φ3.5
シャワーフックスライドバー	ランドリーパイプ	
ハズK16C2B 0799 R<JWX 799 64 33 33 33 1774 754 現地加工：φ3.5	ハズK16C1G 0799 L<JWX 799 645 250 266 現地加工：φ3.5 ハズK16AD 0799 < W 799 645 266 250 現地加工：φ3.5	
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 神戸-姫路SR SB9様邸 現場番号： C3394423 姫路営業所	PREDENCIA プレデンスシア プラン番号： 5505C-2507-0253T 担当営業： 2025.7
穴開け指示図	1/1 作成日： 2025年7月22日 担当アドバイザー： 部材入替	
