

# システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 三重-伊勢SR SB3 様

業者 様

商品名 RELAGE レラージュ

商品  
御見積金額 ￥764,200 (税込 ￥840,620)

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥140,000 (税込 ￥154,000)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

## ◆ 御見積仕様

《システムバス》

|            |                  |
|------------|------------------|
| ユニットサイズ    | 1616 (AR勝手)      |
| 洗い場仕様      | キープクリーンフロア:ハイクラス |
| 洗い場カラー     | カームホワイト          |
| 浴槽材質       | アクリル人造大理石        |
| 浴槽カラー      | シュガーホワイト         |
| 浴槽形状       | ラウンド浴槽           |
| カウンター材質    | アクリル人造大理石        |
| カウンターカラー   | シュガーホワイト         |
| エプロン材質/カラー | ステンレス / ホワイト     |
| 浴室パネル材質    | 高品位ホーロー          |
| パネルカラー(正面) | テラゾーホワイト         |
| パネルカラー(周辺) | ウォルナットミディアム      |
| ガス種 / 周波数  | LPG / 60Hz       |

## ◆ 御確認事項

作成日 2021年3月19日  
プラン番号 5906C-2011-0223T  
現場番号 A6808307

タカラスタANDARD株式会社  
◆伊勢ショールーム  
三重県伊勢市御園町新開874-3

TEL 0596-31-1161 / FAX 0596-31-1166

◆三重支店

TEL 059-234-5711 / FAX 059-234-9203

| 担当営業 | 担当アドバイザー | プラン作成者   |
|------|----------|----------|
|      |          | 2021/2展示 |

## ◆ 備考

プライス価格【764,200円】

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

No.\*

|      |          |       |                  |     |           |
|------|----------|-------|------------------|-----|-----------|
| 現場番号 | A6808307 | プラン番号 | 5906C-2011-0223T | 作成日 | 2021/3/19 |
|------|----------|-------|------------------|-----|-----------|

## 御見積明細 システムバス

| NO | 商品名            | 仕様                                    | 数量 | 単価      | 金額      |
|----|----------------|---------------------------------------|----|---------|---------|
| 1  | レラージュ 1616サイズ  |                                       | 1  | 684,000 | 684,000 |
| 2  | 架台             | 戸建タイプ 一体架台                            | 1  |         |         |
| 3  | ドア             | 折戸<800幅>(ホワイト)/樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)      | 1  |         |         |
| 4  | ドア             | 上部換気口                                 | 1  |         |         |
| 5  | ドア位置変更         | A勝手・移動なし・全面デザインハイクラス・800幅ドア           | 1  |         |         |
| 6  | 洗い場            | キープクリーンフロア(ハイクラス・カームホワイト)             | 1  |         |         |
| 7  | 排水口カバー         | タイル仕上げ                                | 1  | +5,000  | +5,000  |
| 8  | 浴槽             | キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(シュガーホワイト) | 1  |         |         |
| 9  | 浴槽追い焚き穴        | あり                                    | 1  |         |         |
| 10 | エプロン           | カラーステンレス(保温材あり)(ホワイト)                 | 1  |         |         |
| 11 | 浴槽形状           | ラウンド浴槽                                | 1  |         |         |
| 12 | ヘルシージェット       | なし                                    | 1  |         |         |
| 13 | 浴槽ハンドグリップ      | 1本仕様                                  | 1  |         |         |
| 14 | ガス温水式床暖房       | なし                                    | 1  |         |         |
| 15 | 洗い場用水栓         | サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB181-5UTH          | 1  |         |         |
| 16 | 洗い場用水栓         | エコシャワー(節水):SB181-5UTHEN               | 1  | +10,000 | +10,000 |
| 17 | 浴槽用水栓          | 浴槽側水栓なし                               | 1  |         |         |
| 18 | カウンター          | 人ススクエアカウンター                           | 1  |         |         |
| 19 | シャワーフック/スライドバー | シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)                 | 1  | +5,200  | +5,200  |
| 20 | 浴室パネル          | ハイクラス(全面デザインハイクラス)(Kパネル)              | 1  | +40,000 | +40,000 |
| 21 | 浴室パネルタオル穴      | タオル掛け穴なし                              | 1  |         |         |
| 22 | 天井             | 高光沢フラット天井                             | 1  |         |         |
| 23 | 換気機器           | 天井換気扇                                 | 1  |         |         |
| 24 | 換気機器開口         | 工場開口                                  | 1  |         |         |
| 25 | 照明             | ダウンライト照明(3灯)(電球色)                     | 1  | -8,000  | -8,000  |
| 26 | 天井照明開口         | 工場開口                                  | 1  |         |         |
| 27 | ミラー            | ロングクリアミラー                             | 1  |         |         |
| 28 | 風呂フタ           | 組み合わせ式風呂フタ                            | 1  |         |         |
| 29 | タオル掛け          | クリアタイプ クリア                            | 1  | +2,500  | +2,500  |
| 30 | ハンドバー          | ステン I型600タイプ                          | 1  | +8,000  | +8,000  |
| 31 | 収納棚            | クリアタイプB(3段)                           | 1  | +5,000  | +5,000  |

御名前 三重-伊勢SR SB3 様

ページ 3/3

|      |          |       |                  |     |           |
|------|----------|-------|------------------|-----|-----------|
| 現場番号 | A6808307 | プラン番号 | 5906C-2011-0223T | 作成日 | 2021/3/19 |
|------|----------|-------|------------------|-----|-----------|

御見積明細 システムバス

| NO       | 商品名     | 仕様     | 数量 | 単価      | 金額       |
|----------|---------|--------|----|---------|----------|
| 32       | 循環金具セット | PLLX   | 1  | +12,500 | +12,500  |
| 33       | 給水給湯管   | 洗い場1水栓 | 1  |         |          |
| 34       | トラップカバー | なし     | 1  |         |          |
| システムバス合計 |         |        | 34 |         | ¥764,200 |
| 商品総合計    |         |        | 34 |         | ¥764,200 |

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費 ¥140,000 ( 税込 ¥154,000 )

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。



パース

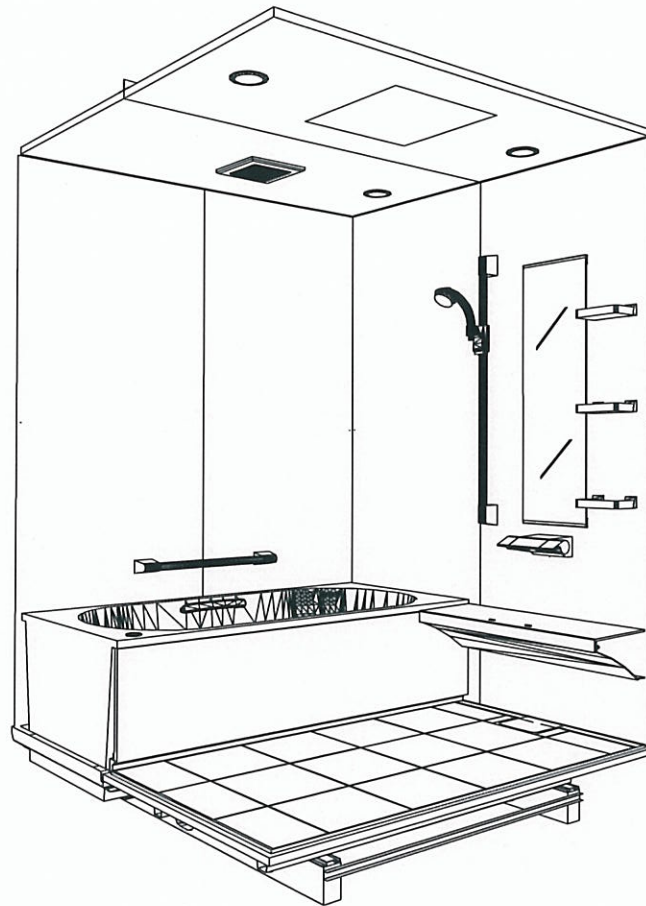

鳥瞰図

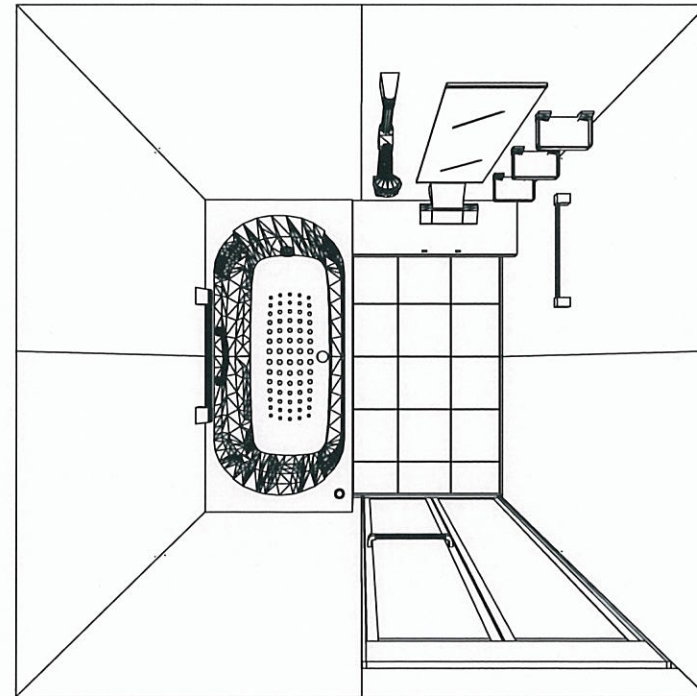

1616

キープクリーン浴槽＜アクリル人造大理石＞  
高光沢フット天井  
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・  
納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認  
して頂きますようお願い致します。

**Takara standard**  
タカラストンダード株式会社

現場名称： 三重-伊勢SR SB3様邸  
現場番号： A6808307  
伊勢ショールーム

RELAGE レラージュ

プラン番号： 5906C-2011-0223T


担当営業：

姿図


作成日： 2021年3月19日

担当アドバイザー：


縮尺：A3サイズ等倍





■留意事項  
 \*印寸法は給水給湯管の  
 突出寸法18mmを含みます。

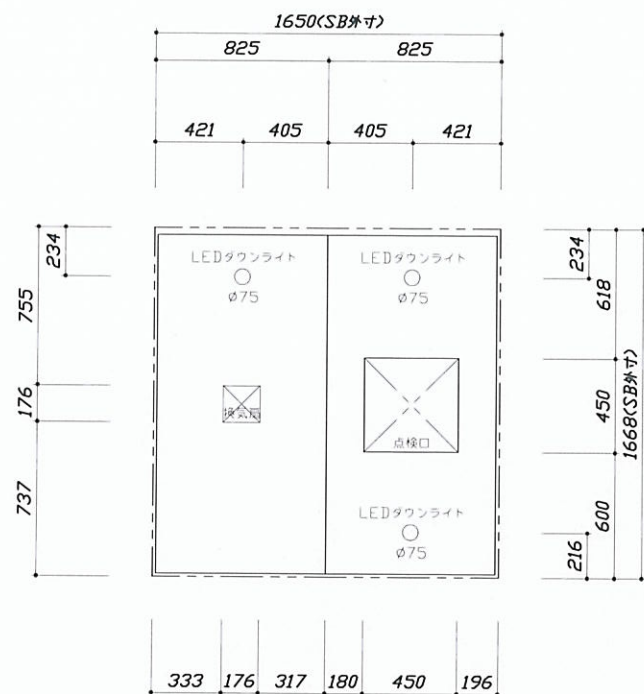

<天井伏図>

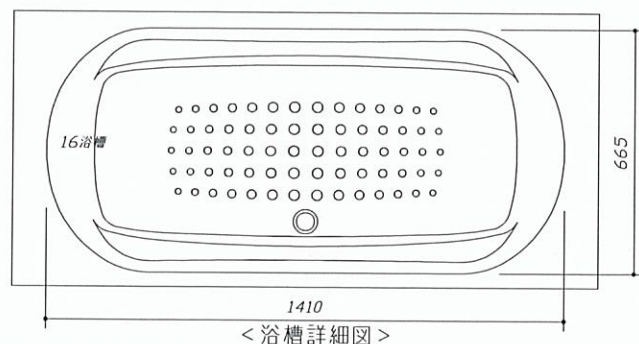

<浴槽詳細図>

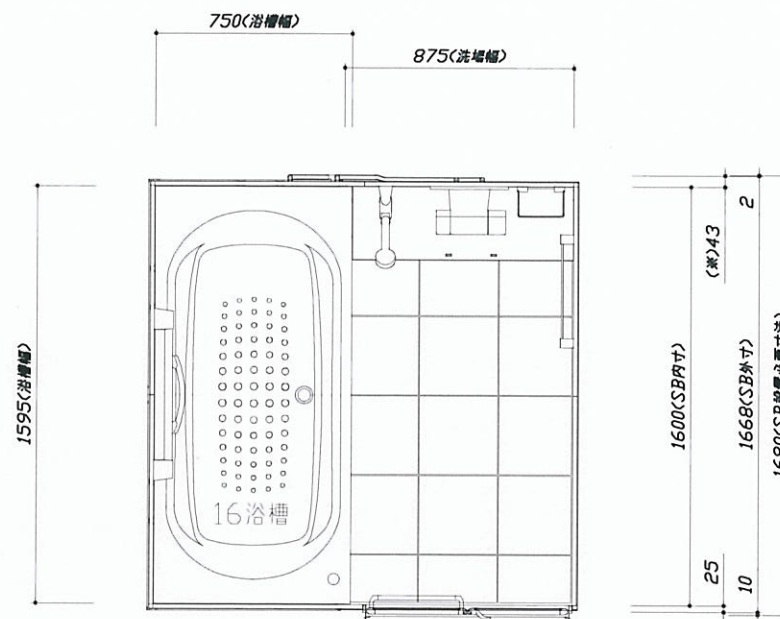

<平面図>

**Takara standard**  
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 三重-伊勢SR SB3様邸  
 現場番号： A6808307  
 伊勢ショールーム



RELAGE レフージュ  
 プラン番号： 5906C-2011-0223T  
 担当営業：

施工図1  
 縮尺： 1:25,20  
 作成日： 2021年3月19日  
 担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間：架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は3mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

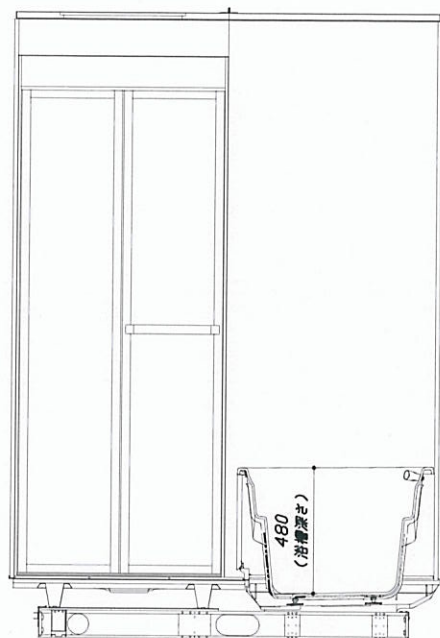

<カウンター対面図>

■土間コン仕上げ寸法  
ドアアングル下端より  
265mm下がり  
(クリア寸法含む)

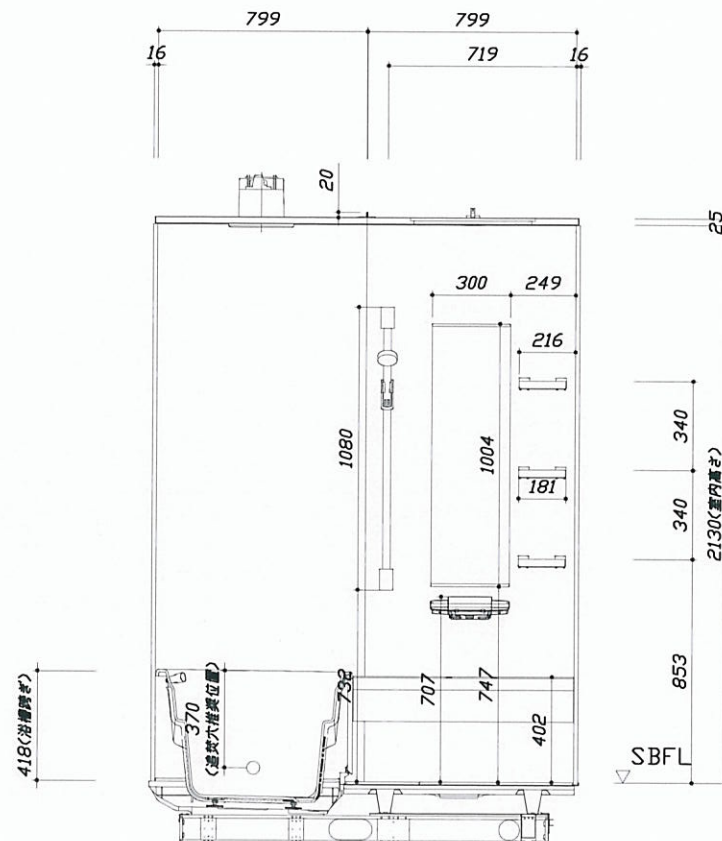

<カウンター面図>

Takara standard  
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 三重-伊勢SR SB3様邸

現場番号： A6808307

伊勢ショールーム

RELAGE レフージュ

プラン番号： 5906C-2011-0223T

担当営業：

施工図2

縮尺： 1:20



作成日： 2021年3月19日

担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間：架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

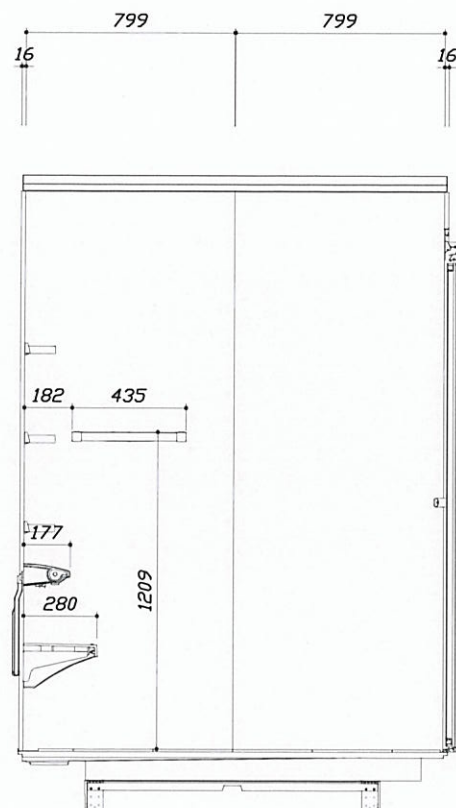

< 洗面側面図 >

■土間コン仕上げ寸法  
ドアアングル下端より  
265mm下がり  
(クリア寸法含む)

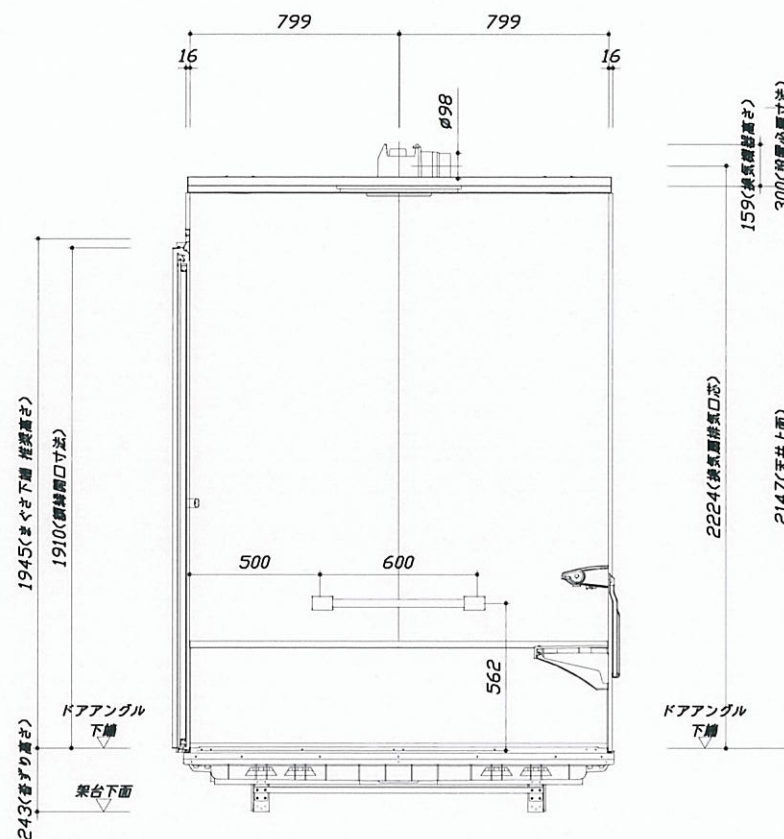

< 浴槽側面図 >

Takara standard  
タカスタンダード株式会社

現場名称： 三重-伊勢SR SB3様邸  
現場番号： A6808307  
伊勢ショールーム

RELAGE レラージュ  
プラン番号： 5906C-2011-0223T  
担当営業：

施工図3  
縮尺： 1:20  
作成日： 2021年3月19日  
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍



本体仕様表

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 浴室サイズ  | 1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)                  |
| ドア勝手   | AR勝手                                    |
| 架台     | 一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板                       |
| 洗場パン   | キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵       |
| 浴槽材質   | キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン） |
| 浴槽形状   | ラウンド浴槽 グリップ付（300リットル）追い焚き穴：あり           |
| 浴槽パン   | ガラス繊維強化樹脂（FRP）                          |
| 浴槽エプロン | ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）        |
| カウンター  | スクエアカウンター：アクリル人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂     |
| 浴室パネル  | パネル高さKタイプ：銅板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし      |
| 天井     | 高光沢パテ仕上げ（内部発泡樹脂）換気機器開口：あり 天井照明開口：あり     |
| ドア     | キープクリーンドア：19高さ折戸（アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口）      |
| 窓1     | －                                       |
| 窓2     | －                                       |
| 窓枠1    | －                                       |
| 窓枠2    | －                                       |
| 排水トラップ | 洗い場：ABS樹脂、浴槽：ASA樹脂 封水50mm               |
| 雑排水配管  | 硬質塩ビパイプ VU50                            |
| 製品重量   | 300kg                                   |

アクセサリ仕様表

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| ミラー    | ロングクリアミラー くもり止め加工                       |
| 収納棚    | クリアタイプB：AS樹脂製（3段）                       |
| タオル掛け  | クリアタイプ：アクリル樹脂製                          |
| 洗場側水栓  | サモスタット(SB181-5UTHEIN)（樹脂ボース：メタル調）       |
| 浴槽側水栓  | －                                       |
| 兼用水栓   | －                                       |
| スライドバー | シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（スライドバー-T1020S MH） |
| 照明     | LEDダウンライト（LED 12.3W電球色）（3灯）             |
| 換気機器   | 天井換気扇（100V・最大消費電力9.3W）（径φ98）            |
| フロフタ   | 組合せ式（アルミ複合板：2枚）                         |
| 給水給湯管  | 銅管（10A）                                 |
| 循環金具   | 循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様            |
| ハンドバー① | －                                       |
| ハンドバー② | －                                       |
| ハンドバー③ | －                                       |
| ハンドバー④ | ステンレスタイプ 1型600タイプ                       |
| ハンドバー⑤ | －                                       |
| ハンドバー⑥ | －                                       |
| ハンドバー⑦ | －                                       |


本体カラー

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 浴槽          | W：シュガーホワイト      |
| カウンター       | W：シュガーホワイト      |
| パネル(カウンター面) | JTW：テラゾーホワイト    |
| パネル(周辺・3面)  | YM：ウォールナットミディアム |
| 水栓上部カウンター   | －               |
| 浴槽エプロン      | W：ホワイト          |
| 洗場          | HW：カームホワイト      |
| ドア          | W：ホワイト          |
| 収納棚         | クリアタイプB         |
| タオル掛け       | クリアタイプ(クリア)     |
| ランドリースェット   | －               |



## 基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

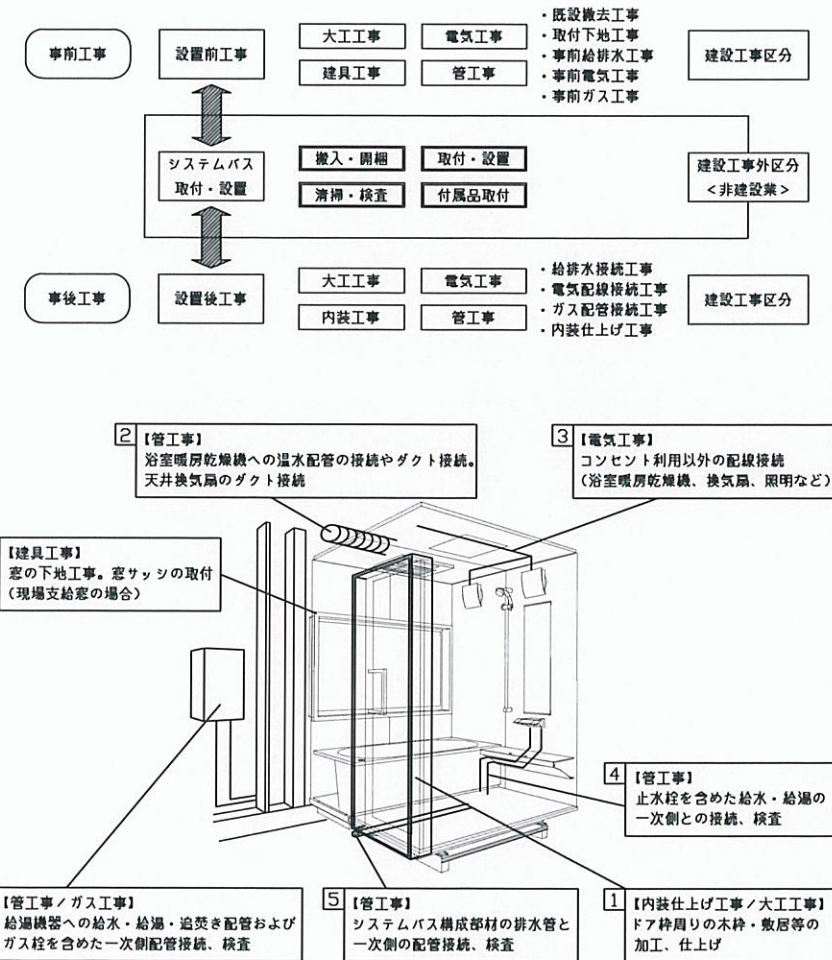

■システムバス 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

| 工事区分              | 部位<br>(図)   | 業種区分           | 作業名称（区分）               | 建設工事 |        |      |     |      |        | 建設工事外    |          | 作業内容                      |
|-------------------|-------------|----------------|------------------------|------|--------|------|-----|------|--------|----------|----------|---------------------------|
|                   |             |                |                        | 大工工事 | とび土工工事 | 建具工事 | 管工事 | 電気工事 | 給湯機器設備 | システムバス設置 | システムバス設置 |                           |
| 設置前工事             | 1<br>2<br>3 | 大工<br>土工<br>建具 | 設置基礎、設置床の工事            | ○    | ○      |      |     |      |        |          |          | 浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事     |
|                   |             |                | 浴室ドア、窓サッシの下地工事         | ○    |        | ○    |     |      |        |          |          | 建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事   |
|                   |             |                | 給排水配管事前工事              |      |        |      | ○   |      |        |          |          | 浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事      |
|                   | 管           | 管              | 換気機器のダクト配管事前工事         |      |        |      | ○   | ○    |        |          |          | 浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工         |
|                   |             |                | 給湯機器専用配管事前工事           |      |        |      | ○   |      |        | □        |          | 風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事         |
|                   |             |                | 浴室専用電気配線事前工事           |      |        |      |     | ○    |        |          |          | 浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事     |
| システムバス<br>本体取付・設置 | 建設工事<br>外区分 | 建設工事<br>外区分    | 架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置      |      |        |      |     |      |        |          | □        | 浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置 |
|                   |             |                | 浴室専用排水トラップ・配管ヒットの取付・設置 |      |        |      |     |      |        |          | □        | 洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付        |
|                   |             |                | 壁パネルの組立・設置             |      |        |      |     |      |        |          | □        | 浴室パネル部材の加工と組立             |
|                   |             |                | 天井・浴槽の組立・設置            |      |        |      |     |      |        |          | □        | 天井部材・浴槽部材の取付              |
|                   |             |                | 内装品、器具類の取付・設置【注記 1】    |      |        |      |     |      |        |          | □        | カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付       |
|                   |             |                | 水栓類の組立・取付【注記 1】        |      |        |      |     |      |        |          | □        | 水栓類の組立、浴室部材への取付           |
|                   |             |                | 浴室専用換気機器の取付【注記 1】      |      |        |      |     |      |        |          | □        | 浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付      |
|                   |             |                | 風呂追焚き部品の取付【注記 1】       |      |        |      |     |      |        | □        | □        | 循環追焚き金具の取付                |
|                   |             |                | 浴室内給湯機器用リモコンの取付        |      |        |      |     |      |        | □        | □        | 専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付       |
|                   |             |                | 浴室照明器具の取付              |      |        |      |     |      |        |          | □        | 浴室照明器具の浴室パネル加工・取付         |
|                   |             |                | その他浴室関連電化機器の取付【注記 1】   |      |        |      |     |      |        |          | □        | 電化品、オプション品の取付             |
|                   |             |                | 浴室ドアの組立・取付             |      |        |      |     |      |        |          | □        | システムバス構成部材のドアの組立・取付       |
|                   |             |                | 浴室窓サッシの取付【注記 1】        |      |        |      |     |      |        |          | □        | システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付     |
|                   |             |                | 浴室窓枠の組立・取付【注記 1】       |      |        |      |     |      |        |          | □        | システムバス構成部材の窓枠の組立・取付       |
|                   |             |                | シリコンの充填                |      |        |      |     |      |        |          | □        | 接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填       |
|                   |             |                | 試運転・完成検査【注記 2】         |      |        |      |     |      |        |          | □        | 完成後の試運転、性能確認検査            |
|                   |             |                | 建築外壁の穴あけ               | ○    |        |      | ○   |      |        |          |          | 建築壁の躯体加工作業                |
|                   |             |                | 排気ダクトの敷設工事             |      |        |      | ○   |      |        |          |          | 浴室換気機器のダクト敷設工事            |
|                   |             |                | 浴室換気機器と排気ダクト接続工事       |      |        |      | ○   |      |        |          |          | 建築側ダクトと換気機器の接続、検査         |
|                   |             |                | 浴室換気機器の電気・アース接続工事      |      |        |      |     | ○    |        |          |          | 建築側の屋内配線と配線器具、アース工事       |
|                   |             |                | ウェザーカーの外壁取付            |      |        |      | ○   | ○    |        |          |          | 建築の外装仕上げ工事                |
|                   |             |                | 給水・給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事  |      |        |      | ○   |      |        |          |          | 給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査   |
|                   |             |                | 建築側排水配管との接続工事【注記 3】    |      |        |      | ○   |      |        |          |          | 浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査     |
|                   |             |                | 給湯機器本体工事（試運転・確認）       |      |        |      |     | ○    |        | □        |          | 機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）       |
| 設置後工事             | 1<br>2<br>3 | 電気<br>他        | 内装仕上げ工事                | ○    |        | ○    |     |      |        |          |          | 床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事           |
|                   |             |                | 浴室用電源配線、接続工事           |      |        |      |     | ○    |        |          |          | 浴室機器の事後電気工事               |
|                   |             |                | 浴室天井裏の電源、スイッチ工事        |      |        |      |     | ○    |        |          |          | 浴室全体の電気器具、配線接続工事          |
|                   |             |                |                        |      |        |      |     |      |        |          |          |                           |

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する

※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする

**Takara standard**  
タカスタンダード株式会社

現場名称： 三重-伊勢SR SB3様邸

現場番号： A6808307

伊勢ショールーム

RELAGE レフージュ

プラン番号： 5906C-2011-0223T

担当営業：


工事区分表

作成日： 2021年3月19日

担当アドバイザー：


# 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





# 給水給湯工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

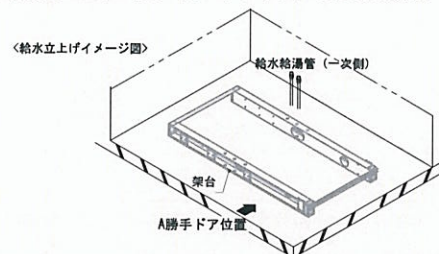




## 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりて打設してください。

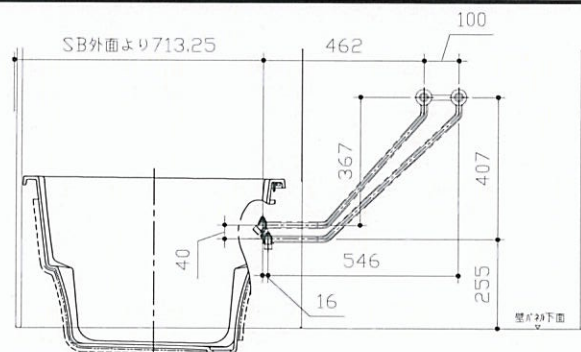

## 設備記号

| 記号 | 記号の意味 |
|----|-------|
| ☒  | 給水位置  |
| ☒  | 給湯位置  |

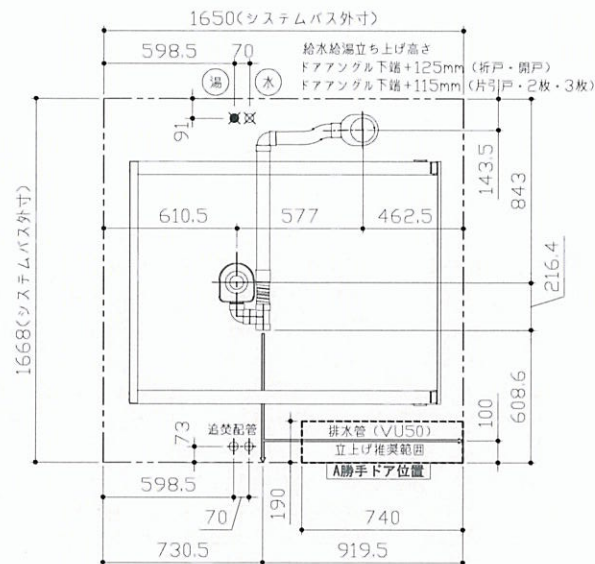

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

## ＜給水給湯管取合詳細図＞

**Takara standard**  
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 三重-伊勢SR SB3様邸

現場番号： A6808307

伊勢ショールーム

RELAGE レフージュ

プラン番号： 5906C-2011-0223T

担当営業：

排水配管図

作成日： 2021年3月19日

担当アドバイザー：







■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯・追焚配管を立上げるので注意してください。
  - ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
  - ・ドア部はSB外寸より突出します。
- 詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

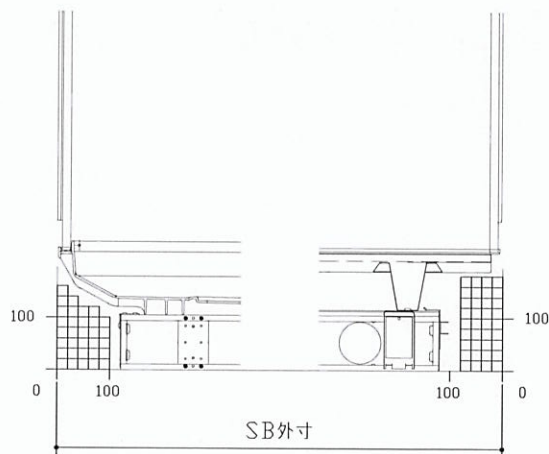


A矢視

B矢視

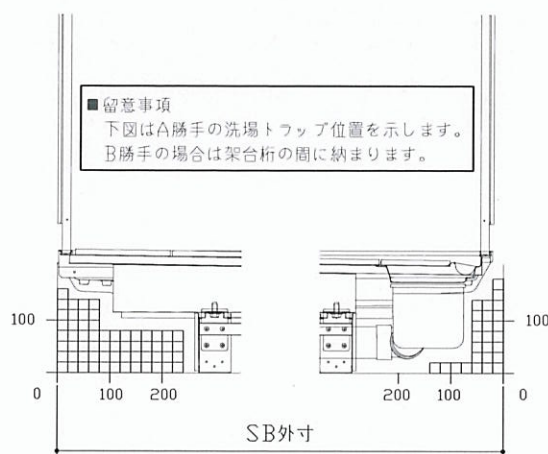

C矢視

D矢視

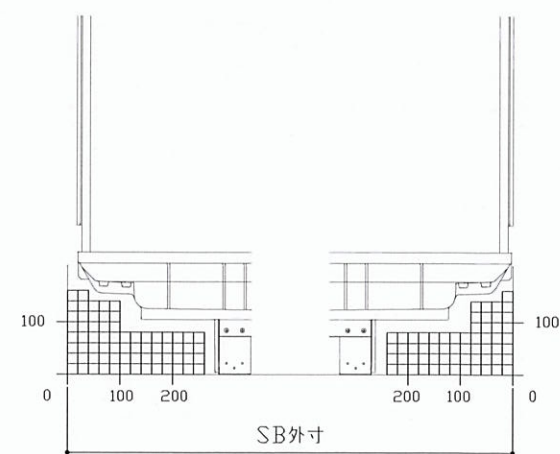

E矢視

F矢視

■留意事項

下図はA勝手の洗場トラップ位置を示します。  
B勝手の場合は架台桁の間に納まります。

**Takara standard**  
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 三重-伊勢SR SB3様邸

現場番号： A6808307

伊勢ショールーム

RELAGE レファージュ

プラン番号： 5906C-2011-0223T

担当営業：

床下空間図


作成日： 2021年3月19日

担当アドバイザー：



# キープクリーンドア：折戸・上部換気口



有効開口寸法689mm

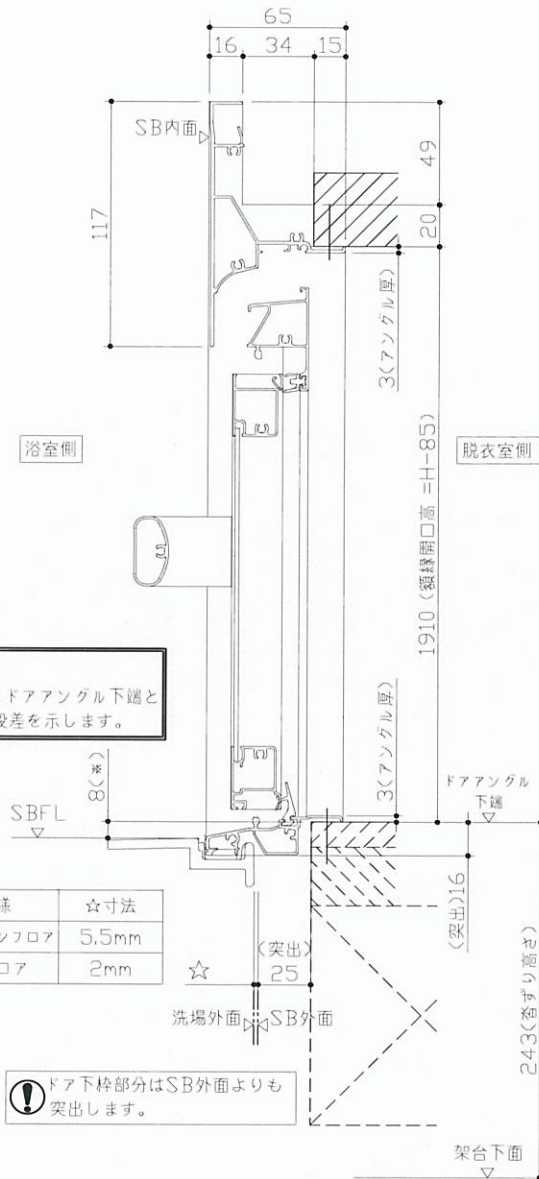

■留意事項  
※印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。


| ドア仕様       | ☆寸法   |
|------------|-------|
| キープクリーンフロア | 5.5mm |
| FRPフロア     | 2mm   |

⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

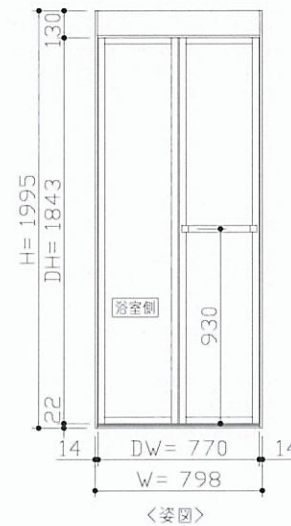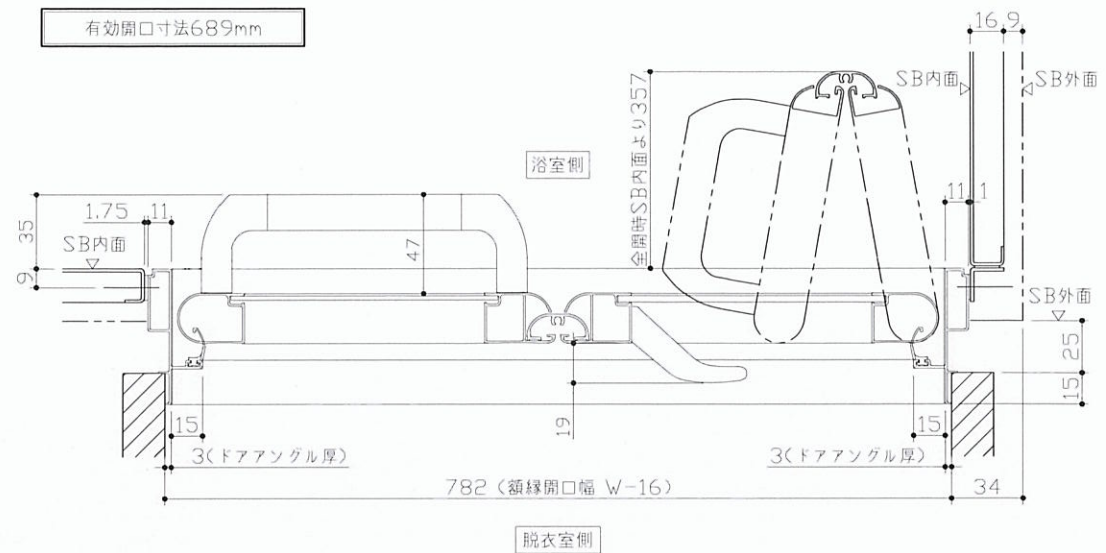

- ドア横の管柱、周柱について
- ・ ドアが管柱、周柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- ・ 躯体へドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉




Takara standard  
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 三重-伊勢SR SB3様邸  
現場番号： A6808307  
伊勢ショールーム


RELAGE レフージュ  
プラン番号： 5906C-2011-0223T  
担当営業：

ドア取合詳細図  
作成日： 2021年3月19日  
担当アドバイザー：

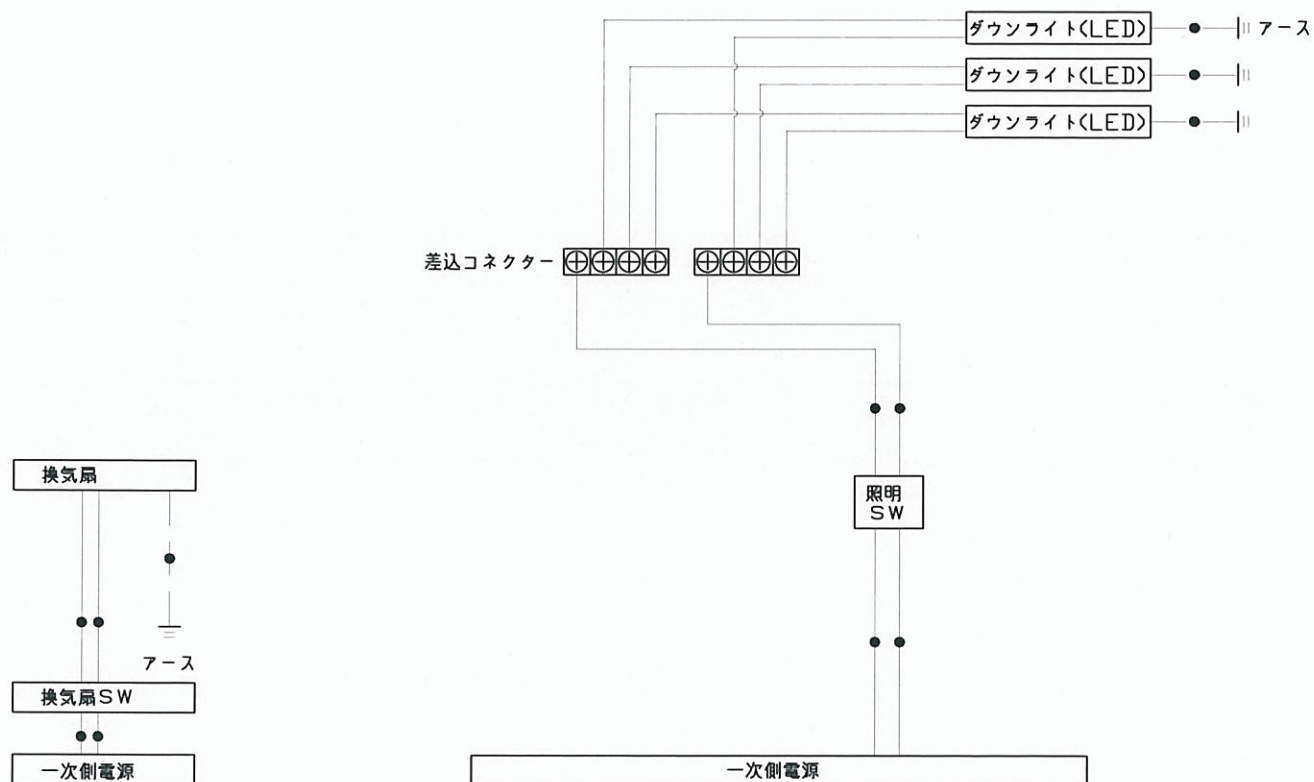


一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。


# 浴槽



| 規格   | 浴槽奥行寸法 |      |
|------|--------|------|
|      | L      | B    |
| 1568 | 1495   | 42.5 |
| 1593 | 1520   | 55   |
| 1618 | 1545   | 67.5 |
| 1643 | 1570   | 80   |
| 1668 | 1595   | 92.5 |
| 1693 |        |      |
| 1718 |        |      |
| 1743 |        |      |
| 1768 | 1620   | 105  |
| 1793 |        |      |
| 1818 |        |      |
| 1843 |        |      |
| 1868 |        |      |




# 洗い場用水栓




# 照明

ダウンライト  
LED 4.1W (1灯あたり)




# 換気機器

管工事




# シャワーフックスライドバー

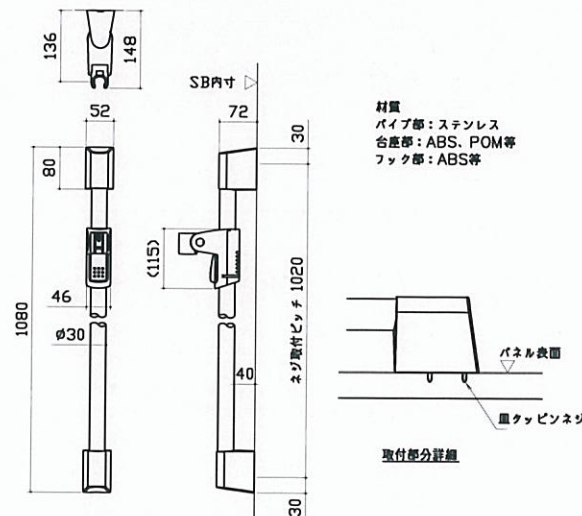

# ミラー

枠: SUS304 t0.8  
ミラー: 表面防曇コートあり (ロングクリアミラー-A)  
表面防曇コートなし (ロングミラー-A)

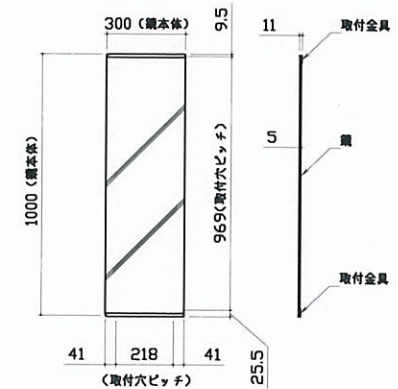







Takara standard  
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 三重-伊勢SR SB3様邸  
現場番号: A6808307  
伊勢ショールーム


RELAGE レフージュ  
プラン番号: 5906C-2011-0223T  
担当営業:






部材詳細図 1/3  
作成日: 2021年3月19日  
担当アドバイザー:

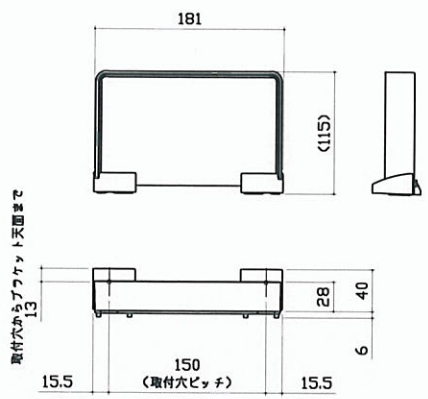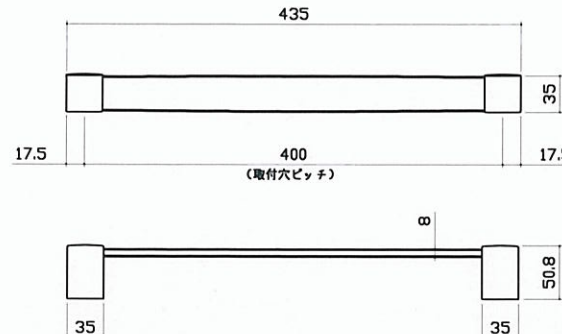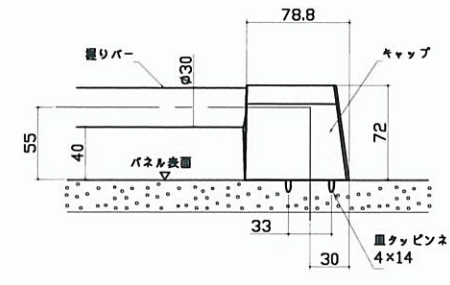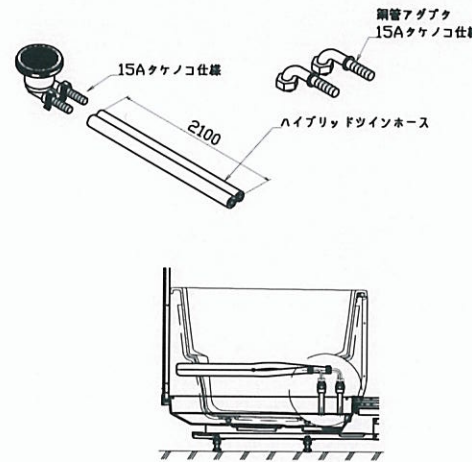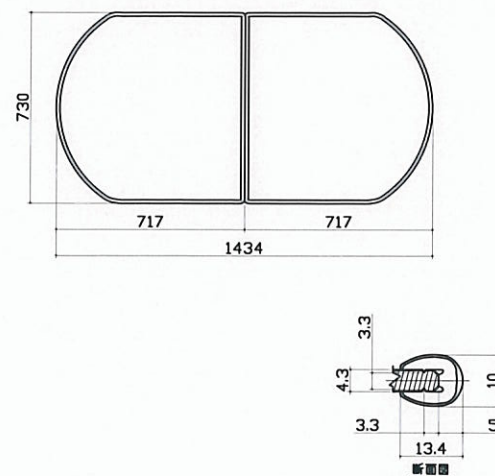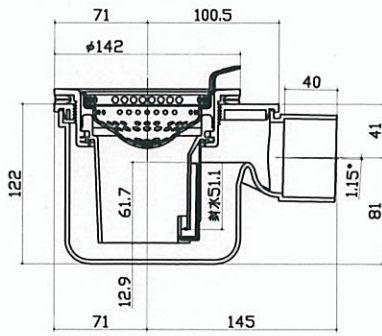

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div>収納棚</div> <div>本体：AS</div> <div></div> | <div>タオル掛け</div> <div>本体：PMMA<br/>ポケット：ABS（クロムメッキ仕上げ）</div> <div></div> | <div>ハンドバー支持部取合詳細図</div> <div></div> |                                                                                 |
| <div>循環金具・フロアダプタ関連</div> <div></div>       | <div>風呂蓋 707MVA-16Y</div> <div></div>                                  | <div>洗い場側排水トラップ</div> <div></div>   |                                                                                 |
| <div>Takara standard</div> <div>タカラスタンダード株式会社</div>                                                                          | <div>現場名称： 三重-伊勢SR SB3様邸</div> <div>現場番号： A6808307</div> <div>伊勢ショールーム</div>                                                                              | <div>RELAGE レフージュ</div> <div>プラン番号： 5906C-2011-0223T</div> <div>担当営業：</div>                                             | <div>部材詳細図</div> <div>2/3</div> <div>作成日： 2021年3月19日</div> <div>担当アドバイザー：</div> |

浴槽側排水トラップ

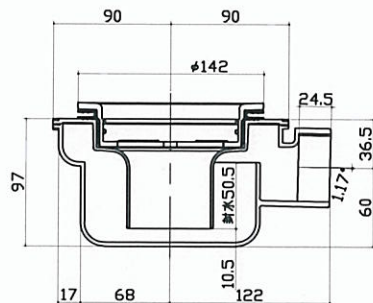
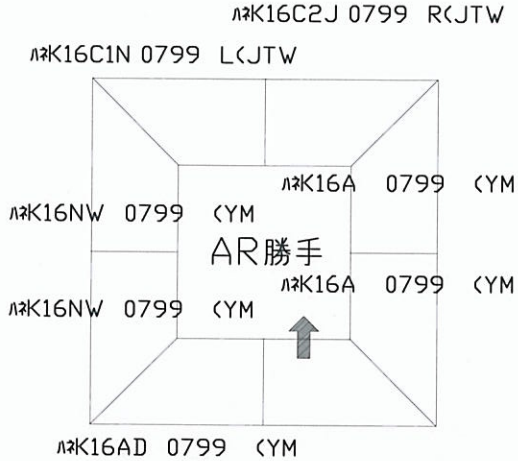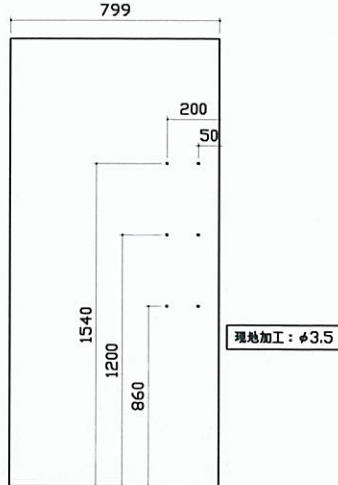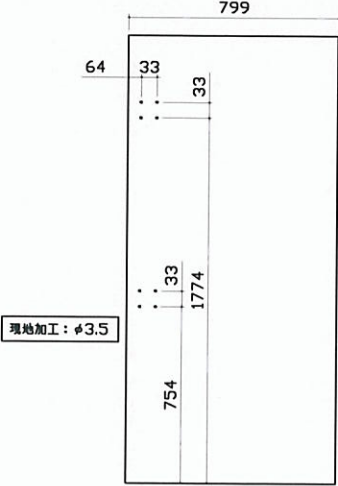
|                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>パネル割図</p>           | <p>ミラー</p>                                                     | <p>収納棚</p>  |
| <p>シャワーフックスライドバー</p>  | <p>タオル掛け</p>  <p>■留意事項<br/>ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。</p> |                                                                                                |

|                                             |                     |                         |                 |     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-----|
| <p>Takara standard</p> <p>タカラスタンダード株式会社</p> | 現場名称： 三重-伊勢SR SB3様邸 | RELAGE レフージュ            | 穴開け指示図          | 1/1 |
|                                             | 現場番号： A6808307      | プラン番号： 5906C-2011-0223T | 作成日： 2021年3月19日 |     |
|                                             | 伊勢ショールーム            | 担当営業：                   | 担当アドバイザー：       |     |
|                                             |                     |                         |                 |     |
