

システムバス 御見積書

御名前 支社 いわきSR SB3 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランスパ

商品
御見積金額 **¥646,800** (税込 ¥711,480)
()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

作成日 2025年7月7日
プラン番号 7205C-2505-0205T
現場番号 A6170950

タカラスタANDARD株式会社
◆いわき営業所
福島県いわき市平字下の町8番地の14
TEL 0246-22-6181 / FAX 0246-22-6205

◆いわきショールーム
TEL 0246-22-6181 / FAX 0246-22-6215

※ 商品御見積金額には商品組付費と現場配送費が含まれております。
※ 給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616(AR勝手)
洗い場仕様	ガラス繊維強化樹脂<FRP>
洗い場カラー	グレー
浴槽材質	FRP
浴槽カラー	ライトグレー
浴槽形状	スクエア浴槽
カウンター材質	樹脂
カウンター/下カバーカラー	チャコールグレー / -
浴槽前カウンターカラー	-
エブロン材質/カラー	樹脂 / ライトグレー
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ダークグレー
パネルカラー(周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 50Hz

◆ 御確認事項

☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には、弊社支店営業所等へお問い合わせ、又はカタログにてよくご確認下さいませ。
☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。
☆修理受付フリーダイヤル 0120-557-910(土日祝、夏季・年末年始休業日を除く)

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		水野

◆ 備考

--	--

No.SB11 *

御名前 支社 いわきSR SB3

様

現場番号	A6170950	プラン番号	7205C-2505-0205T	作成日	2025/7/7
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	769,000	769,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイ)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・1面デザイン/周辺レギュラークラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	FRP洗い場(保温材有り)(グレー)	1	-76,000	-76,000
7	浴槽	FRP(ライトグレー)	1	-88,000	-88,000
8	浴槽追焚き穴	あり	1		
9	エプロン	FRP浴槽用保温材なし(ライトグレー)	1		
10	浴槽形状	FRPスクエア浴槽	1		
11	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
12	浴槽パン	なし	1		
13	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂ホース(シルバー)KF3000LTTKST	1		
14	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド	1		
15	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
16	カウンター	コンパクトカウンター	1	-56,000	-56,000
17	シャワーフック	シャワーフックKJ	1	+2,000	+2,000
18	シャワーフックスライドバー	なし	1	-5,000	-5,000
19	浴室パネル	レギュラークラス(一面デザイン)(Kパネル)	1	-20,000	-20,000
20	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴あり	1		
21	天井	フラット天井	1	-15,000	-15,000
22	換気機器	天井換気扇ホワイ	1		
23	換気機器開口	工場開口	1		
24	照明	ソフトスクエアライト(電球色)	1	-15,500	-15,500
25	ミラー	ショートミラー	1	-8,500	-8,500
26	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
27	タオル掛け	スクエアタイプ	1		
28	ハンドバー	樹脂製 1型600タイプ(風呂フタフック付)(バー:ホワイ、フック:チャコールグレー)	1	+13,000	+13,000
29	収納棚	スクエアタイプ(2段)<チャコールグレー>	1	+1,200	+1,200
30	どこでもラック	シャンプーフック(チャコールグレー)	1	+2,100	+2,100
31	循環金具セット	ELX	1	+11,500	+11,500

御名前 支社 いわきSR SB3 様

現場番号	A6170950	プラン番号	7205C-2505-0205T	作成日	2025/7/7
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
33	トラップカバー	なし	1		
34	ブロック積用ボンド	2段用	1	+2,000	+2,000
システムバス合計			34		¥516,800

商品総合計	34	¥516,800
-------	----	----------

商品組付費		数量	金額
1	本体組付費	1	122,000
商品組付費合計			¥122,000

その他費用		数量	金額
	現場配送費	1	8,000
配送費他合計			¥8,000

商品御見積金額	¥646,800
---------	----------


※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。

又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

パース

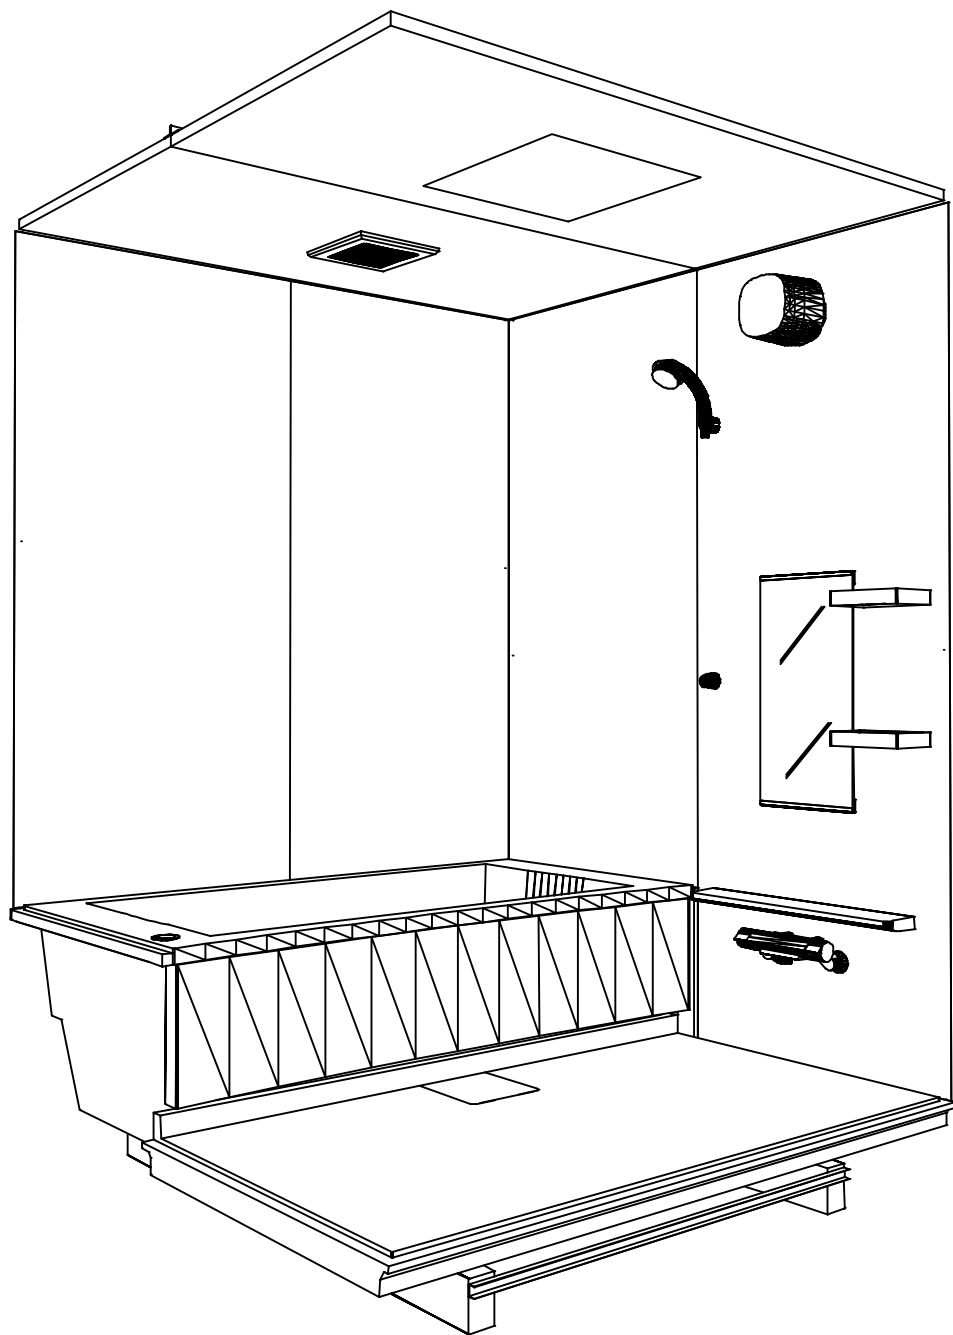

鳥瞰図

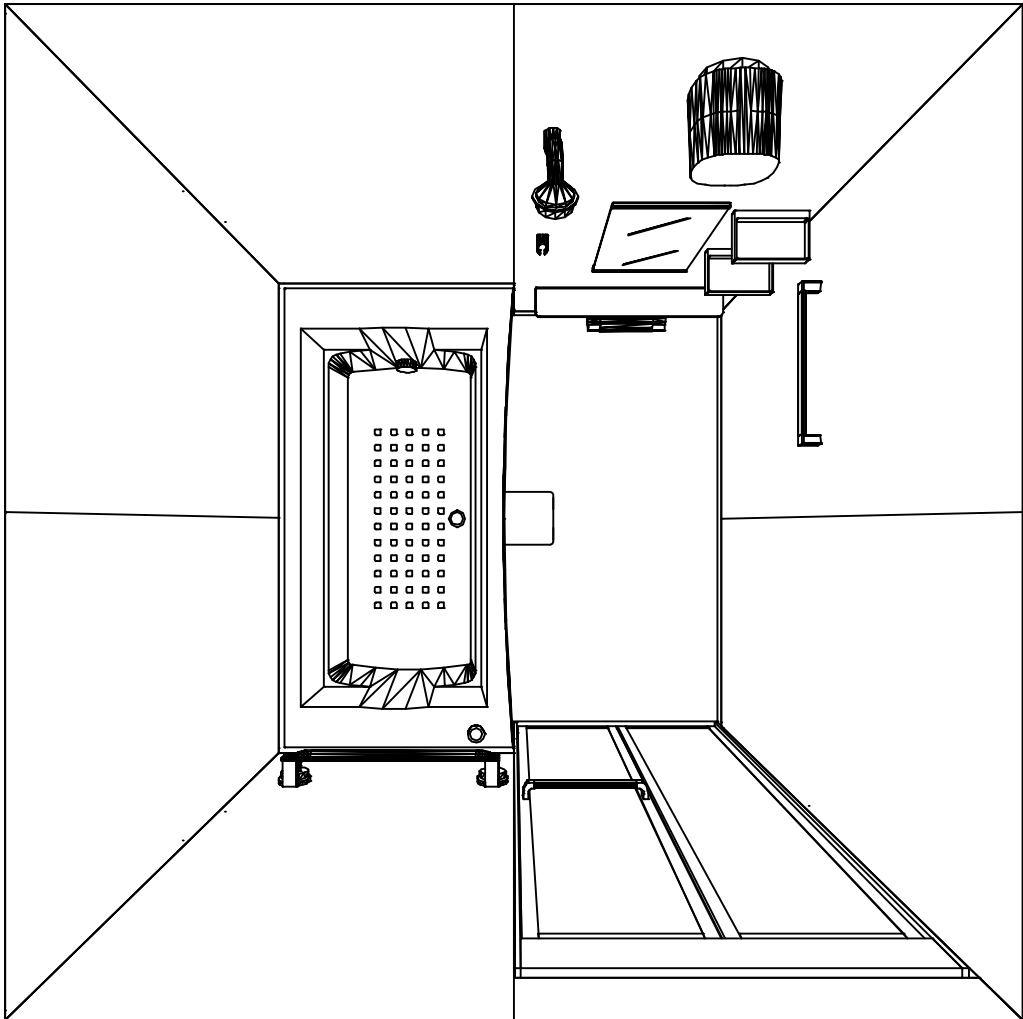

1616



フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： 支社_いわきSR SB3様邸	GRANSPA グランspa	姿図	
現場番号： A6170950	プラン番号： 7205C-2505-0205T	作成日： 2025年7月7日	
いわき営業所	担当営業 ：	担当アドバイザー：	

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行き・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

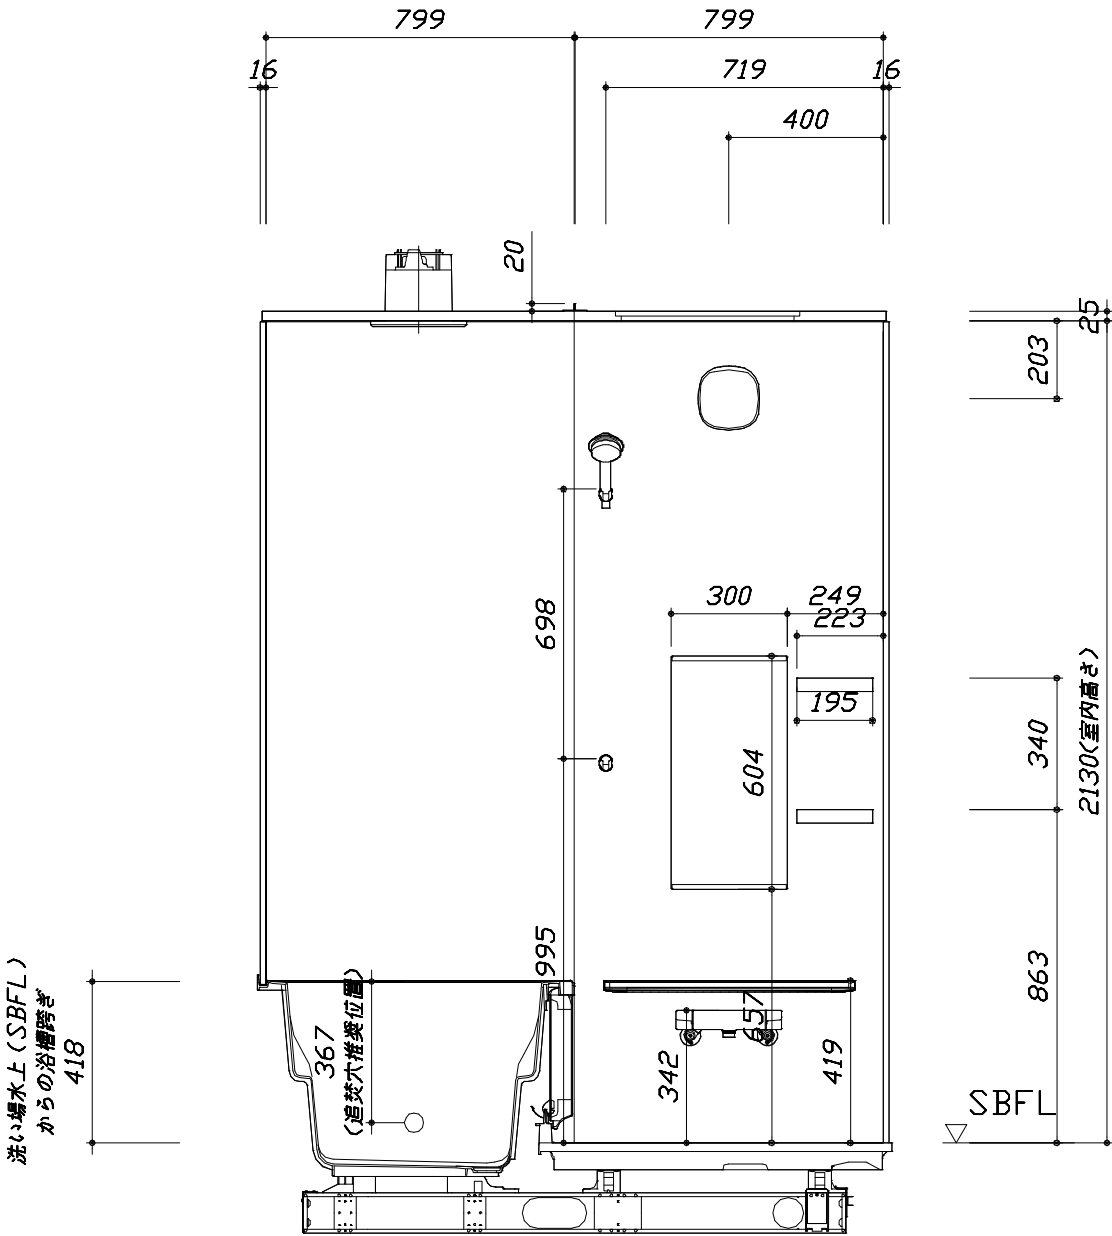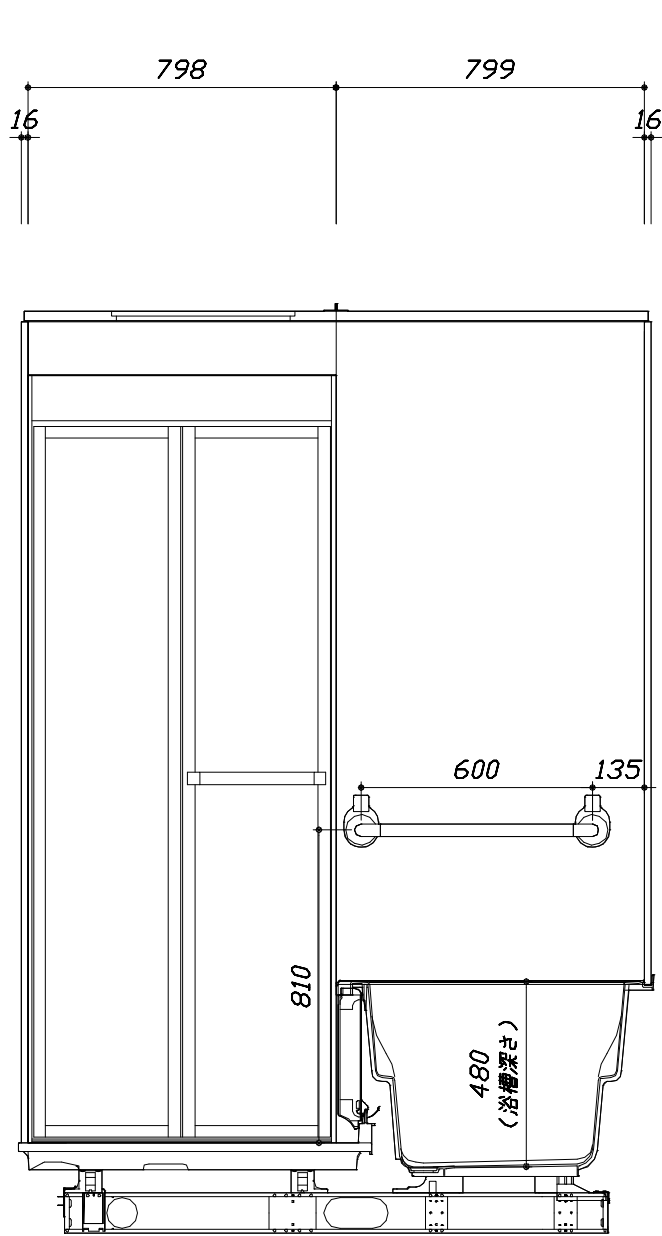


■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

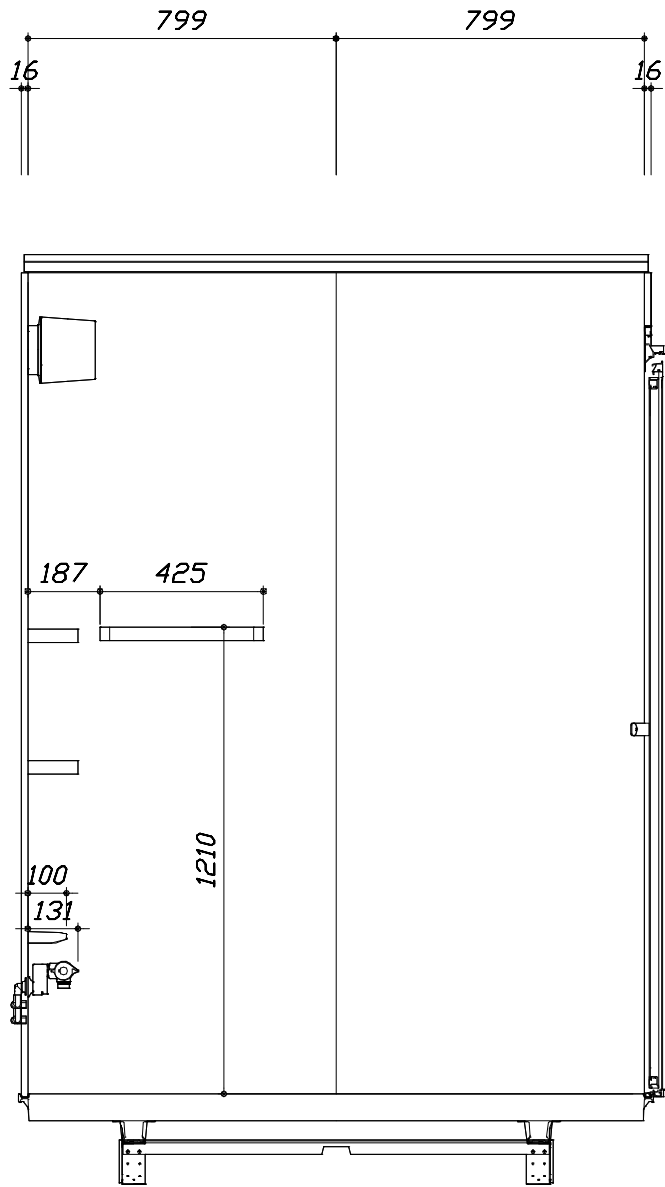

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

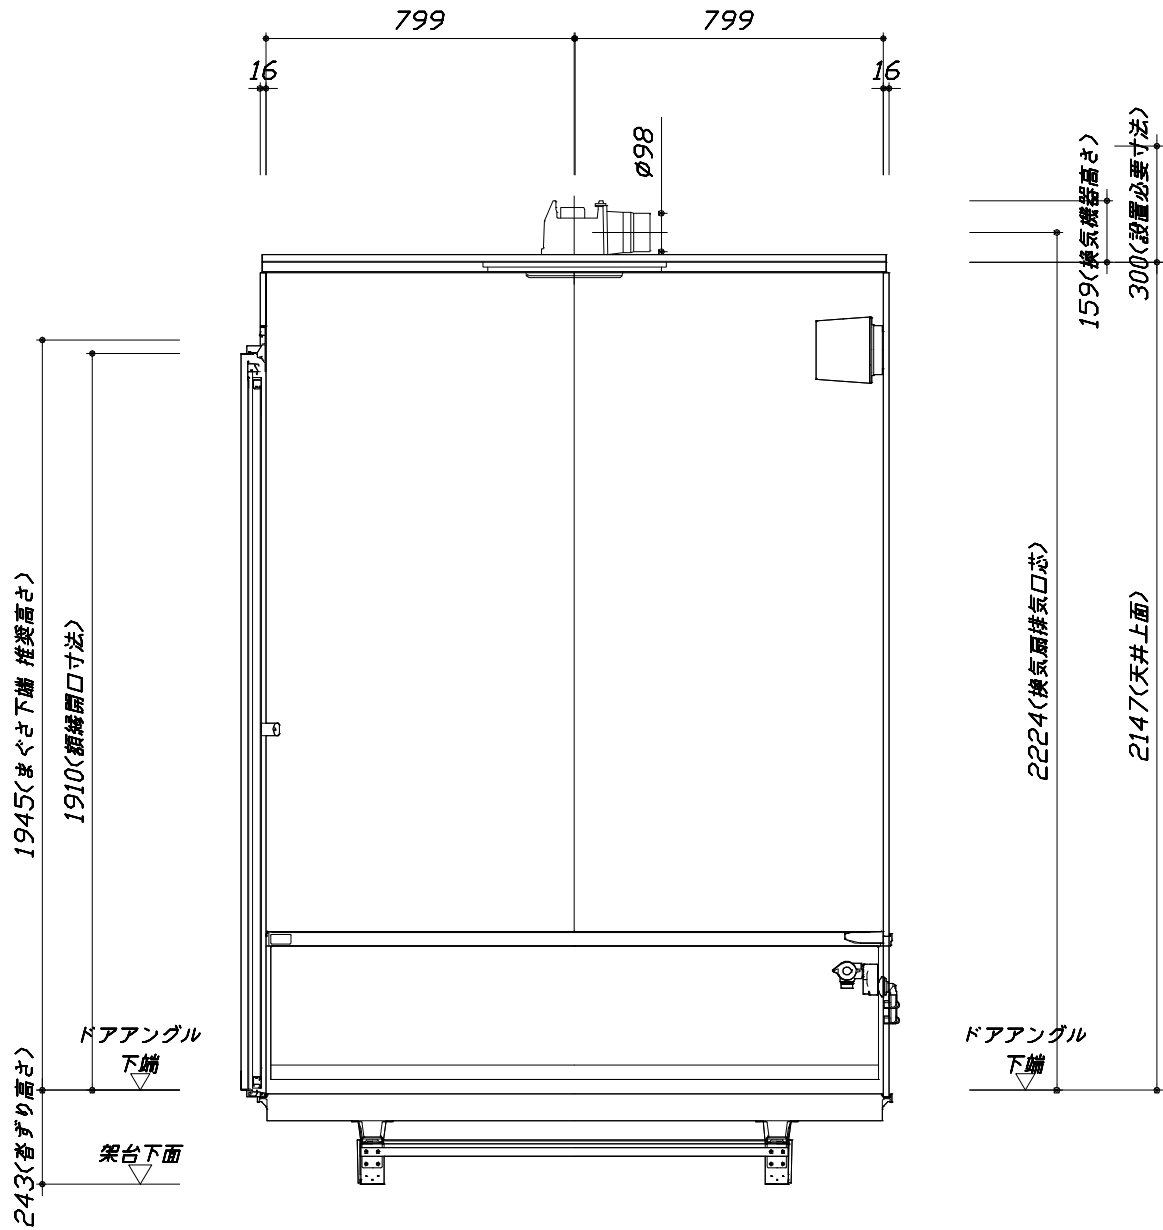

< 浴槽側面図 >

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	AR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP） 保温材付（発泡ウレタン）
浴槽材質	ガラス繊維強化樹脂（FRP）裏面保温材（発泡ウレタン）
浴槽形状	スクエア浴槽（325リットル） 追い焚き穴:あり
浴槽パン	－
浴槽エプロン	A B S 樹脂
カウンター	コンパクトカウンター：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:あり
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：なし
ドア	キープクリーンドア:19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓1	－
窓2	－
窓枠1	－
窓枠2	－
排水トラップ	A B S 樹脂・封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	250kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ショートミラー
収納棚	スクエアタイプ：ABS樹脂製（2段）
タオル掛け	スクエアタイプ(ホワイト)：ABS樹脂製
洗場側水栓	サーモスタット(KF3000LTKST) (樹脂ホース:シルバー)
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフック（シャワーフック KJ）
照明	ソフトスクエアライト（LED 8W電球色）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W) (ダクト径φ98) ホワイト
フロフタ	組合せ式(アルミ複合板：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットELX：ホース先端部R1/2オスネジ仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	樹脂製 I型600タイプ(フロフタフック付) ホワイト
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	G：ライトグレー
カウンター	CG：チャコールグレー
パネル(カウンター面)	OG：ダークグレー
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カウンター	－
浴槽エプロン	G：ライトグレー
洗場	G：グレー
ドア / 天井	W：ホワイト / W：ホワイト
収納棚	スクエアタイプ(CG：チャコールグレー)
タオル掛け	スクエアタイプ(ホワイト)
ランドリーセット	－

Takara standard タカラストانダード株式会社	現場名称： 支社_いわきSR SB3様邸	GRANSPA グランspa	仕様表	
	現場番号： A6170950	プラン番号： 7205C-2505-0205T	作成日： 2025年7月7日	
	いわき営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分			参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』								
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事	
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
			浴室用電源配線、接続工事					○		浴室機器の事後電気工事	
浴室天井裏の電源、スイッチ工事							○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

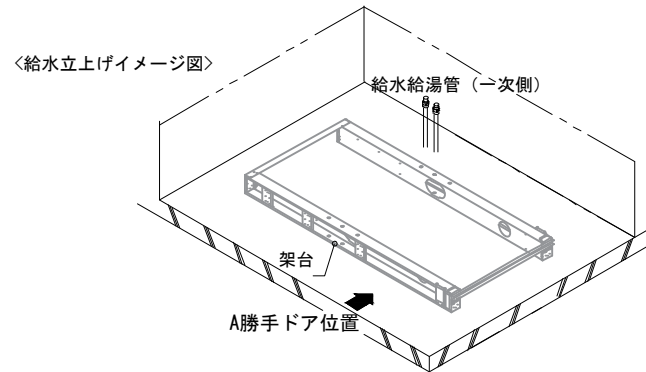

■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。



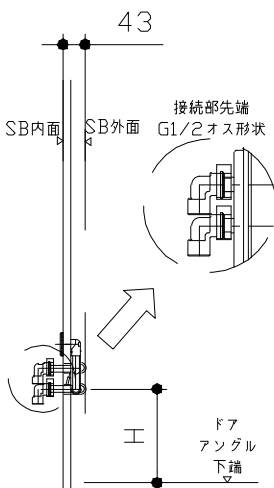
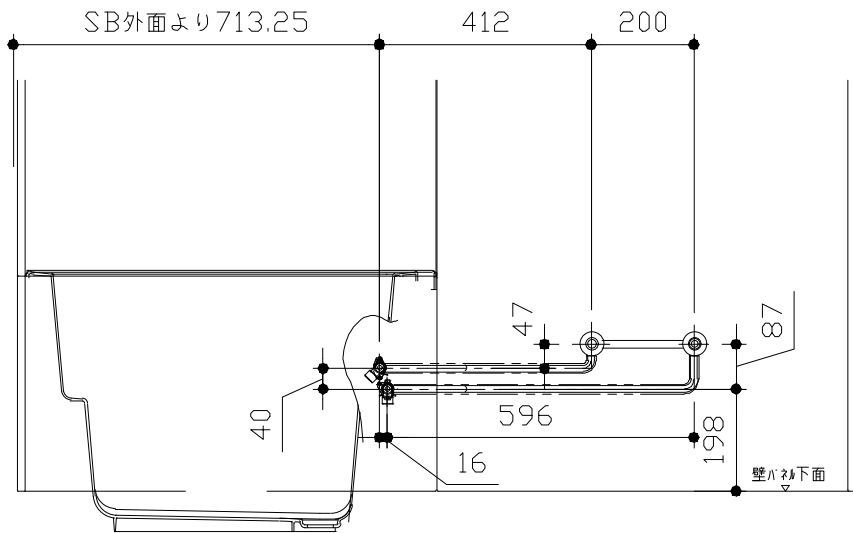


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	182
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	173

＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置

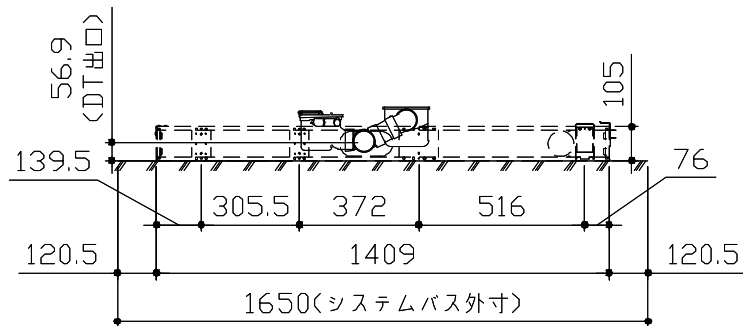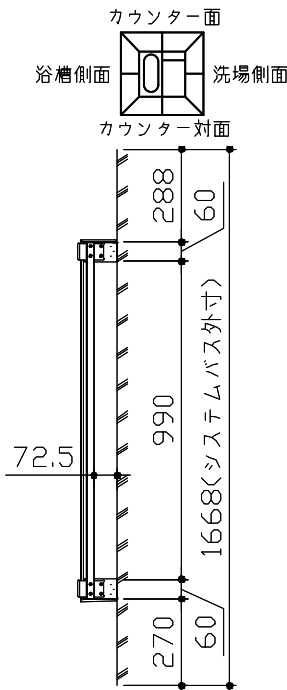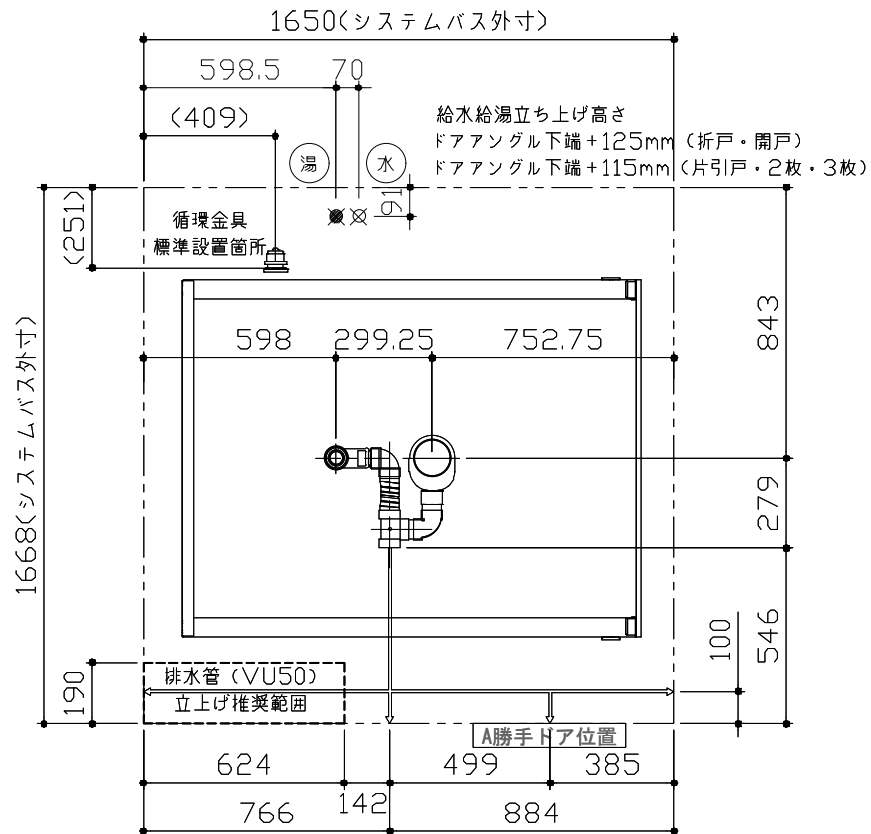

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞


■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角



(2) 留意事項

- ・カウンター面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

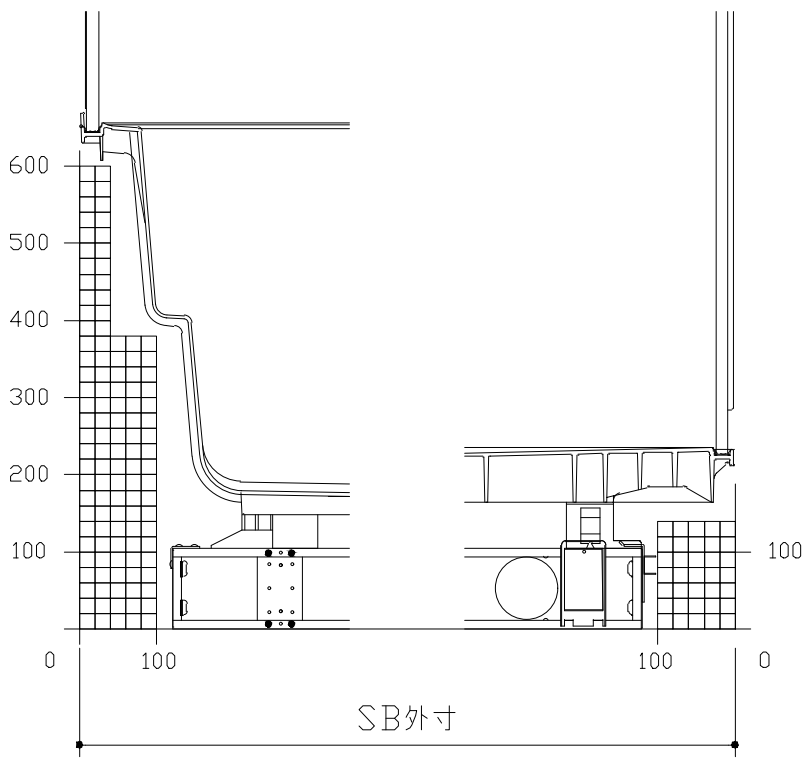



A矢視

B矢視

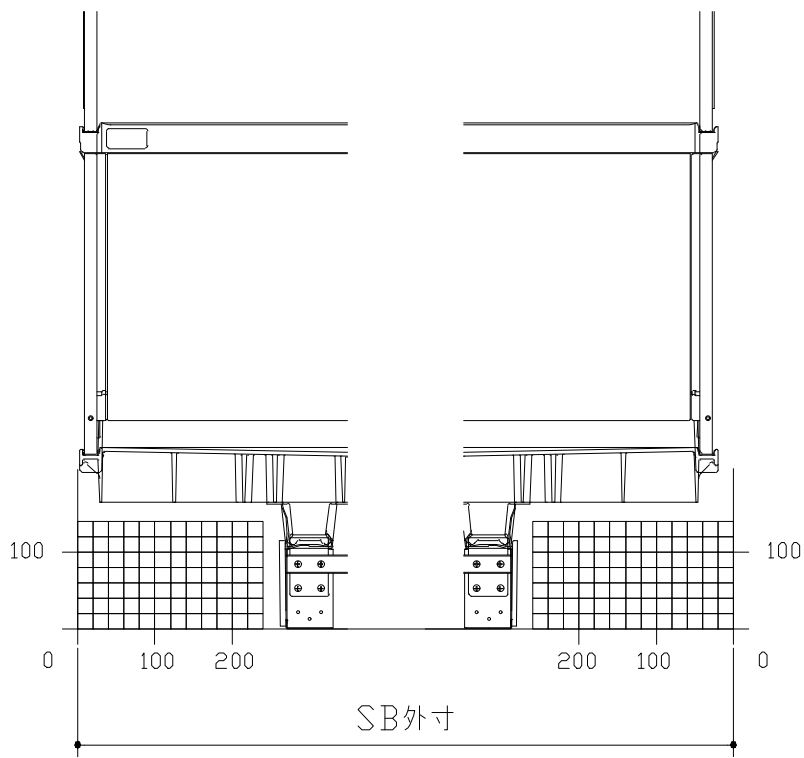

C矢視



D矢視

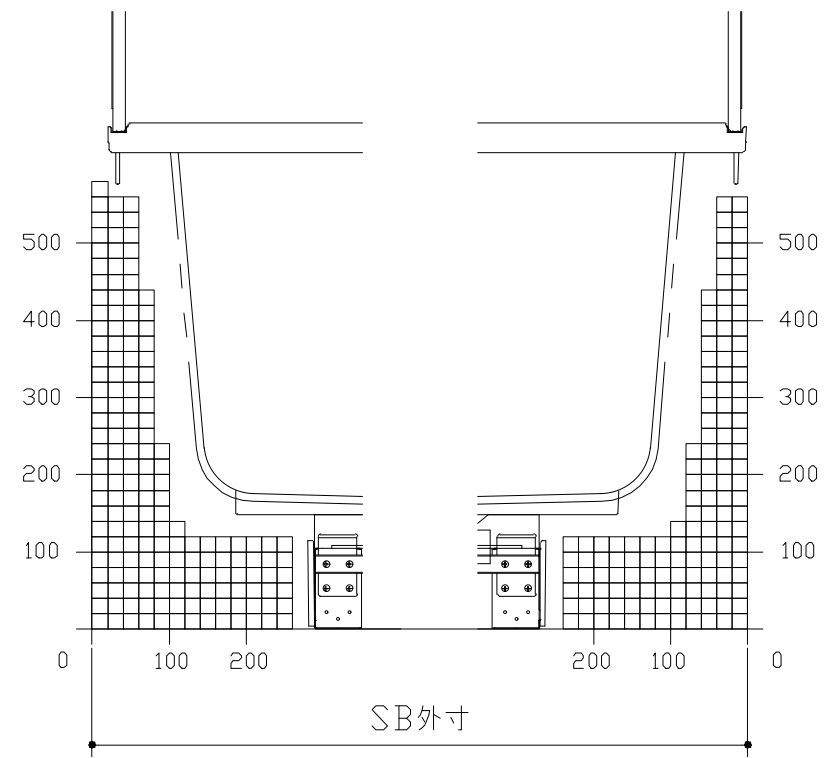

E矢視


F矢視

キープクリーンドア：折戸・上部換気口

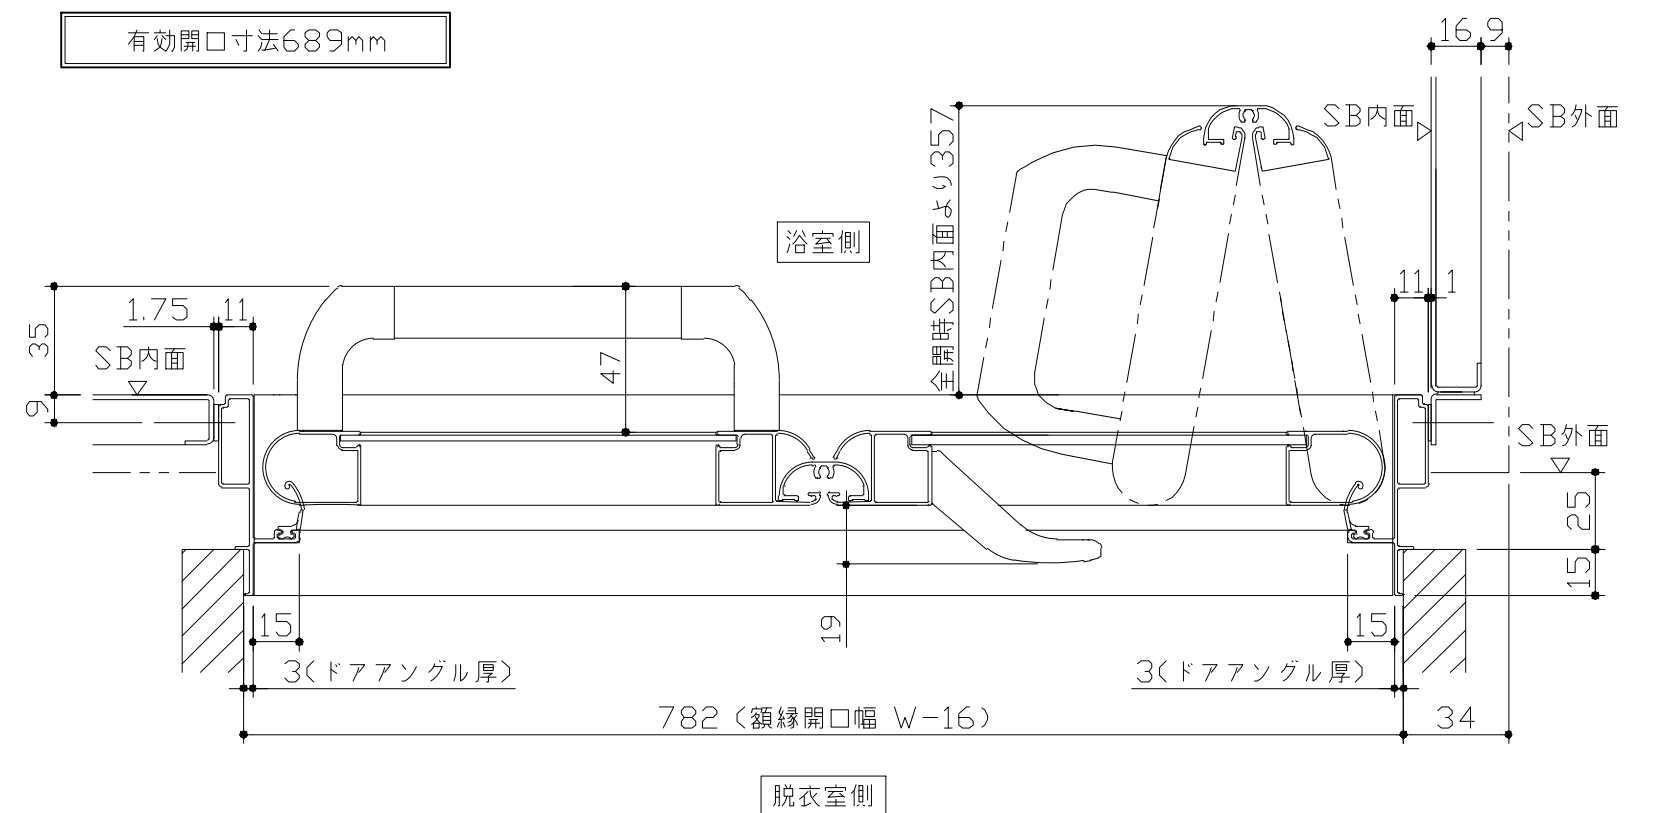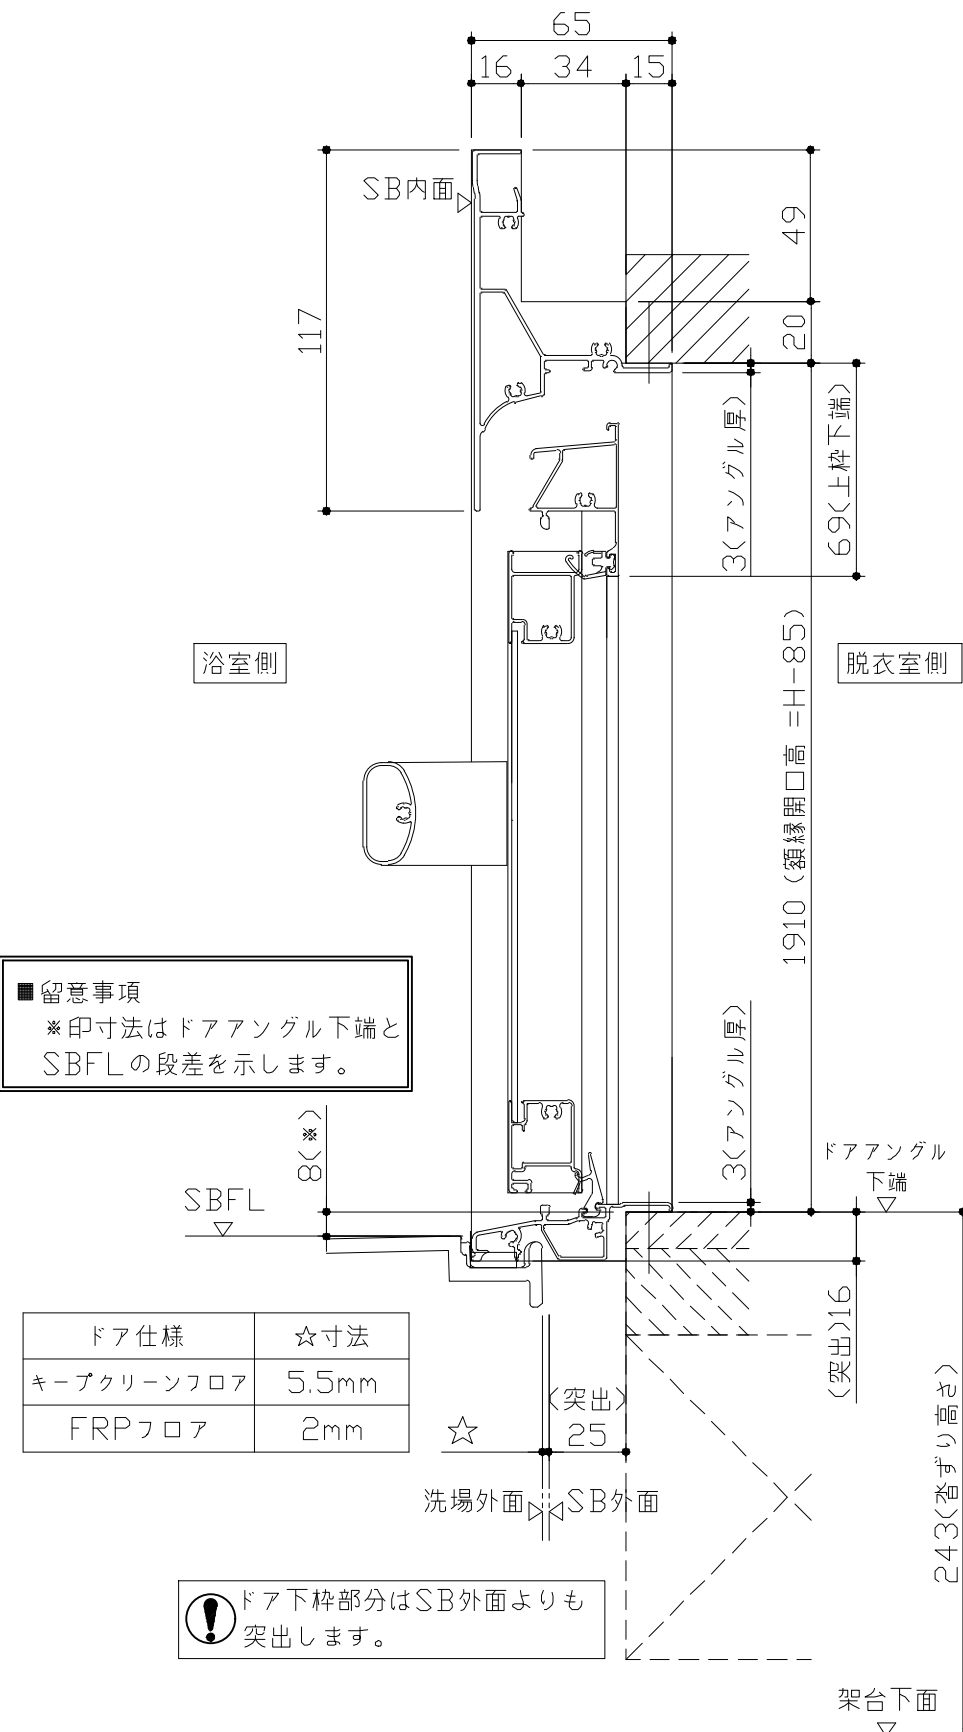

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



















一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

Takara standard タカラストンダード株式会社	現場名称： 支社_いわきSR SB3様邸	GRANSPA グランspa	電気配線図	
	現場番号： A6170950	プラン番号： 7205C-2505-0205T	作成日： 2025年7月7日	
	いわき営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

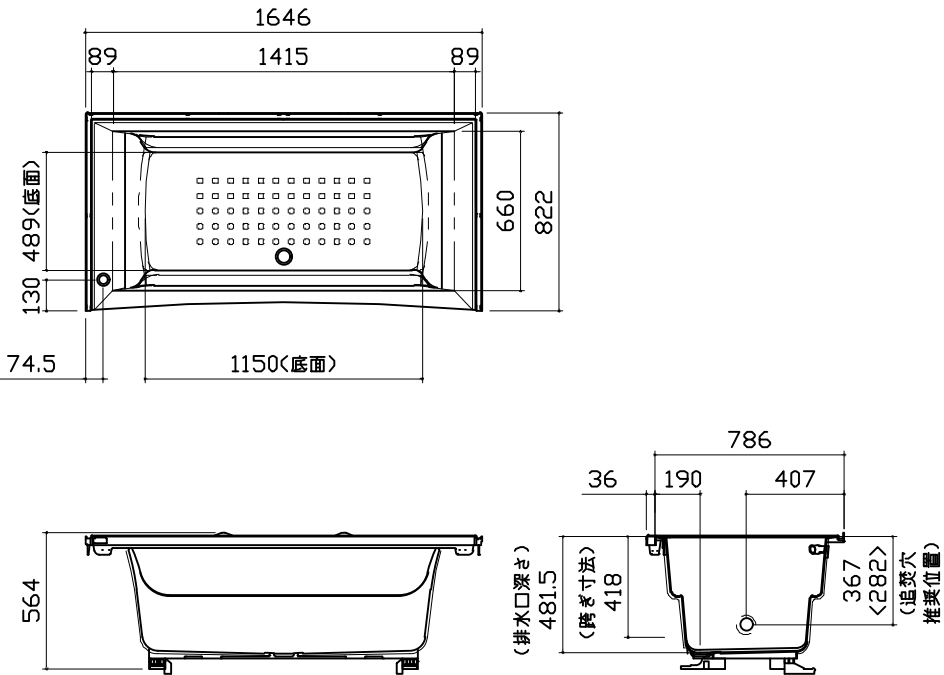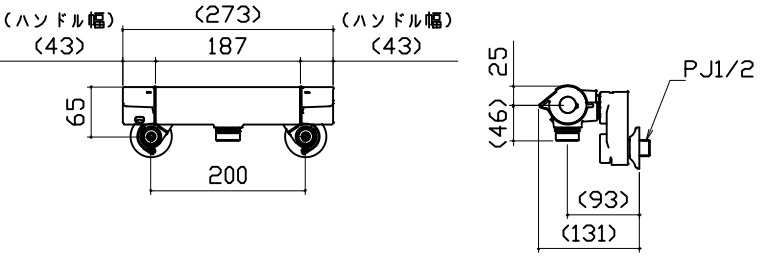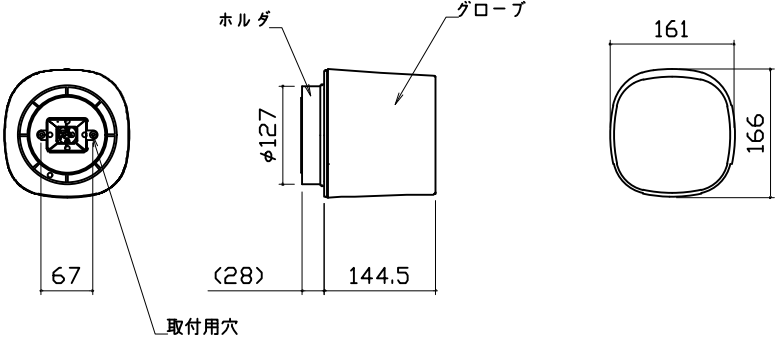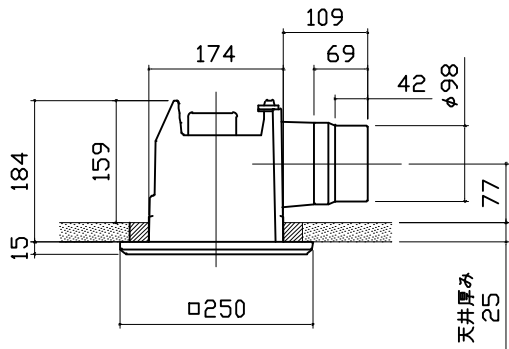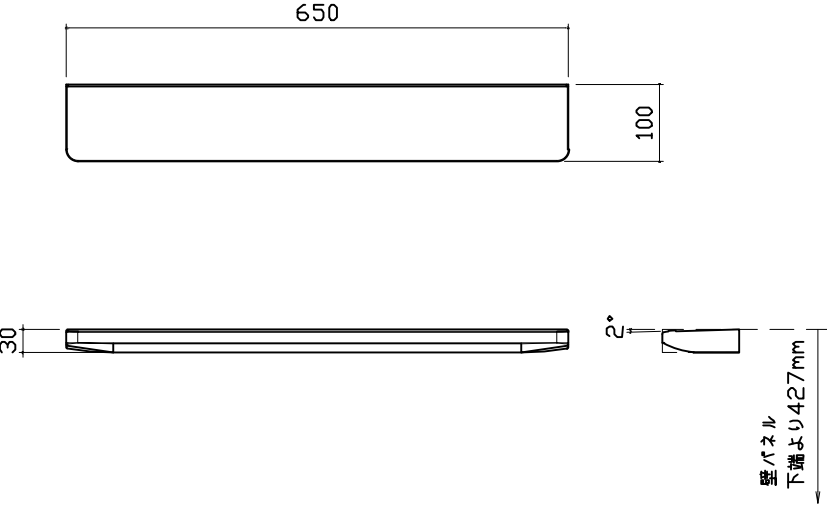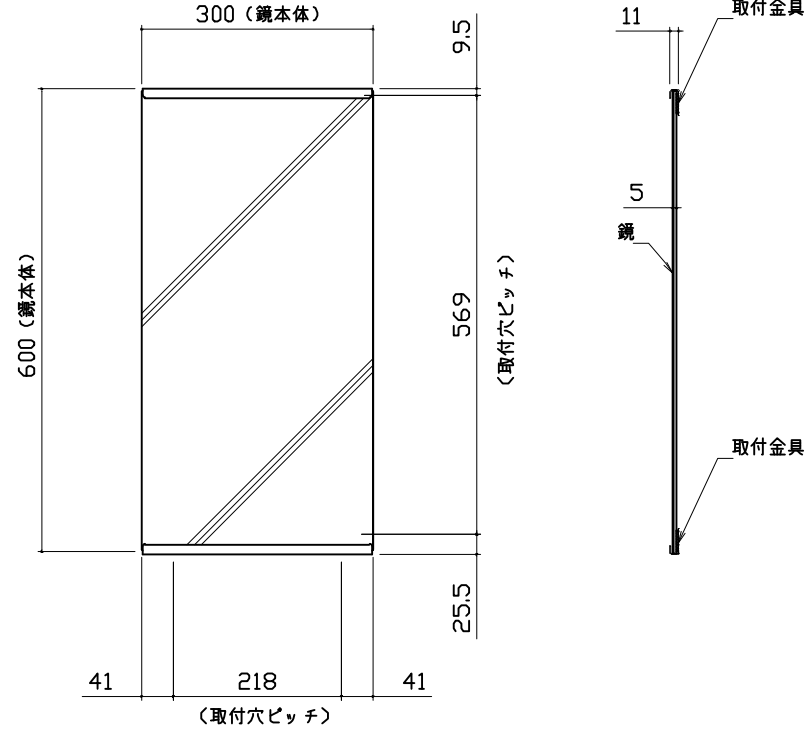浴槽		洗い場用水栓		照明	
 ※ 漏水受け仕様の場合は<>内寸法参照のこと				ソフトスクエアライト 使用電球：LED電球8W（1灯あたり） 口金E26 	
換気機器		カウンター		ミラー	
管工事 		本体：ABS 		枠：SUS304 t0.8 ミラー：表面防曇コートなし 	
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 支社_いわきSR SB3様邸	GRANSPA グランspa	部材詳細図	1/3
現場番号： A6170950		現場番号： A6170950	プラン番号： 7205C-2505-0205T	作成日： 2025年7月7日	
いわき営業所		担当営業	:	担当アドバイザー：	

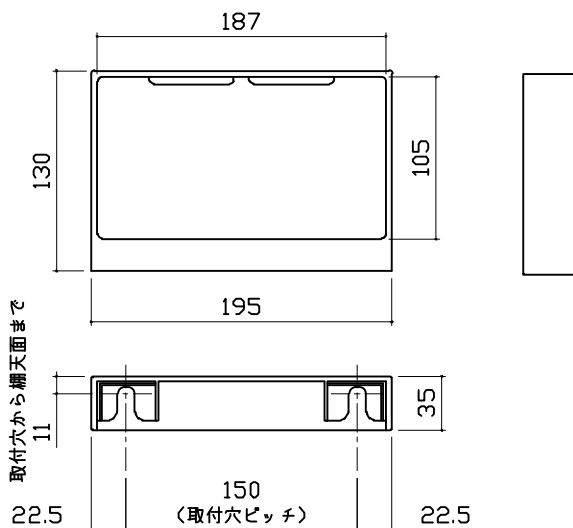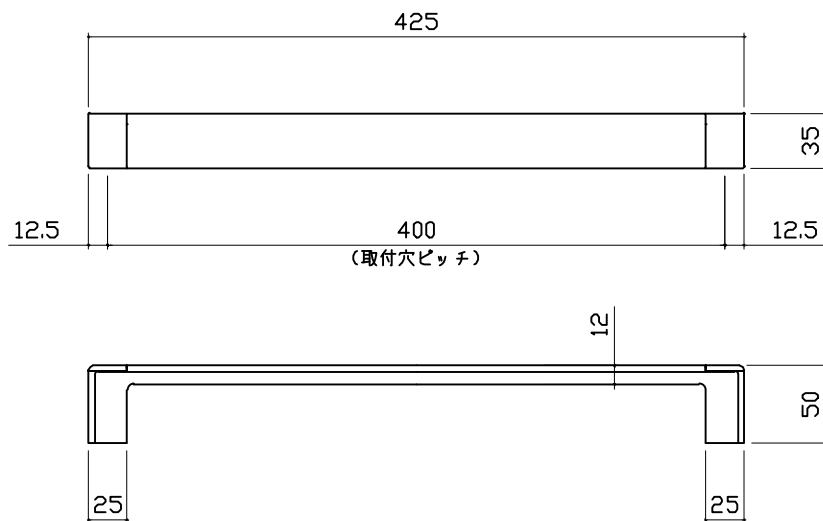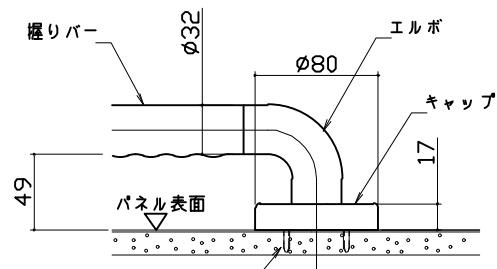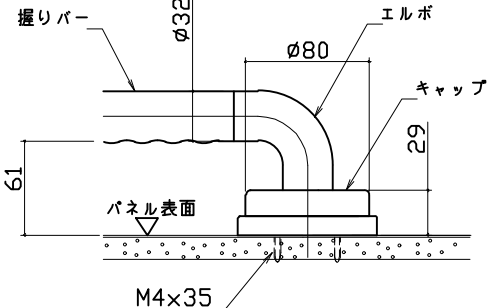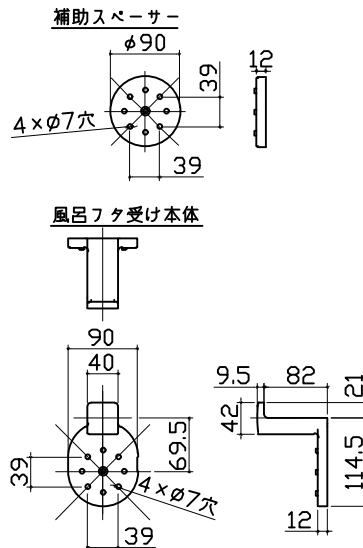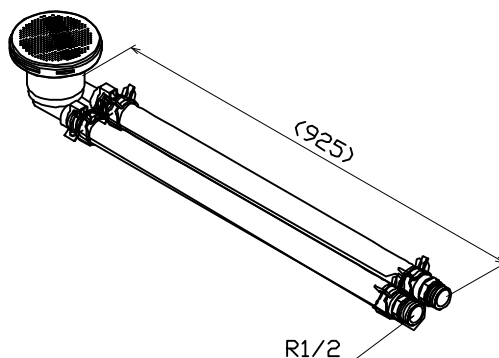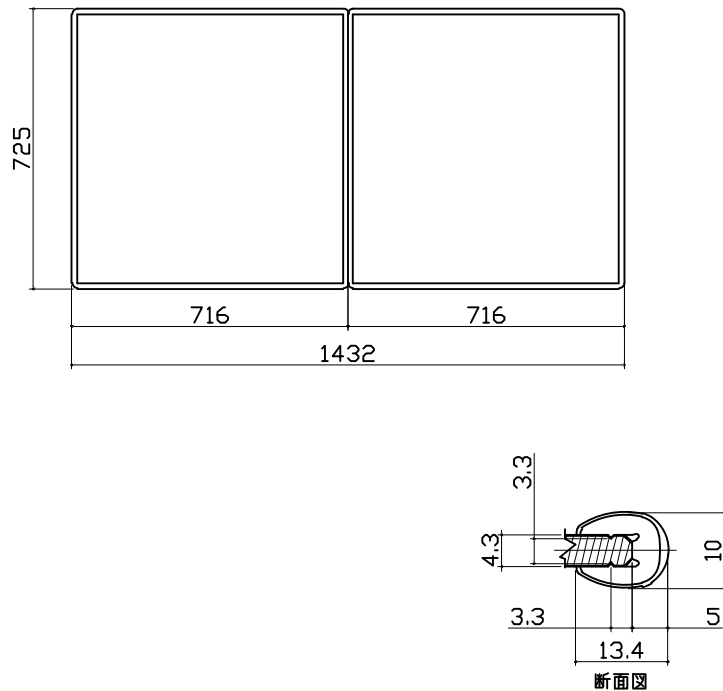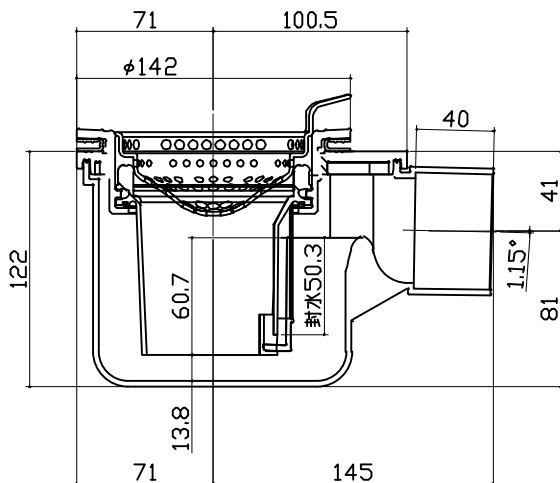収納棚 本体：ABS 		タオル掛け 本体：ABS キャップ：ABS 		ハンドバー 支持部取合詳細図 安心ハンドバー（風呂フタフック付）以外の場合  安心ハンドバー（風呂フタフック付）の場合  			
循環金具・フロアダプタ関連 		風呂蓋 フォワMZA-16SN 		洗い場側排水トラップ 			
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 支社_いわきSR SB3様邸 現場番号： A6170950 いわき営業所		GRANSPA グランspa プラン番号： 7205C-2505-0205T 担当営業：		部材詳細図 2 / 3 作成日： 2025年7月7日 担当アドバイザー：	

浴槽側排水トラップ			
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 支社_いわきSR SB3様邸	GRANSPA グランspa	部材詳細図 3/3
	現場番号： A6170950	プラン番号： 7205C-2505-0205T	作成日： 2025年7月7日
	いわき営業所	担当営業：	担当アドバイザー：

パネル割図		ミラー		収納棚	
ハネK16C2C 0799 R<OG ハネL16C1N 0799 <OG ハネL16C1N 0799 <W ハネL16C1N 0799 <W ハネL16C1N 0799 <W ハネK16A T 0799 <W ハネK16A 0799 <W AR勝手 ↑		ハネK16C2C 0799 R<OG 799 509 291 1259 690 現地加工：φ3.5		ハネK16C2C 0799 R<OG 799 200 50 1200 860 現地加工：φ3.5	
シャワーフック		照明			
ハネK16C2C 0799 R<OG 799 80 980 1003 1678 1701 現地加工：φ3.5		ハネK16C2C 0799 R<OG 799 200 366 400 433 ※：現地加工φ18 ・：現地加工φ3.5			
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 支社_いわきSR SB3様邸	GRANSPA グランスパ	穴開け指示図	1/1
		現場番号： A6170950	プラン番号： 7205C-2505-0205T	作成日： 2025年7月7日	
		いわき営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	
