

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 支社 いわきSR SB6 様

業者 UD-1-20(WP)6 様

商品名 PREDECIA プレデンシア

作成日 2025年5月30日
プラン番号 7205C-2505-0231T
現場番号 A6117499

タカラスタンダード株式会社
◆いわき営業所
福島県いわき市平字下の町8番地の14
TEL 0246-22-6181 / FAX 0246-22-6205

◆いわきショールーム
TEL 0246-22-6181 / FAX 0246-22-6215

商品
御見積金額 **¥1,953,000** (税込 ¥2,148,300)
()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

※ 商品御見積金額には商品組付費が含まれております。
※ 給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		水野

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1620(AL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	ピエトラグレイジュ
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	ラスターブラック
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	クォーツストーン
カウンター/下カバーカラー	サンディヘイズ / ブラック
浴槽前カウンターカラー	サンディヘイズ
エプロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	チェスナットベージュ
パネルカラー(周辺)	ビンテージアイアン
ガス種 / 周波数	未定 / 50Hz

◆ 御確認事項

◆ 備考

--	--

No.SB06 *

御名前 支社 いわきSR SB6

様

現場番号	A6117499	プラン番号	7205C-2505-0231T	作成日	2025/5/30
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1620サイズ		1	1,314,000	1,314,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・周辺プレミアムクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・ピエトラグレイージュ)	1	+29,000	+29,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(ラスターブラック)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
11	浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
16	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)FTB220K 水栓上部カウンター(ダークグレイ)	1	+32,000	+32,000
17	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:KVK FTB220K	1		
18	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
19	カウンター	クォーツストーンカウンター	1	+138,000	+138,000
20	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
21	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザイン 周辺プレミアムクラス)(Kパネル)	1	+85,000	+85,000
22	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
23	窓枠フリー	窓枠フリー(樹脂タイプ)L1512 W	1	+21,000	+21,000
24	天井	カラーフラット天井(ベージュ)	1		
25	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ホワイト	1	+45,500	+45,500
26	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
27	換気機器開口	工場開口	1		
28	照明	ダウンライト照明(3灯)(白色)	1	-3,000	-3,000
29	天井照明開口	工場開口	1		
30	ミラー	ワイドクリアミラー(収納棚対応)	1	+31,000	+31,000
31	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		

御名前 支社 いわきSR SB6 様

現場番号	A6117499	プラン番号	7205C-2505-0231T	作成日	2025/5/30
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	タオル掛け	クリアタイプ ブラック	1		
33	収納棚	クリアタイプ ブラック(2段)	1	-4,000	-4,000
34	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
35	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
36	トラップカバー	なし	1		
37	ブロック積用ボンド	2段用	1	+2,000	+2,000
システムバス合計			37		¥1,728,000


商品総合計	37	¥1,728,000
-------	----	------------

商品組付費			数量	金額
1	本体組付費		1	225,000
商品組付費合計				¥225,000


商品御見積金額	¥1,953,000
---------	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。
※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

パース

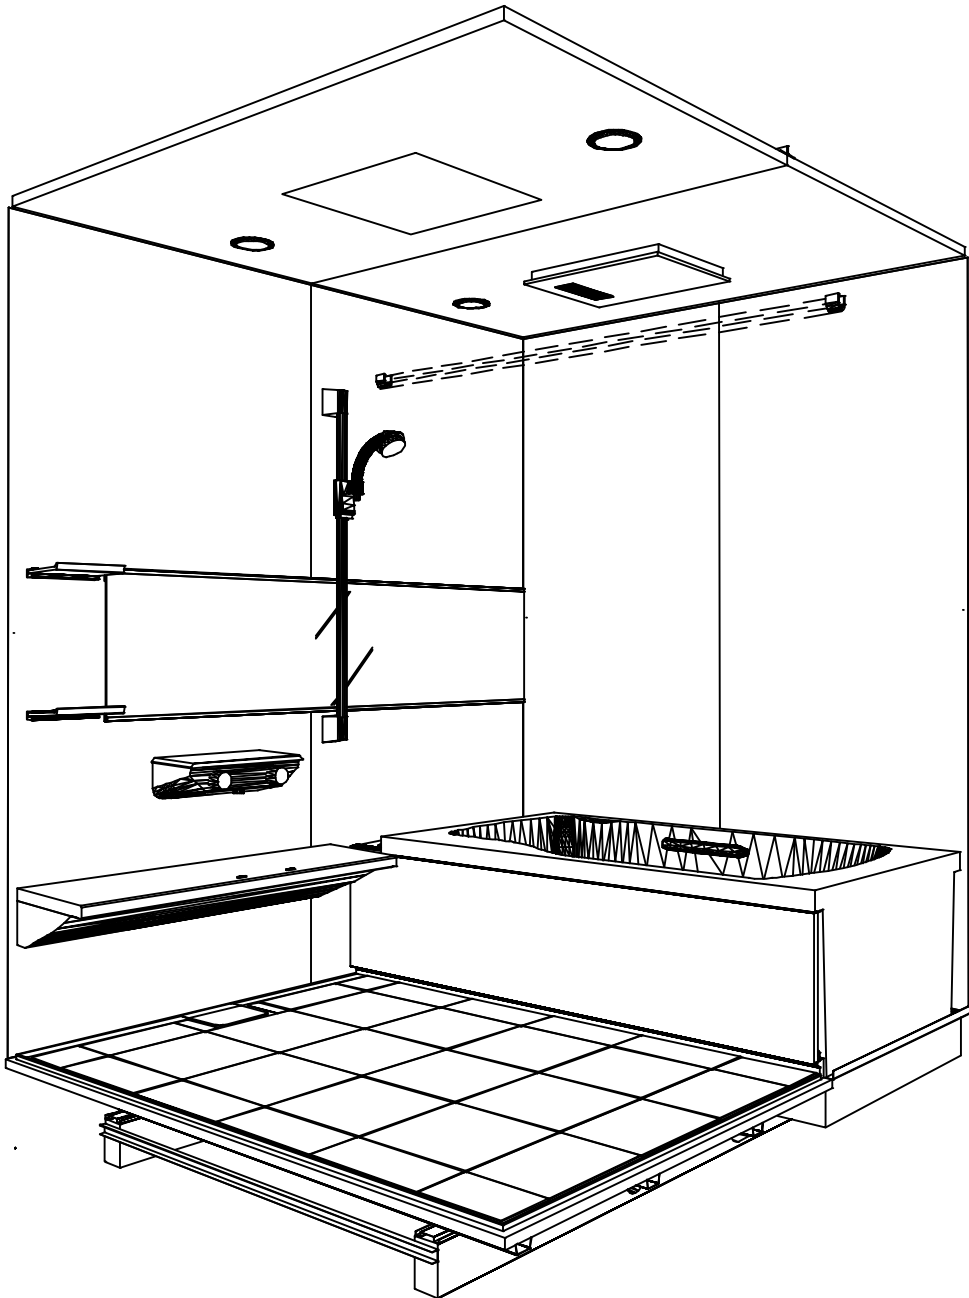

鳥瞰図

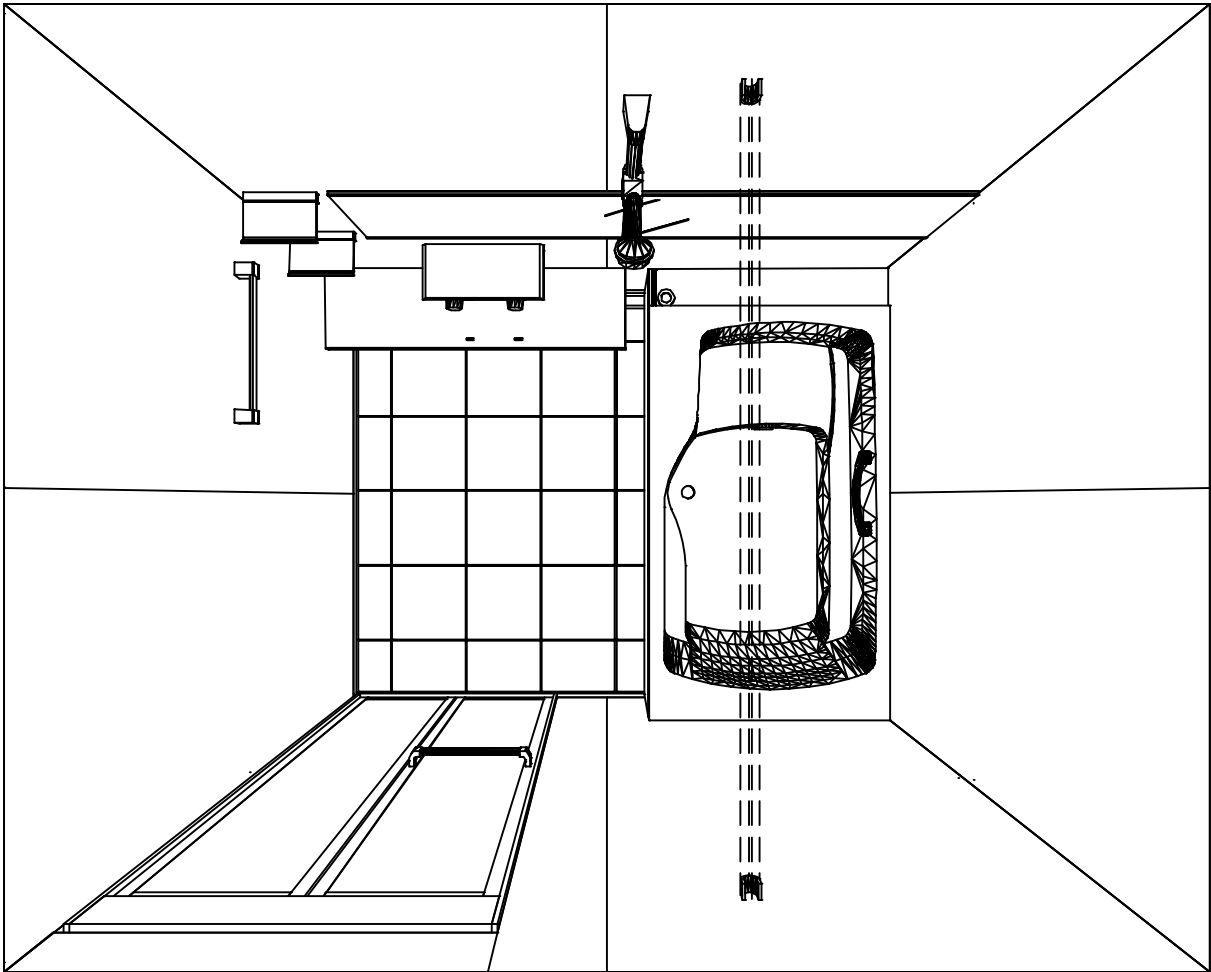

1620

フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。

現場名称： 支社_いわきSR SB6様邸	PREDENCIA プレデンシア	姿図	
現場番号： A6117499	プラン番号： 7205C-2505-0231T	作成日： 2025年5月30日	
いわき営業所	担当営業 ：	担当アドバイザー：	

カウンター面


洗場側面

浴槽側面


カウンター対面

■ 留意事項



* 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

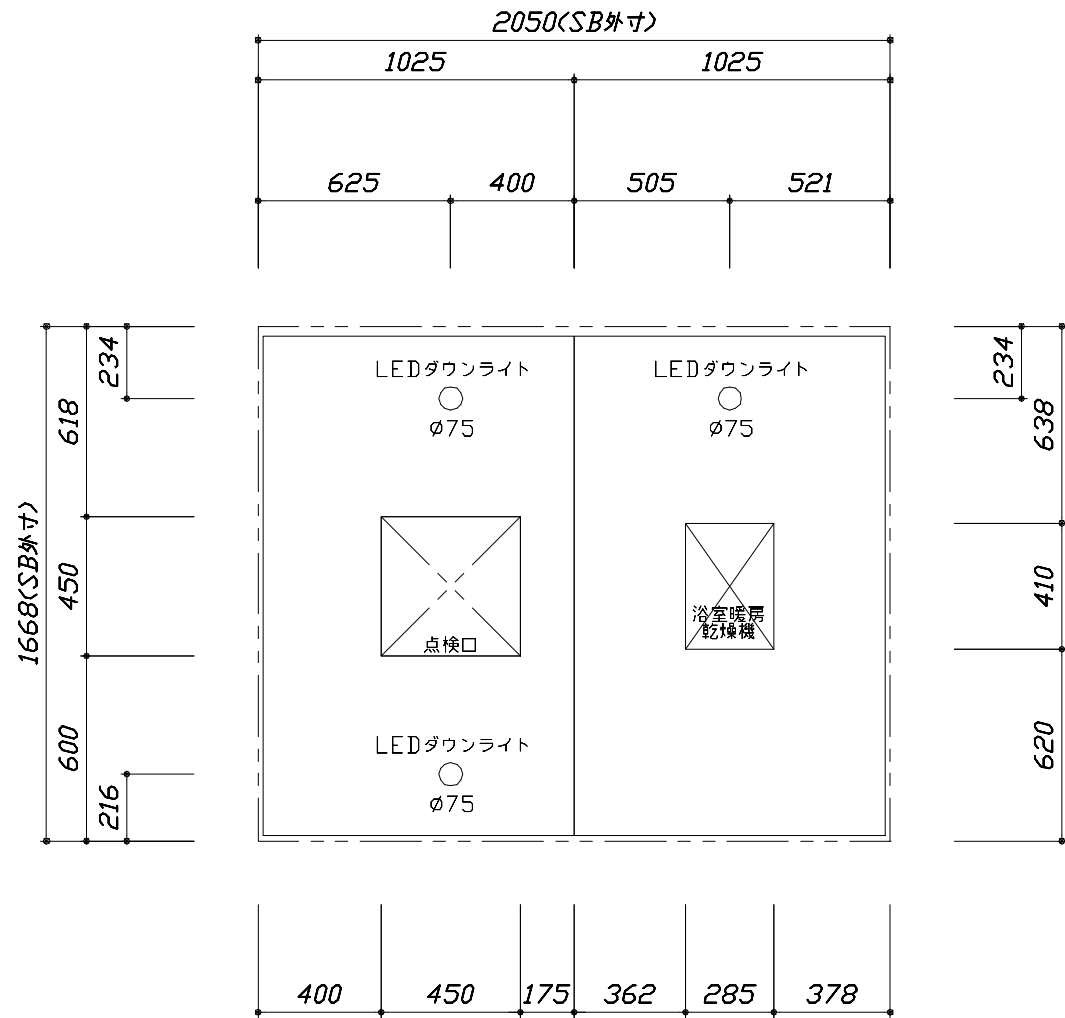

<天井伏図>

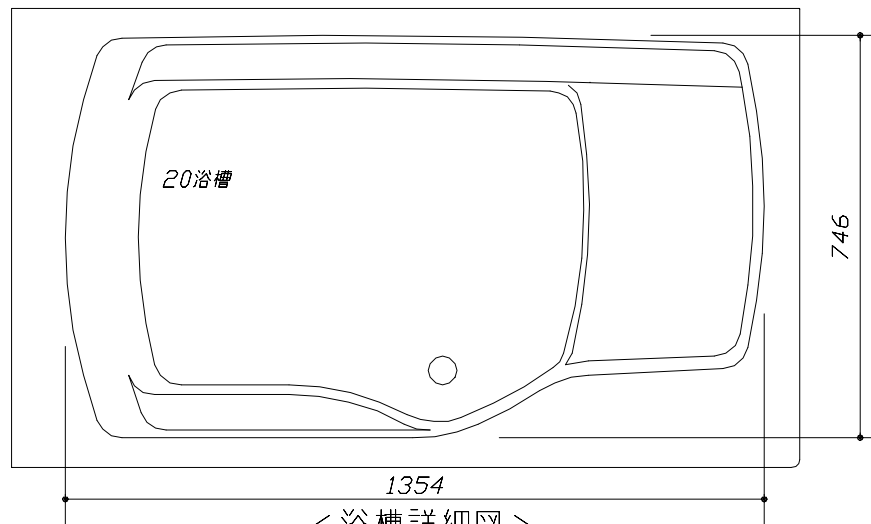



<浴槽詳細図>

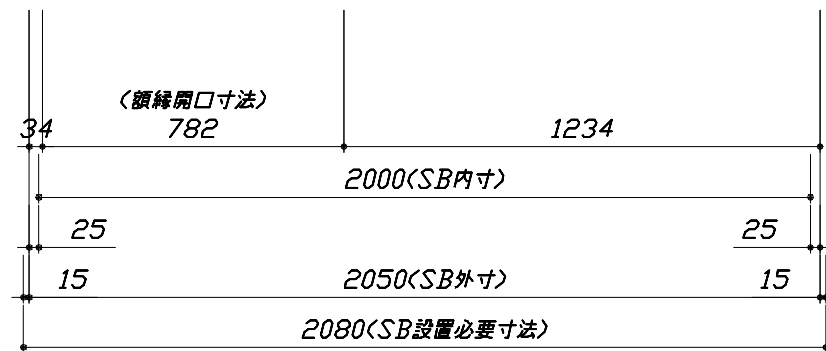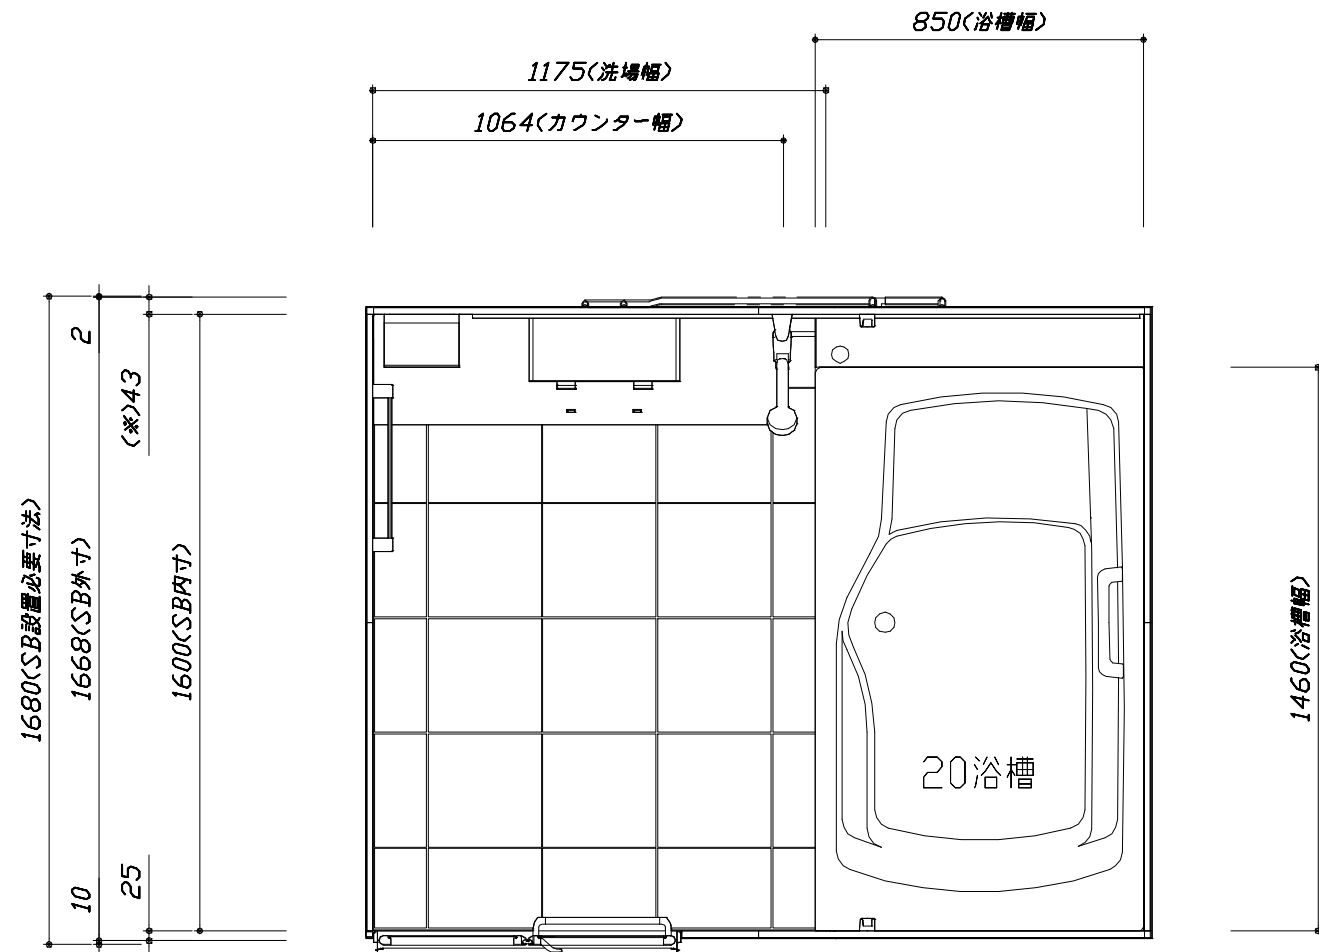

<平面図>

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

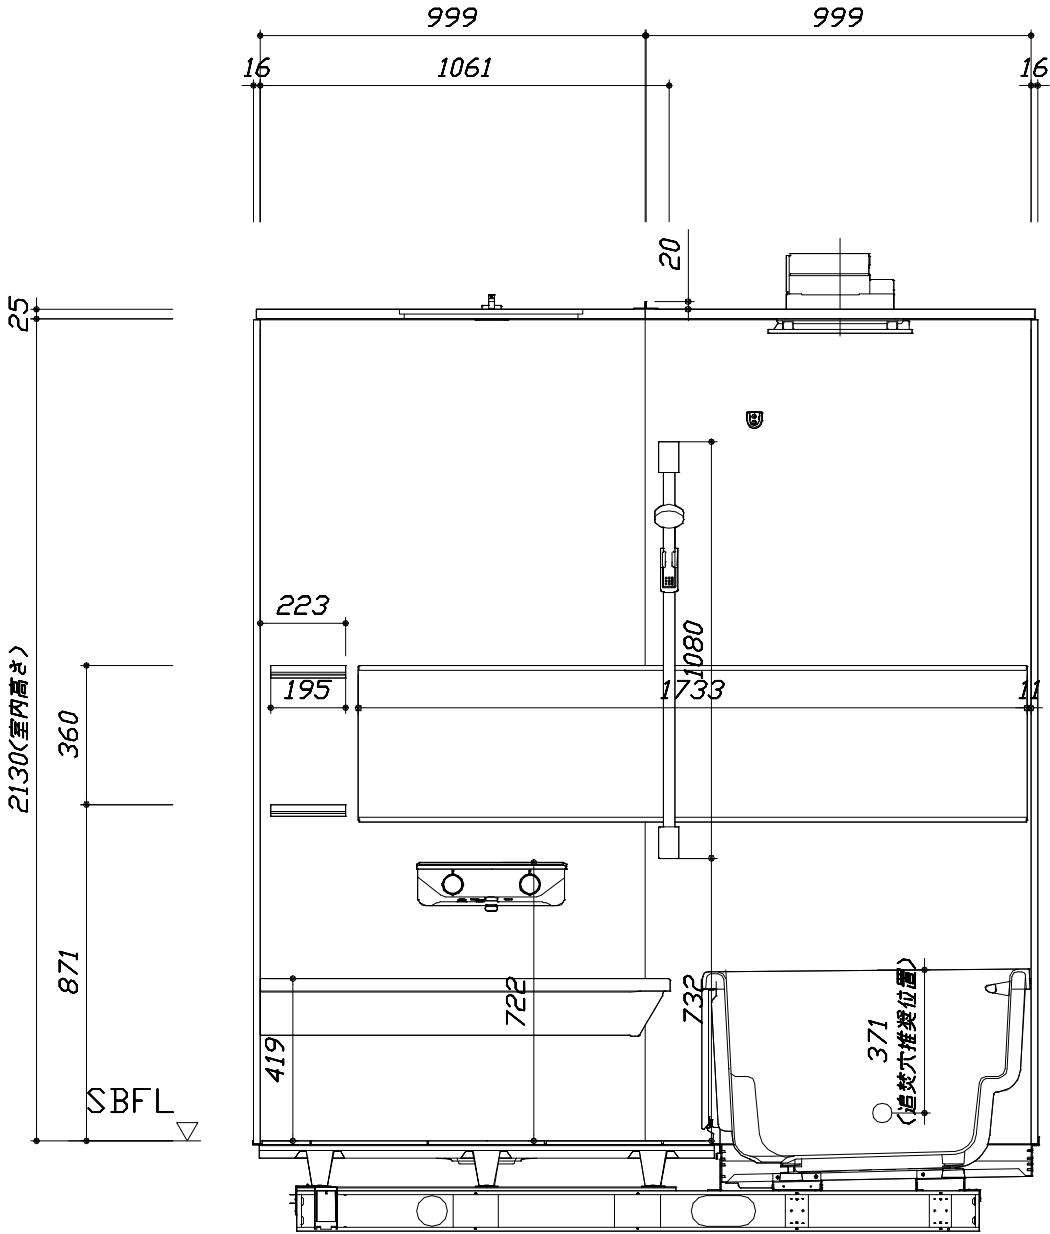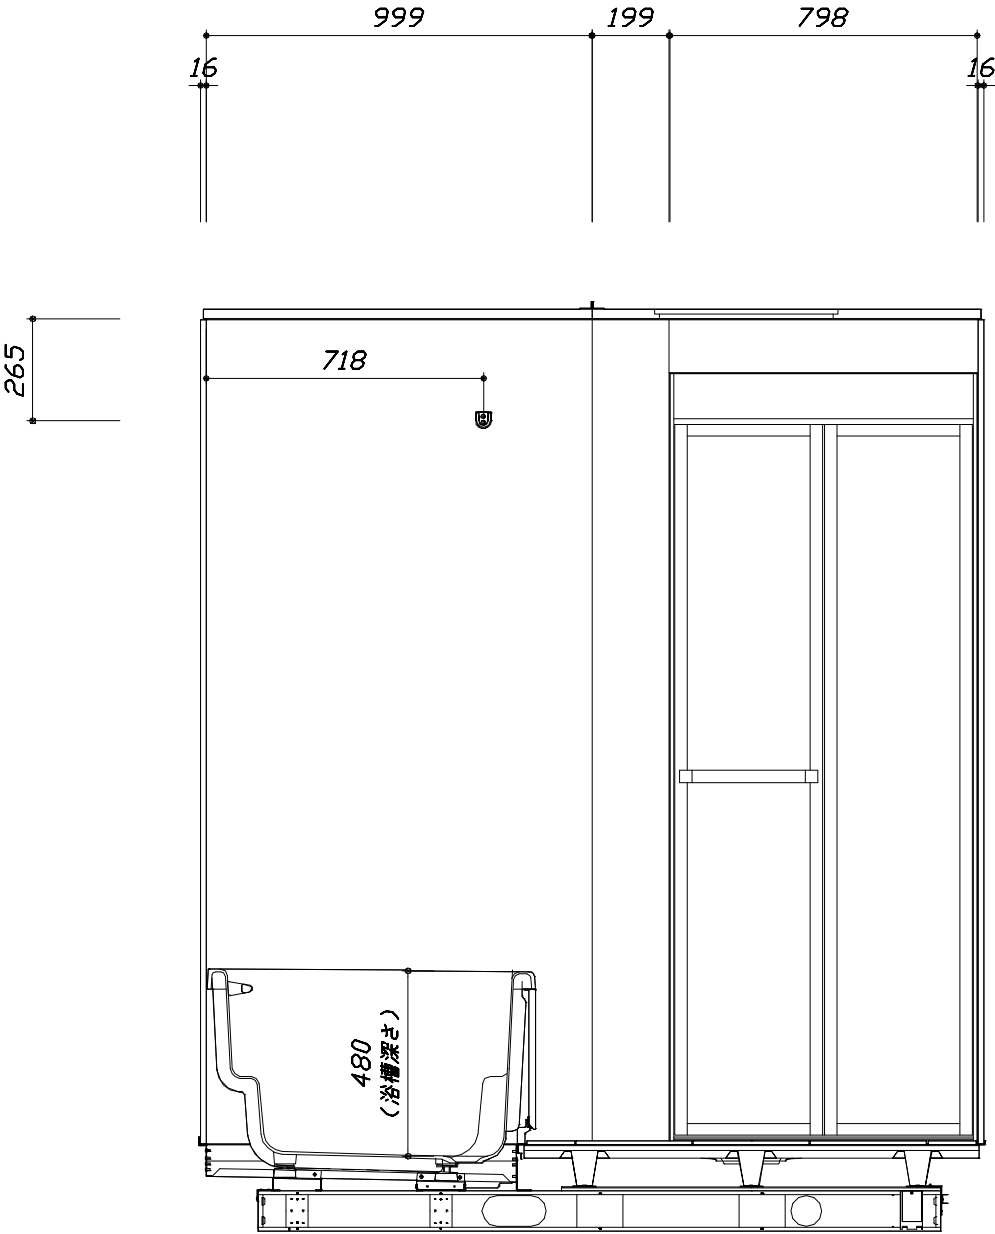


■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

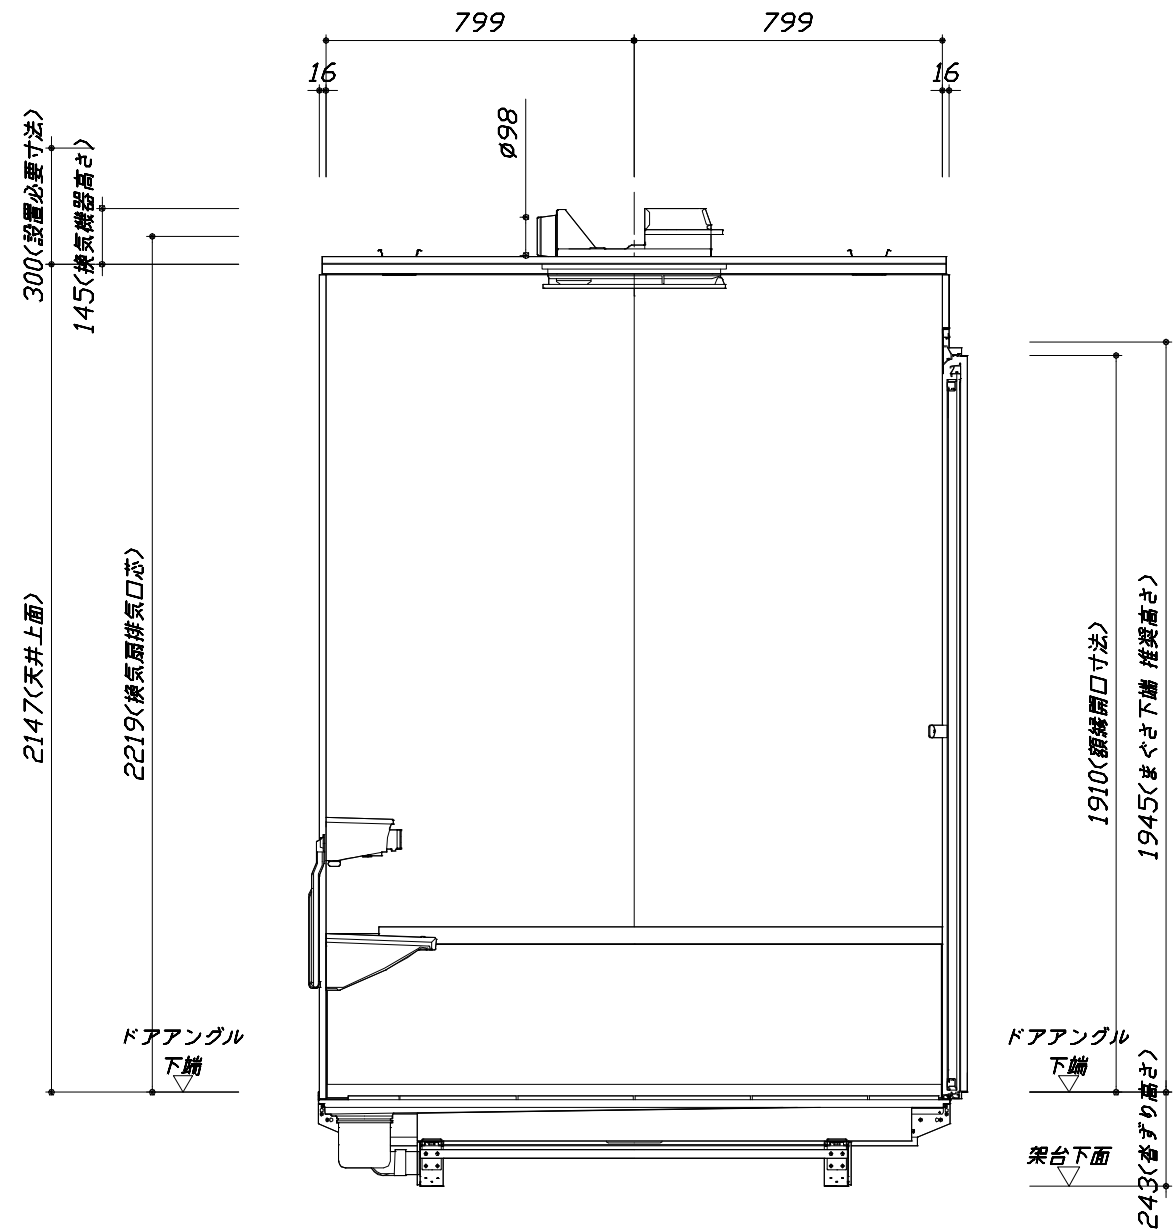

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

< 浴槽側面図 >

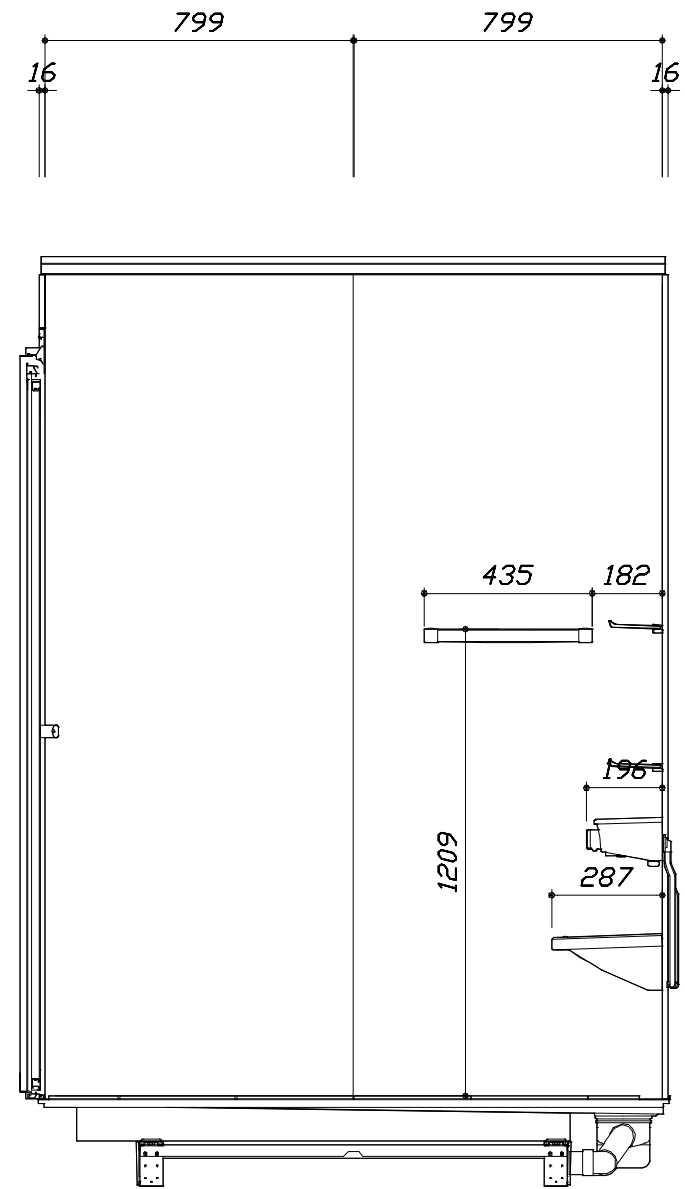

< 洗場側面図 >

本体仕様表

浴室サイズ	1620サイズ(室内容量6.8立方メートル)
ドア勝手	AL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	鋳物ホーロー 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付) グリップ付（305リットル）追い焚き穴：あり
浴槽パン	ステンレス
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	クォーツストーンカウンター：クォーツストーン カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓 1	ー
窓 2	ー
窓枠 1	末尾(NW-1)：ABS樹脂、末尾(E-1)：PVC樹脂 W：ホワイト
窓枠 2	ー
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂、 浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	505kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ワイドクリアミラー(収納棚対応) くもり止め加工
収納棚	クリアタイプ：アクリル樹脂製（2段）
タオル掛け	クリアタイプ：アクリル樹脂製
洗場側水栓	サーモスタット(KVK FTB220K)（樹脂ホース：メタル調）
浴槽側水栓	ー
兼用水栓	ー
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（スライドバー-T1020S MH）
照明	LEDダウンライト（LED 12.3W白色）（3灯）
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V・最大消費電力1250W)（ダクト外径φ98）（常時換気対応品）ホワイト
フロフタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	ー
ハンドバー②	ー
ハンドバー③	ー
ハンドバー④	ー
ハンドバー⑤	ー
ハンドバー⑥	ー
ハンドバー⑦	ー

本体カラー

浴槽	K：ラスターストック
カウンター	K：サンディヘイズ
パネル(カウンター面)	JCD：チェスナットベージュ
パネル(周辺・3面)	JVA：ビンテージアイアン
水栓上部カウンター	KA：ダークグレー
浴槽エプロン	K：ブラック
洗場	XD：ピエトラグレージュ
ドア / 天井	W：ホワイト / D：ベージュ
収納棚	クリアタイプ(ブラック)
タオル掛け	クリアタイプ(ブラック)
ランドリーセット	ホワイト

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 支社_いわきSR SB6様邸	PREDENCIA プレデンシア	仕様表	
	現場番号： A6117499	プラン番号： 7205C-2505-0231T	作成日： 2025年5月30日	
	いわき営業所	担当営業 〃	担当アドバイザー：	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分			参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』								
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事	
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
			浴室用電源配線、接続工事					○		浴室機器の事後電気工事	
浴室天井裏の電源、スイッチ工事							○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。




■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

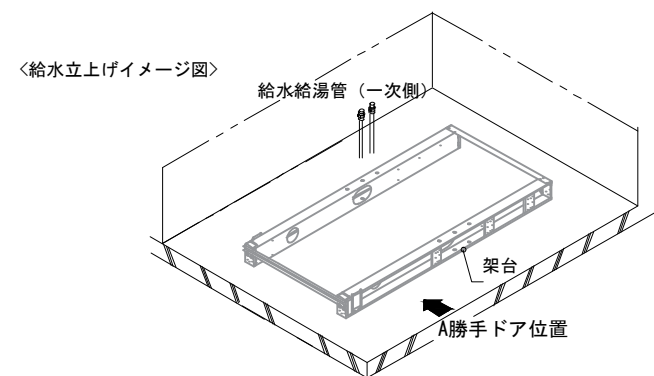



■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

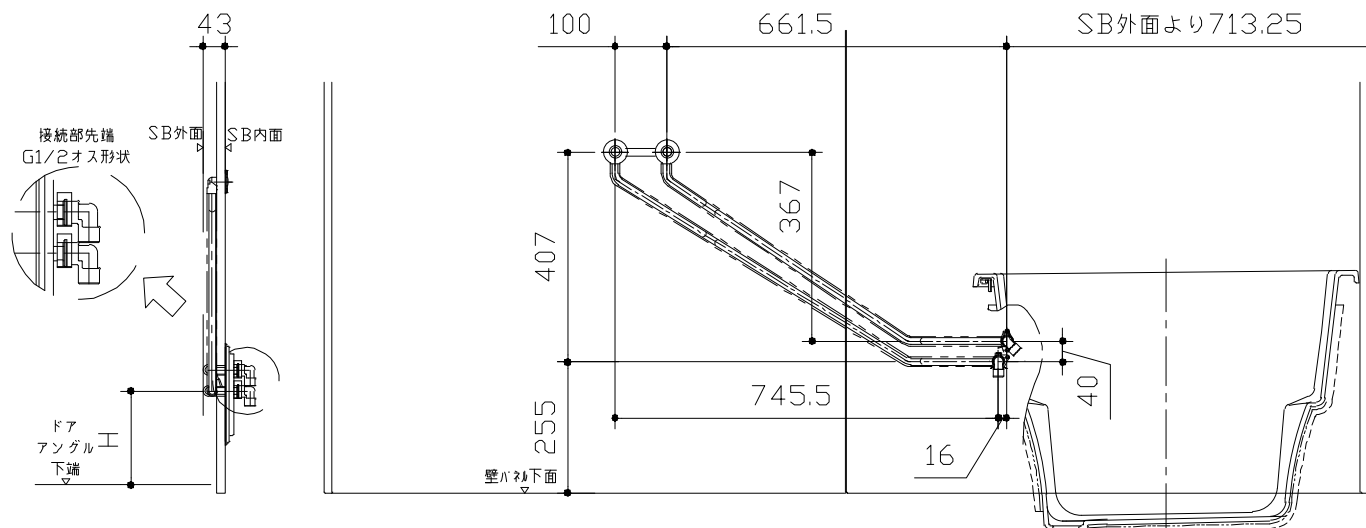


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230

＜給水給湯管取合詳細図＞

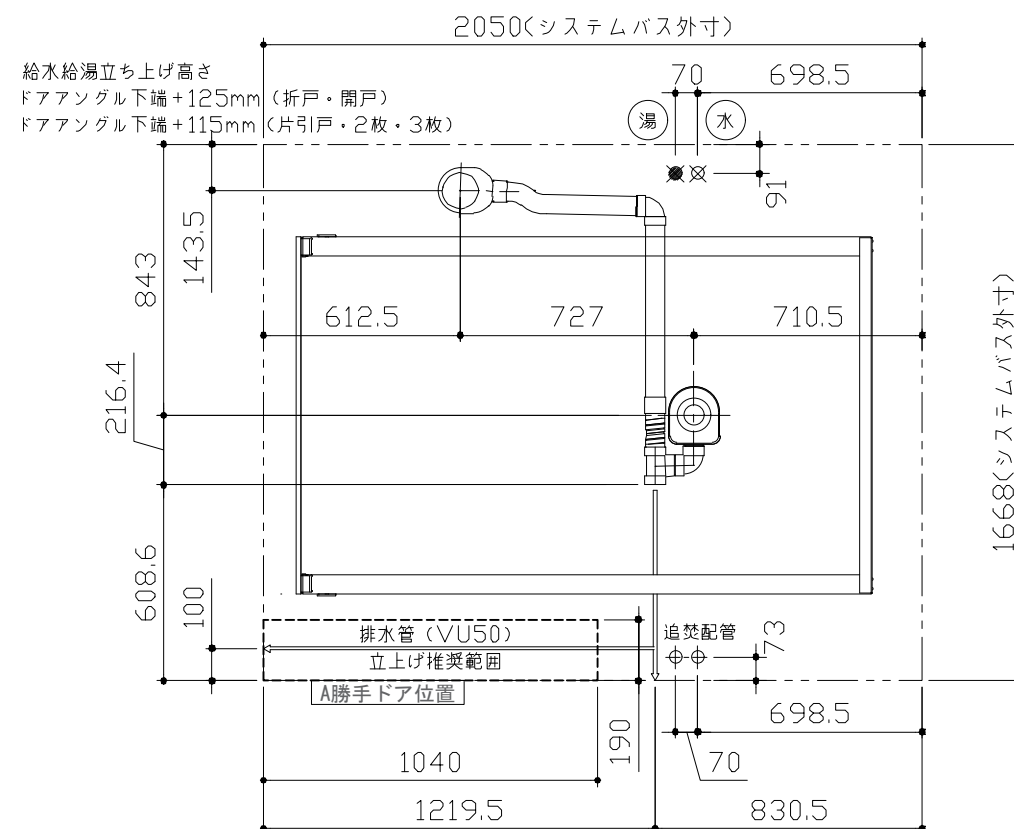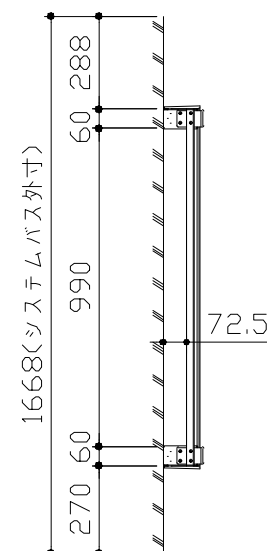

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置



＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 支社_いわきSR SB6様邸
現場番号： A6117499
いわき営業所

PREDENCIA プレデンシア
プラン番号： 7205C-2505-0231T
担当営業 ：

排水配管図
作成日： 2025年5月30日
担当アドバイザー：


■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

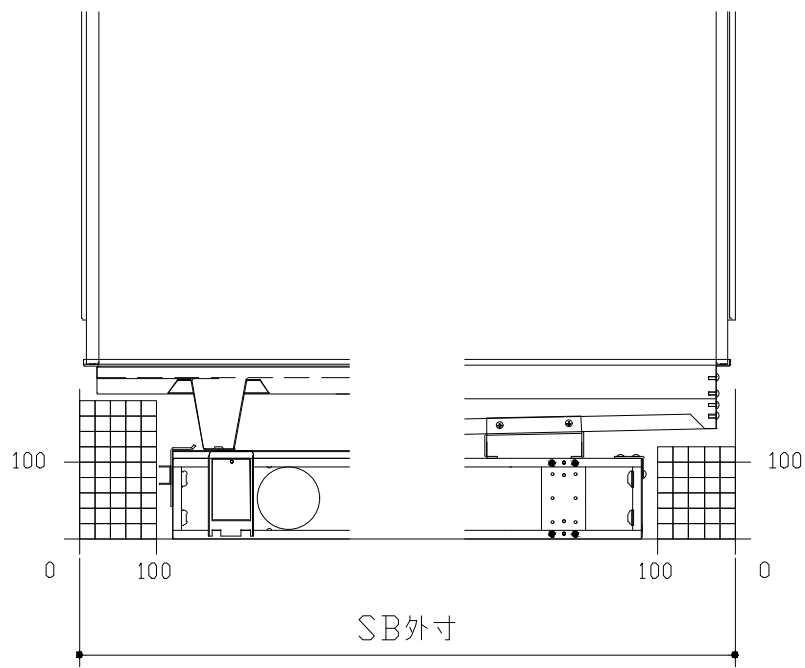


B矢視

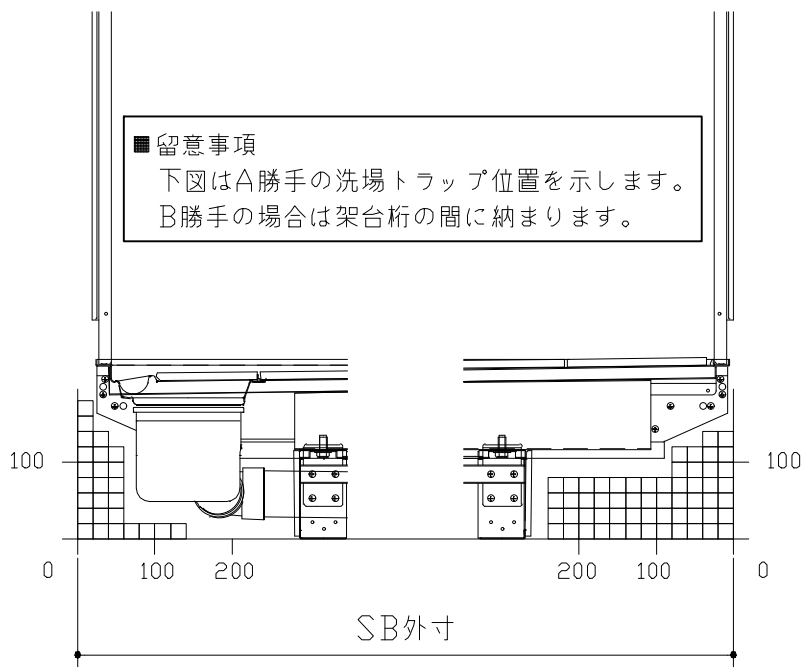


A矢視

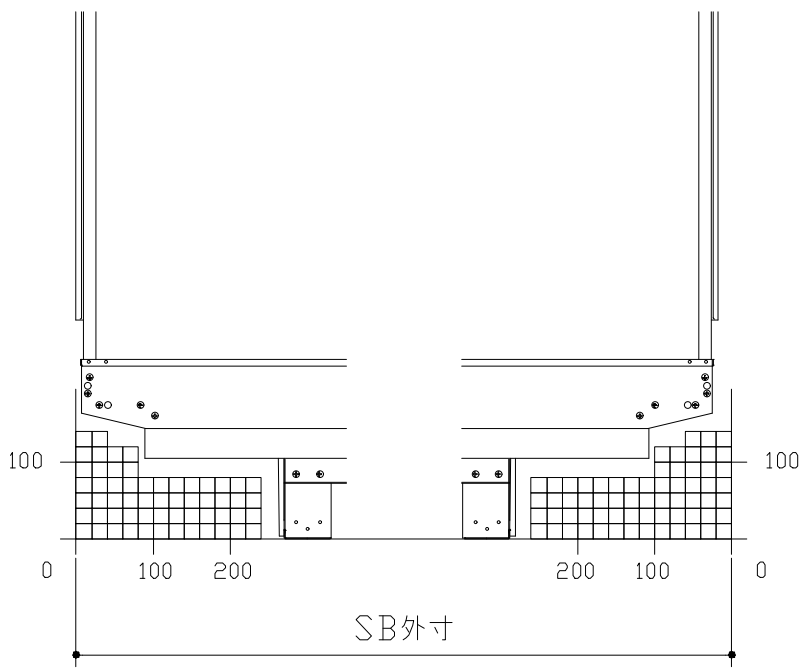


D矢視

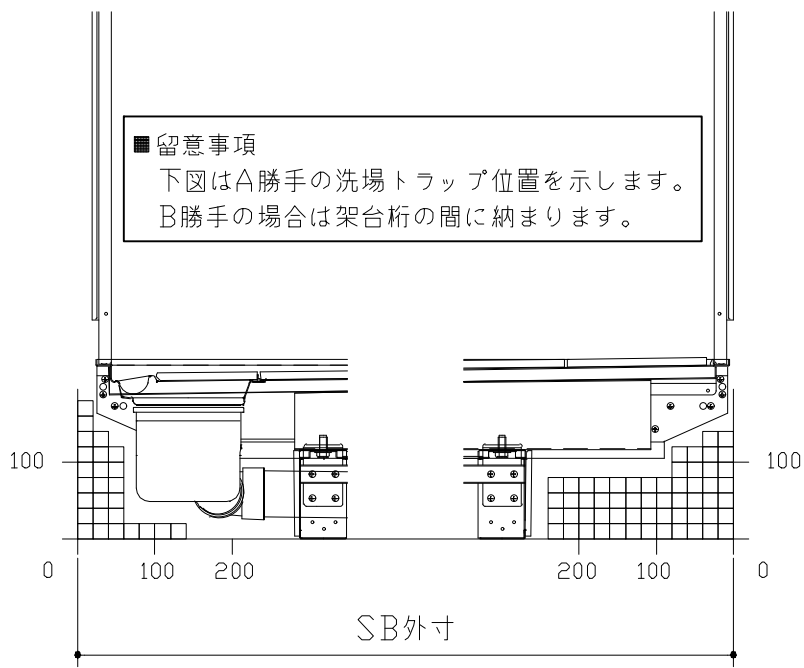

C矢視


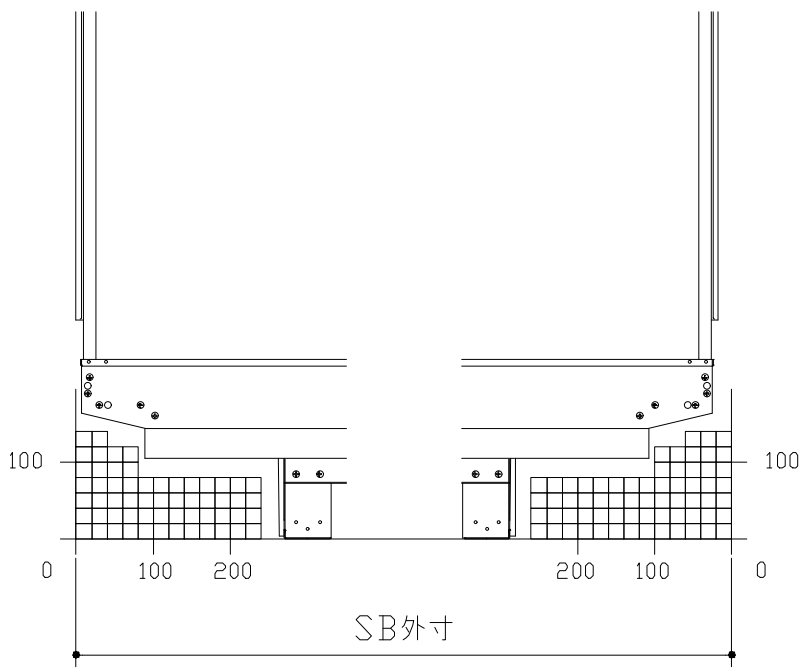


F矢視

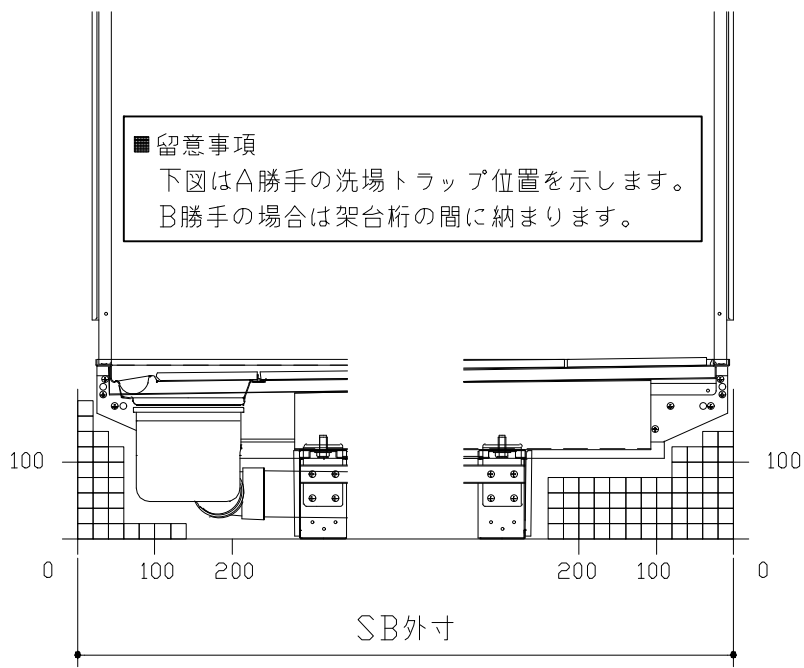


E矢視


キープクリーンドア：折戸・上部換気口

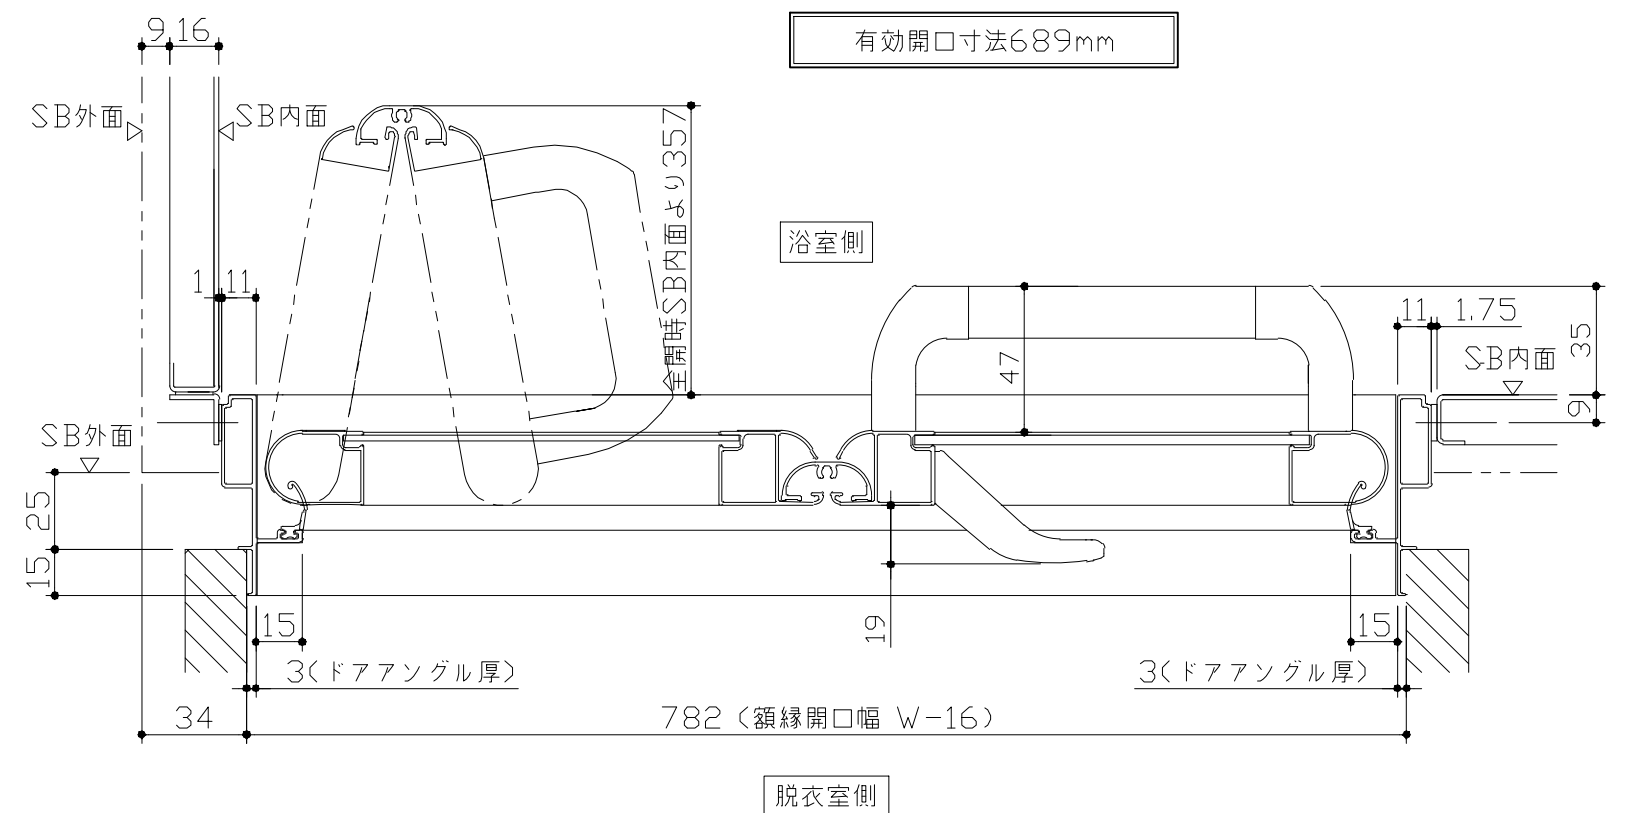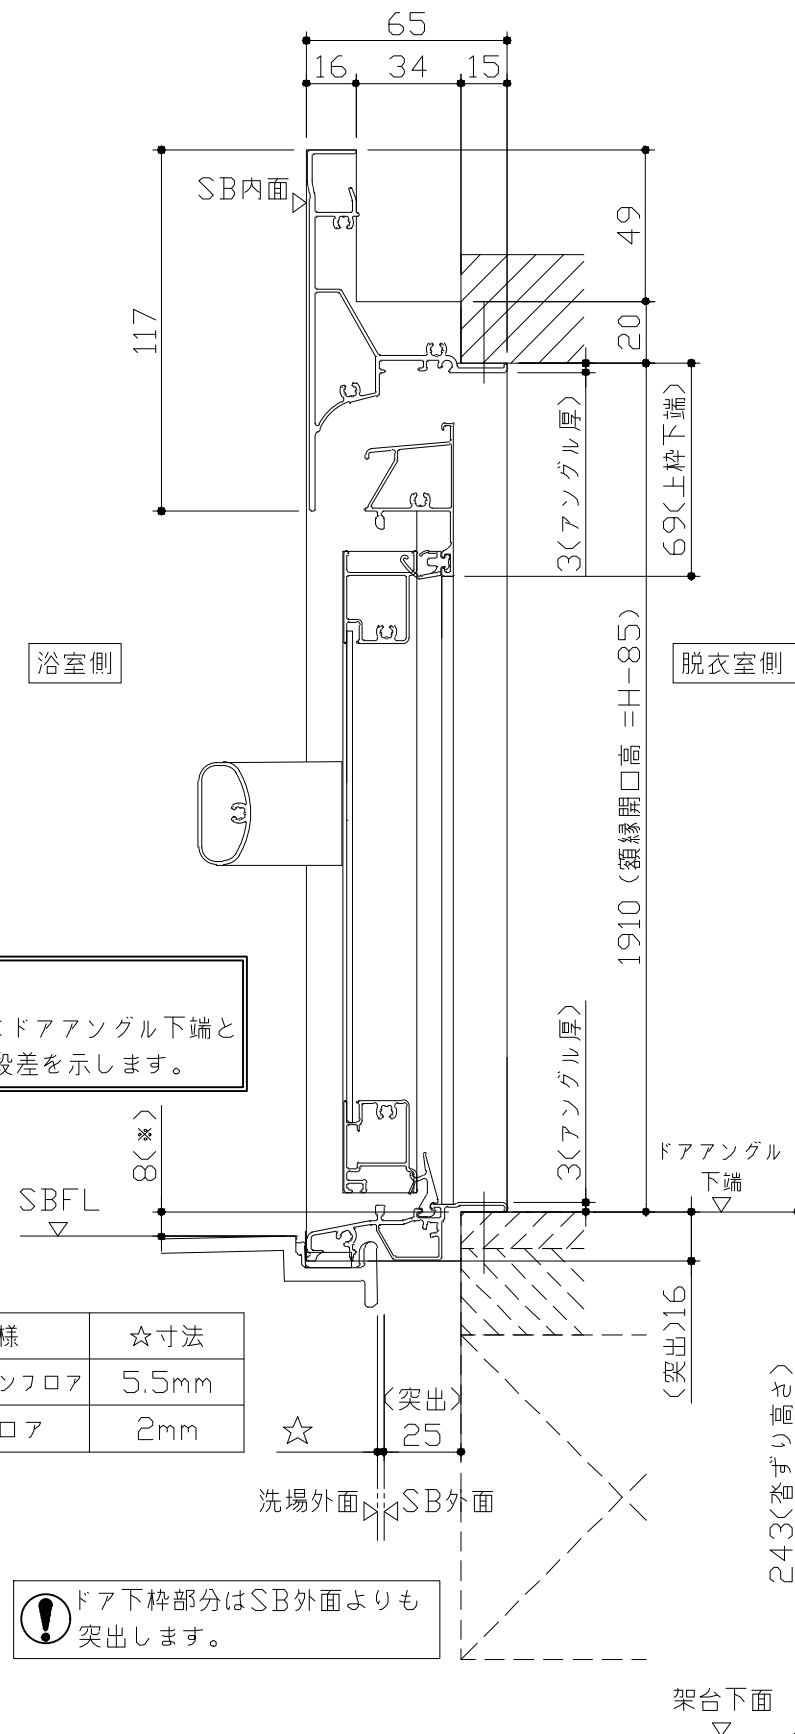

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉








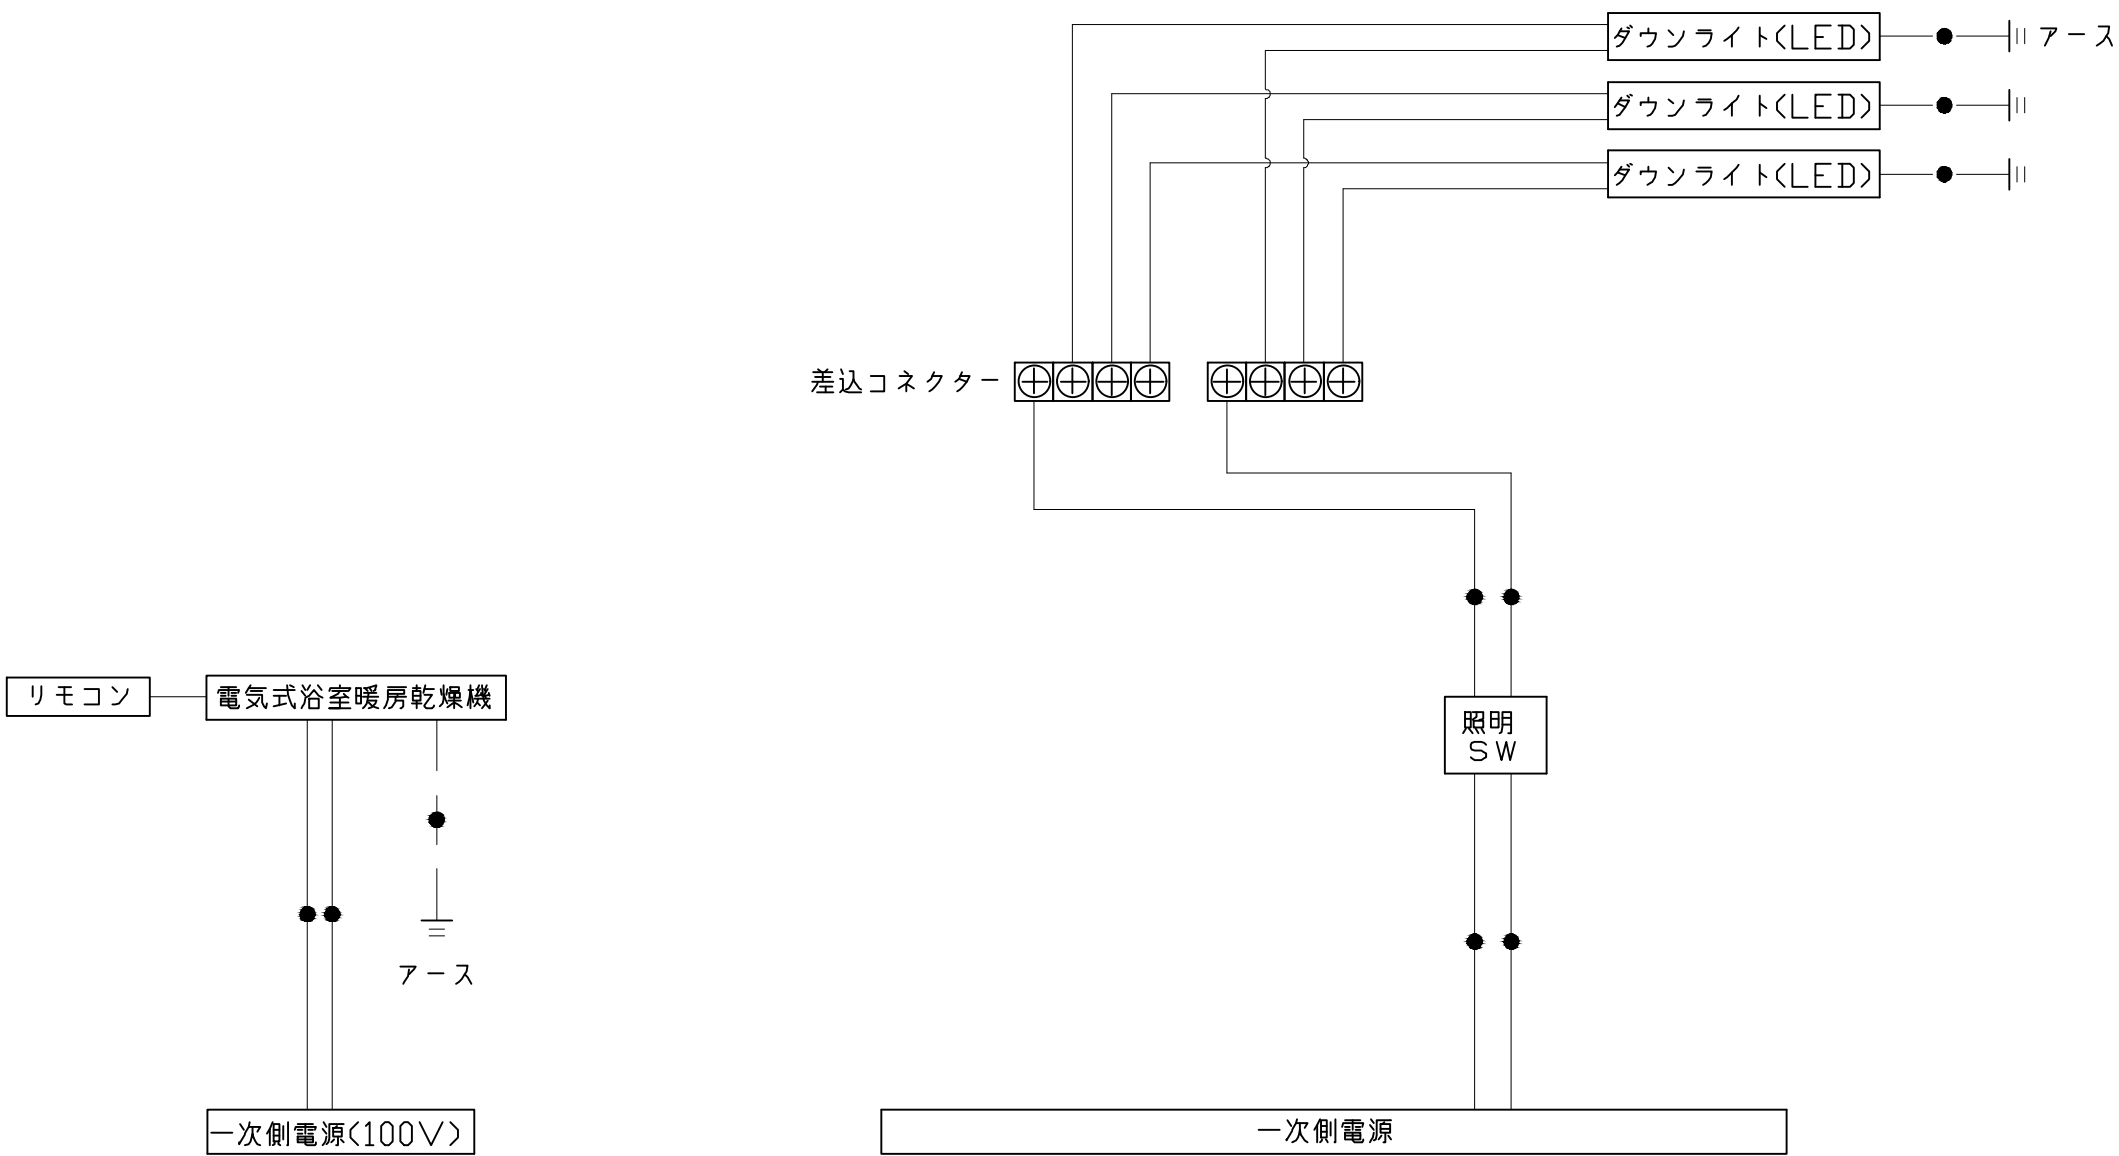








※浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。


アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 支社_いわきSR SB6様邸	PREDENCIA プレデンシア	電気配線図	
	現場番号： A6117499	プラン番号： 7205C-2505-0231T	作成日： 2025年5月30日	
	いわき営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

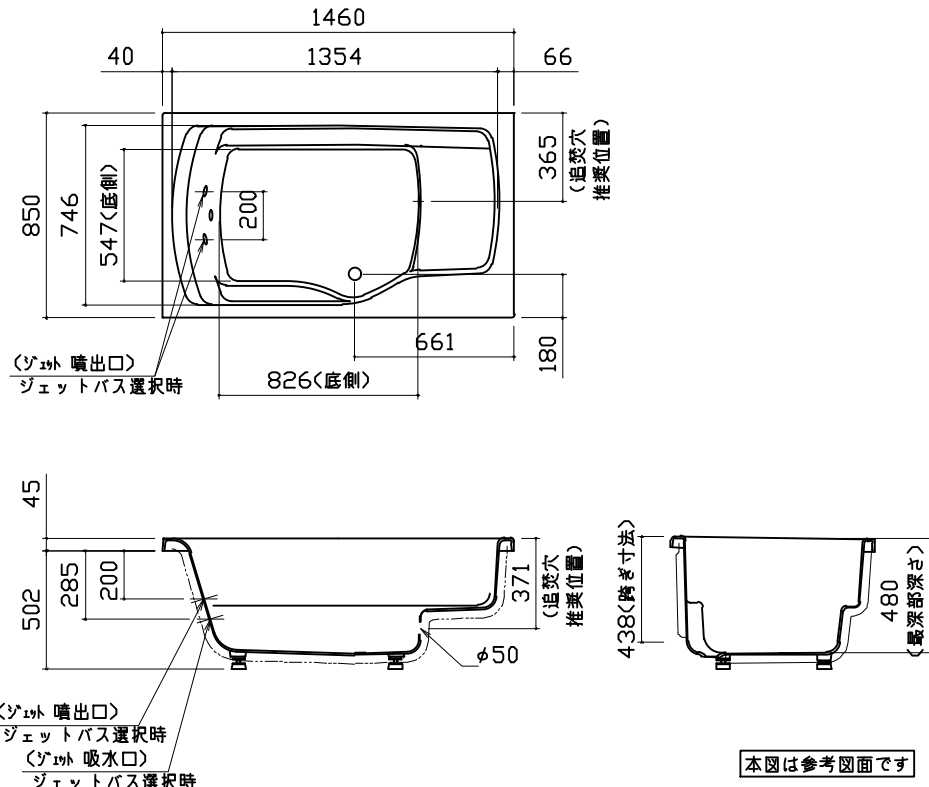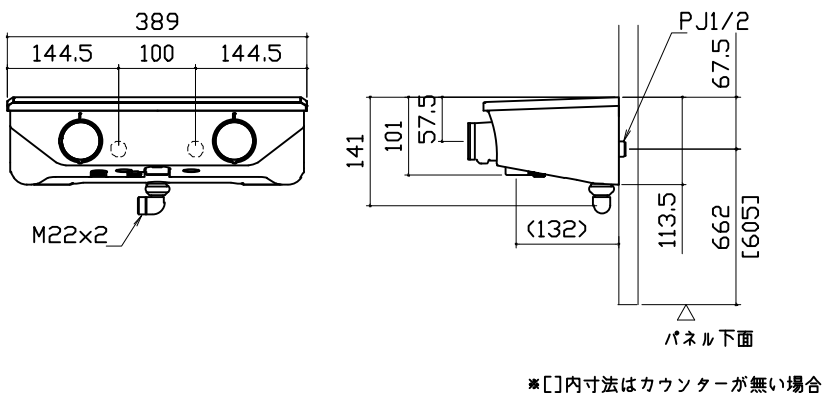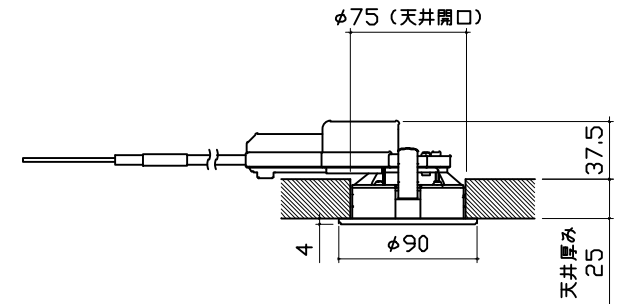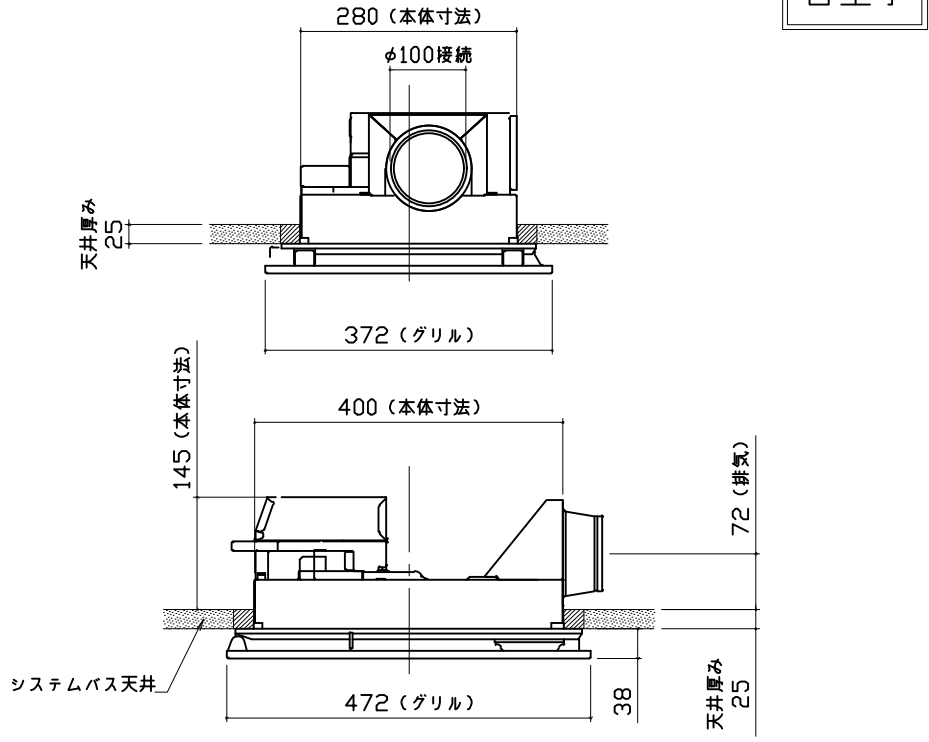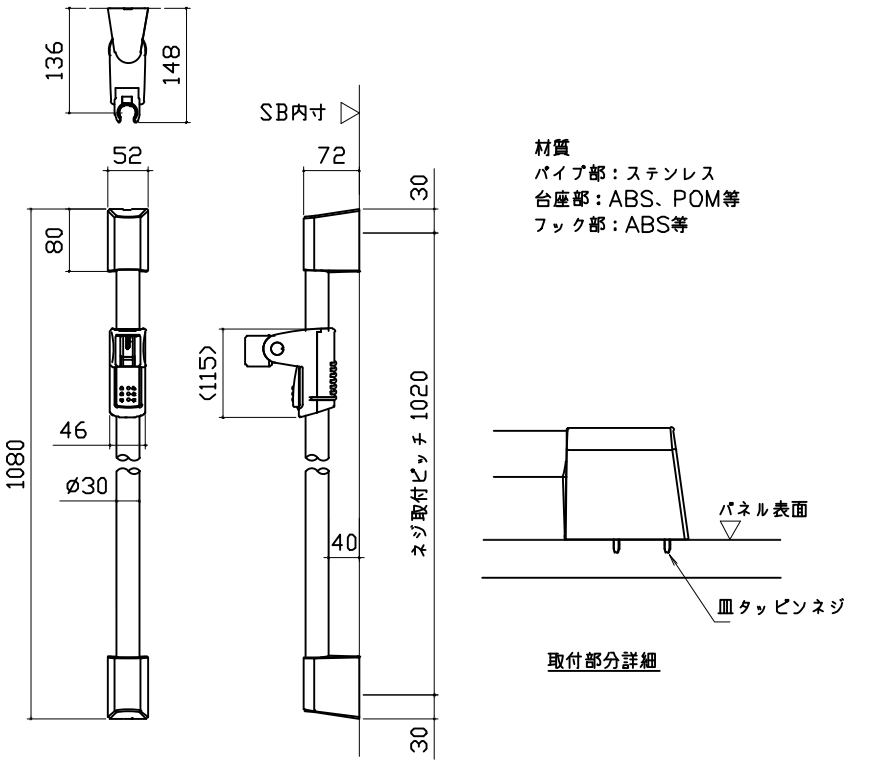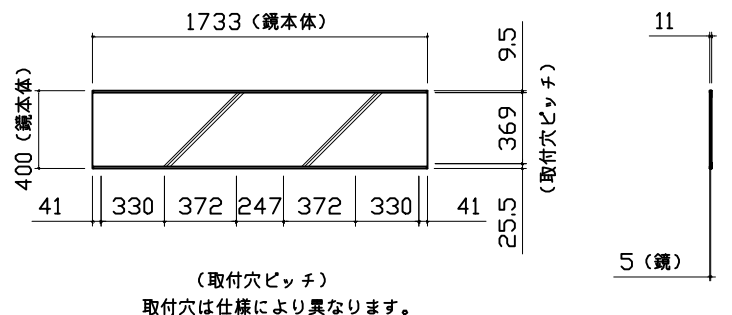浴槽		洗い場用水栓	照明		
 Top view dimensions: 1460 (total width), 1354 (inner width), 66 (side panel), 40 (top edge), 826 (bottom width), 661 (inner bottom width), 180 (bottom edge), 850 (total depth), 746 (inner depth), 547 (inner depth at bottom), 200 (inner width at bottom), 365 (total depth at side), 371 (inner depth at side), 480 (total depth at side), 438 (total depth at side), 502 (total depth at side), 285 (inner depth at side), 200 (inner depth at side), 45 (top edge), 502 (total depth at side), 285 (inner depth at side), 200 (inner depth at side), 45 (top edge). Side view dimensions: 45 (top edge), 502 (total depth), 285 (inner depth), 200 (inner depth), 45 (top edge), 371 (inner depth at side), 480 (total depth at side), 438 (total depth at side), 502 (total depth at side), 285 (inner depth at side), 200 (inner depth at side), 45 (top edge). Bottom view dimensions: 826 (bottom width), 661 (inner bottom width), 180 (bottom edge), 66 (side panel), 40 (top edge), 1354 (inner width), 1460 (total width). Labels: (ジェット 噴出口) ジェットバス選択時, (追焚穴 推奨位置), (ジェット 噴出口) ジェットバス選択時, (ジェット 吸水口) ジェットバス選択時, (追焚穴 推奨位置), (吸込部深さ), 本図は参考図面です		 Top view dimensions: 389 (total width), 144.5 (inner width), 100 (inner width), 144.5 (inner width), M22x2 (thread), (132) (inner width), 113.5 (inner width), 662 (inner width), [605] (inner width), 67.5 (inner width), 141 (total height), 101 (inner height), 57.5 (inner height), PJ1/2 (thread), パネル下面, *[]内寸法はカウンターが無い場合	 Dimensions: φ75 (天井開口), 37.5 (height), 4 (height), φ90 (diameter), 25 (height), 天井厚み		
換気機器		シャワーフックスライドバー	ミラー		
リモコンコード長さ: 5m 外形: 縦120mm×横116mm 管工事  Top view dimensions: 280 (本体寸法), φ100接続, 372 (グリル), 400 (本体寸法), 472 (グリル), 38 (bottom edge), 72 (排気), 25 (天井厚み), 145 (本体寸法), システムバス天井 Side view dimensions: 1080 (total height), 136 (top edge), 148 (top edge), 52 (top edge), 80 (top edge), 46 (top edge), φ30 (diameter), 72 (top edge), 30 (top edge), 1020 (total height), 40 (bottom edge), 30 (bottom edge), SB内寸, (115) (inner width), ネジ取付ピッチ		材質 パイプ部: ステンレス 台座部: ABS、POM等 フック部: ABS等  Dimensions: 1080 (total height), 136 (top edge), 148 (top edge), 52 (top edge), 80 (top edge), 46 (top edge), φ30 (diameter), 72 (top edge), 30 (top edge), 1020 (total height), 40 (bottom edge), 30 (bottom edge), SB内寸, (115) (inner width), ネジ取付ピッチ 取付部分詳細 パネル表面 皿タッピンネジ	枠: SUS304 t0.8 ミラー: 表面防曇コートあり (ワイドクリアミラー) 表面防曇コートなし (ワイドミラー)  Dimensions: 1733 (鏡本体), 400 (鏡本体), 41 (left edge), 330 (left edge), 372 (left edge), 247 (left edge), 372 (left edge), 330 (left edge), 41 (left edge), 25.5 (left edge), 369 (left edge), 9.5 (left edge), 11 (left edge), 5 (鏡), (取付穴ピッチ), 取付穴は仕様により異なります。		
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称: 支社_いわきSR SB6様邸 現場番号: A6117499 いわき営業所	PREDENCIA プレデンシア プラン番号: 7205C-2505-0231T 担当営業:	部材詳細図 作成日: 2025年5月30日 担当アドバイザー:	1/3

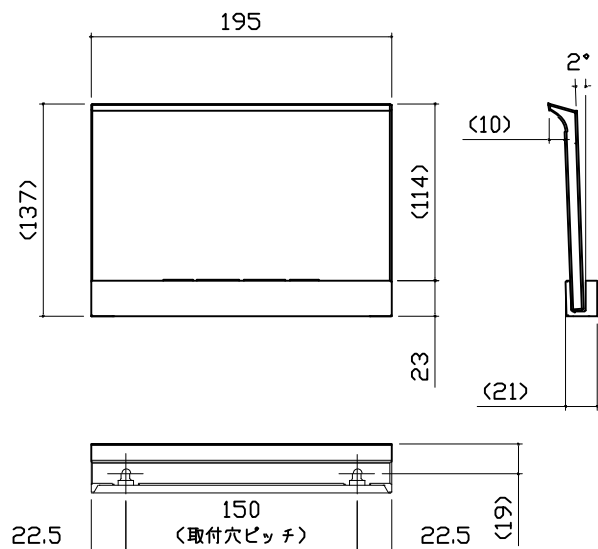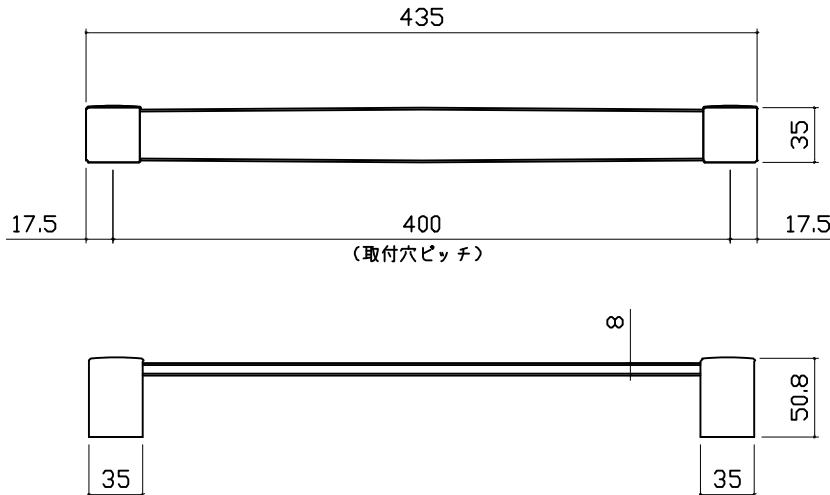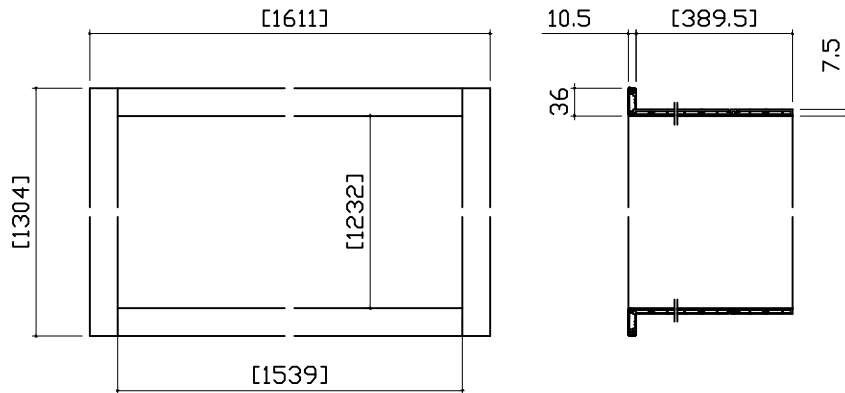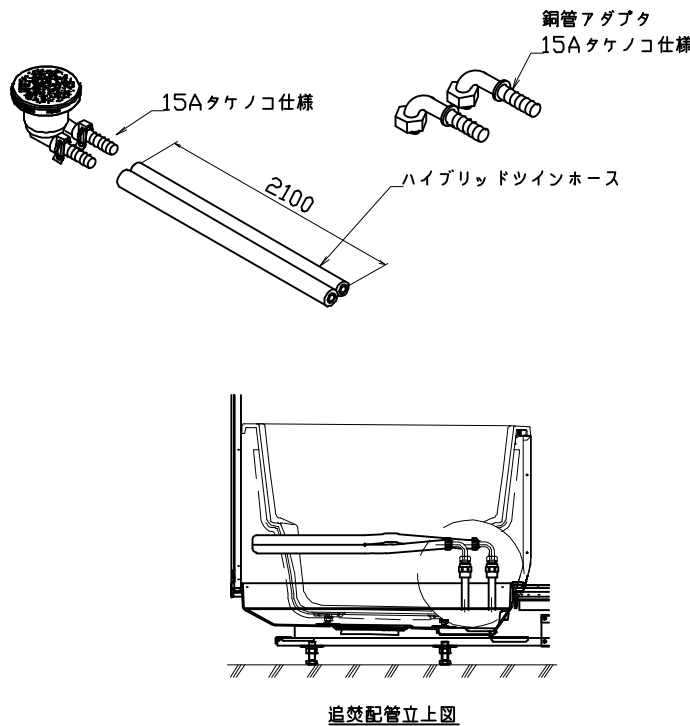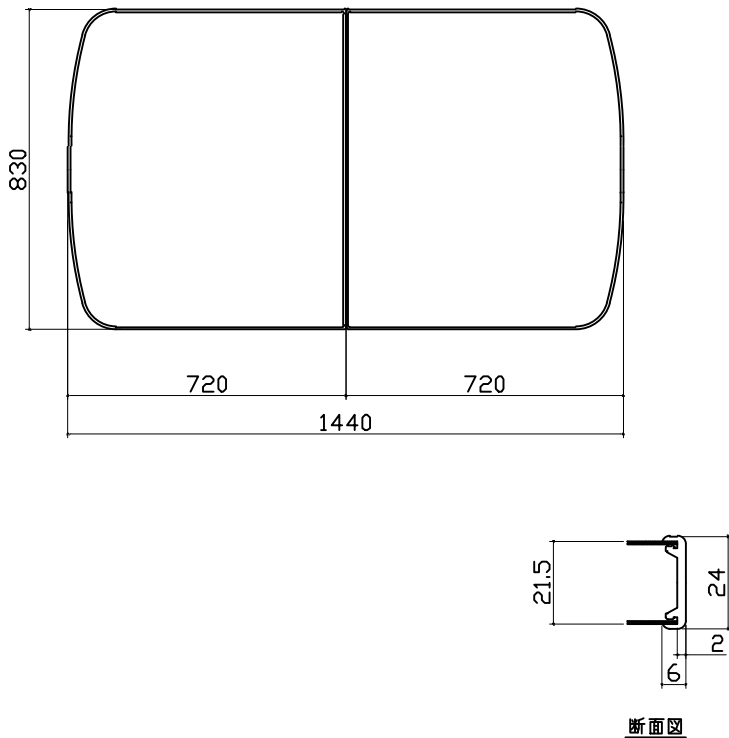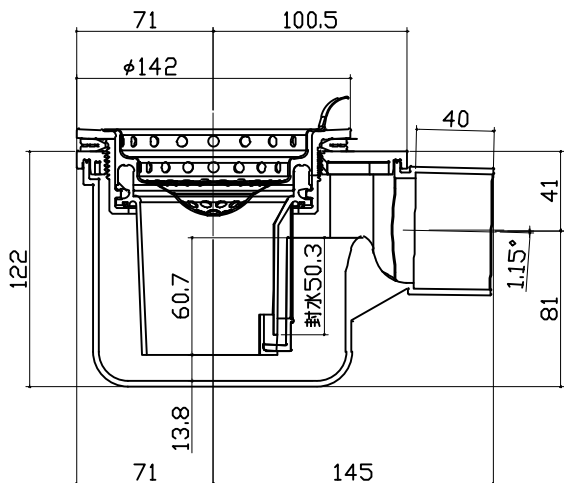収納棚 本体：PMMA 		タオル掛け 本体：PMMA ブラケット：ABS（クロムメッキ仕上げ） 		窓枠フリー ※[]寸法はそれ以下に現地加工することができます。 ※末尾 E：フクビ化学工業製 NW/NG/NB：キョーセー製 材質：窓枠本体/カバー AESコートABS …L1512(E/NG/NB) AASコートABS …L1512(NW) コーナーピース部 ABS …(E/NW/NG/NB共通) 		
循環金具・フロアダプタ関連 		風呂蓋 707MDH-20WSK 		洗い場側排水トラップ 		
Takara standard タカスタンダード株式会社		現場名称： 支社_いわきSR SB6様邸 現場番号： A6117499 いわき営業所		PREDENCIA プレデンシア プラン番号： 7205C-2505-0231T 担当営業：		部材詳細図 2/3 作成日： 2025年5月30日 担当アドバイザー：

浴槽側排水トラップ

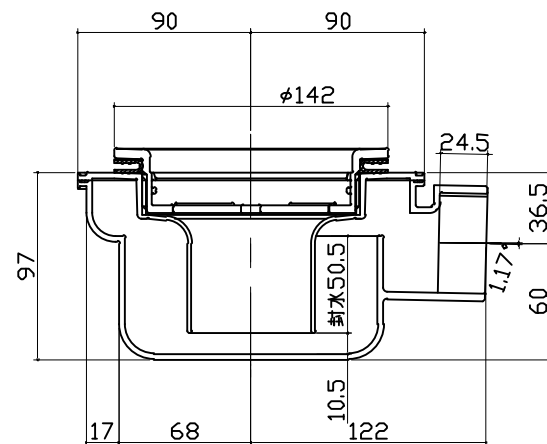

Takara standard

タカスタンダード株式会社

現場名称： 支社_いわきSR SB6様邸

現場番号： A6117499

いわき営業所

P R E D E N C I A プレデンシア

プラン番号： 7205C-2505-0231T

担当営業：

部材詳細図

3/3

作成日： 2025年5月30日

担当アドバイザー：

パネル割図		ミラー		収納棚	
↑ AL勝手 ハネK20C2B 0999 L<JCD ハネK20C1G 0999 R<JCD ハネK16A 0799 <JVA ハネK16NW 0799 <JVA ハネK16A 0799 <JVA ハネK16NW 0799 <JVA ハネK18FD 0199P <JVA ハネK18AD 0999 <JVA		ハネK20C2B 0999 L<JCD ハネK20C1G 0999 R<JCD 現地加工：φ3.5		ハネK20C2B 0999 L<JCD 現地加工：φ3.5	
シャフーフックスライドバー		ランドリーパイプ		タオル掛け	
ハネK20C1G 0999 R<JCD 現地加工：φ3.5		ハネK18AD 0999 <JVA ハネK20C1G 0999 R<JCD 現地加工：φ3.5 現地加工：φ3.5		ハネK16A 0799 <JVA 現地加工：φ3.5 ■留意事項 ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。	
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 支社_いわきSR SB6様邸	PRE D E N C I A プレデンシア	穴開け指示図	1/1
現場番号： A6117499		いわき営業所	プラン番号： 7205C-2505-0231T	作成日： 2025年5月30日	
			担当営業：	担当アドバイザー：	
