

システムバス 御見積書

御名前	北陸-金沢SR 新SB4	様
業者		様
商品名	PREDENCIA プレデンスシア	

作成日 2020年12月23日
プラン番号 1600A-2011-0981T
現場番号 A7963363

タカラスタンダード株式会社
◆北陸支店 販売課
石川県金沢市新保本4丁目65番5
TEL 076-269-4400 / FAX 076-269-4499

◆金沢シヨールーム
TEL 076-269-4450 / FAX 076-269-4407

商品御見積金額 ¥1,350,700 (税込 ¥1,485,770)
()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費	¥170,000 (税込 ¥187,000)
※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。	
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。	

◆御見積仕様

《システムバス》	
ユニットサイズ	1616(BR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	グラングレー
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	プレシヤスホワイト
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付)
浴槽・風呂フタ	高断熱仕様
カウンター材質	アクリル人造大理石
カウンターカラー	ラスターブラック
エプロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ノルディックグリーン
パネルカラー(周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	LPG / 60Hz

◆御確認事項

- ☆御見積りの商品は受注生産品の為、納期は約3週間程度いただきます
- ☆商品の仕様・価格等は予告なく変更する事があります。ご購入の際には、弊社支店営業所等へお問い合わせ、またはカタログにてよく御確認下さるようお願い致します。
- ☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。
- ☆この御見積書の有効期間は30日間です。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
	2021.02	前田(野)

◆備考

--

--	--

No.*

現場番号	A7963363	プラン番号	1600A-2011-0981T	作成日	2020/12/23
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデシシア 1616サイズ		1	1,038,000	1,038,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	3枚引戸<1400幅>(グレー)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1	+76,500	+76,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・グラングレー)	1	+20,000	+20,000
6	排水口カバー	ステンレス	1		
7	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(プレシヤスホワイト)	1		
8	浴槽追い焚き穴	あり	1		
9	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
10	浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付)	1	+50,000	+50,000
11	ヘルシージェット	なし	1		
12	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1		
13	ガス温水式床暖房	なし	1		
14	洗い場用水栓	棚付サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)KF9152H 水栓上部カウンター(チャコールグレー)	1		
15	洗い場用水栓	エコナワ- (節水+手元止水+3Way): KF9152HLE/RE	1	+13,000	+13,000
16	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
17	カウンター	人ススクエアカウンター	1		
18	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	1	+5,200	+5,200
19	浴室パネル	プレミアムクラス(一面デザイン)(Kパネル)	1	+15,000	+15,000
20	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
21	引き違い窓	0806(高断熱アルミ樹脂複合窓)<中抜き>(ホワイト)	1	+37,500	+37,500
22	窓枠フリー	窓枠フリー(樹脂タイプ)M1509 W	1	+9,500	+9,500
23	天井	高光沢フラット天井	1		
24	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V規格)	1	+41,000	+41,000
25	換気機器	ランドリーパイプメタルタイプ(1本)	1	+1,500	+1,500
26	換気機器開口	工場開口	1		
27	照明	ストレータライン照明(電球色)	1	+35,000	+35,000
28	天井照明開口	工場開口	1		
29	ミラー	ロングクリアミラー	1		
30	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
31	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-4,000	-4,000

現場番号	A7963363	プラン番号	1600A-2011-0981T	作成日	2020/12/23
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	収納棚	クリアタイプ ブラック(3段)	1		
33	循環金具セット	PLIX	1	+12,500	+12,500
34	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
35	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			35		¥1,350,700

商品総合計	35	¥1,350,700
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥170,000 (税込 ¥187,000)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

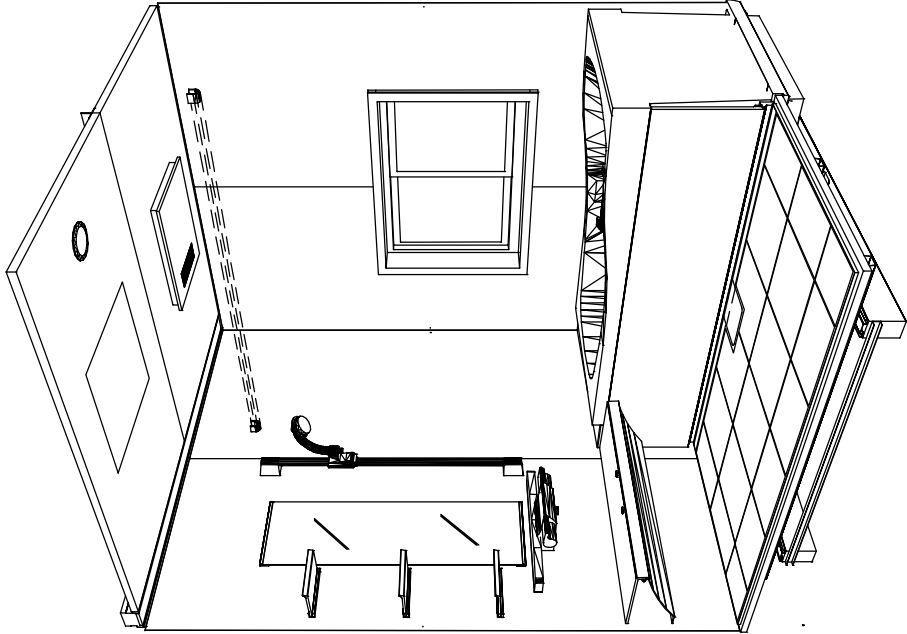

鳥瞰図

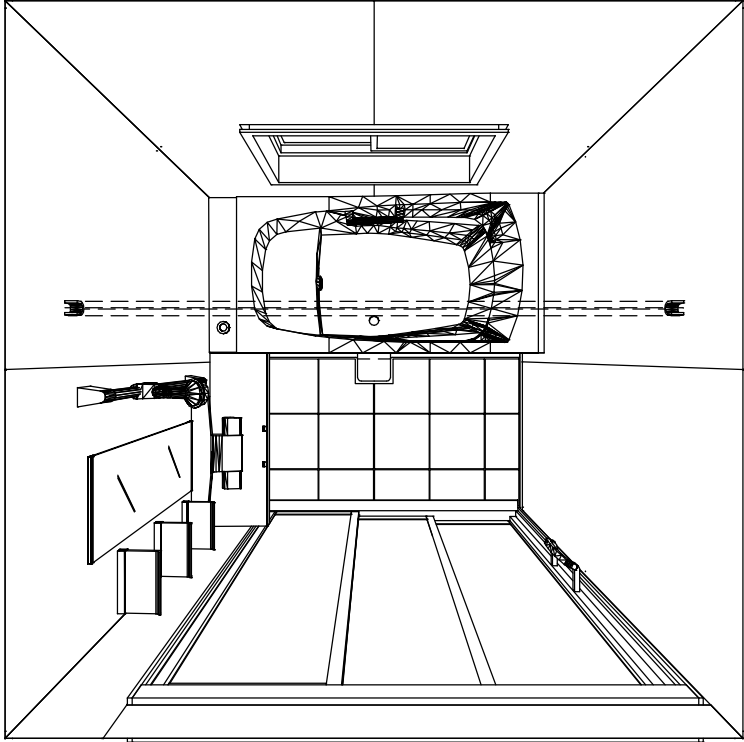

1616

鋳物ホーロー浴槽

高光沢フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：北陸-金沢SR 新SB4様邸	PREDENCIA プレデンスIA	姿図
	現場番号：A7963363	プラン番号：1600A-2011-0981T	作成日：2020年12月23日
	北陸支店 販売課	担当営業：	担当アドバイザー：2021.02
縮尺：A3サイズ等倍			

カウンター面

浴槽前面

浴槽側面





浴槽前面

浴槽側面


カウンター面

※注意事項

※印寸法は給水給湯器の
突出寸法18mmを含みます。

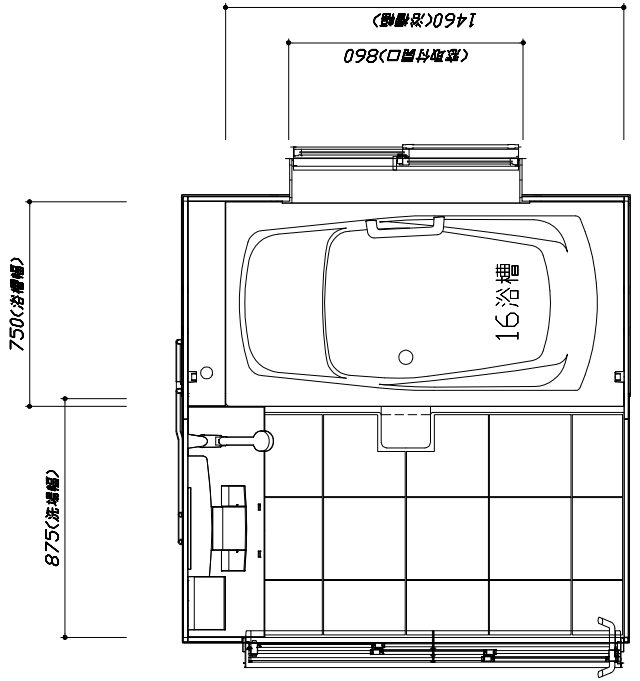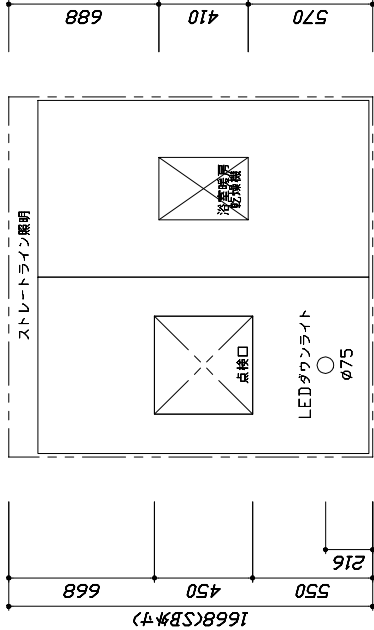


< 天井伏図 >

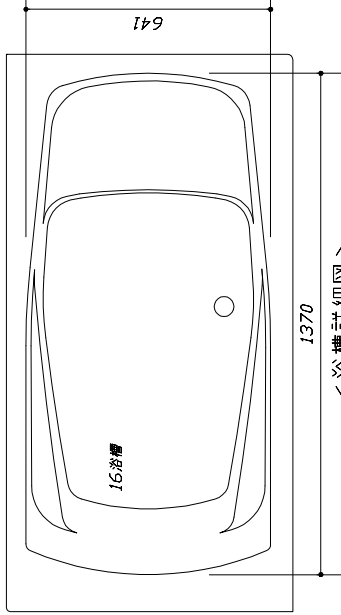

< 浴槽詳細図 >


< 平面図 >



Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：北陸-金沢SR 新SB4様邸	PREDENCIA プレデンスIA	施工図1	縮 尺： 1:25,20
	現場番号：A7963363	プラン番号：1600A-2011-0981T	作成日：2020年12月23日	
	北陸支店 販売課	担当営業：	担当アドバイザー：2021.02	


縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼書、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
・土間には床名板面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・浴槽側面の窓設置位置は参考です。ご確認をお願い致します。
・ドアアンクル下端とSBFLの段差は17mmになります。
・ハンドバー・設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認をお願い致します。
・外寸は突出部を含みます。
・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

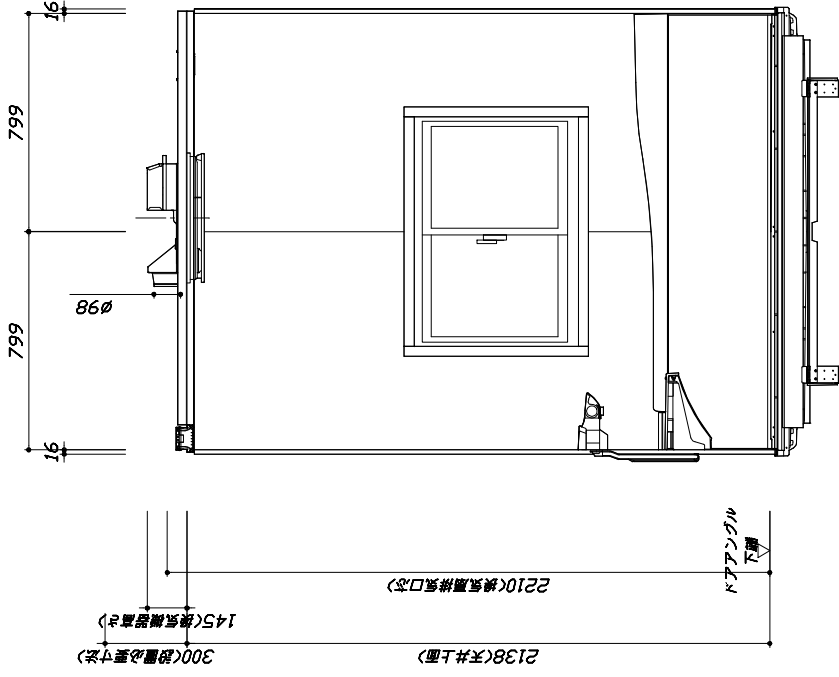


＜浴槽側面図＞

■土間コン仕上げ寸法
ドアアンクル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

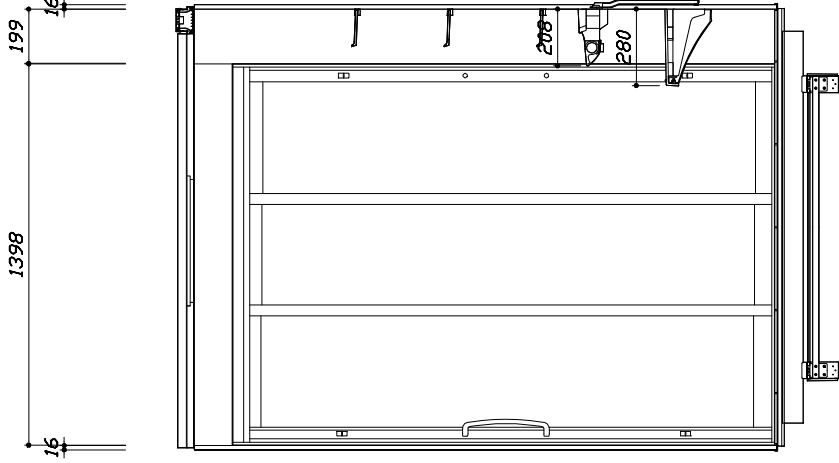

＜洗場側面図＞



Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称：北陸-金沢SR 新SB4棟邸	PRE DENCIA プレデンスシア	施工図3	縮 尺： 1:20
		現場番号： A7963363	プラン番号： 1600A-2011-0981T	作成日： 2020年12月23日	
		北陸支店 販売課	担当営業：	担当7 ドバイザー： 2021.02	
縮尺：A3サイズ等倍					

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	BR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	鋳物ホーロー 裏面保温材・高断熱仕様 (発泡ウレタン)
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付) グリップ付 (270リットル) 追い焚き穴:あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂 (FRP)
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材 (発泡ポリエチレン)
カウンタ―	スクエアカウンタ―：アクリル人造大理石 カウンタ―下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：銅板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし
天井	高光沢パンドイがパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア:19高さ3枚引戸(7ℓ×框/樹脂ガラス/ﾀｲﾌﾟ換気口)
窓 1	高断熱引違い窓0806(7ℓ×樹脂複合ﾊﾞﾍﾞﾗｽ(Low-E)) ﾏｲﾌﾟ色 W:ﾎﾜｲﾄ
窓 2	―
窓枠 1	ABS樹脂 W：ホワイト
窓枠 2	―
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂、 浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	410kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ロングクリアミラー くもり止め加工
収納棚	クリアタイプ：アクリル樹脂製 (3段)
タオル掛け	―
洗場側水栓	チモカット(KVK KF9162HLE) (樹脂ホース:ﾀｲﾌﾟ調)
浴槽側水栓	―
兼用水栓	―
スライドバー	シャワーフックスライドバー (手すりタイプ) (ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ-T1020S MH)
照明	ストレートライン照明 (LED 21.3W調光機能なし電球色)
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V・最大消費電力1250W) (ﾀｲﾌﾟ径 ϕ98) (常時換気対応品)
フロフタ	保温風呂フタ (PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管 (10A)
循環金具	循環金具セットPLLA：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	―
ハンドバー②	―
ハンドバー③	―
ハンドバー④	―
ハンドバー⑤	―
ハンドバー⑥	―
ハンドバー⑦	―

本体カラー


浴槽	WP：プレシヤスホワイト
カウンタ―	K：ラスタ―ブラック
ﾊﾞﾈﾙ(ｶｳﾝﾀｰ面)	JYH：ノルディックグリーン
ﾊﾞﾈﾙ(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部ｶﾞｰﾃﾞﾝ	CG：チヤコールグレー
浴槽エプロン	K：ブラック
洗場	PG：グラングレー
ドア	G：グレー
収納棚	クリアタイプ(ブラック)
タオル掛け	―
ﾗﾝﾄﾞﾘｰｾｯﾄ	M：メタル

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

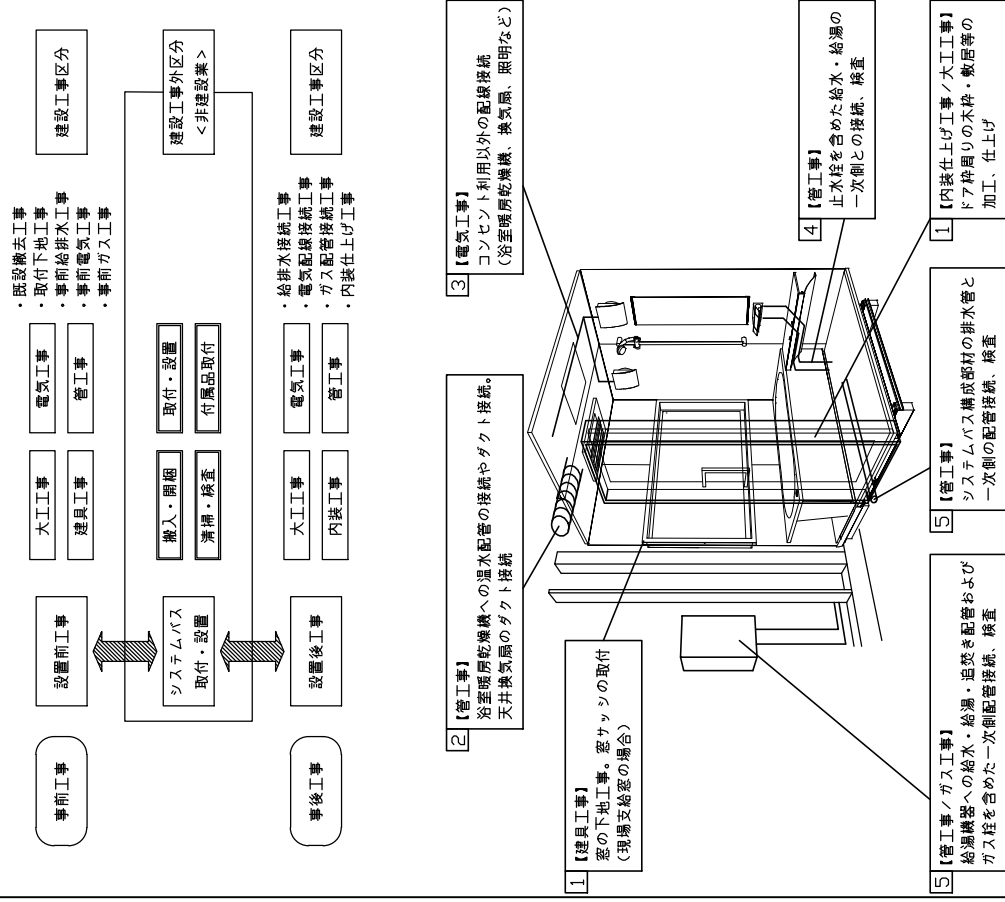

■システムバス 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事			建設工事外
				大工工事	とび・土工・石工事	管工事	
設置前工事		大工・土工・建具	設置基礎、設置床の工事	○	○		浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
	1		浴室ドア、窓サッシの地下工事	○			建築躯体への浴室ドア枠回り、窓サッシの地下工事
	2		給排水配管工事		○		浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
	3	管	換気機器のダクト配管事前工事			○	浴室の専用ダクト事前工事、壁六加工
			給湯機器専用配管事前工事			○	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
		電気	浴室専用電気配線事前工事			○	浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パンプ・流し場の取付・設置			○	浴室専用の架台・浴槽パンプ・流し場を所定の位置に設置
			浴室専用パンプ・配管レットの取付・設置			○	流し場・浴槽・浴槽パンプへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置			○	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置			○	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置【注記 1】			○	カウンター、ミラー、ハンダー等の取付
			水栓類の組立・取付【注記 1】			○	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付【注記 1】			○	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付【注記 1】			○	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付			○	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付			○	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付【注記 1】			○	電化品、オブション品の取付
			浴室ドアの組立・取付			○	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付【注記 1】			○	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
設置後工事		管 大工 電気	浴室窓枠の組立・取付【注記 1】			○	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンコーンの充填			○	接合部、仕上り部へのシリコン塗布・充填
			試運転、完成検査【注記 2】			○	完成後の試運転、性能確認検査
			建築外壁の穴あけ	○			建築壁の仮体加工作業
	1		排気ダクトの敷設工事		○		浴室換気機器のダクト敷設工事
	2		浴室換気機器と排気ダクト接続工事		○		建築側ダクトと換気機器の接続、検査
	3	電気	浴室換気機器の電気・フェース接続工事			○	建築側の屋内配線と配電器具、フェース工事
			ウェザーカバーの外壁取付			○	建築の外装仕上り工事
	4	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				給水・給湯の二次配管、追焚き配管の接続、検査
5	建築側排水配管との接続工事【注記 3】					○	浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
6	給湯機器本体工事（試運転・確認）				○	○	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
		電気 他	内装仕上げ工事	○	○		床、ドア廻縁、脱衣室仕上げ工事
1	浴室用電線配線、接続工事				○		浴室機器の事後電気工事
	3		浴室天井裏の電線、スイッチ工事			○	浴室全体の電気器具、配線接続工事

- ※ 注記 1) 原則、現場完成製品は支給側で取付実施とする。
※ 注記 2) 製品の完成検査、試験実施を行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時には検査、試験実施が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する。
※ 注記 3) 設置室内の工仕、ざり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲内とする。

Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称：北陸 金沢SR 新SB4様邸	P R E D E N C I A プレデンスIA	工事区分表
		現場番号：A7963363	プラン番号：1600A-2011-0981T	作成日：2020年12月23日
		北陸支店 販売課	担当営業：	担当アドバイザー：2021.02


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



■ 給水給湯管工事注意事項


- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

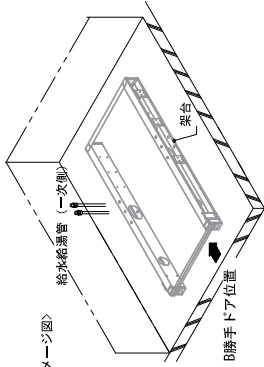


＜給水立上げイメージ図＞

■ 土間コンクリート仕上り寸法


ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

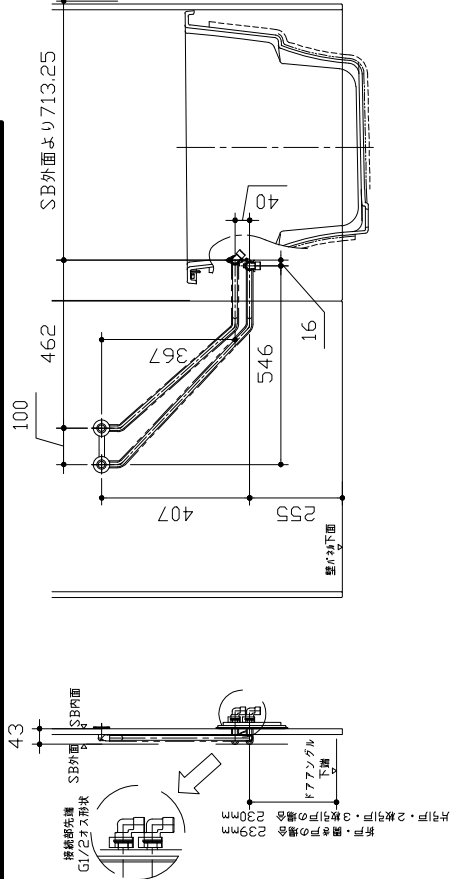

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

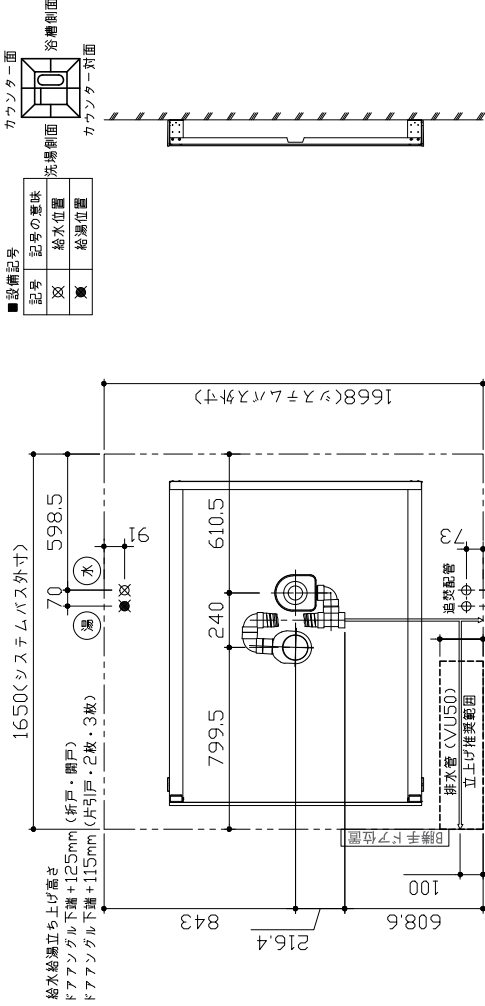

■設備記号		
記号	記号の意味	
○	排水位置	
●	給水位置	



＜給水給湯管取合詳細図＞

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北陸-金沢SR 新SB4様邸

現場番号： A7963363

北陸支店 販売課

PREDECIA プレデシシア

プラン番号： 1600A-2011-0981T

担当営業：

排水配管図

作成日： 2020年12月23日

担当アドバイザー： 2021.02





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
 - ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
 - ・ドア部はSB外寸より突出します。
- 詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

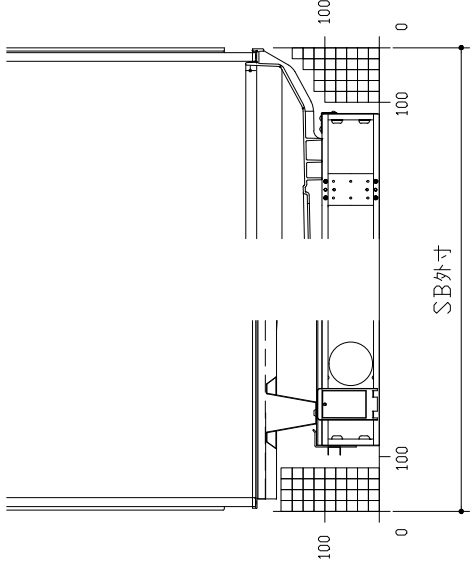


B矢視

A矢視

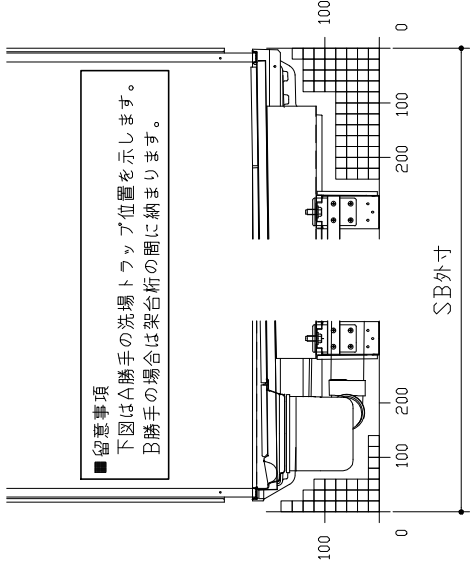

D矢視

C矢視

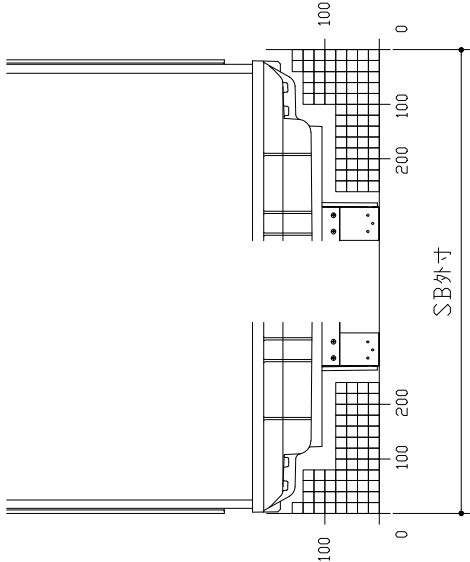

F矢視

E矢視

Takara standard

タカラスタンダード株式会社

現場名称：北陸-金沢SR 新SB4様邸

現場番号：A7963363

北陸支店 販売課

PREDECIA プレデシシア

プラン番号：1600A-2011-0981T


担当営業：

床下空間図

作成日：2020年12月23日


担当アドバイザー：2021.02

担当アドバイザー：2021.02

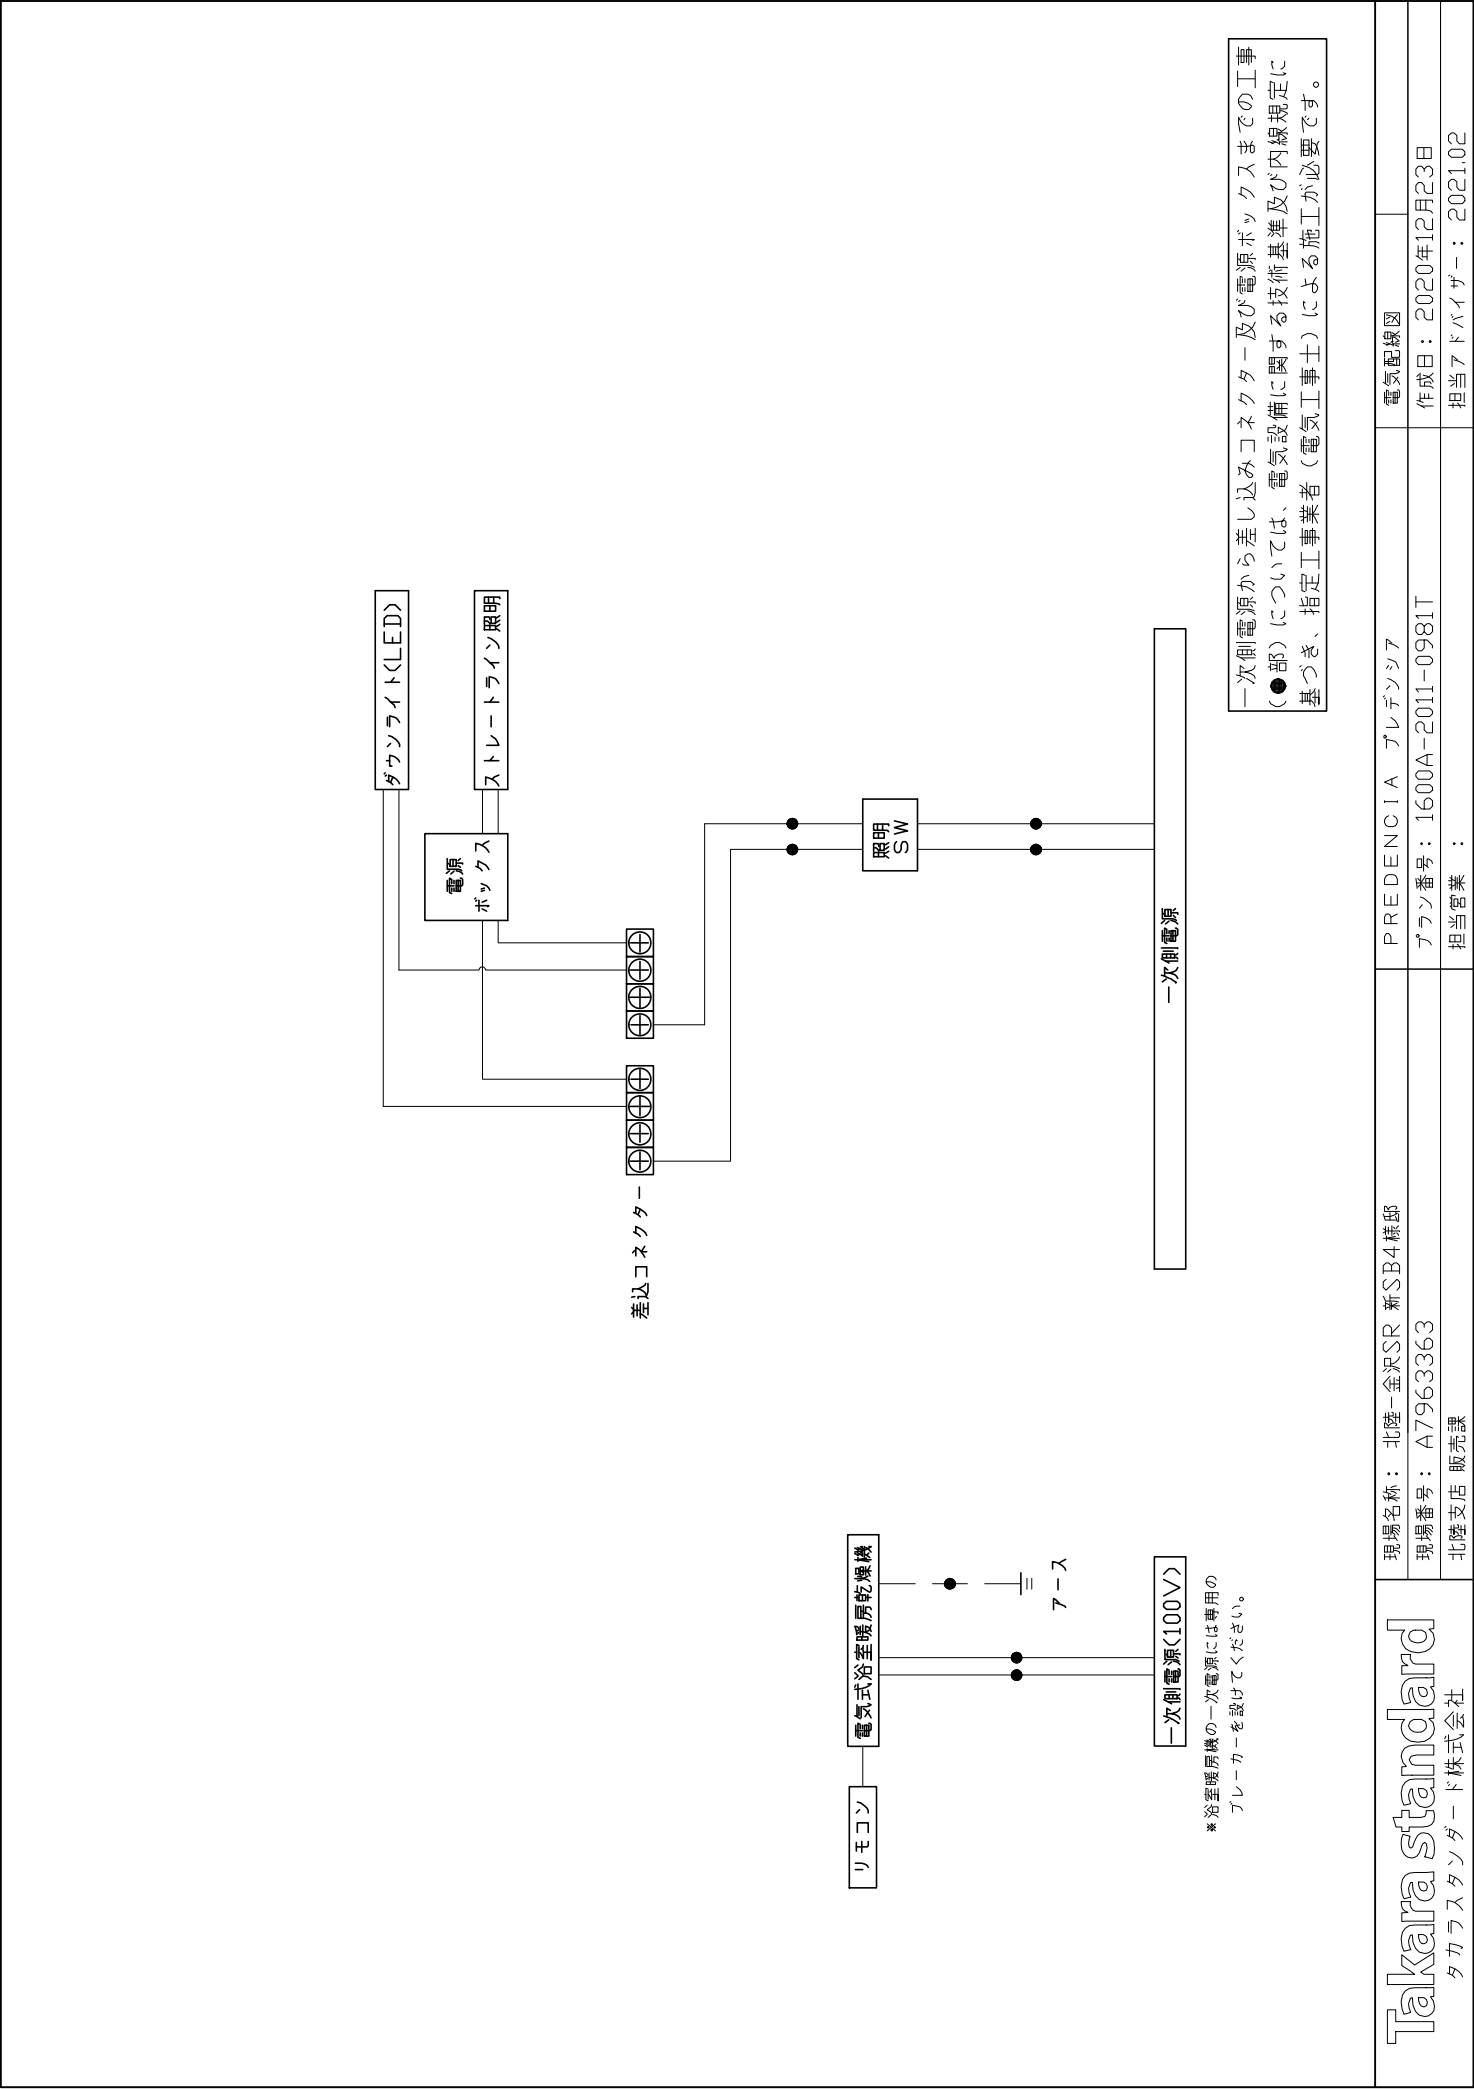


収納棚

本体：PMMA

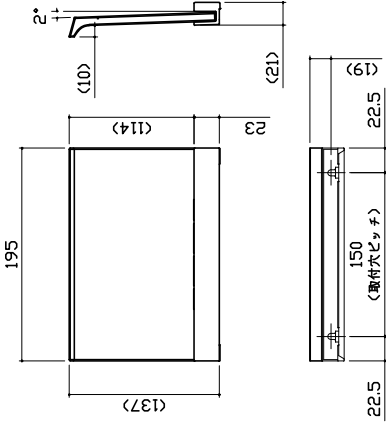


窓枠フリー


※【】寸法はそれ以下に現場加工することができます。
※素材 圧：フクヒ化学工業製 NW：キョーセー製
材質：窓枠本体/カバー AESコートABS ...MI509(E)
AASコートABS ...MI509(NW)
コーナーピース部 ABS ...〈E/NW未議〉




循環金具・フロアダンプタ関連

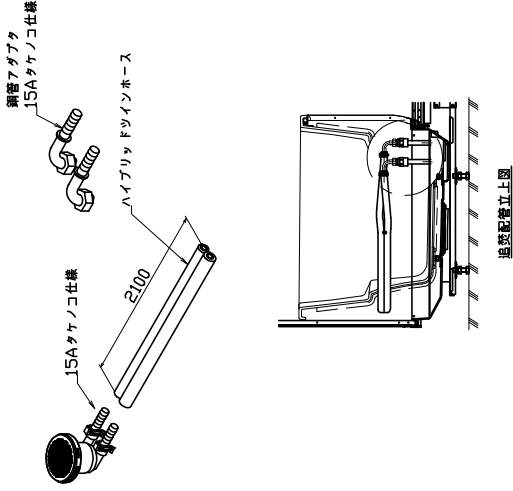


風呂蓋 7077MDH-16XST

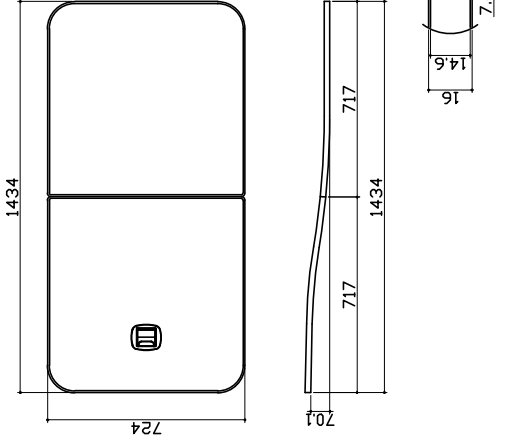

洗い場側排水トラップ

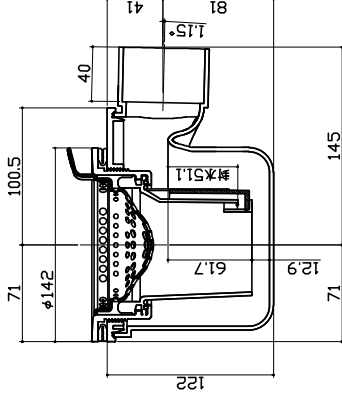

浴槽側排水トラップ

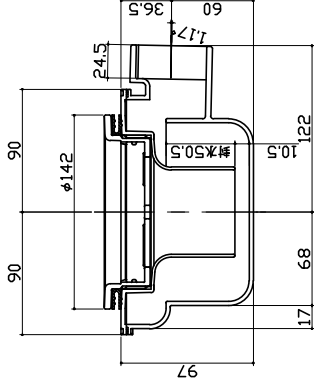

パネル割図		ミラー		収納棚	
※K16C2J 0799 L<JYH ※K16C1N 0799 R<JYH ※K18FD 0199 <W ※K16NW 0799 <W ※K16A 0799 <W ※K16AD 0799 <W		※K16C2J 0799 L<JYH 現地加工：φ3.5		※K16C2J 0799 L<JYH 現地加工：φ3.5	
シャワーフックスライドバー		ランドリーパイプ			
※K16C2J 0799 L<JYH 現地加工：φ3.5		※K16AD 0799 <W ※K16C1N 0799 R<JYH 現地加工：φ3.5			
現場名称：北陸-金沢SR 新SB4様邸 現場番号：A7963363 北陸支店 販売課		PREDENCIA プレデンスア プラン番号：1600A-2011-0981T 担当営業：		穴開け指示図 1/1 作成日：2020年12月23日 担当アドバイザー：2021.02	
