

現場番号	A7961605	プラン番号	1600A-1912-0756T	作成日	2019/12/23
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	レラージュ 1620サイズ		1	751,000	751,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	キーブクリーンドア:折戸<800mm幅>(ホワイト)(20サイズ)	1		
4	洗い場	キーブクリーンプフロア(ハイクラス・カームベージュ)	1		
5	浴槽	キーブクリーニ浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)	1		
6	排水口カバー	ステンレス	1		
7	浴槽追炊き穴	あり	1		
8	エプロン	カラスステンレス(保温材あり)	1		
9	浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)	1		
10	ヘルシージェット	なし	1		
11	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1		
12	ガス温水式床暖房	なし	1		
13	洗い場用水栓	単独型プッシュ式水栓(メタルホース)SB280 水栓カウンター(ホワイト)	1	+122,000	+122,000
14	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド<節水仕様>	1		
15	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
16	カウンター	人スクエアカウンター	1		
17	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(TN-116)	1		
18	浴室パネル	ハイクラス(一面デザイン)	1		
19	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
20	天井	高光沢フラット天井	1		
21	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V規格)	1	+41,000	+41,000
22	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
23	換気機器開口	工場開口	1		
24	照明	天井付スクエア照明+ダウンライト(1灯)(白色)	1		
25	天井照明開口	工場開口	1		
26	ミラー	ハイロングクリアミラー	1	+5,000	+5,000
27	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
28	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,500	-1,500
29	ハンドバー	ステン 1型600タイプ	1	+8,000	+8,000
30	収納棚	クリアタイプB(3段)	1	+5,000	+5,000
31	浴室テレビ	16インチ(ブラック)	1	+156,000	+156,000

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	循環金具セット	PLIX	1	+12,500	+12,500
33	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
34	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			34		¥1,099,000
商品総合計			34		¥1,099,000

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥147,000 (税込 ¥161,700)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

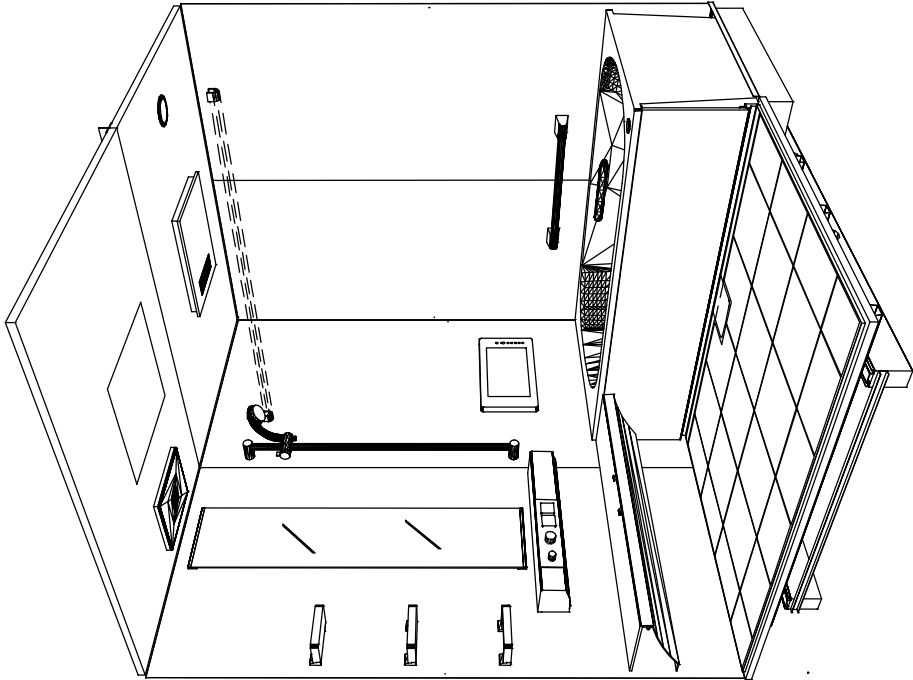

鳥瞰図

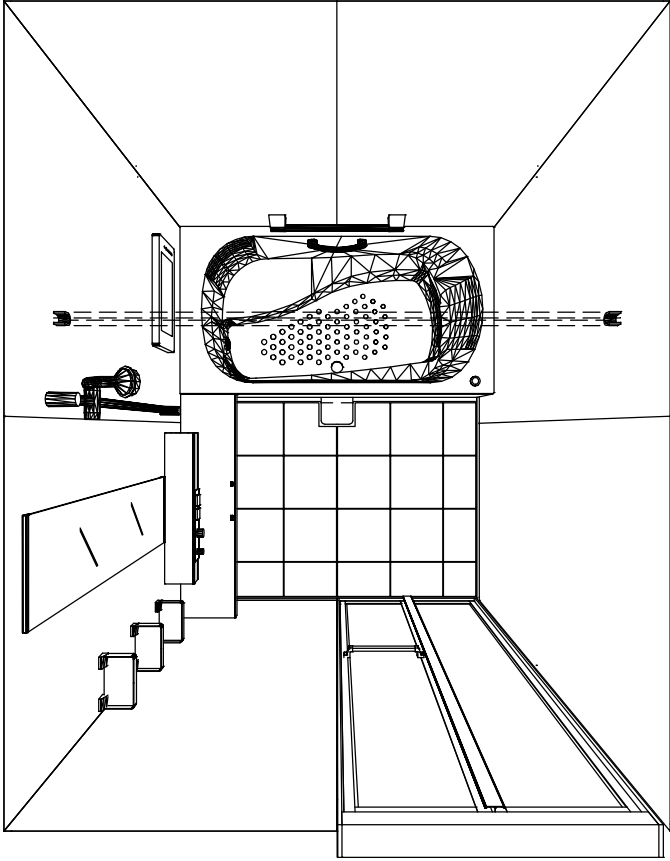

1620

キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>

高光沢フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。



Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：北陸-金沢SR 新SB5様邸		RELAGE レフージュ	姿図
	現場番号：A7961605		プラン番号：1600A-1912-0756T	作成日：2019年12月23日
	北陸支店 販売課		担当営業：	
			担当アドバイザー：2017.8	
縮尺：A3サイズ等倍				

カウンター面

浴槽前面


浴槽側面

■注意事項
※印寸法は給水給湯器の
突出寸法18mmを含みます。

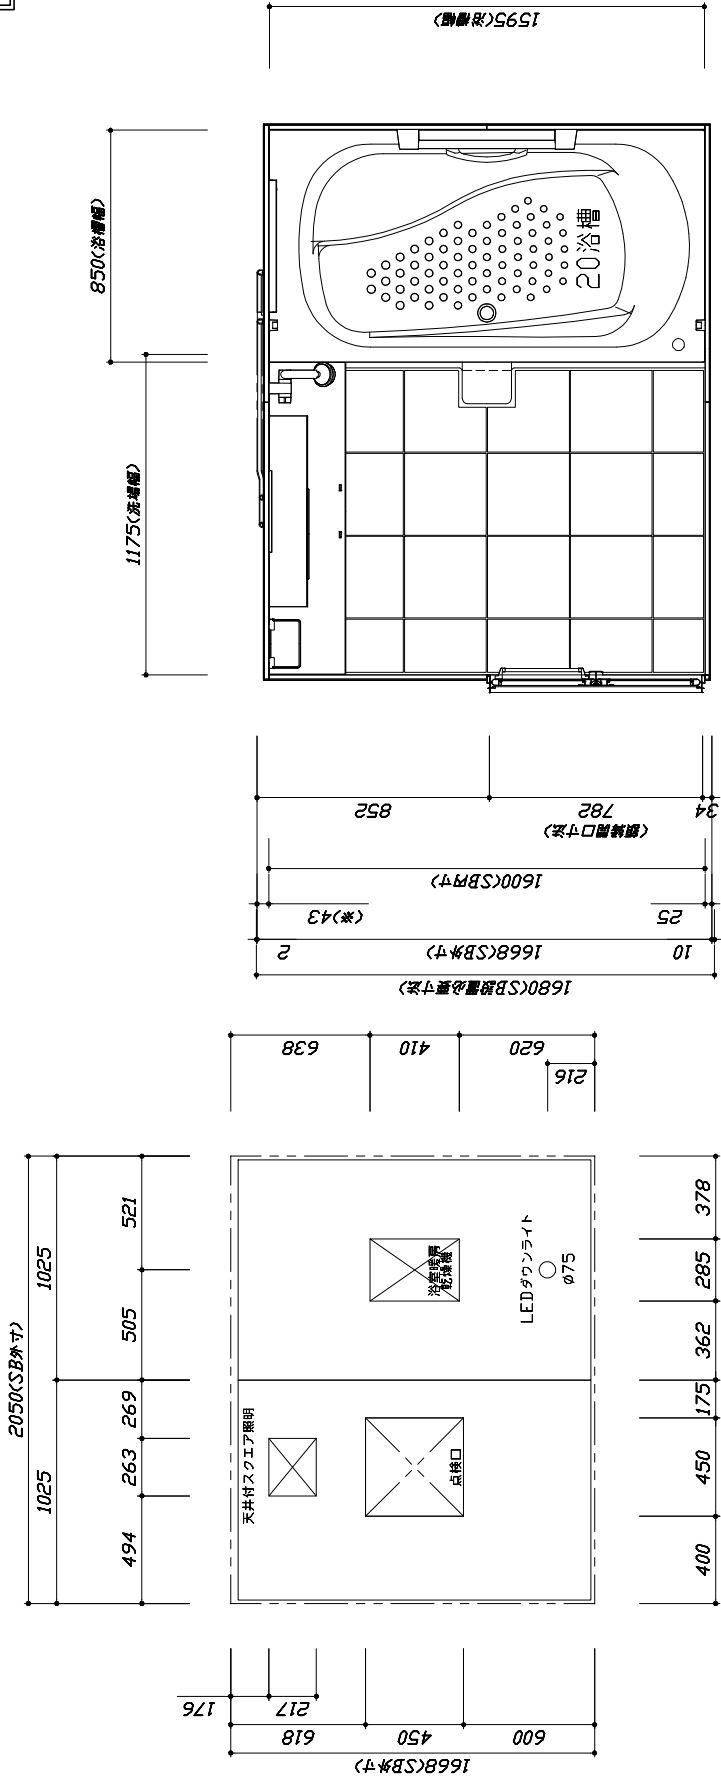

< 平面図 >

< 天井伏図 >






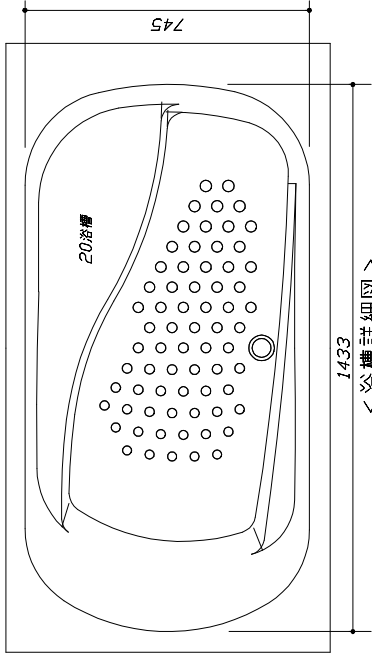


< 浴槽詳細図 >

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：北陸-金沢SR 新SB5様邸	RELAGE レラージュ	施工図1	縮 尺：1:25,20
	現場番号：A7961605	プラン番号：1600A-1912-0756T	作成日：2019年12月23日	
	北陸支店 販売課	担当営業：	担当アドバイザー：2017.8	

縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼書、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
・土間には床名産面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・ドアアンクル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認をお願いします。
・外寸は引出部を含みます。
・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

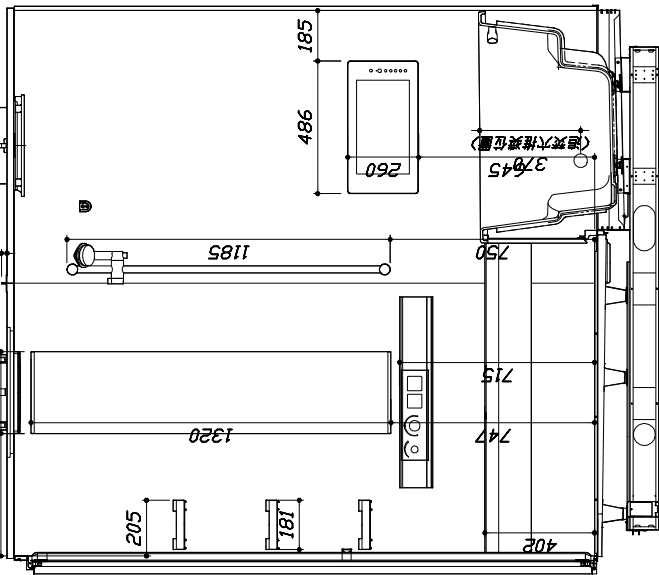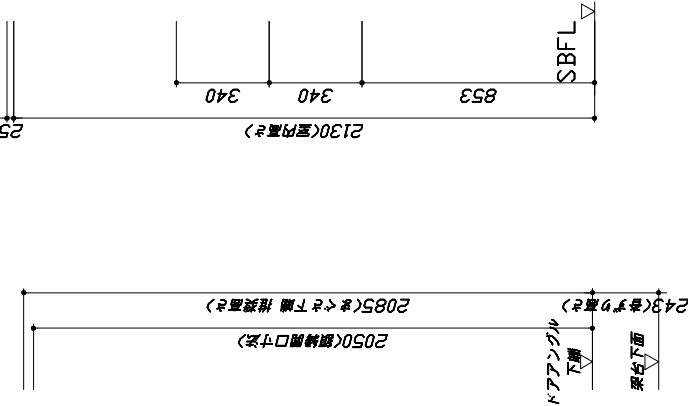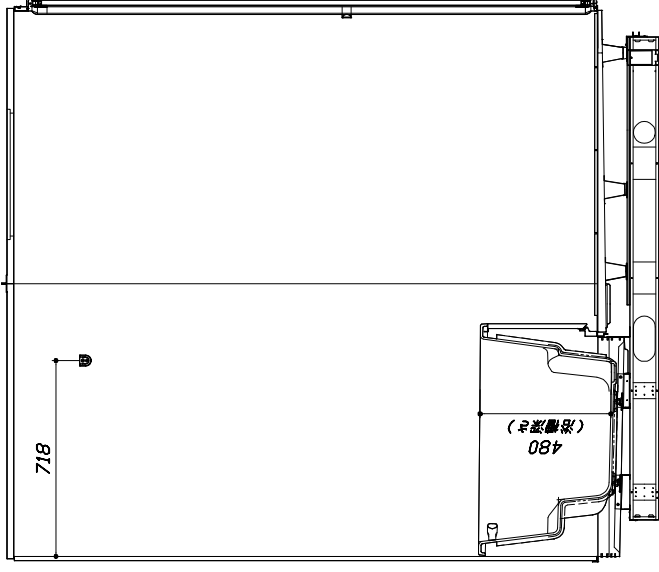


■土間コン仕上げ寸法
ドアアンクル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

＜カウンター対面図＞


＜カウンター面図＞

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼書、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
・土間には床名産面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・ドアアンクル下端より265mm下がり
・ドアアンクル下端より265mm下がり
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認をお願いします。
・外寸は突出部を含みます。
・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

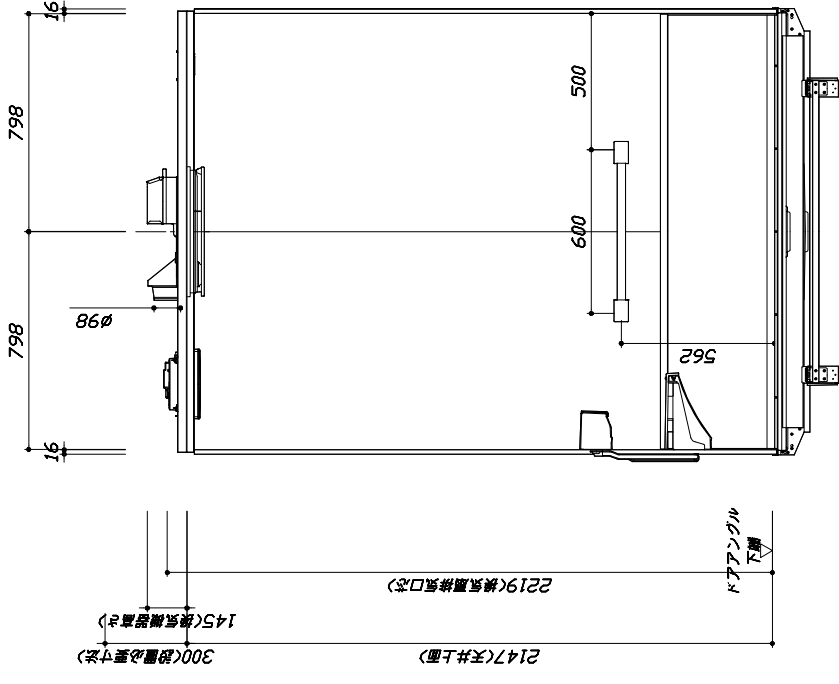


■土間コン仕上げ寸法
ドアアンクル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

<浴槽側面図>

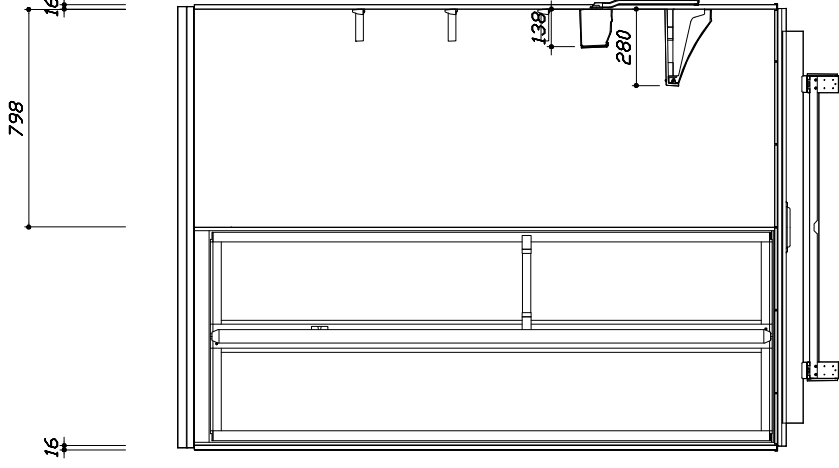

<洗場側面図>



本体仕様表

浴室サイズ	1620サイズ(室内容量6.8立方メートル)
ドア勝手	BR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ銅板
洗場パン	キープクリーン浴槽フロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ワイド浴槽（ペンチ付）グリップ付（330リットル）追いつなぎ穴あり
浴槽パン	ステンレス
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンタ―	スクエアカウンタ―：アクリル人造大理石 カウンタ―下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：銅板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴なし
天井	高光沢ワイド天井：高光沢ワイド天井（内部発泡樹脂）換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：20高さ折戸（7kg/框/樹脂ガラス）
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂、浴槽：ASS樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	365kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ハイロンダクリアミラー くもり止め加工
収納棚	クリアタイプB：AS樹脂製（3段）
タオル掛け	－
洗場側水栓	シャワー・付・タッチ式（タホース仕様・SB280LAB(M)/RAB(M)）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
スライドバー	TN-116
照明	天井付スクエア照明＋LEDダウンライト（LED 16W白色）
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機（100V・最大消費電力1250W）（ダクト径φ98）（常時換気対応品）
フロフタ	組合せ式（アルミ複合板：2枚）
給水給湯管	銅管（10A）
循環金具	循環金具セットPLLA：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	ステンレスタイプ I型600タイプ
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	W：シユガーホワイト
カウンタ―	W：シユガーホワイト
パネル(カウンター面)	BI：ブリックダーク
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カバー	W：ホワイト
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	HD：カームベージュ
ドア	W：ホワイト
収納棚	クリアタイプB
タオル掛け	－
ランドリーセット	ホワイト


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



■ 給水給湯管工事注意事項


- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

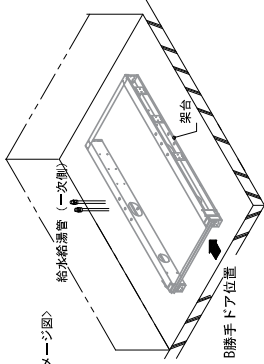


＜給水立上げイメージ図＞

■ 土間コンクリート仕上り寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

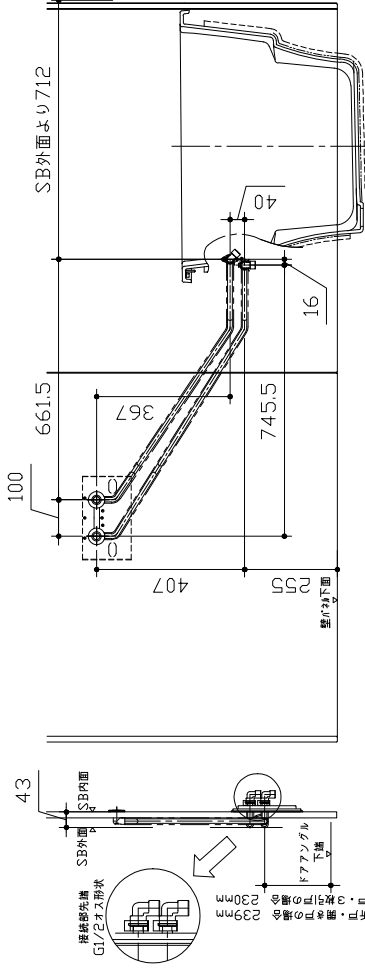

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞



■ 設備記号

記号	記号の意味
△	給水位置
○	給湯位置





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯・追焚配管を立上げるので注意してください。
 - ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
 - ・ドア部はSB外寸より突出します。
- 詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

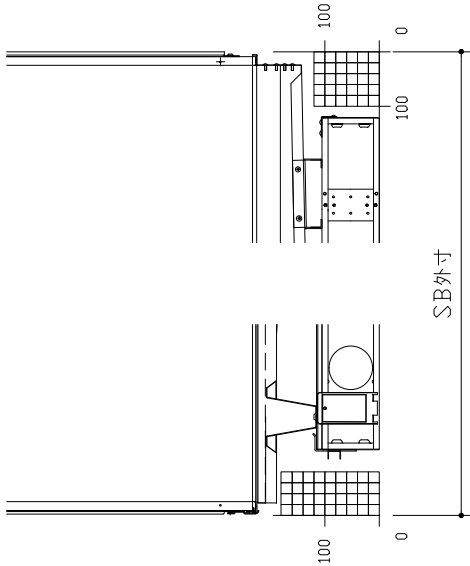


[B矢視]

[A矢視]

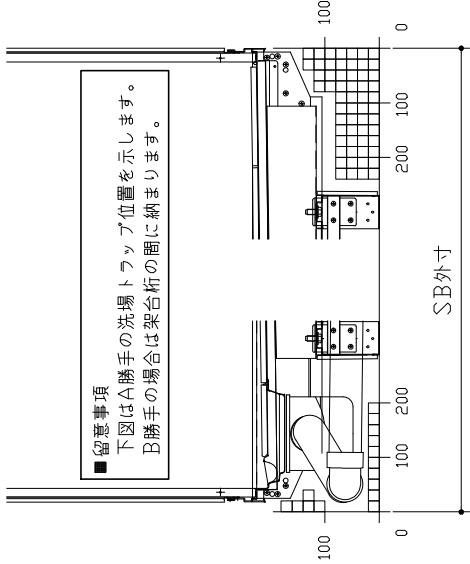

[D矢視]




[C矢視]

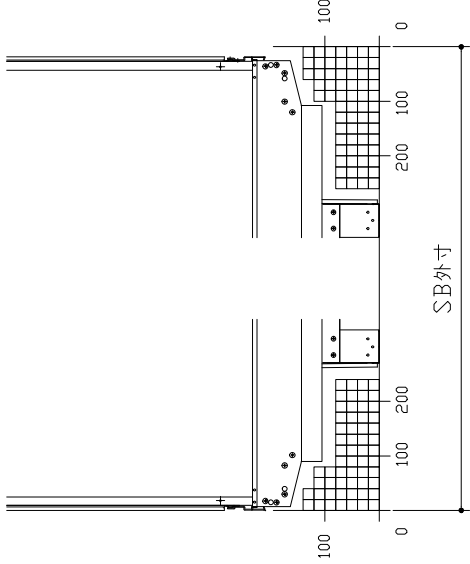

[F矢視]


[E矢視]

キーブックリーニングドア：折戸ホワイト（AWTオールド8）

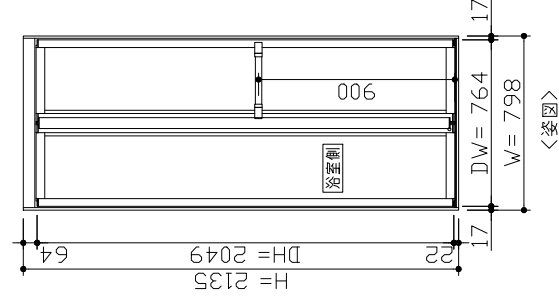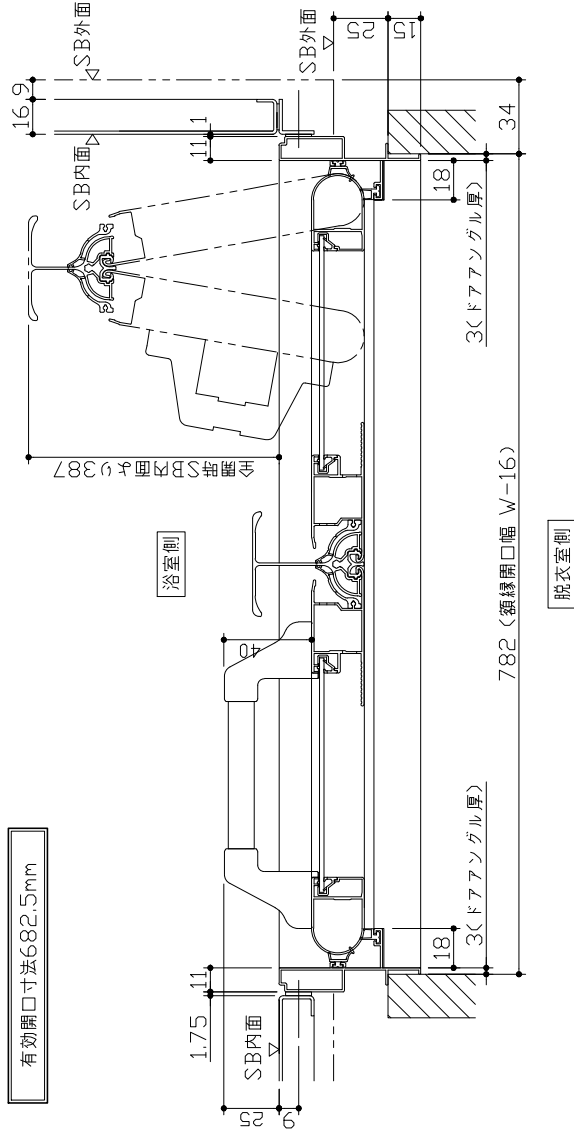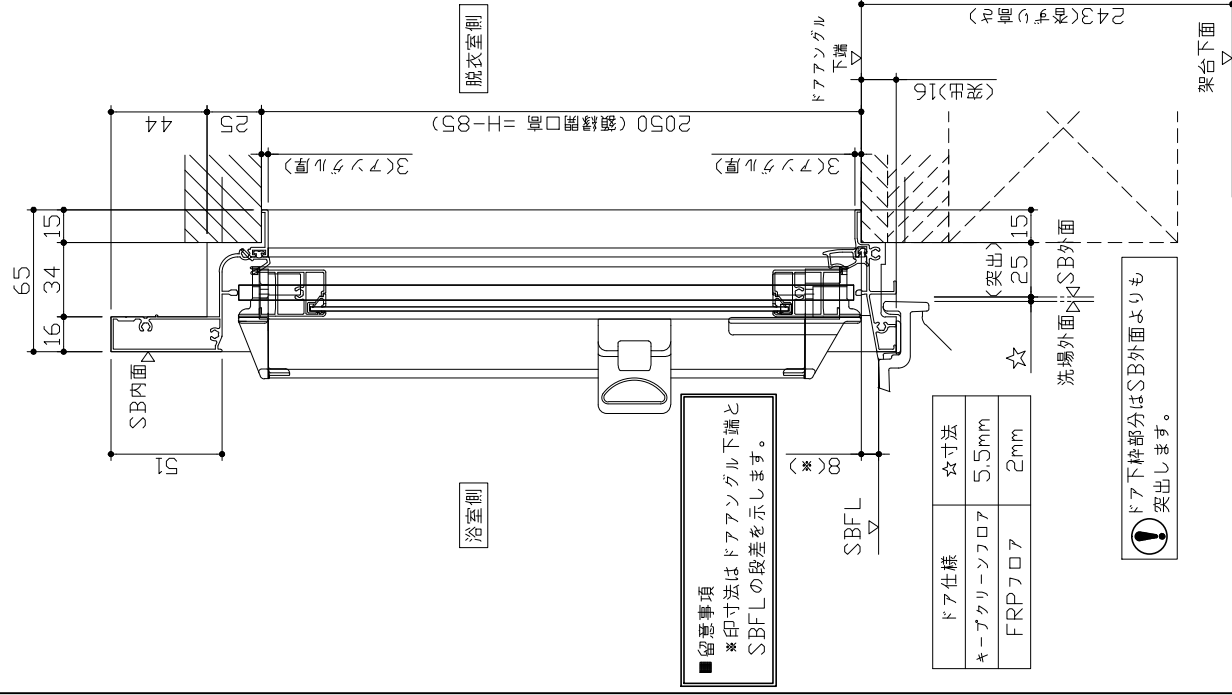


■ ドア横の管柱、間柱について

- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。




 下枠部分はSB外面よりも
出っ張ります。

ドア仕様	☆寸法
キープクリンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

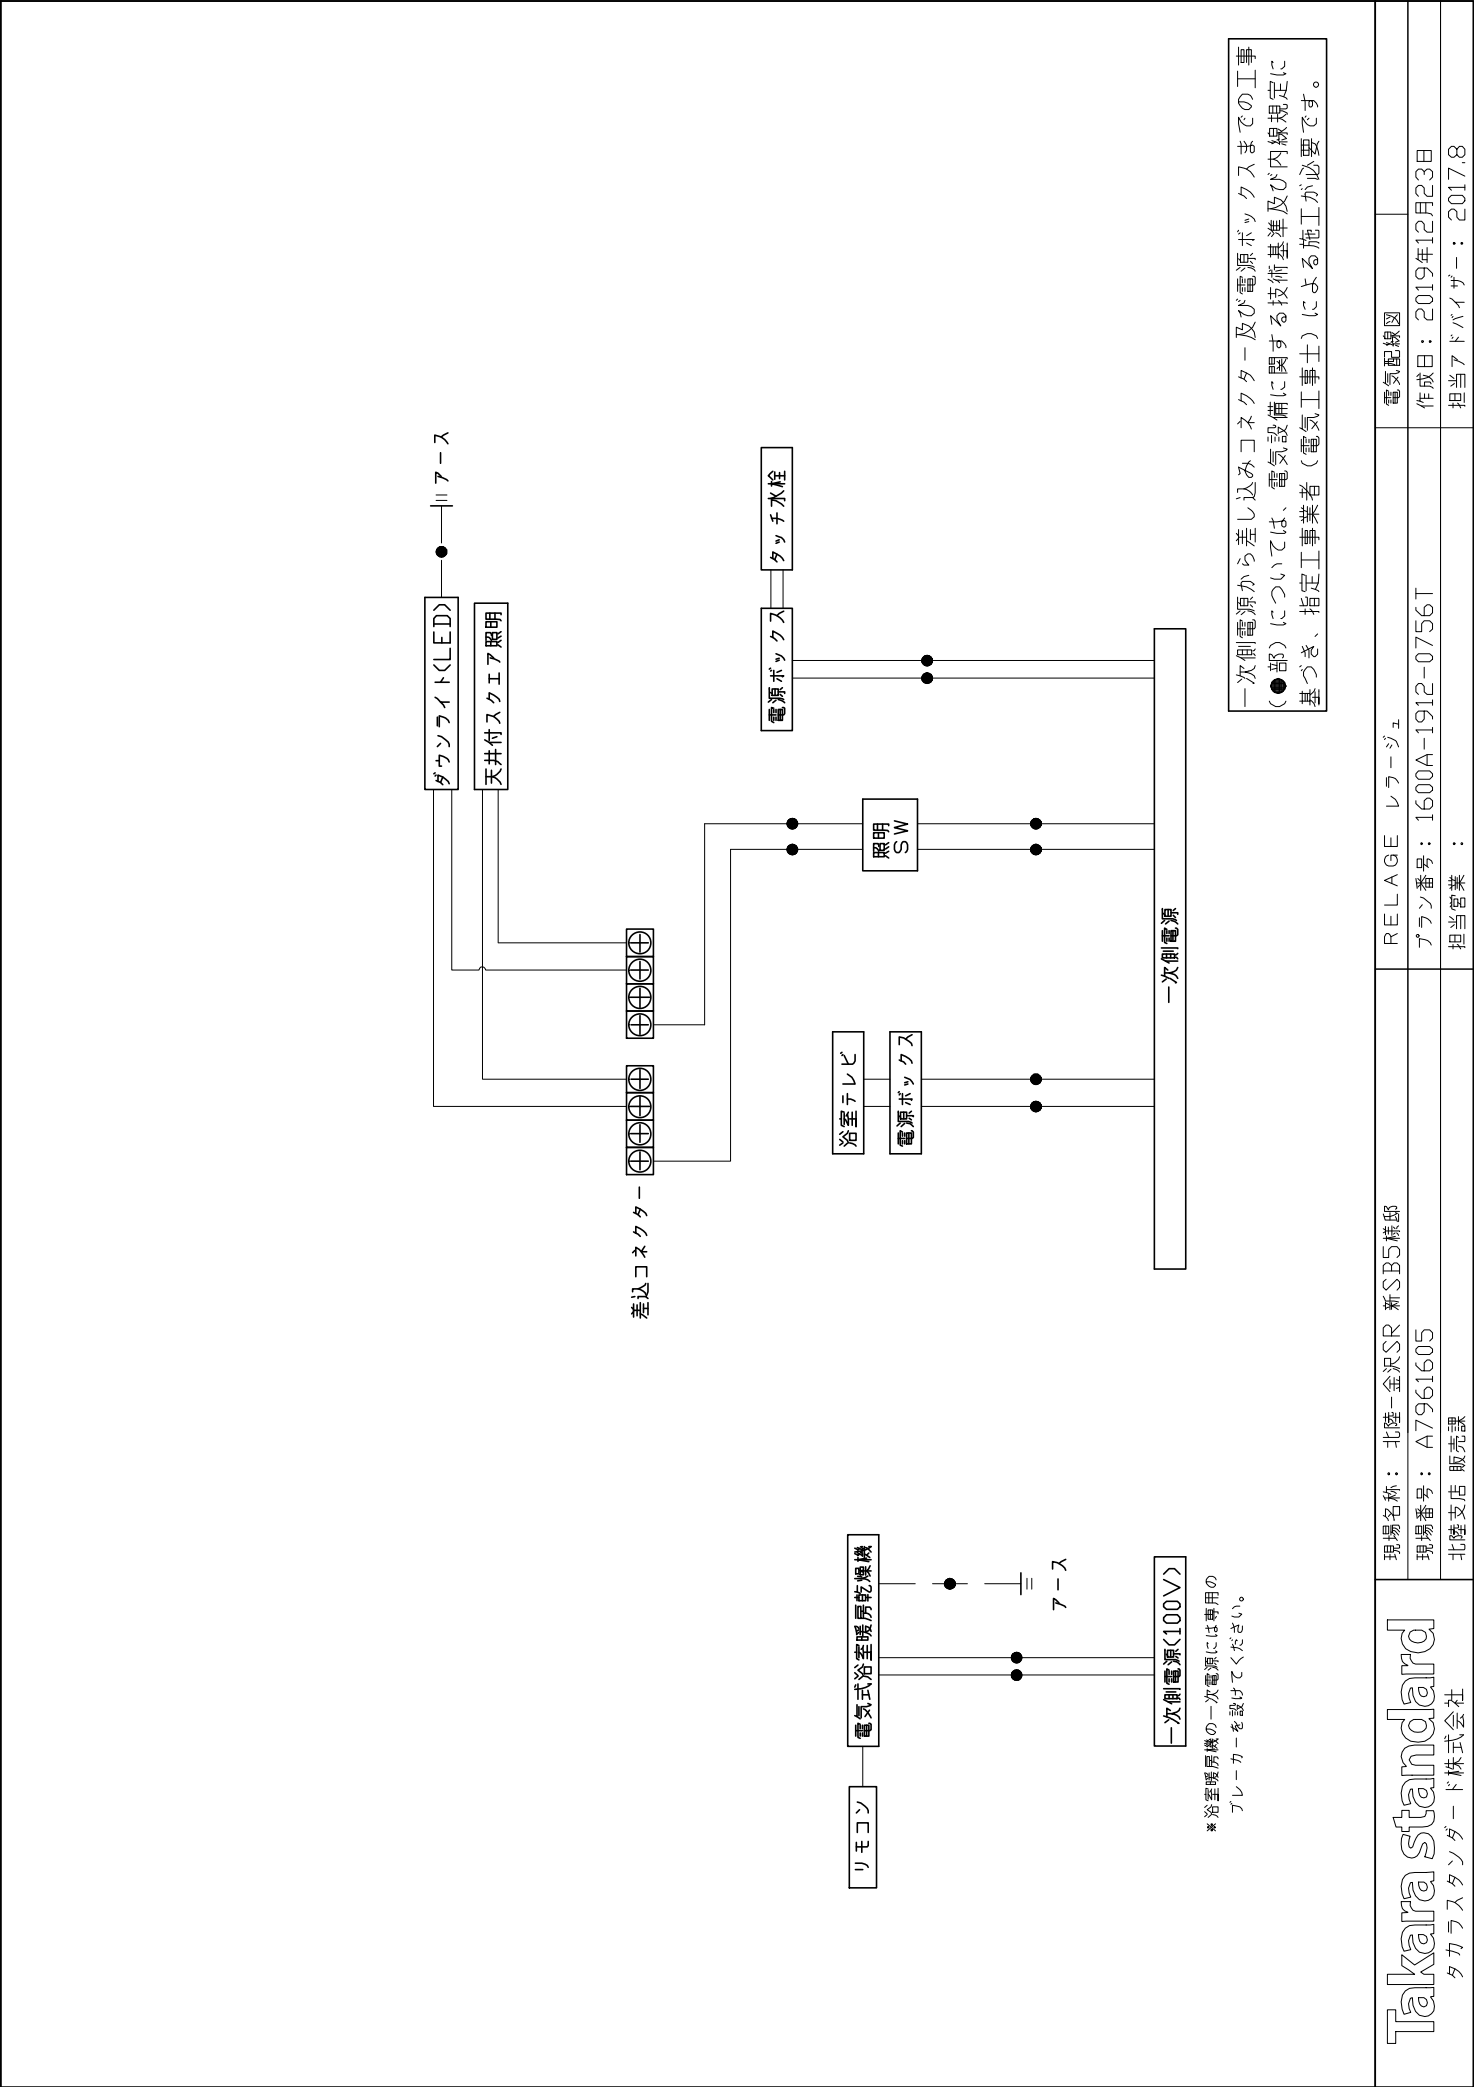

槽浴


SB 興行法	洛陽興行寸法		
	L	A	B
1593	1520	32.5	54.5
1618	1545	57.5	54.5
1643	1570	82.5	54.5
1668	1595	107.5	54.5
1693			
1718			
1743			
1768	1620	120	67
1793			
1818			
1843			
1868			

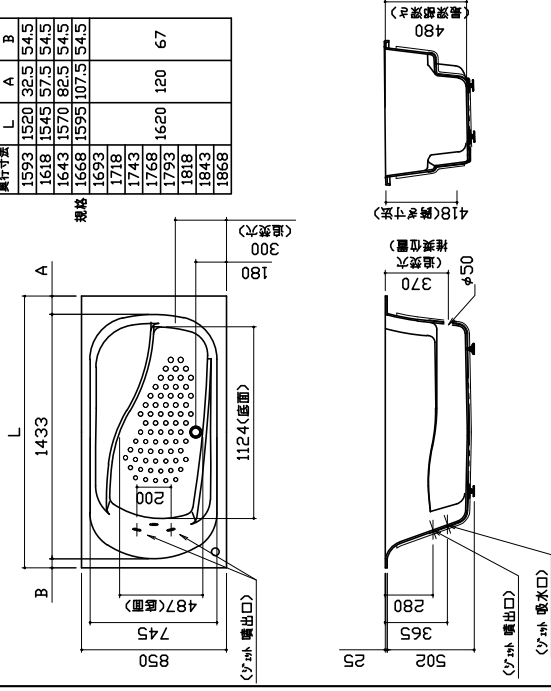


换气機器

リモコンコード長さ: 5m
外形: 縦120mm×横116mm

外形：縦120mm×横116mm

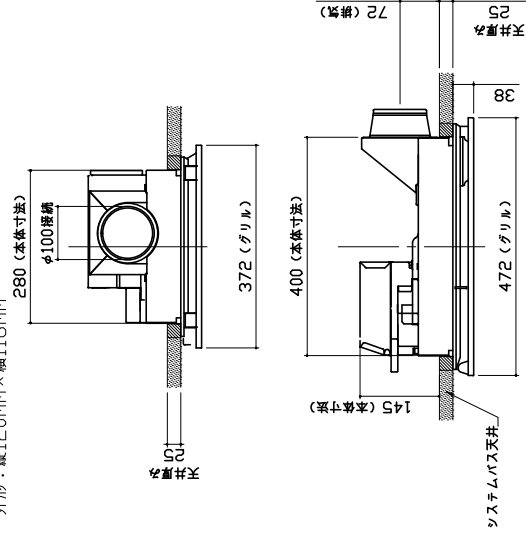


洗い場用水栓

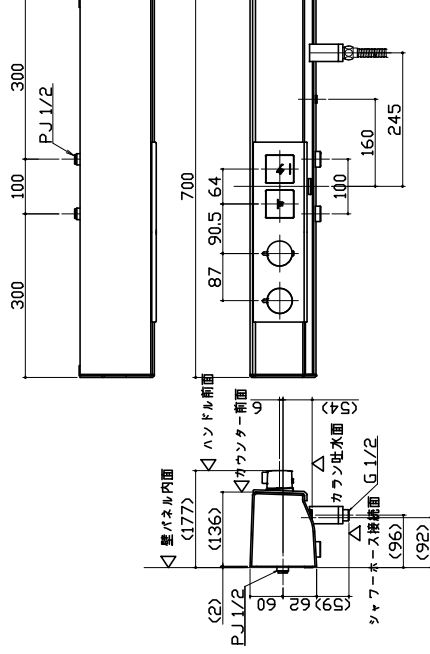


照明

天井付スクエア照明
LED 11W (1灯あたり)

LED 11W (1灯あたり)

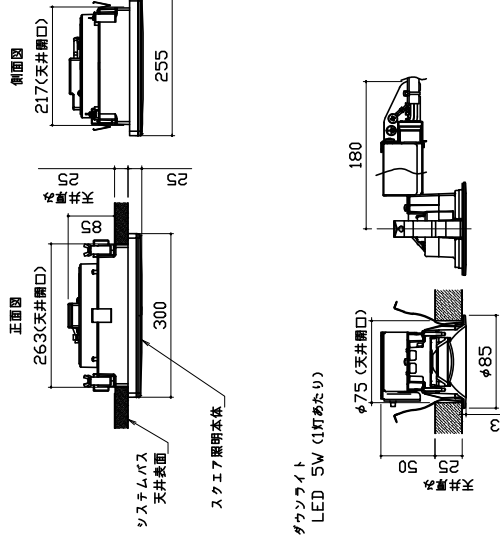

シャワーフックスライドバー

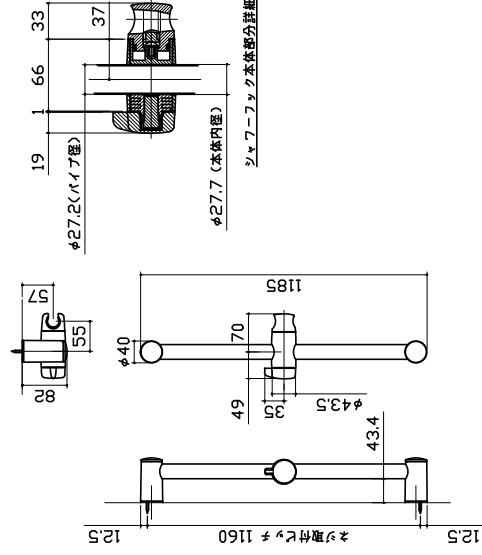


||
||
||

棒: SUS304 ± 0.8


ミラー：表面防曇コートあり（ハイロングクリアマミラー）
材・303304 008

表面防曇コートなし（ハイロングミラー）

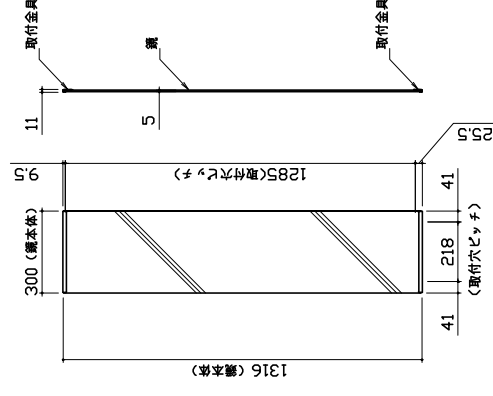


浴室テレビ①

浴室テレビ本体

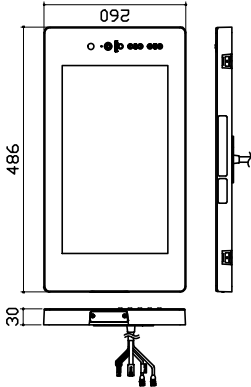

TV本体仕様	
名称	浴室テレビユニット
型式	白色:HW16D-3KT 黒色:HW16D-3BKT
外形寸法(mm)	幅486×高さ260×奥行30
質量	3.2kg
周囲温度	0~50℃
表示部	画面サイズ 15.6インチ
バックライト	3W×3W
スピーカー	WXGA:1366×768
消費電力	24W

電源チャージャーボックス



電源チャージャーボックス仕様	
名称	電源チャージャーボックス
外形寸法(mm)	幅230×高さ104×奥行47.3
質量	0.95kg
定格入力	AC100V
アンプ仕様	F回路型
周囲温度	0~40℃

※三台同時使用

浴室テレビ②



【工事範囲】

当工事範囲

1. 浴室テレビ本体、電源ボックスの取付
2. モニター中継ケーブルの天井裏への配線
3. 浴室テレビ本体及び電源ボックスとモニター中継ケーブルの接続

電気工事業者様 工事範囲

1. 電源ボックスへ一次側100Vの接続
2. アンテナ線の配線及び接続作業
3. プレーカーと扇電遮断機の設置



■留意事項

- (1) レコーダー、プレーヤー等の外部機器は接続できません。
- (2) 付属のモニター中継ケーブルは4mで長さが必要な場合には別売品のモニター延長ケーブル (4m) で最長8mまで延長可能です。

パネル割図	ニラー	収納棚
↑ BR勝手 16A M 16N W 16N W 18B1 W 18AD W	1015 2065 780 509 291 現地加工：φ3.5	1015 205 55 860 1200 1540 現地加工：φ3.5
シャワーフックスライドバー	カウンター	浴室テレビ
1015 150 1930 770 現地加工：φ3.5	1015 44 5 198 20 100 245 20 20 27 20 115 165 80 19 7 20 16 3.5 水栓穴 16 3.5	1015 869 758 689 234 384 504 654 244 384 444 504 644 50 2.8
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：北陸-金沢SR 新SB5様邸 現場番号：A7961605 北陸支店 販売課	穴開け指示図 作成日：2019年12月23日 担当アドバイザー：2017.8

ランドリーパイプ

