

御名前 横浜-港北SR SB1プレデンシアプレミア

様

| | | | | | |
|------|----------|-------|------------------|-----|-----------|
| 現場番号 | A5692765 | プラン番号 | 2716H-1903-0134T | 作成日 | 2019/3/13 |
|------|----------|-------|------------------|-----|-----------|

御見積明細 システムバス

御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

| NO | 商品名 | 仕様 | 数量 | 単価 | 金額 |
|----|---------------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|
| 1 | プレデンシアプレミアム 1616サイズ | | 1 | 1,226,000 | 1,226,000 |
| 2 | 架台 | 戸建タイプ 一体架台 | 1 | | |
| 3 | ドア | キーブクリーンドア:片引戸<800幅>(グレー)(20サイズ) | 1 | +56,500 | +56,500 |
| 4 | 洗い場 | キーブクリーンフロア(プレミアムクラス・グランベージュ) | 1 | +20,000 | +20,000 |
| 5 | 浴槽 | 鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽) | 1 | | |
| 6 | 排水口カバー | タイル仕上げ | 1 | +5,000 | +5,000 |
| 7 | 浴槽追炊き穴 | あり | 1 | | |
| 8 | エプロン | カラーステンレス(保温材あり) | 1 | | |
| 9 | 浴槽形状 | くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付) | 1 | +50,000 | +50,000 |
| 10 | ヘルシージェット | なし | 1 | | |
| 11 | 浴槽ハンドグリップ | 1本仕様 | 1 | | |
| 12 | ガス温水式床暖房 | なし | 1 | | |
| 13 | 洗い場用水栓 | プッシュ式水栓(メタルホース)SB280 | 1 | | |
| 14 | 洗い場用水栓 | 標準シャワーヘッド<節水仕様> | 1 | | |
| 15 | 浴槽用水栓 | 浴槽側水栓なし | 1 | | |
| 16 | カウンター | クォーツストーンデュアルカウンター | 1 | +212,000 | +212,000 |
| 17 | シャワーフック/スライドバー | シャワーフックスライドバー(手すりタイプ) | 1 | +5,200 | +5,200 |
| 18 | 浴室パネル | プレミアムクラス(全面デザイン4面同柄) | 1 | +70,000 | +70,000 |
| 19 | 浴室パネルタオル穴 | タオル掛け穴なし | 1 | | |
| 20 | 窓枠フリー | 窓枠フリー(樹脂タイプ)L1512 G<グレー色> | 1 | +19,000 | +19,000 |
| 21 | 天井 | 高光沢フラット天井 | 1 | | |
| 22 | 換気機器 | 浴室暖房乾燥機(100V規格) | 1 | +41,000 | +41,000 |
| 23 | 換気機器 | ランドリーパイプメタルタイプ(1本) | 1 | +1,500 | +1,500 |
| 24 | 換気機器開口 | 工場開口 | 1 | | |
| 25 | 照明 | ストレートライン照明(調光機能付き) | 1 | +29,000 | +29,000 |
| 26 | 天井照明開口 | 工場開口 | 1 | | |
| 27 | ミラー | ワイドクリアミラー(収納棚対応) | 1 | +17,000 | +17,000 |
| 28 | 風呂フタ | 断熱風呂フタ | 1 | | |
| 29 | タオル掛け | タオル掛けなし | 1 | -4,000 | -4,000 |
| 30 | ハンドバー | ステン I型600タイプ | 1 | +8,000 | +8,000 |
| 31 | 収納棚 | クリアタイプ(2段) | 1 | -4,000 | -4,000 |

御名前 横浜-港北SR SB1プレデンシアプレミア 様

| | | | | | |
|------|----------|-------|------------------|-----|-----------|
| 現場番号 | A5692765 | プラン番号 | 2716H-1903-0134T | 作成日 | 2019/3/13 |
|------|----------|-------|------------------|-----|-----------|

御見積明細 システムバス

御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

| NO | 商品名 | 仕様 | 数量 | 単価 | 金額 |
|----------|---------|--------|----|---------|------------|
| 32 | 循環金具セット | PLLX | 1 | +12,500 | +12,500 |
| 33 | 給水給湯管 | 洗い場1水栓 | 1 | | |
| 34 | トラップカバー | なし | 1 | | |
| システムバス合計 | | | 34 | | ¥1,764,700 |
| 商品総合計 | | | 34 | | ¥1,764,700 |

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥165,000 (税込 ¥178,200)


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格 < 税率8% > を表示しています。

パース

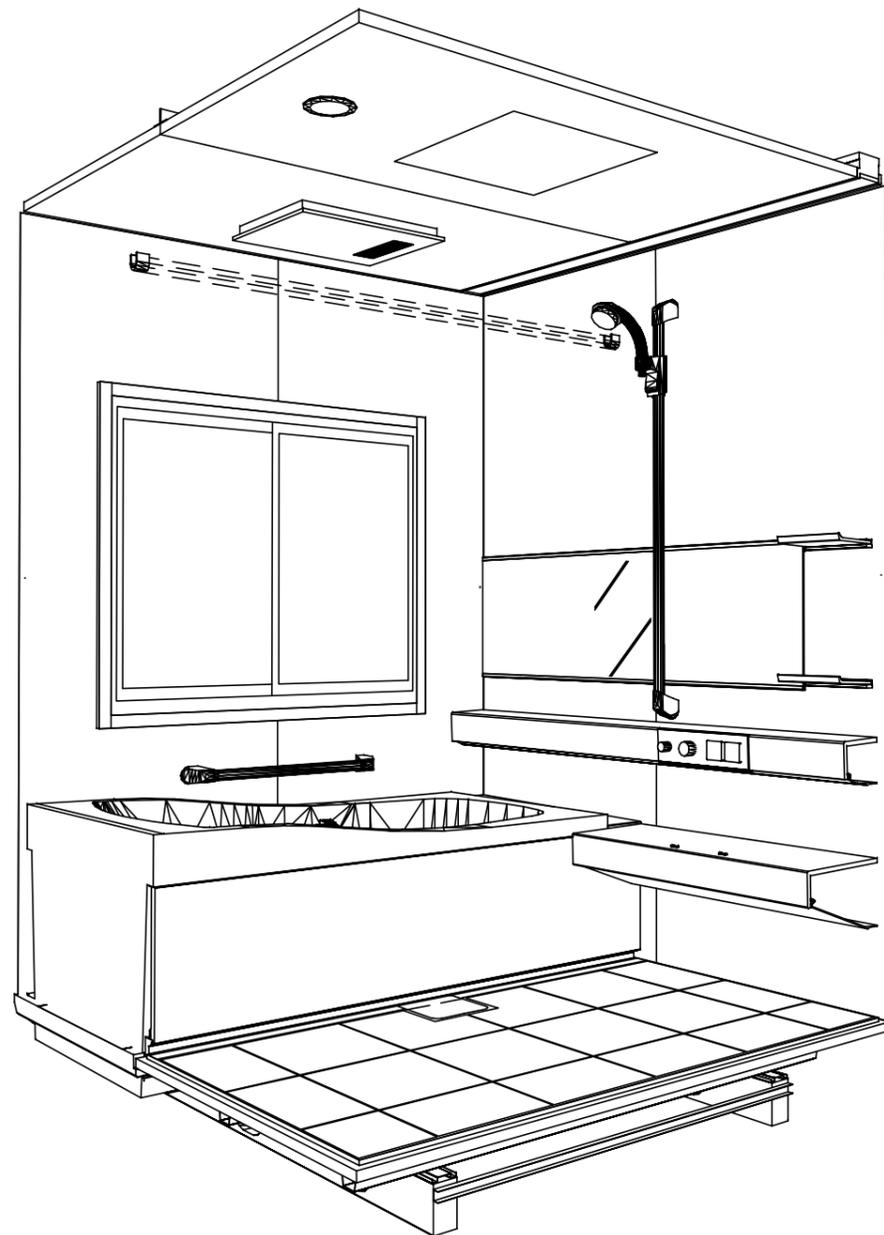

鳥瞰図

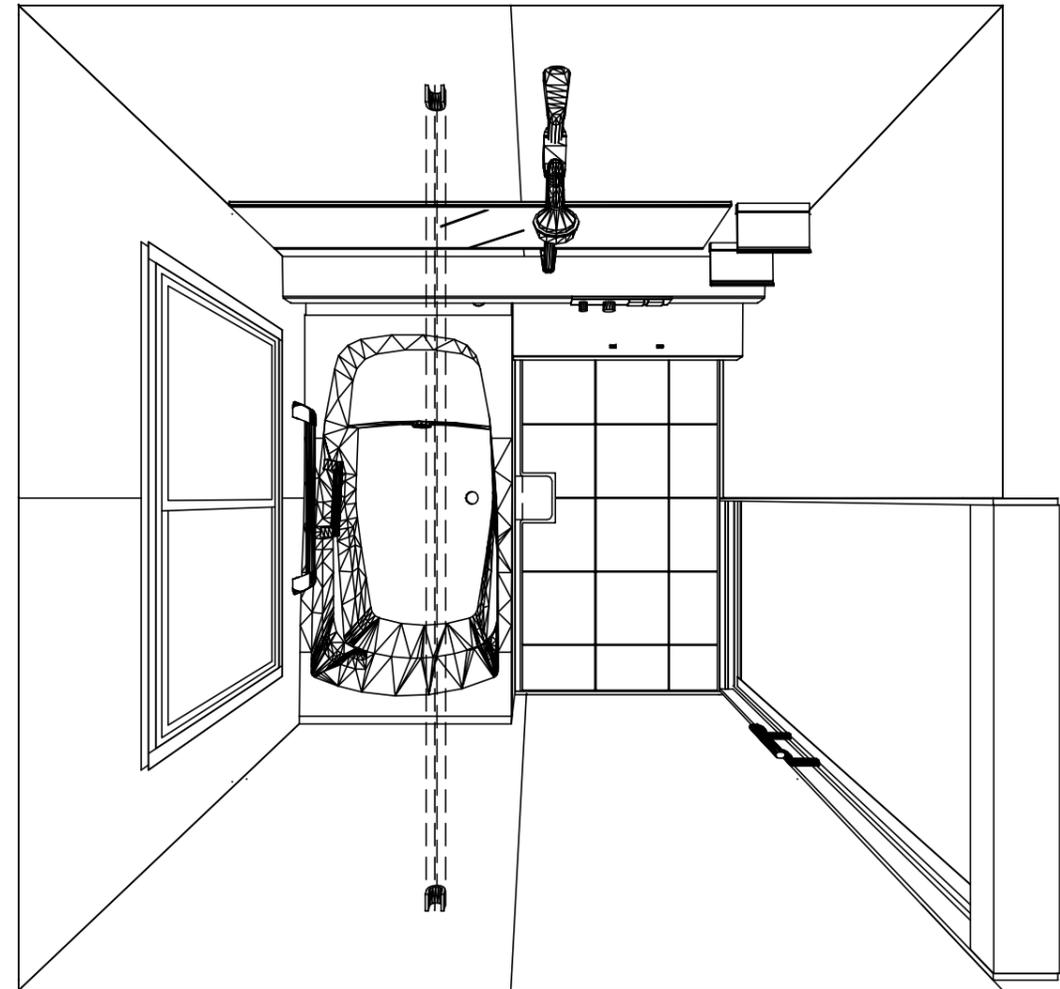

1616

鑄物ホーロー浴槽

高光沢フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

Takara standard
タカラストانダード株式会社

現場名称： 横浜-港北SR SB1アプレシアアミア様邸

現場番号： A5692765

港北営業所

PREDECENCIA プレデンスシア

プラン番号： 2716H-1903-0134T


担当営業：

姿図



作成日： 2019年3月13日

担当アドバイザー： 田中(恵)

縮尺：A3サイズ等倍

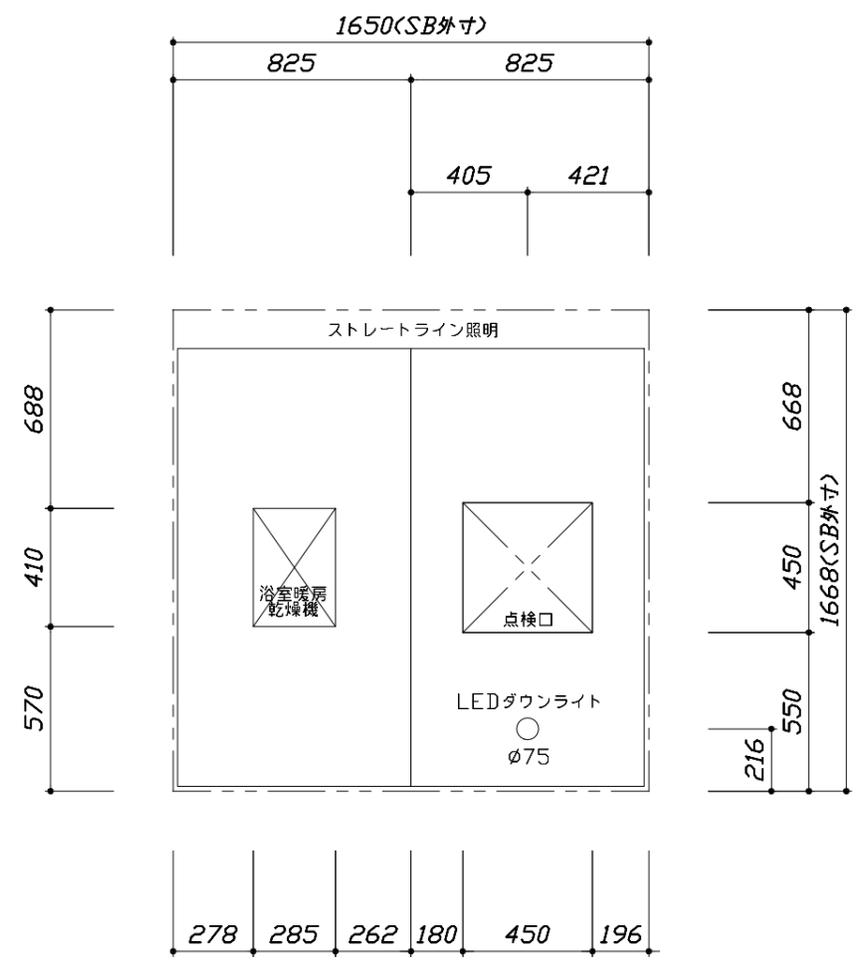

< 天井伏図 >

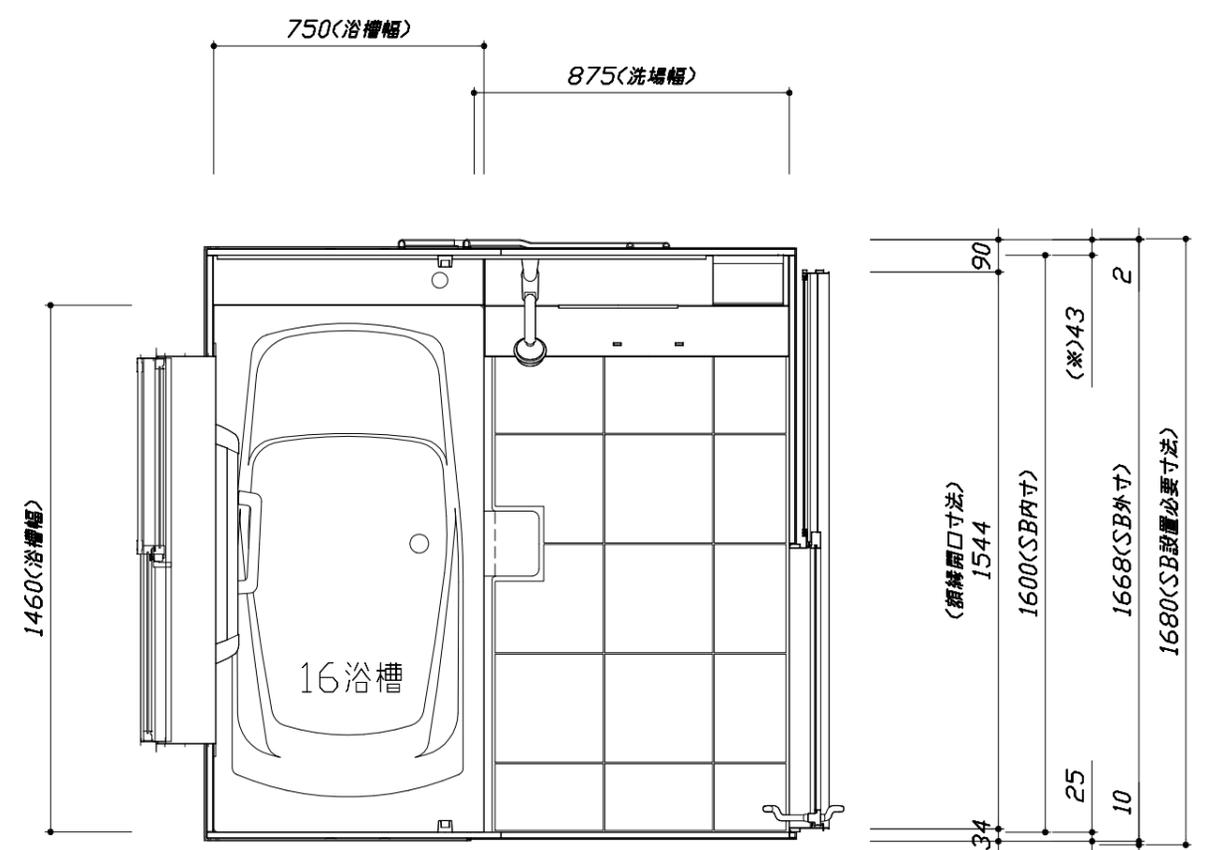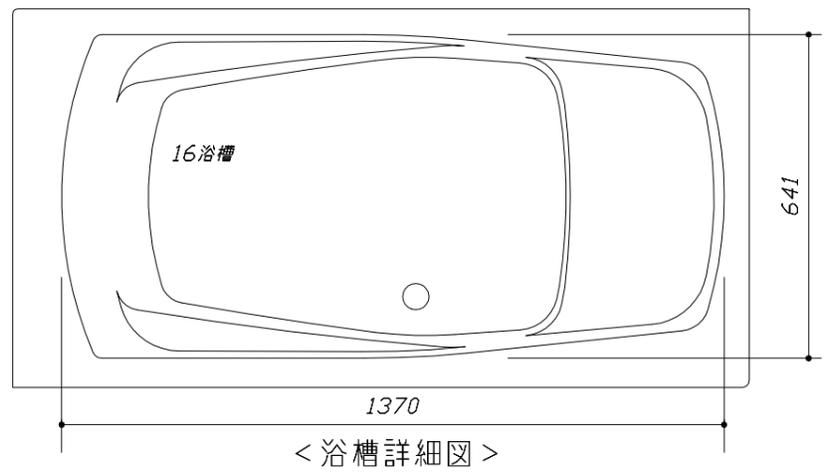




< 平面図 >

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・浴槽側面の窓は参考です。窓は現地手配となります。

大きさ、設置位置等確認をお願いします。

- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法をご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

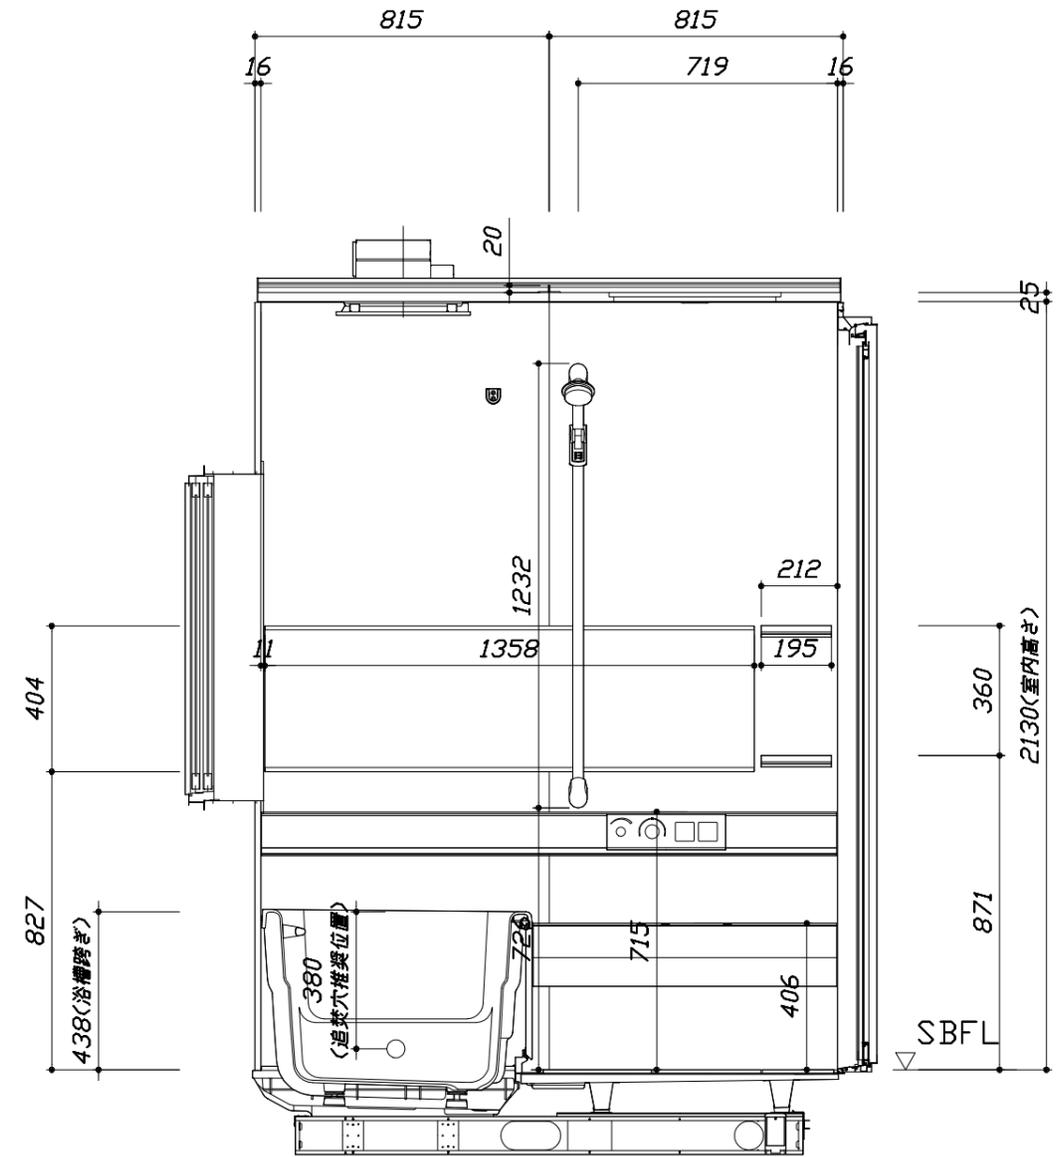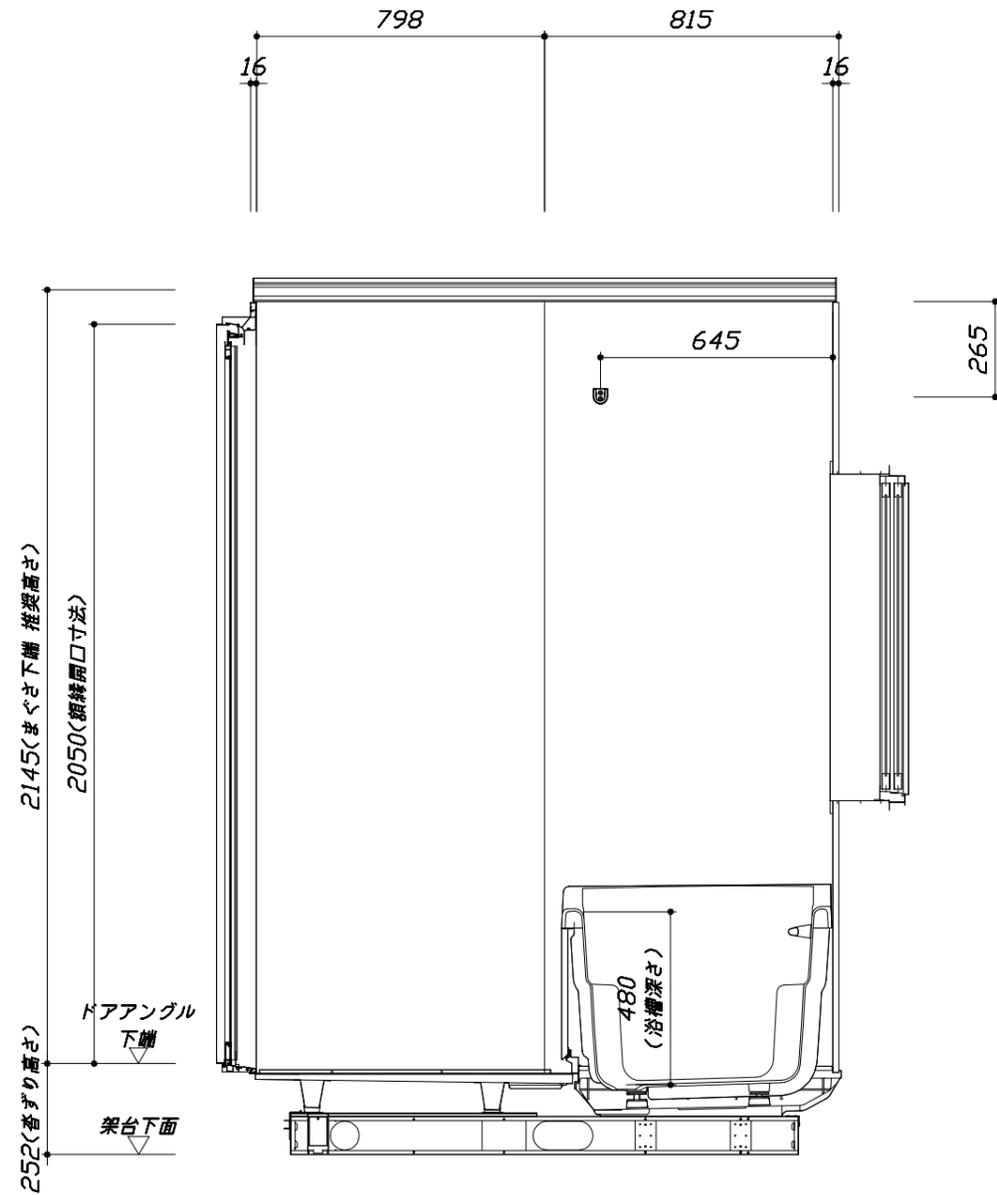



■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・浴槽側面の窓は参考です。窓は現地手配となります。
- ・大きさ、設置位置等確認をお願いします。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法をご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

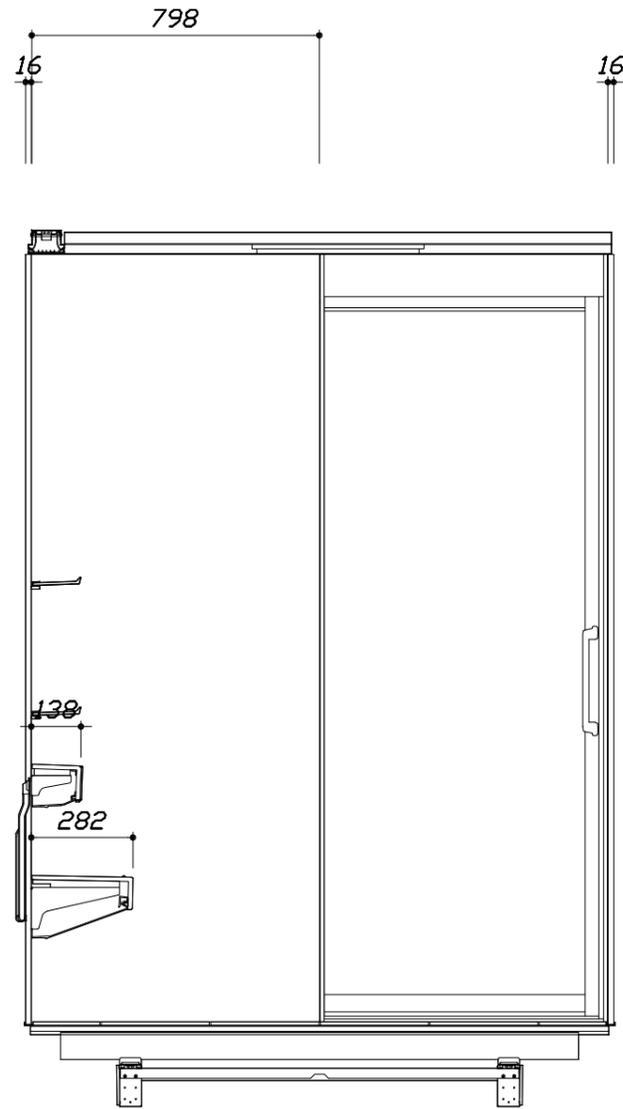

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)

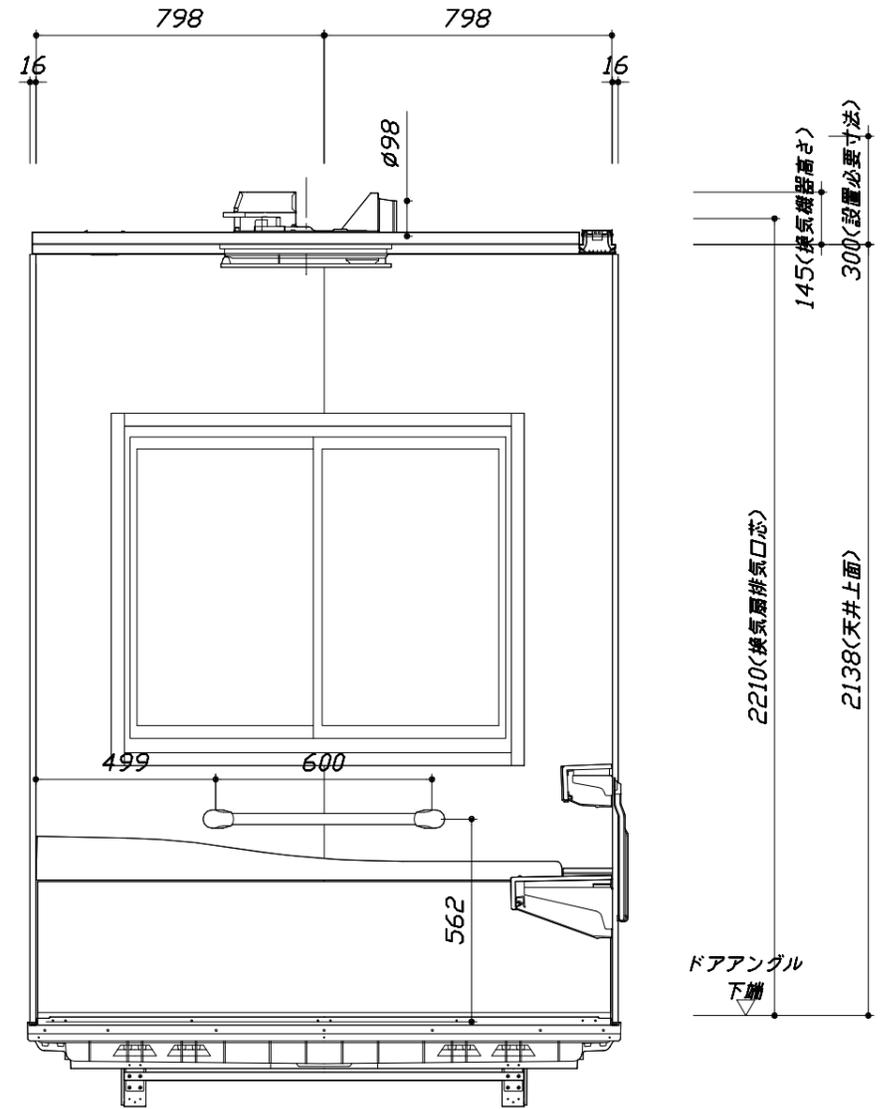

< 浴槽側面図 >

Takara standard
 タカラストANDARD株式会社

現場名称： 横浜-港北SR SB1アプレソシアアミア様邸
 現場番号： A5692765
 港北営業所


PREDECENCIA プレデンスシア
 プラン番号： 2716H-1903-0134T
 担当営業：

施工図3 縮尺：1:20
 作成日：2019年3月13日
 担当アドバイザー：田中(恵)

縮尺：A3サイズ等倍


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

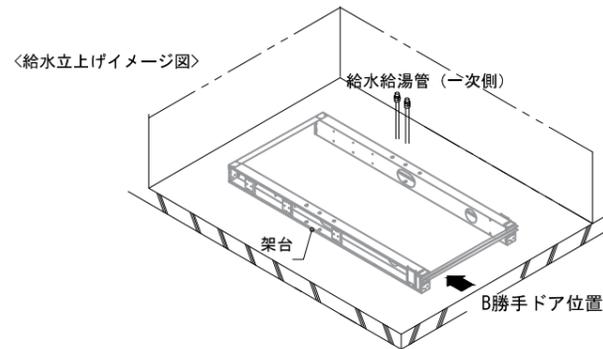


■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

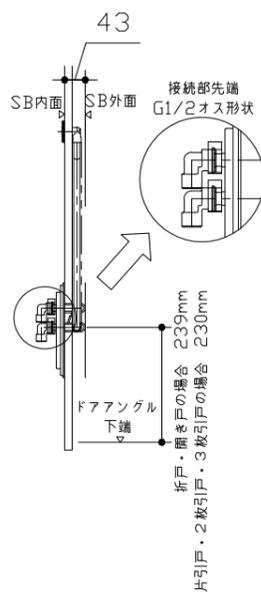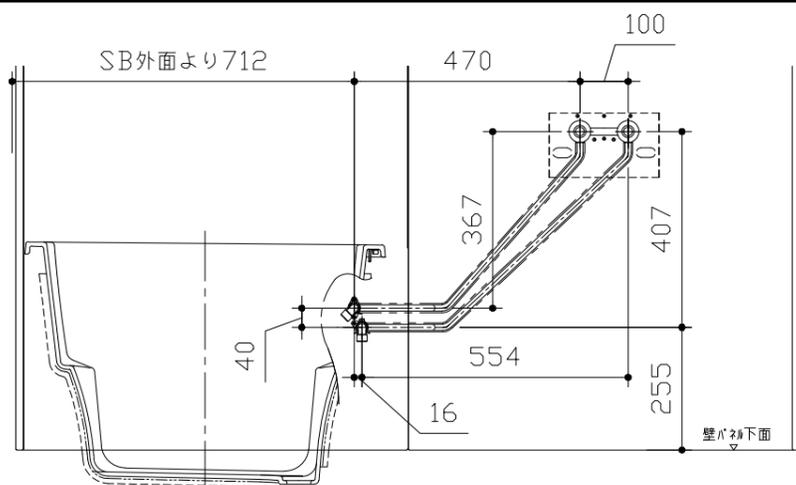

■ 設備記号

| 記号 | 記号の意味 |
|----|-------|
| ⊗ | 給水位置 |
| ⊙ | 給湯位置 |

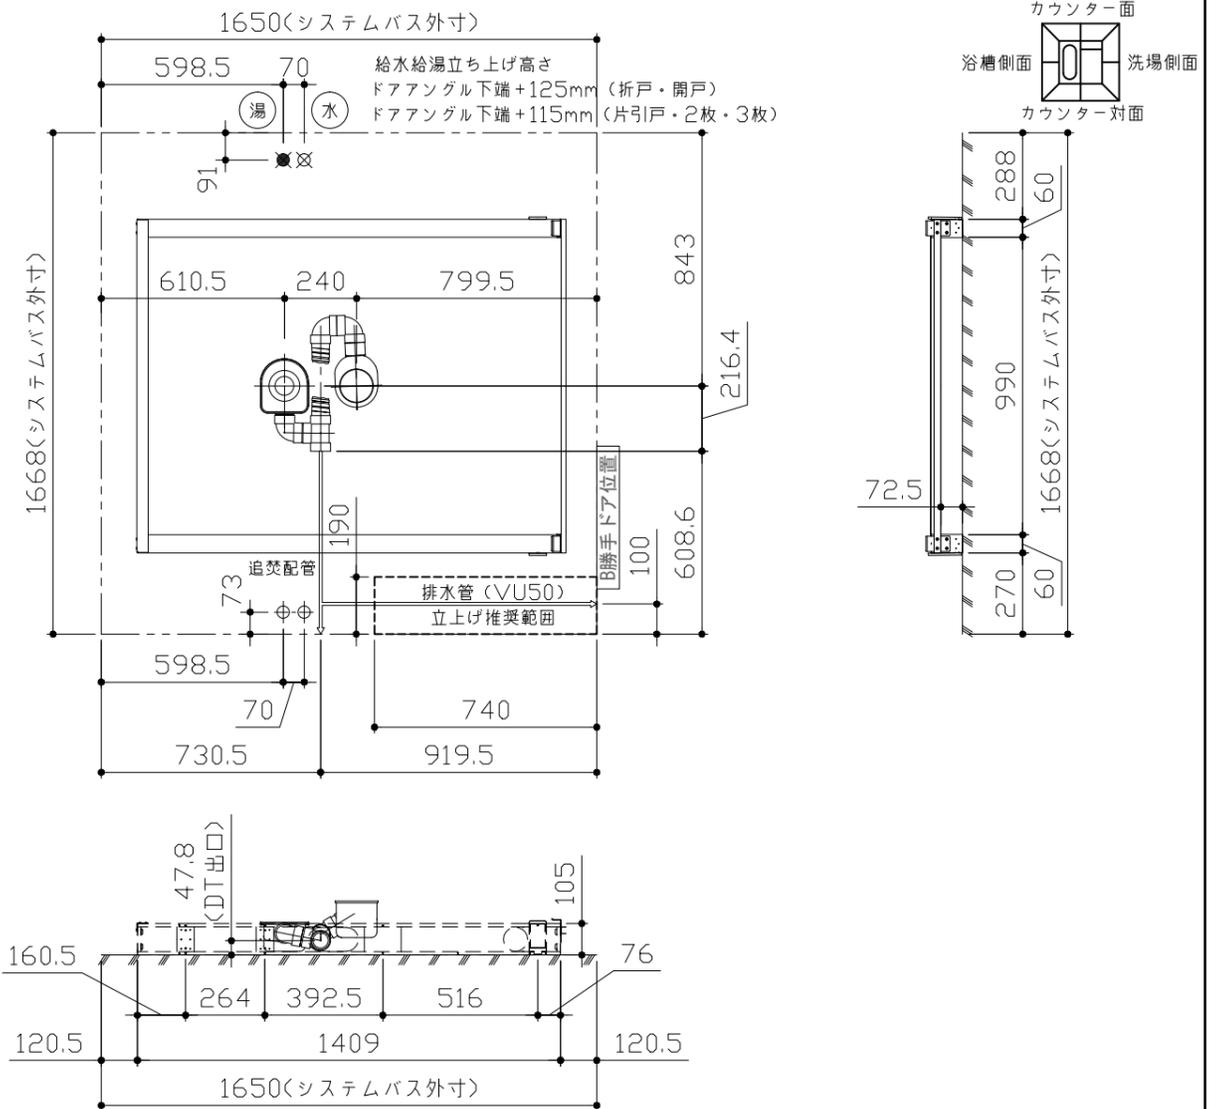

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

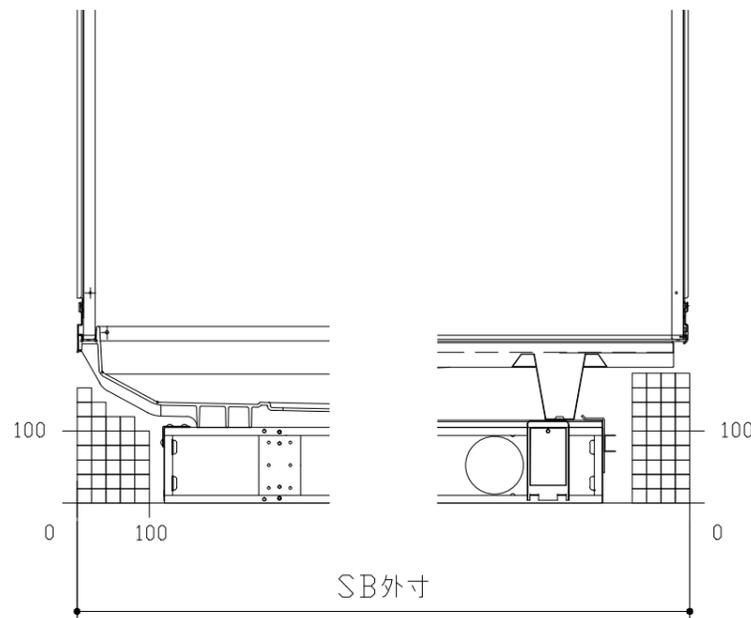


A矢視

B矢視

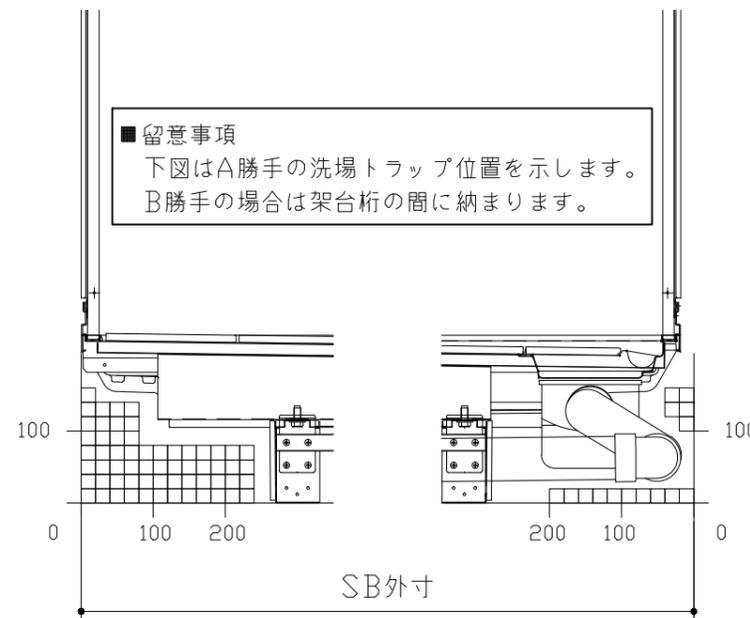

C矢視




D矢視

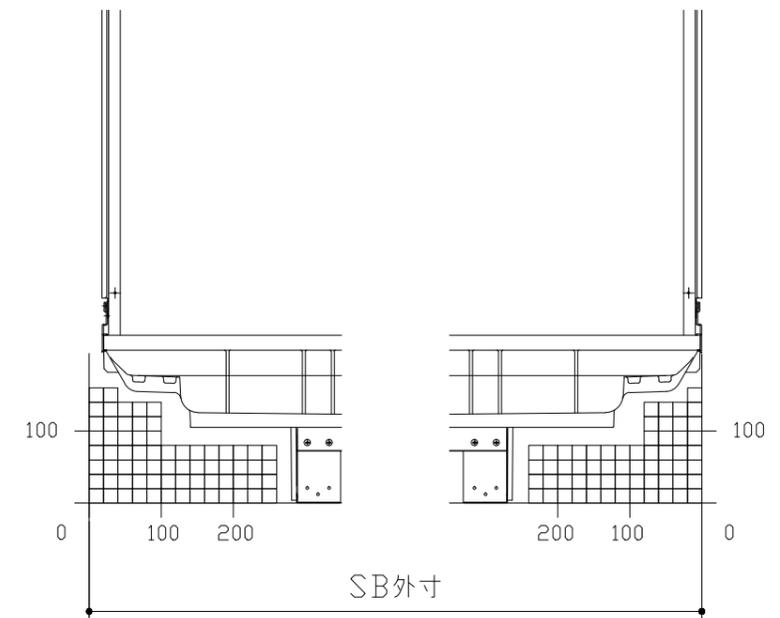

E矢視

F矢視

キーブクリーンドア：片引戸グレー（YGTヒキド[®]8）

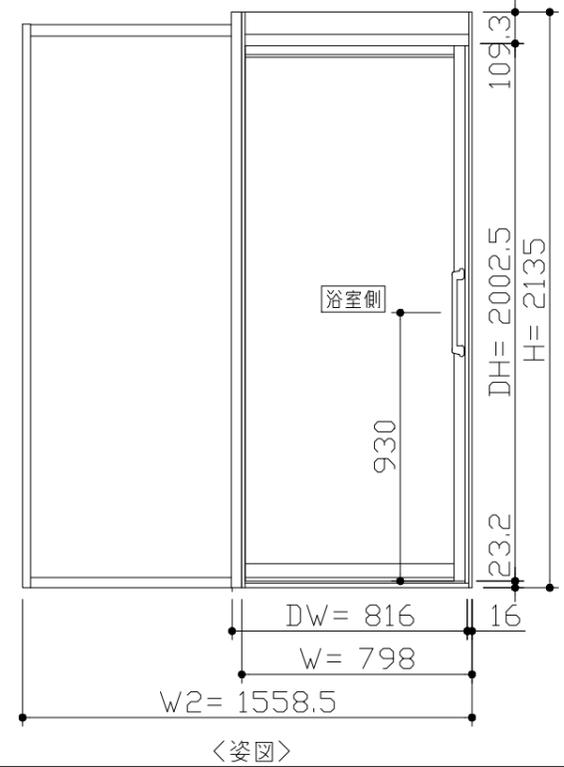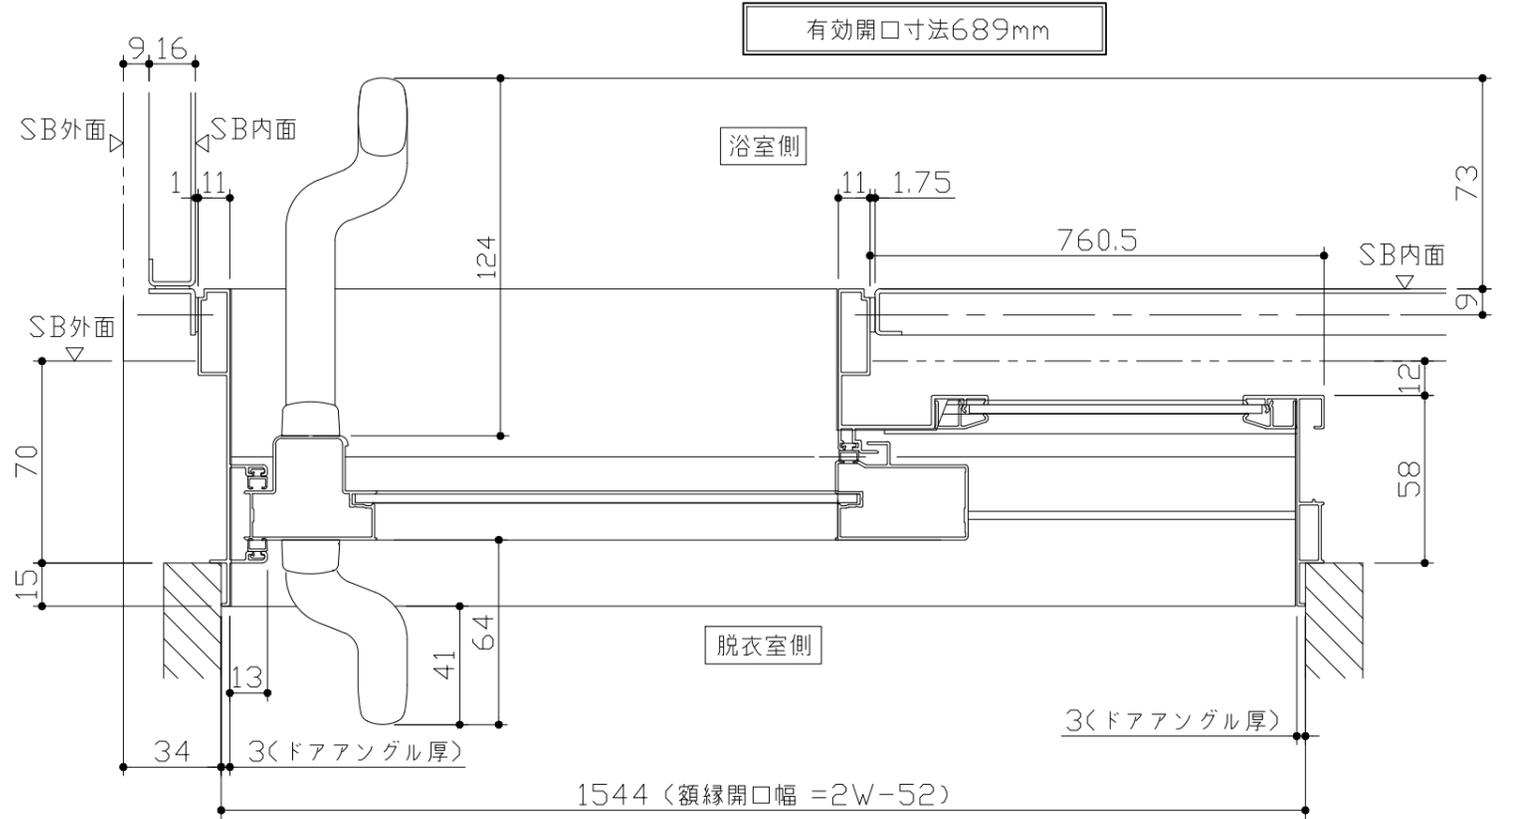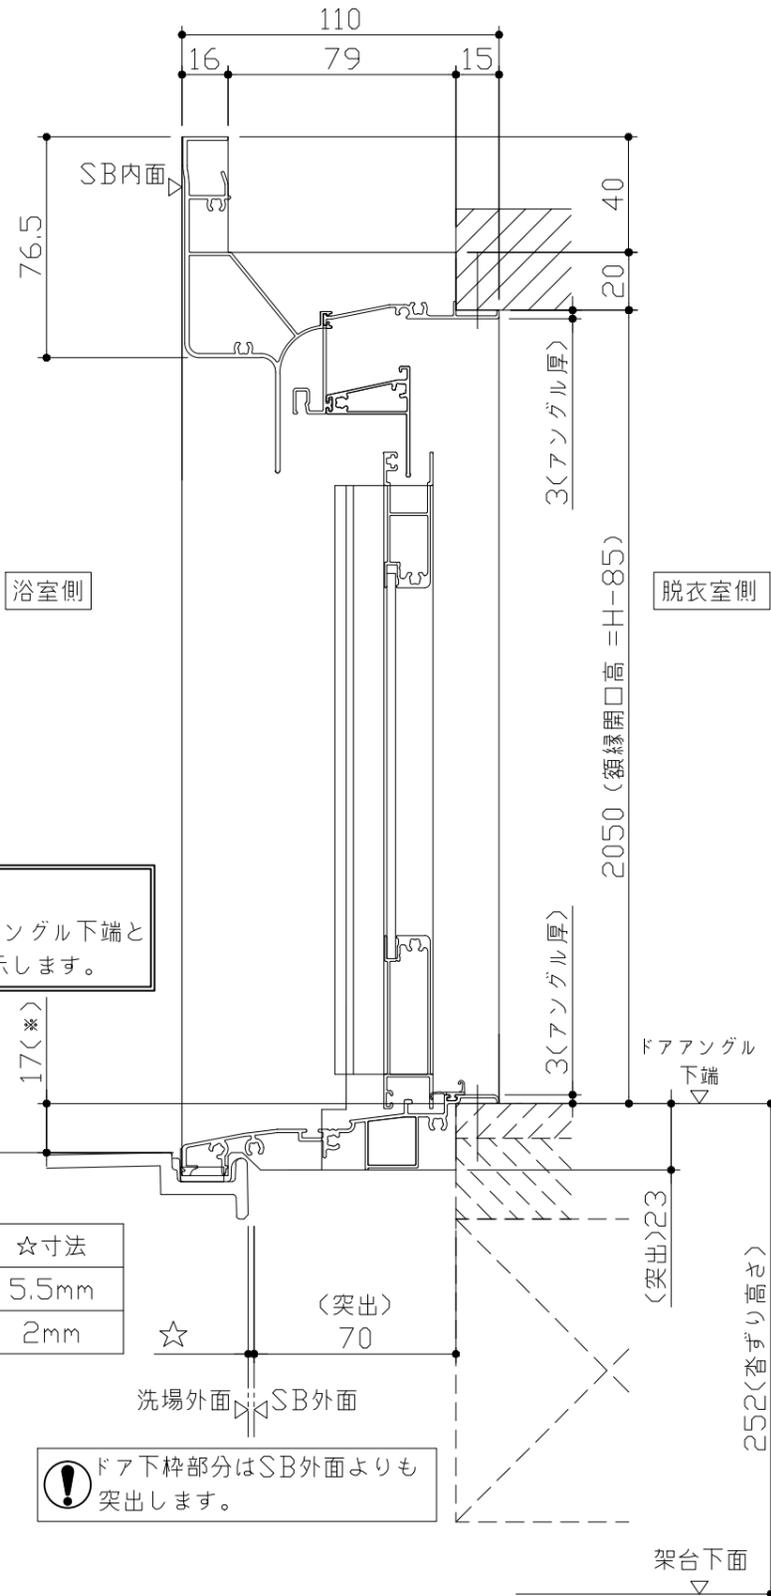

■ ドア横の管柱、間柱について

- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。


＜参考寸法図＞

66.5
105 (柱厚)
1544 (額縁開口)
1610.5
管柱、間柱
(ドア額縁厚)


■ 留意事項
* 印寸法はドアアンゲル下端とSBFLの段差を示します。

| ドア仕様 | ☆寸法 |
|------------|-------|
| キーブクリーンフロア | 5.5mm |
| FRPフロア | 2mm |

⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

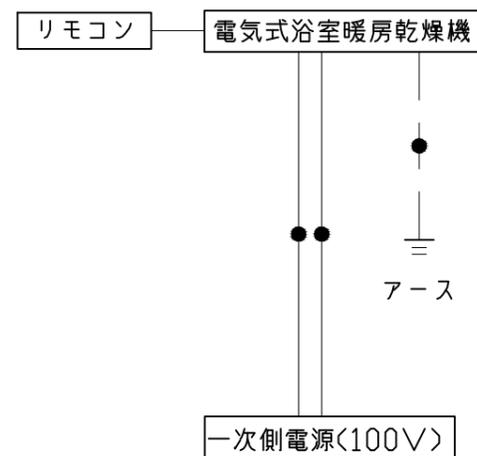

*浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

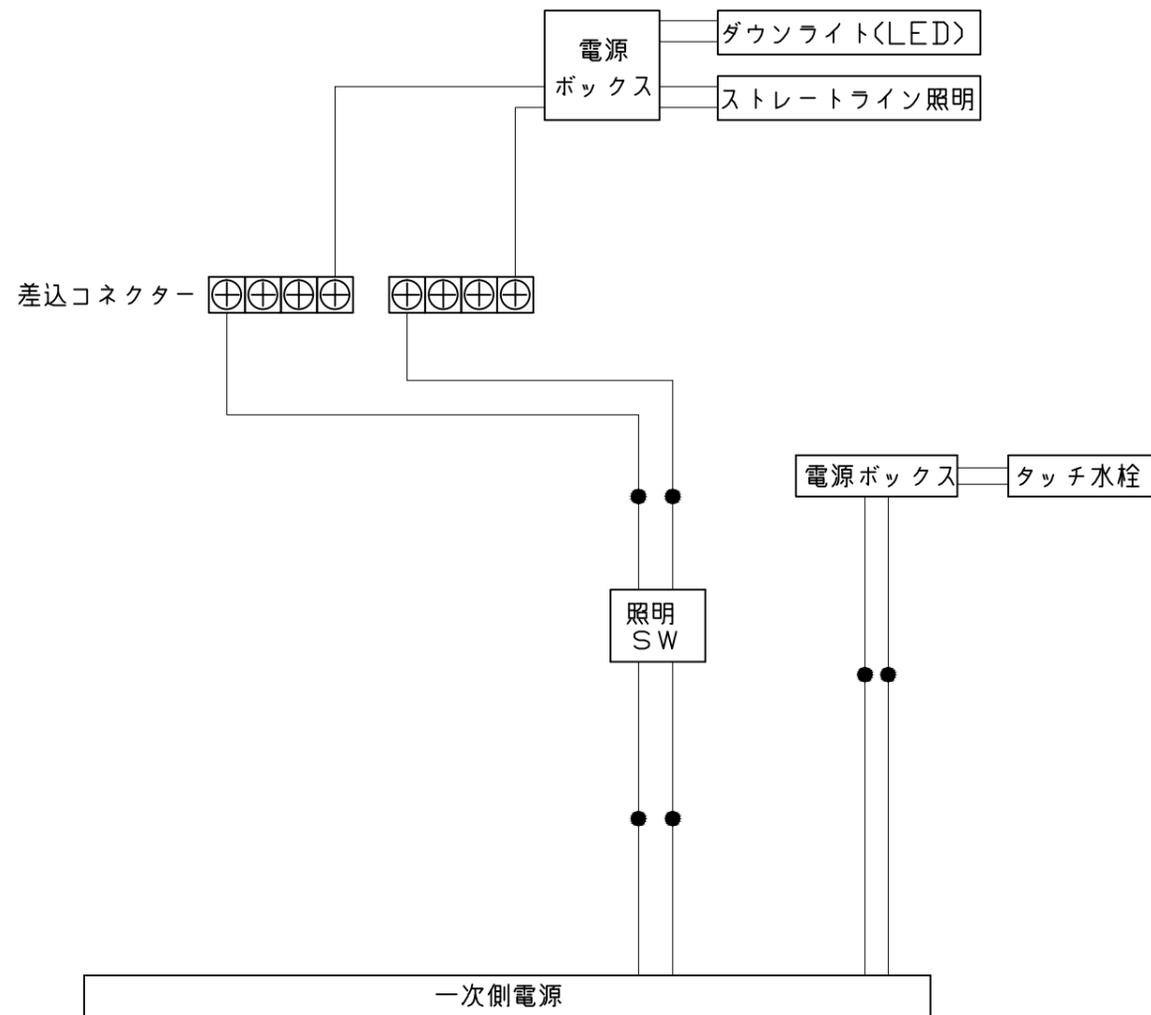

一次側電源から差し込みコネクタ及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。
