

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 横浜-港北SR SB3プレデンシア 様

業者 様

商品名 PREDENCIA プレデンシア

商品
御見積金額 \1,209,900 (税込 \1,306,692)
()内の価格は税込価格<税率8%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 別途

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616 (AR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア(プレミアムクラス)
浴槽材質	鋳物ホーロー
カラー	プレシャスホワイト
形状	くつろぎラウンド浴槽(ハンチ付)
浴槽・風呂フタ	高断熱仕様
カウンター材質	アクリル人造大理石
カラー	プレシャスホワイト
エプロン材質	ステンレス (カラーコーティング)
カラー	ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
カラー	マロンブラウン
ガス種	未定
周波数	50Hz

◆ 御確認事項

作成日 2019年8月3日
プラン番号 2716H-1908-0014T
現場番号 A5692975

タカラスタANDARD株式会社
◆港北営業所
神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目4-14
TEL 045-594-1612 / FAX 045-594-1616

◆港北ショールーム
TEL 045-594-1610 / FAX 045-594-1611

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
濱田		直井

◆ 備考

--	--

No.SB3 *

御名前 横浜-港北SR SB3プレデンシア

様

現場番号	A5692975	プラン番号	2716H-1908-0014T	作成日	2019/8/3
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1616サイズ		1	1,038,000	1,038,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	キープクリーンドア:折戸<800mm幅> (ホワイト) (20サイズ)	1		
4	洗い場	キープクリーンフロア (プレミアムクラス・グラングレー)	1	+20,000	+20,000
5	浴槽	鋳物ホーロー浴槽 (高断熱浴槽)	1		
6	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
7	浴槽追炊き穴	あり	1		
8	エプロン	カラーステンレス (保温材あり)	1		
9	浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽 (ベンチ付)	1	+50,000	+50,000
10	ヘルシージェット	なし	1		
11	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1		
12	ガス温水式床暖房	なし	1		
13	洗い場用水栓	棚付サーモ水栓 (メタルホース) KF9152 水栓上部カウンター (ホワイト)	1		
14	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド	1		
15	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
16	カウンター	人大スクエアカウンター	1		
17	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー (TN-116)	1		
18	浴室パネル	プレミアムクラス (一面デザイン)	1	+15,000	+15,000
19	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴あり	1		
20	天井	高光沢フラット天井	1		
21	換気機器	浴室暖房乾燥機 (100V規格)	1	+41,000	+41,000
22	換気機器	ランドリーパイプメタルタイプ (1本)	1	+1,500	+1,500
23	換気機器開口	工場開口	1		
24	照明	天井付スクエア照明+ダウンライト (1灯) (電球色)	1		
25	天井照明開口	工場開口	1		
26	ミラー	ロングクリアミラー	1		
27	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
28	タオル掛け	クリアタイプ	1		
29	収納棚	クリアタイプ (3段)	1		
30	どこでもラック	マルチラック (ホワイト)	1	+1,900	+1,900
31	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500

御名前 横浜-港北SR SB3プレデンシア 様

現場番号	A5692975	プラン番号	2716H-1908-0014T	作成日	2019/8/3
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
33	トラップカバー	なし	1		
34	壁面スピーカー	どこでもスピーカー	1	+25,000	+25,000
システムバス合計			34		\1,209,900

商品総合計	34	\1,209,900
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

〔参考〕別途 商品組付費


システムバス商品組付費

別途


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

() 内の価格は税込価格＜税率8%＞を表示しています。

パース

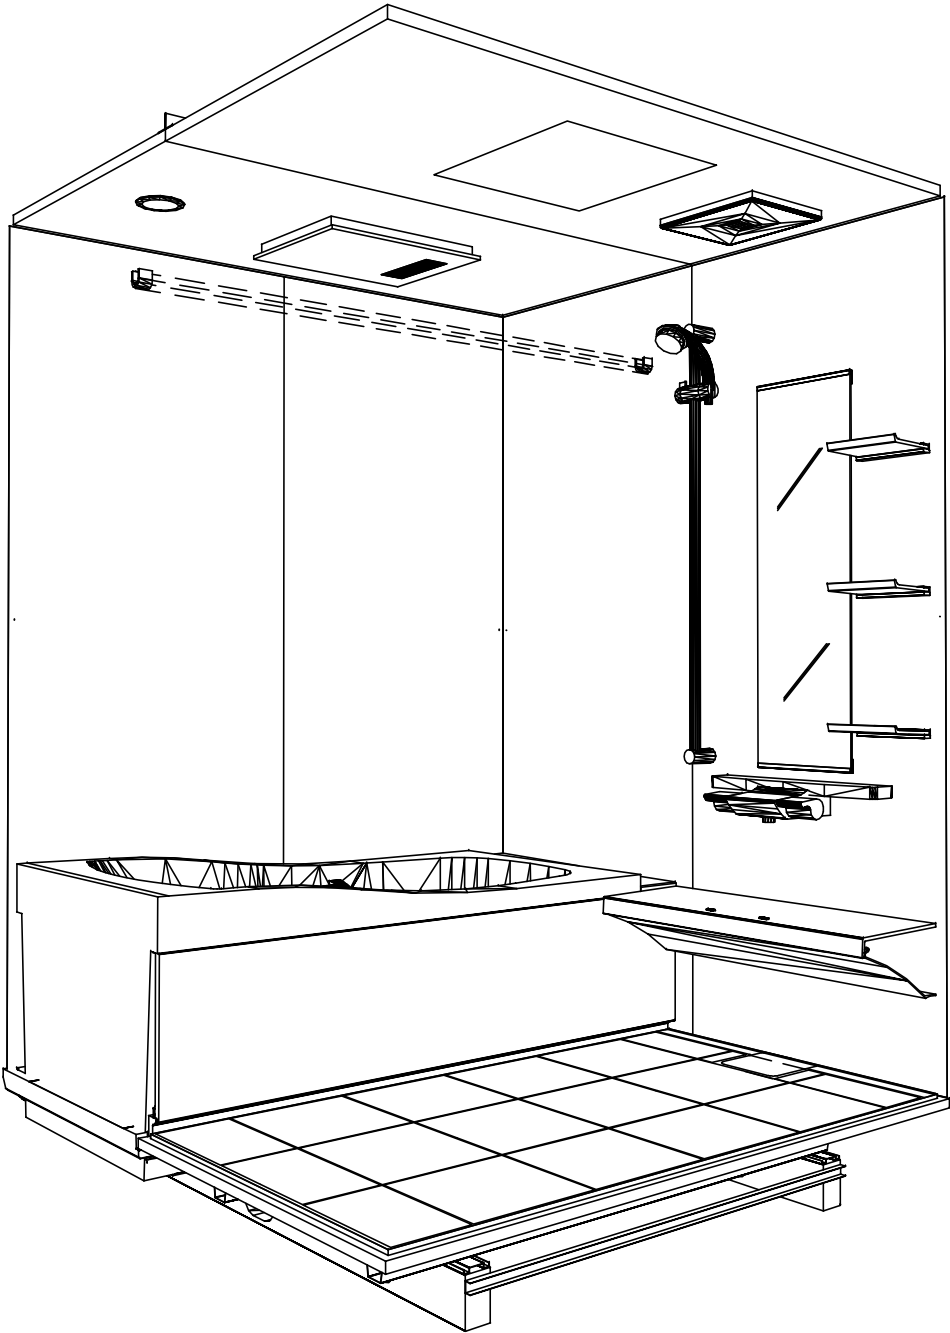

鳥瞰図

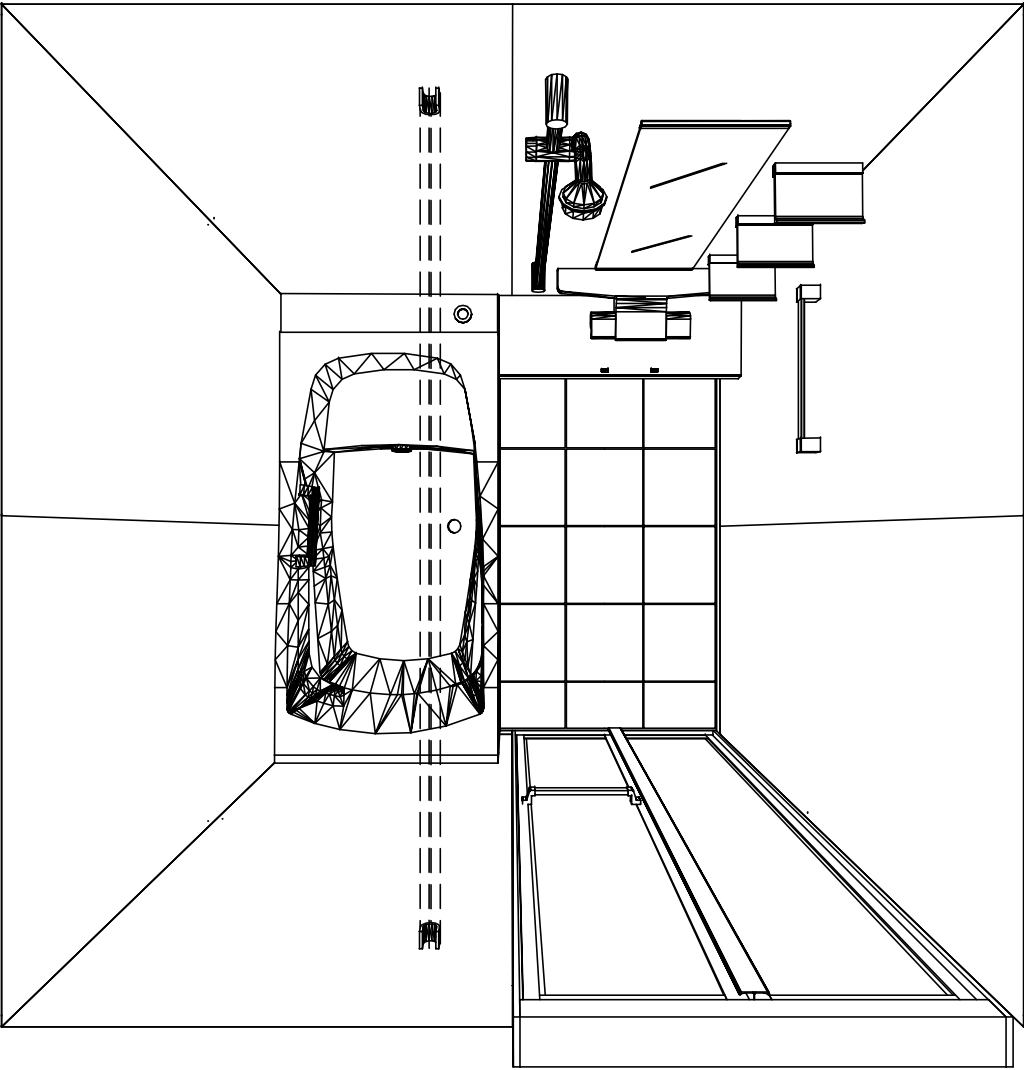

1616
鋳物ホーロー浴槽
高光沢フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・
納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認
して頂きますようお願い致します。

Takara standard タカラストンダード株式会社	現場名称： 横浜-港北SR SB3プレデンスIA様邸	PREDENCIA プレデンスIA	姿図	
	現場番号： A5692975	プラン番号： 2716H-1908-0014T	作成日： 2019年8月3日	
	港北営業所	担当営業： 濱田	担当アドバイザー：	


カウンター面

浴槽側面


洗場側面

カウンター対面



■留意事項
※印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。

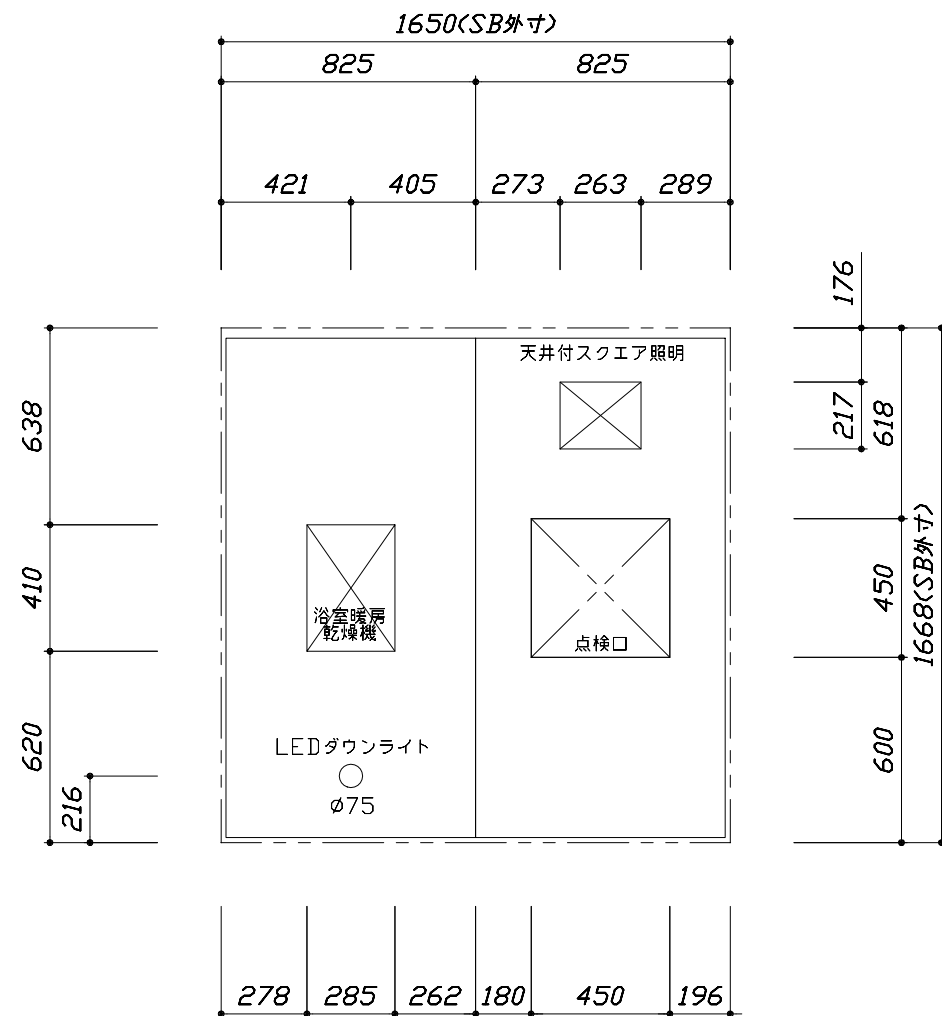

< 天井伏図 >

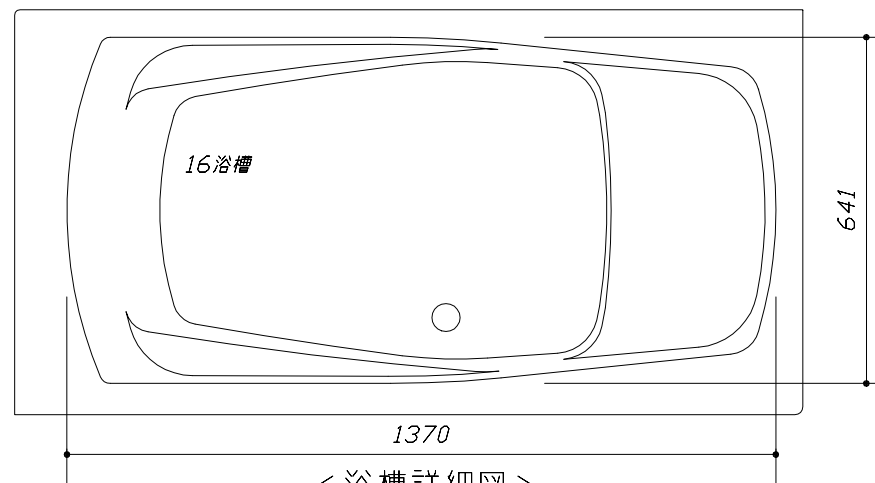




< 浴槽詳細図 >

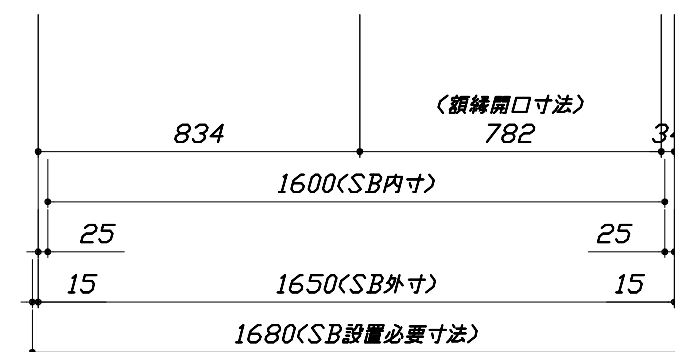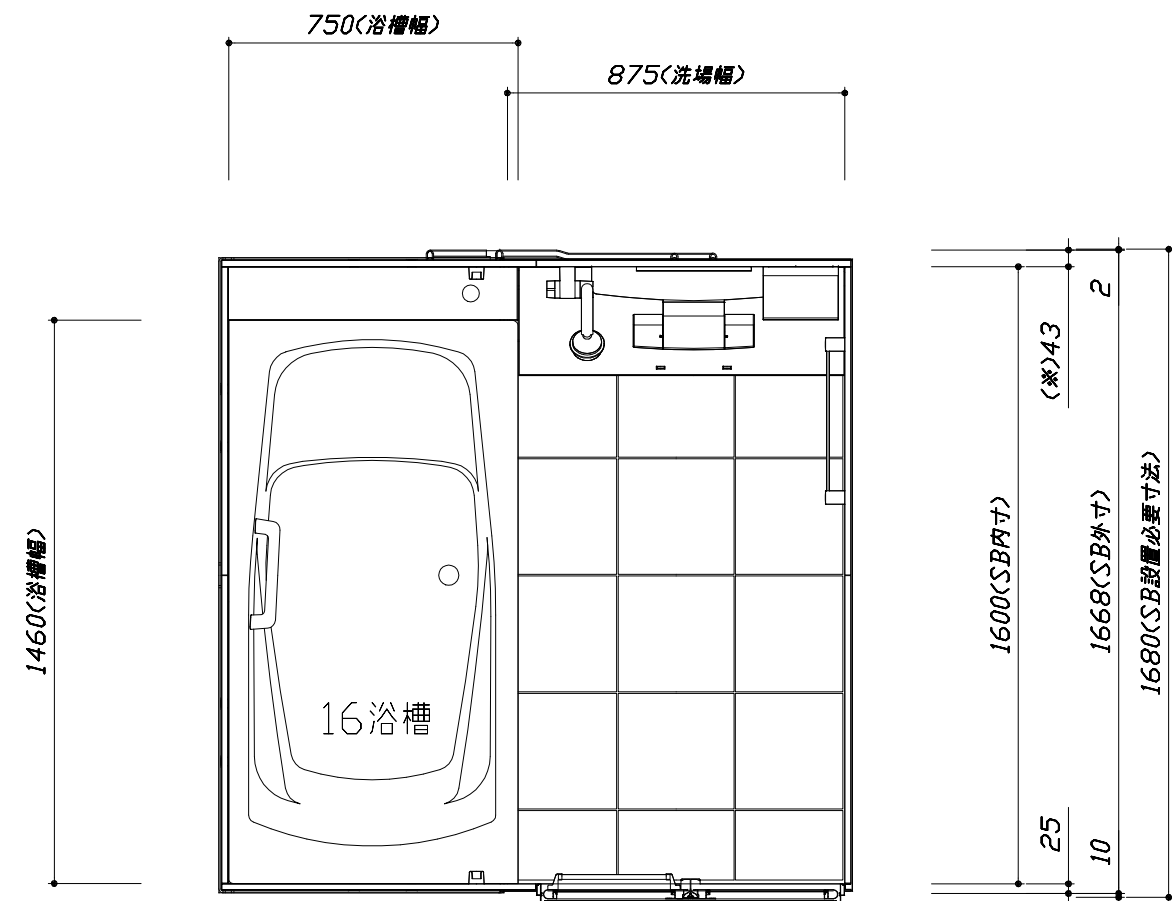

< 平面図 >

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

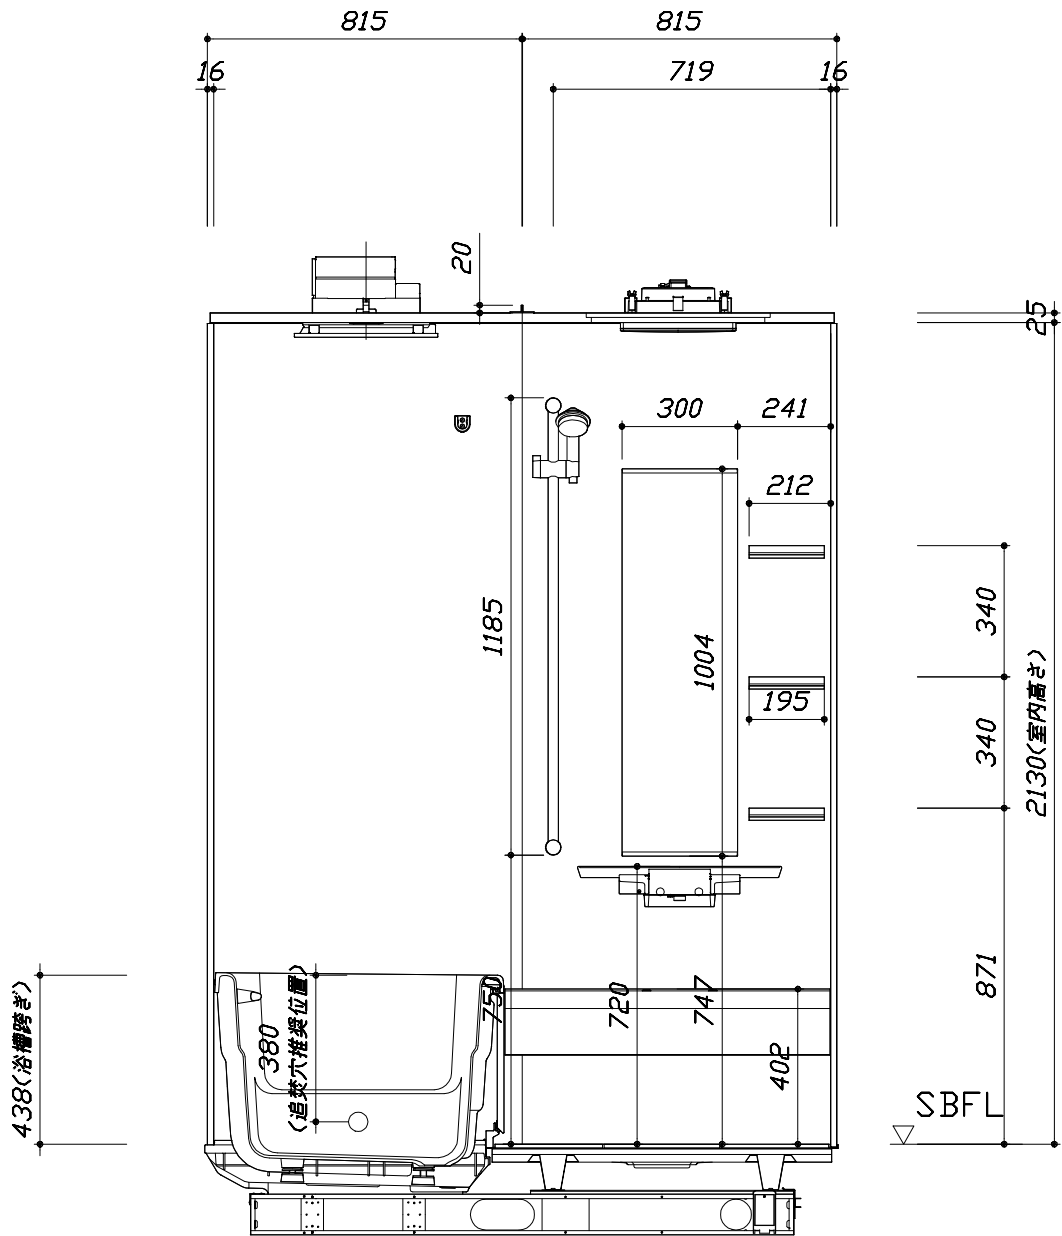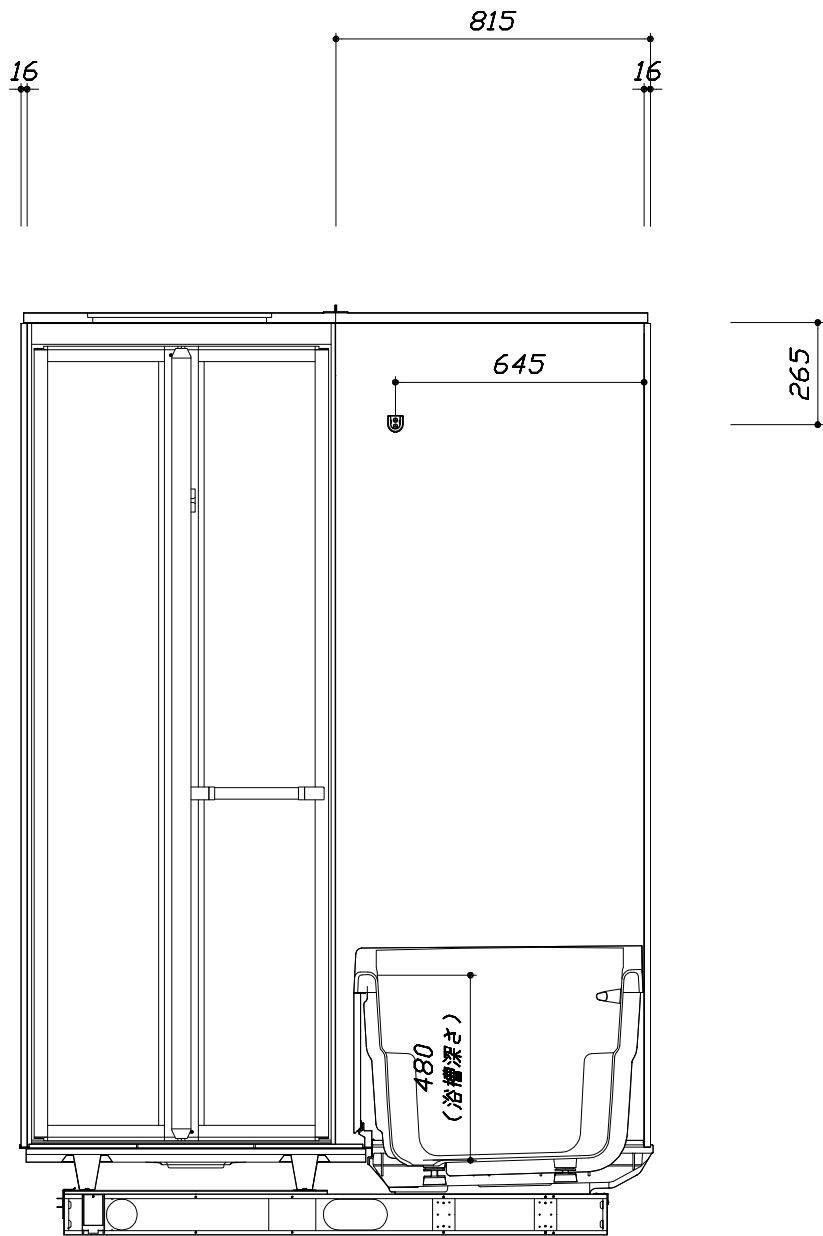

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

< カウンター対面図 >



< カウンター面図 >

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜-港北SR SB3プレデンシア様邸	PREDENCIA プレデンシア	施工図2	縮 尺： 1:20
	現場番号： A5692975	プラン番号： 2716H-1908-0014T	作成日： 2019年8月3日	
	港北営業所	担当営業： 濱田	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認お願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

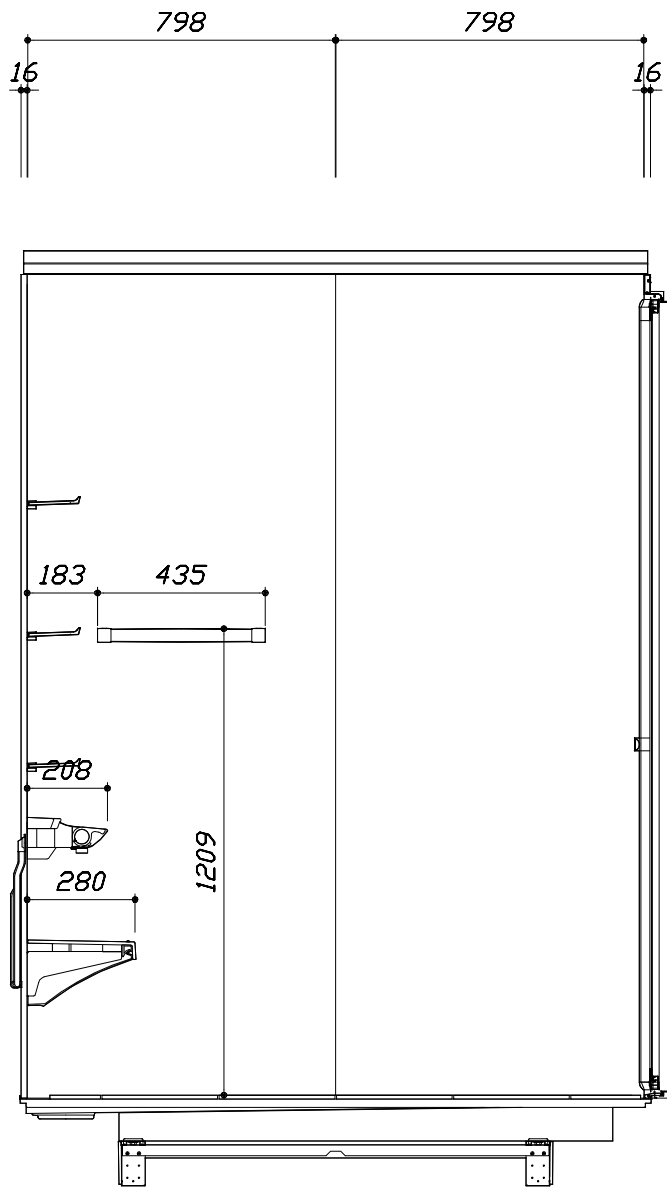

< 洗場側面図 >


■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

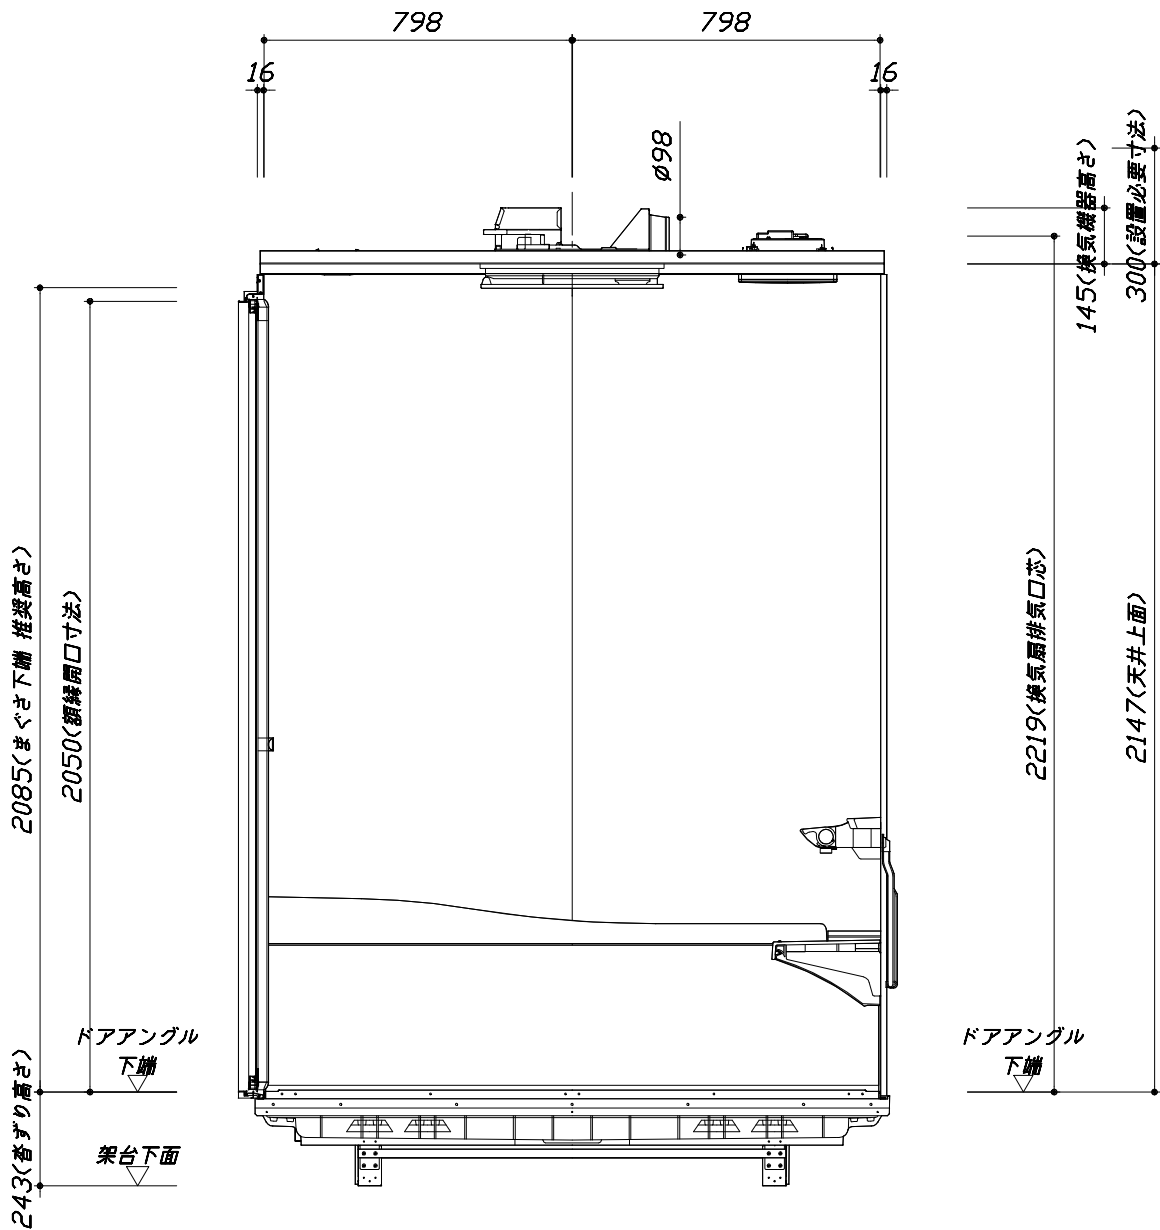

< 浴槽側面図 >


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

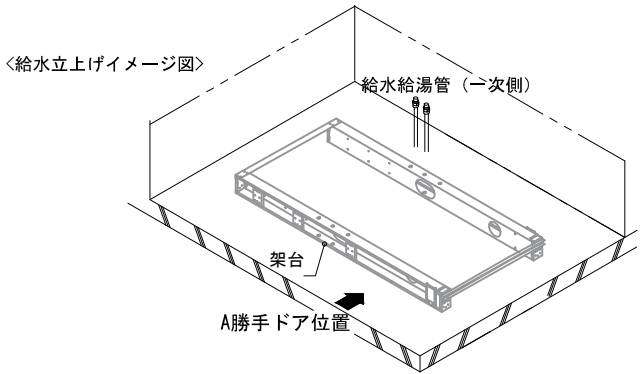




■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より 265mm 下がりで打設してください。

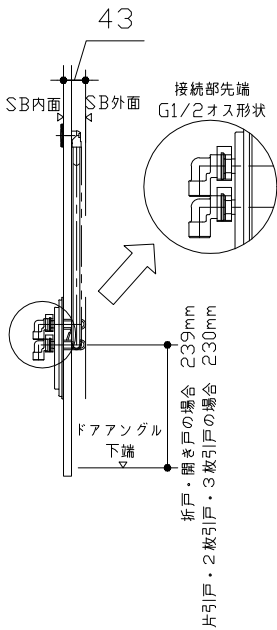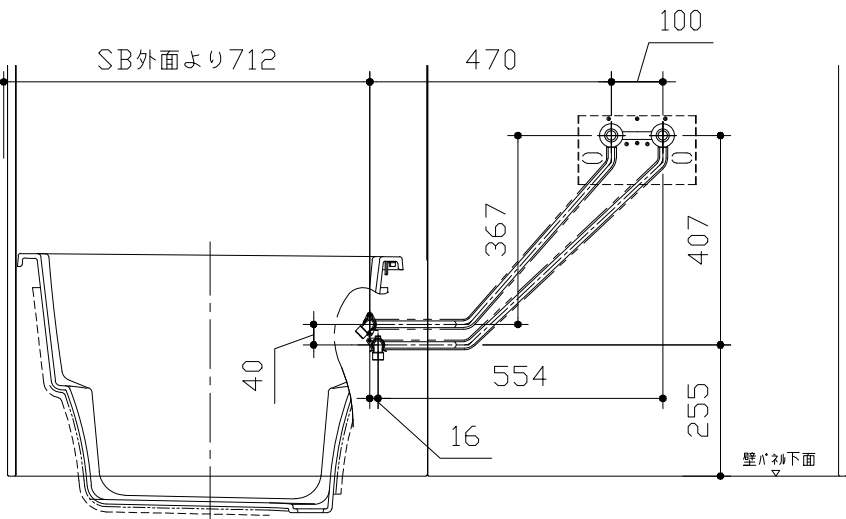

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置

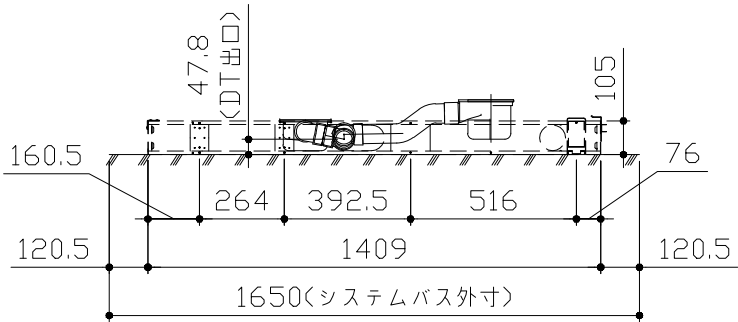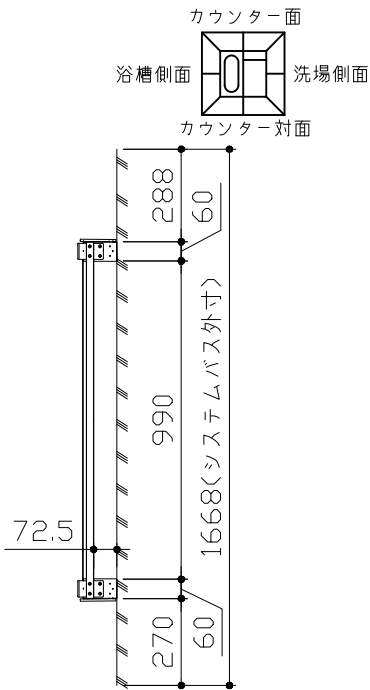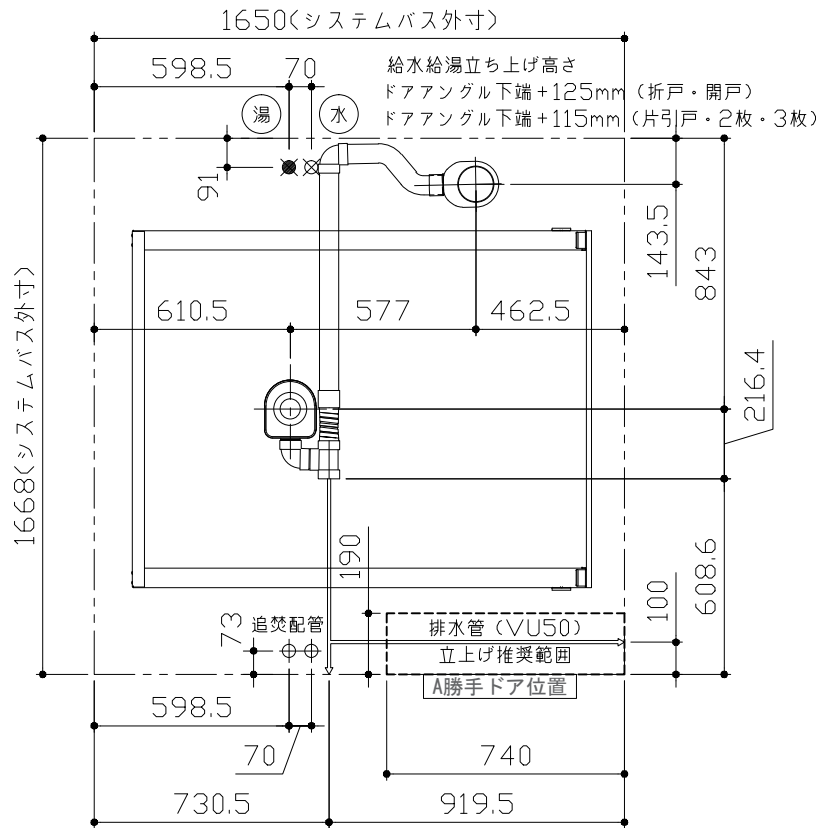

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

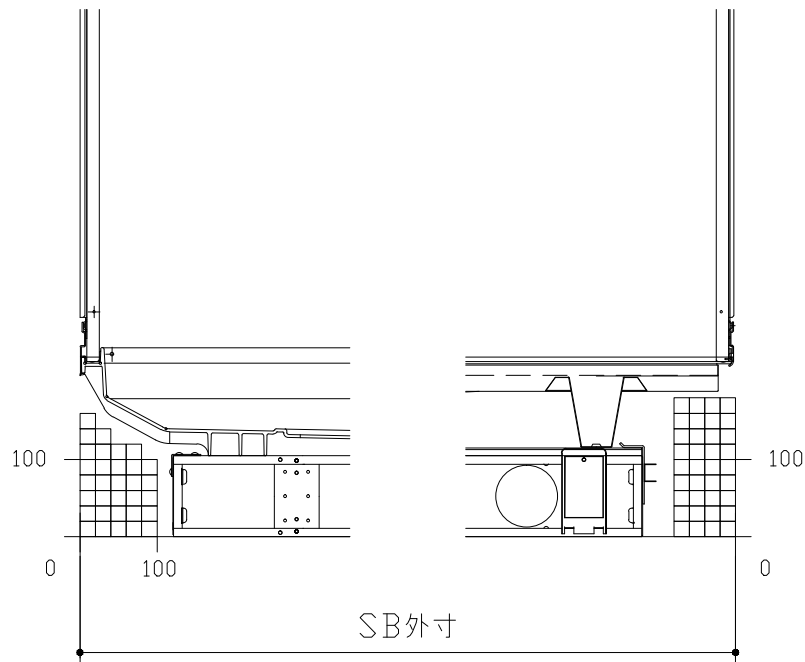


A矢視

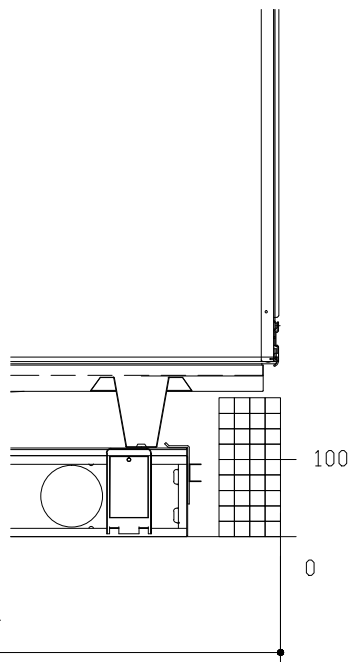


B矢視

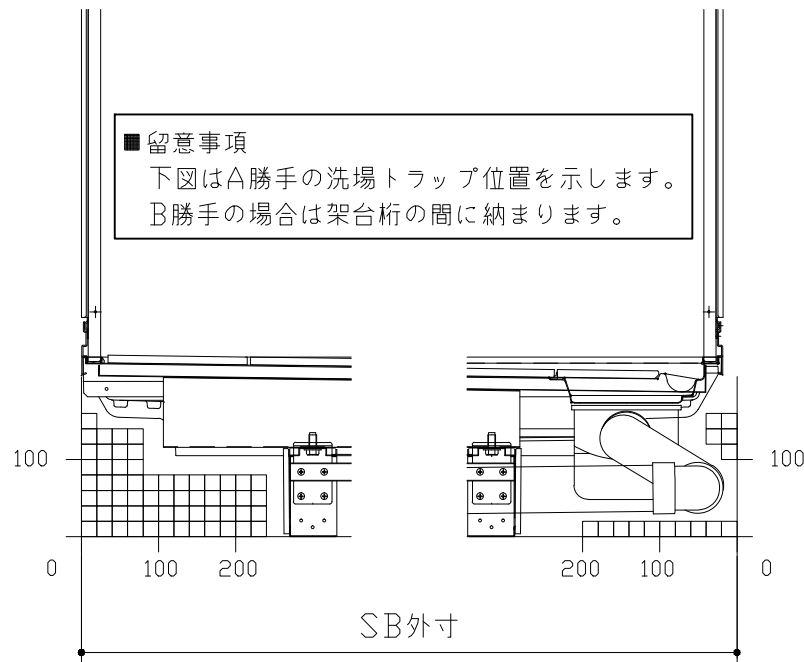


C矢視

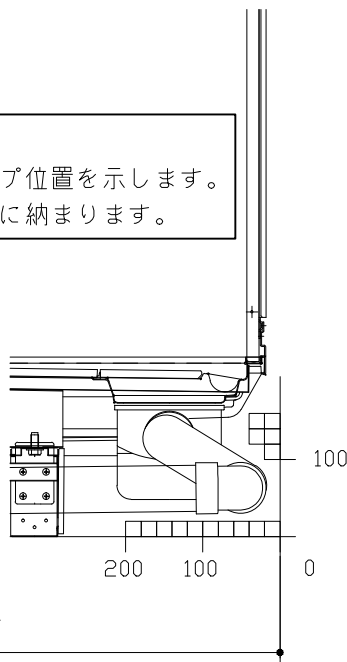

D矢視



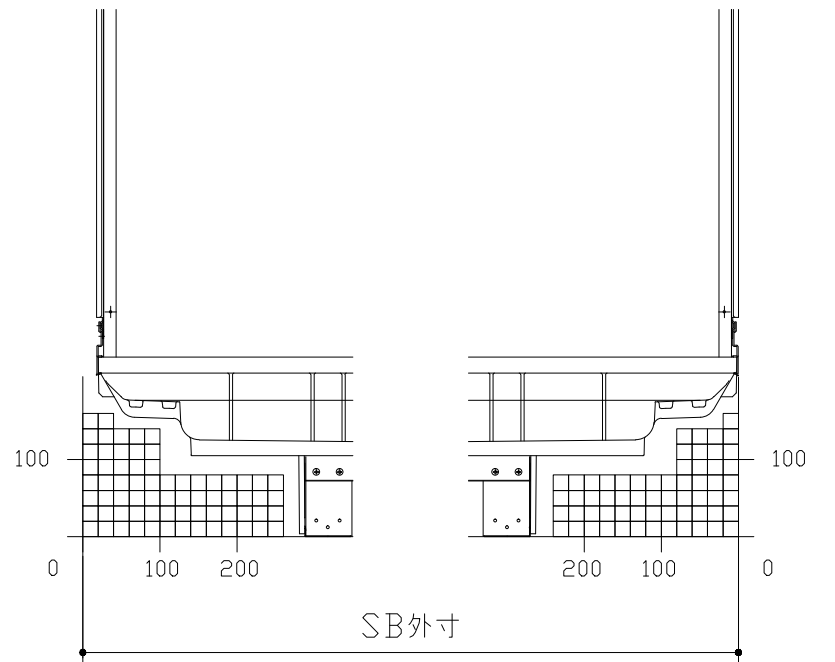


E矢視

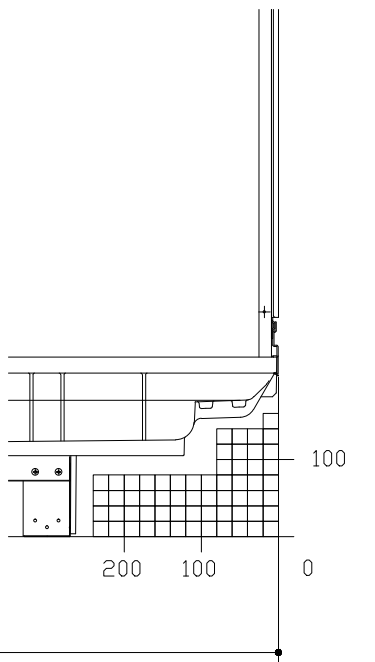


F矢視


キープクリーンドア：折戸ホワイ ト（AWTオレト®8）

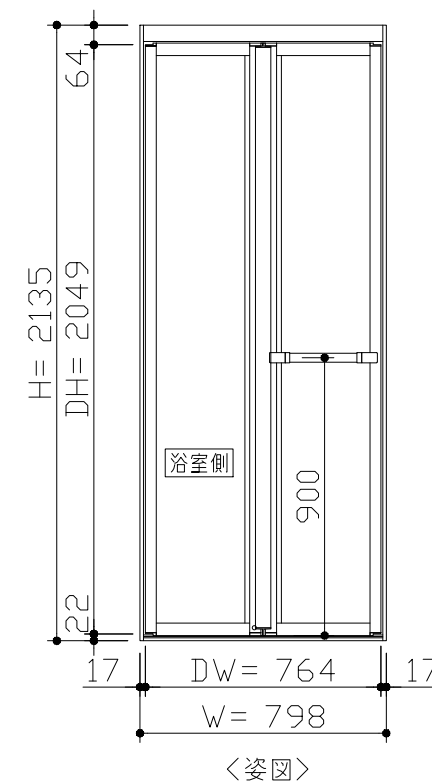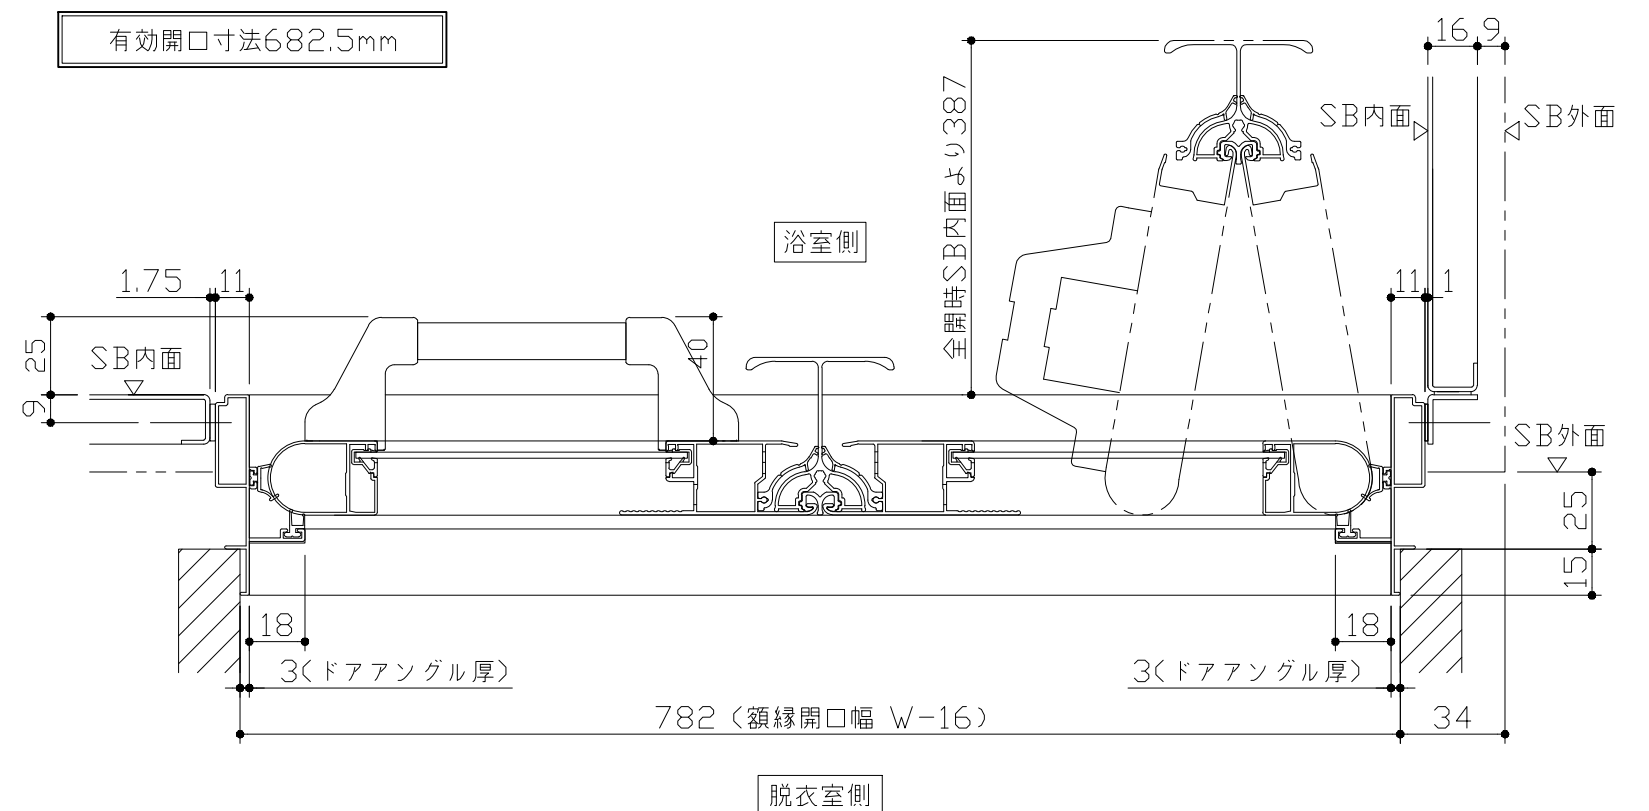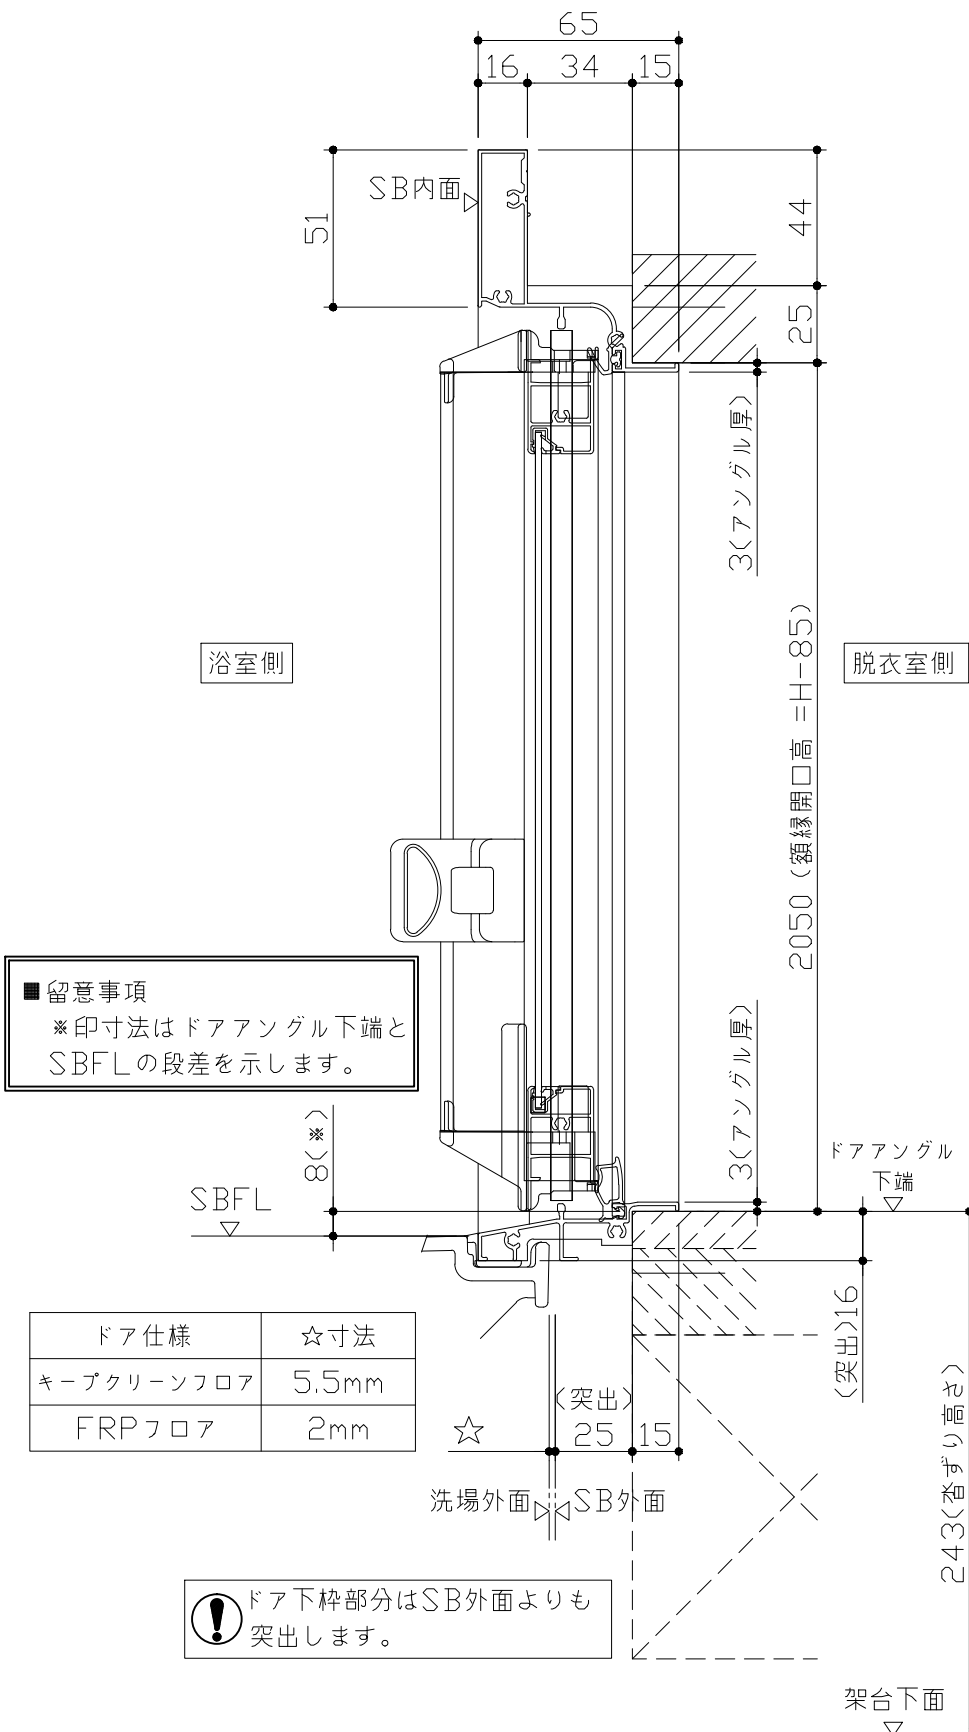

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



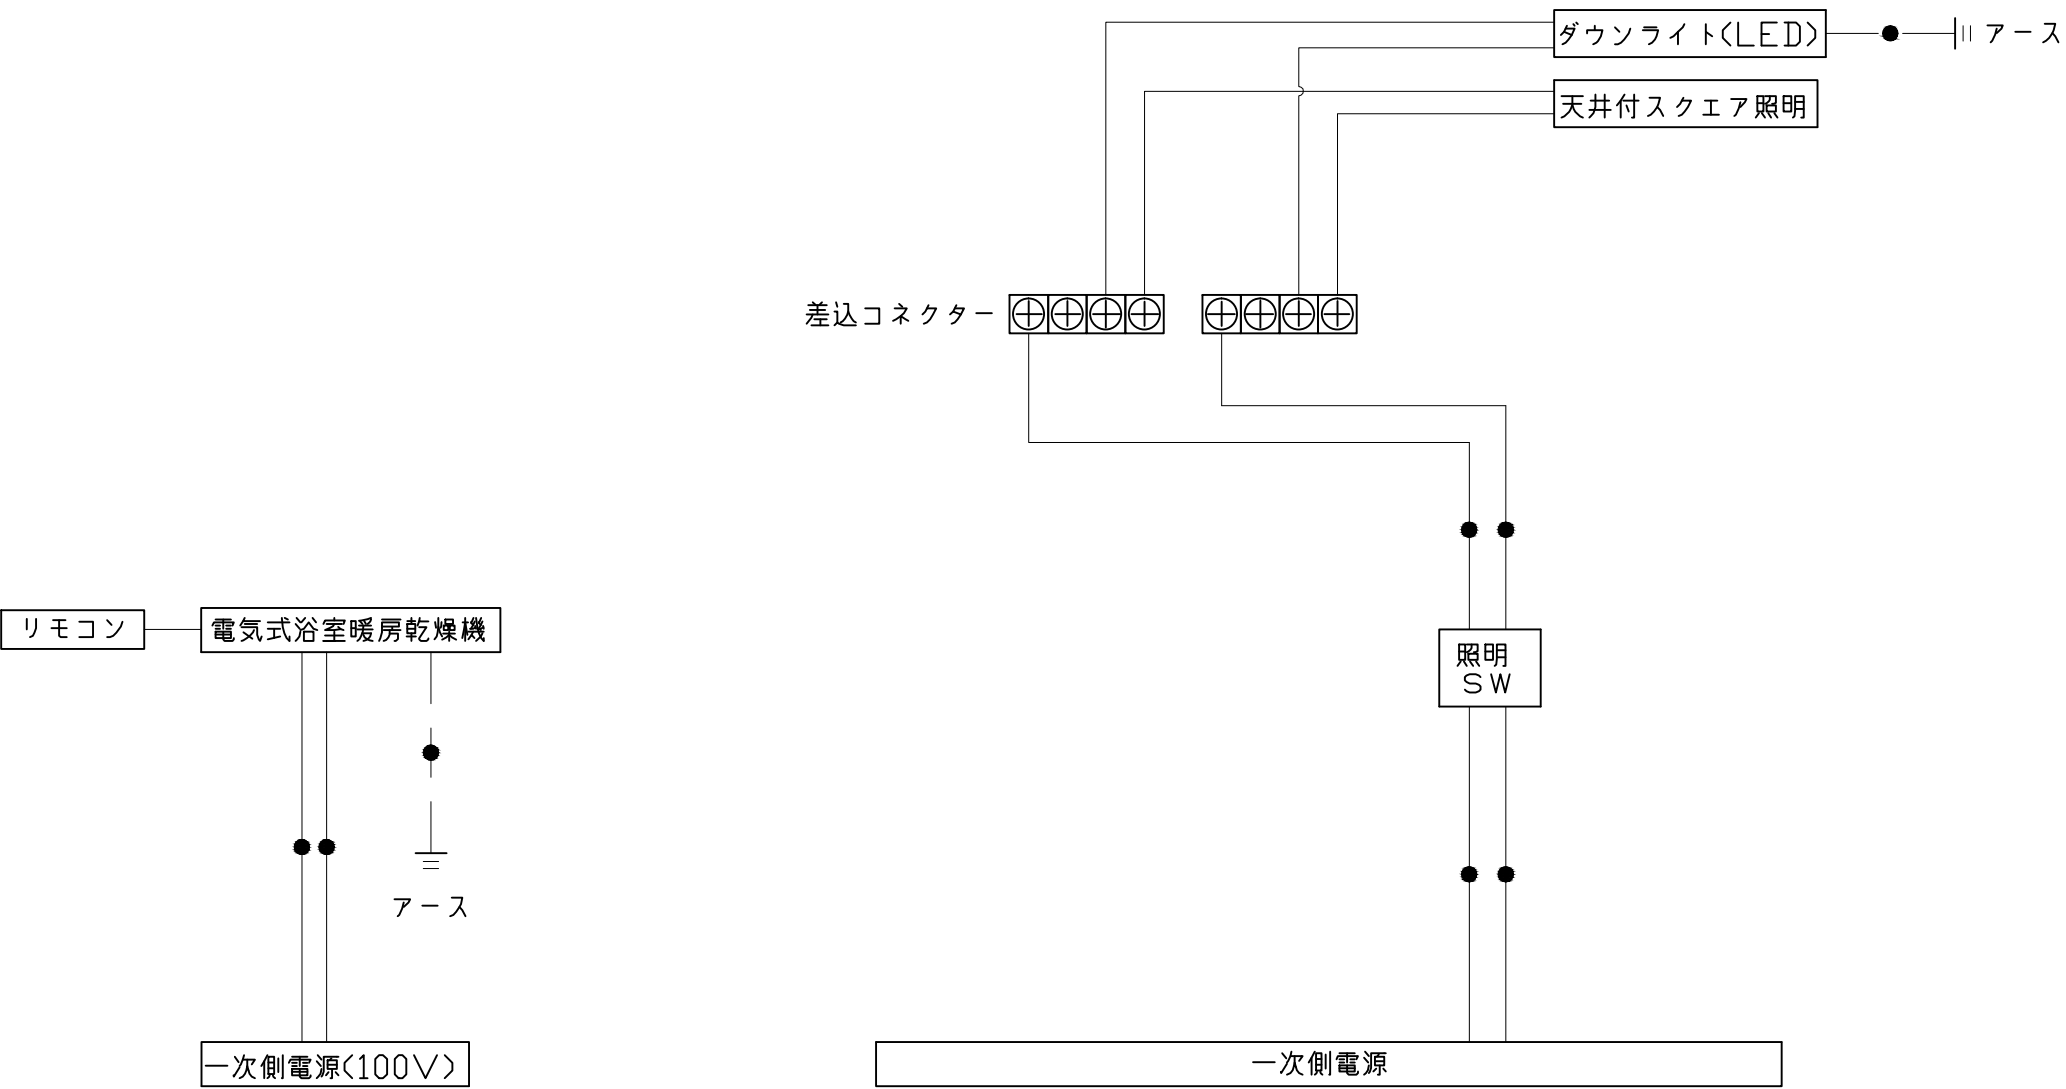


※浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。

浴槽		洗い場用水栓		照明			
				天井付スクエア照明 LED 11W (1灯あたり)			
		換気機器		シャワーフックスライドバー			
リモコンコード長さ: 5m 外形: 縦120mm×横116mm				枠: SUS304 t0.8 ミラー: 表面防曇コートあり (ロングクリアミラー-A) 表面防曇コートなし (ロングミラー-A)			
Takara standard タカラストANDARD株式会社		現場名称: 横浜-港北SR SB3プレデンシア様邸 現場番号: A5692975 港北営業所		PREDENCIA プレデンシア プラン番号: 2716H-1908-0014T 担当営業: 濱田		部材詳細図 作成日: 2019年8月3日 担当アドバイザー:	


收納棚

本体：PMMA


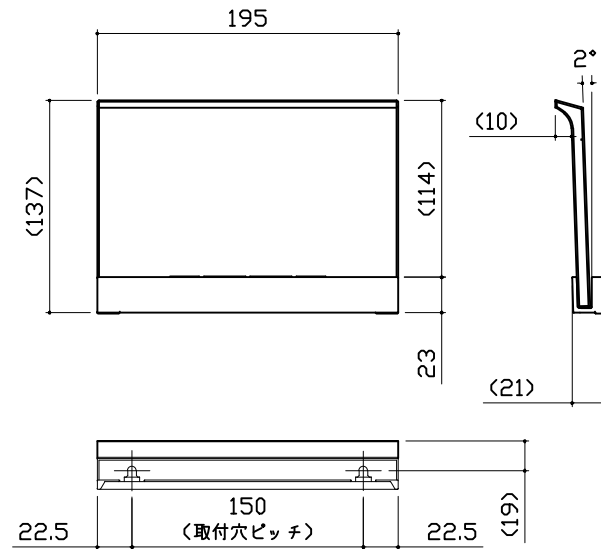


タオル掛け


本体：PMMA
ブラケット：ABS（クロムメッキ仕上げ）

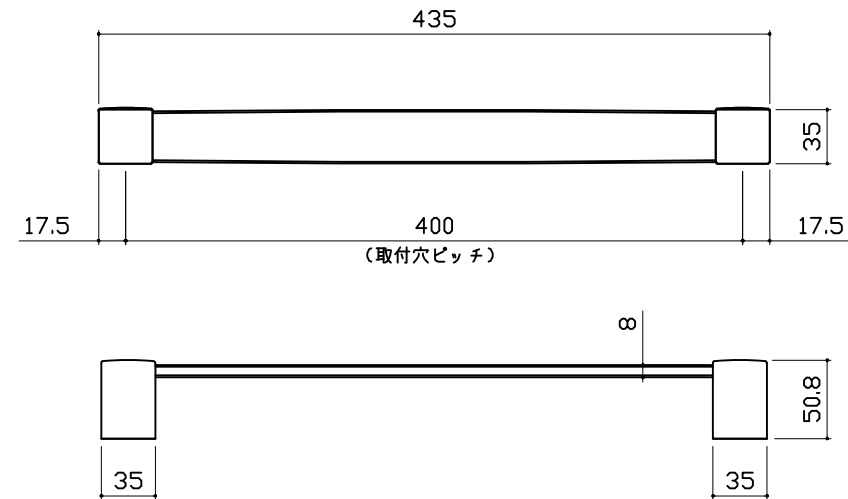


循環金具・フロアダプタ関連

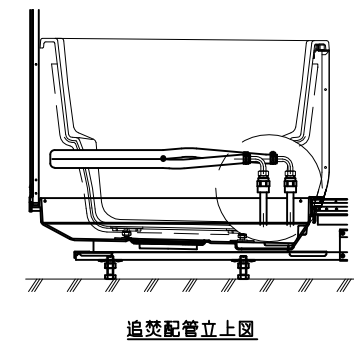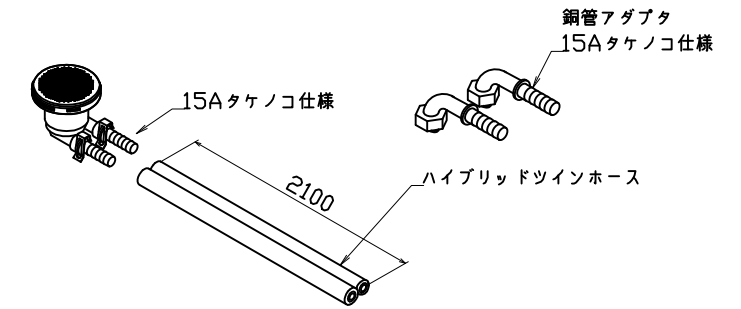


風呂蓋 7079MDH-16XST

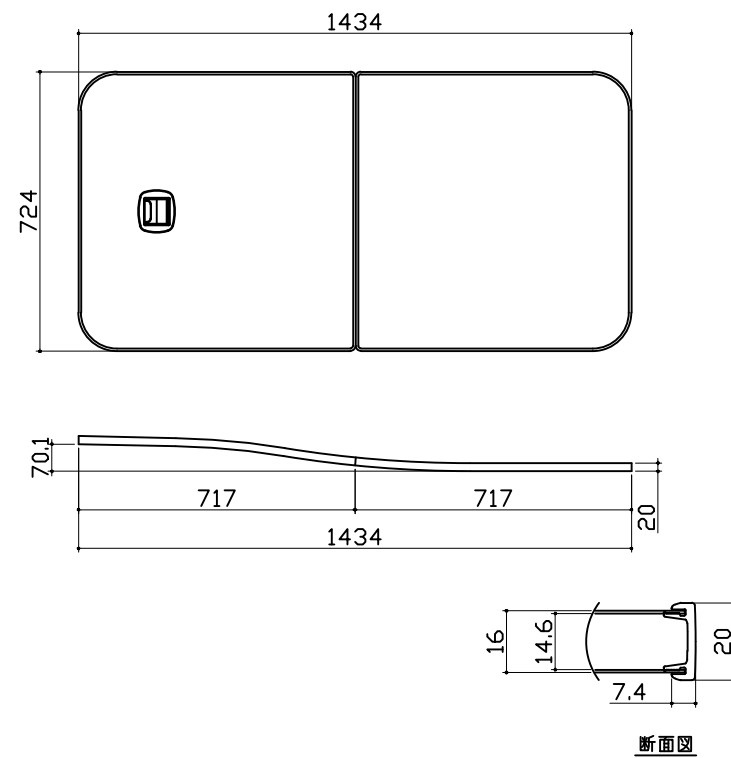

洗い場側排水トラップ

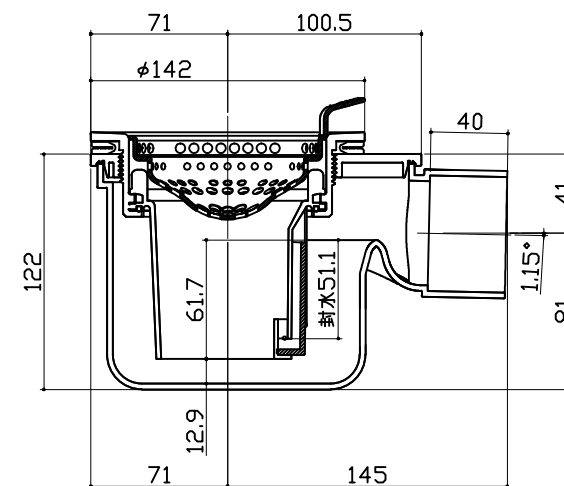

浴槽側排水トラップ

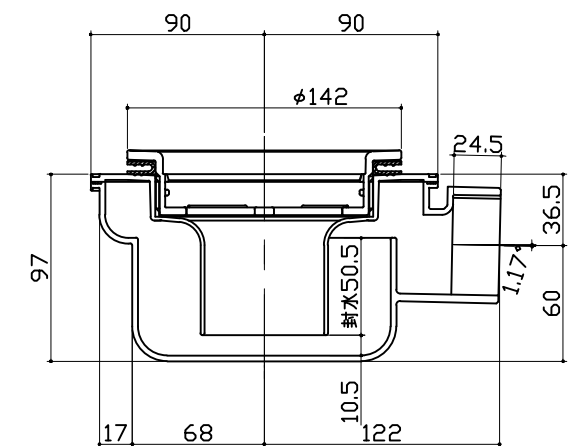

パネル割図		ミラー		収納棚	
シャフーフックスライドバー		ランドリーパイプ			
Takara standard タカラストANDARD株式会社		現場名称： 横浜ー港北SR SB3プレデンシア様邸 現場番号： A5692975 港北営業所		PREDENCIA プレデンシア プラン番号： 2716H-1908-0014T 担当営業： 濱田	
				穴開け指示図	1/1
				作成日： 2019年8月3日	
				担当アドバイザー：	
