

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 群馬-前橋SR SB7 様

業者 様

商品名 MINA ミーナ

作成日 2022年4月24日
プラン番号 7407C-2011-0262T
現場番号 C2735453

タカスタンダード株式会社
◆前橋営業所
群馬県前橋市天川大島町1480-1
TEL 027-290-2163 / FAX 027-290-2269

◆前橋ショールーム
TEL 027-290-2248 / FAX 027-290-2259

商品
御見積金額 \613,900 (税込 \675,290)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 \110,000 (税込 \121,000)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様 ★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

《システムバス》

ユニットサイズ	1616 (BR勝手)
洗い場仕様	ガラス繊維強化樹脂<FRP>
洗い場カラー	グレーベージュ
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	シュガーホワイト
浴槽形状	ラウンド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	樹脂
カウンターカラー	チャコールグレー
エプロン材質/カラー	ステンレス / ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー (正面)	ミックスウッドダーク
パネルカラー (周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	LPG / 50Hz

◆ 御確認事項

- ☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事があります。
- お問い合わせ、またはカタログにて よく御確認下さるようお願い致します。
- ☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。
- ☆この御見積書の有効期間は30日間です。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		藤巻

◆ 備考

No.*

御名前 群馬-前橋SR SB7

様

現場番号

C2735453

プラン番号

7407C-2011-0262T

作成日

2022/4/24

御見積明細 システムバス

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	ミーナ 1616サイズ		1	379,000	379,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅> (ホワイト) / 樹脂ガラス (半透明) (19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
6	洗い場	FRP洗い場 (グレーベージュ)	1		
7	浴槽	キーブクリーン浴槽<アクリル人造大理石> (高断熱浴槽) (シュガーホワイト)	1	+116,000	+116,000
8	浴槽追焚き穴	あり	1		
9	エプロン	人大浴槽用カーステンレス (保温材あり) (ホワイト)	1		
10	浴槽形状	ラウンド浴槽 (ベンチ付)	1		
11	ヘルシージェット	なし	1		
12	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
13	浴槽パン	あり	1		
14	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース (メタル調) KF9032H	1	+7,000	+7,000
15	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:KF9032HN	1		
16	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
17	カウンター	ワイドカウンター	1		
18	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックなし	1	-2,000	-2,000
19	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー	1	+8,800	+8,800
20	浴室パネル	ハイクラス (一面デザイン) (Kパネル)	1	+15,000	+15,000
21	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
22	引き違い窓	1109S (ペアガラス窓) <中抜き> (シャンパングレー)	1	+31,500	+31,500
23	引き違い窓	アルミ製窓枠1109S (シャンパングレー)	1	+11,500	+11,500
24	天井	フラット天井	1		
25	換気機器	天井換気扇	1		
26	換気機器開口	工場開口	1		
27	照明	天井付ミニ照明<電球色>	1		
28	天井照明開口	工場開口	1		
29	ミラー	ロングクリアミラー	1	+16,000	+16,000
30	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1	+11,500	+11,500
31	タオル掛け	タオル掛けなし	1		

御名前 群馬-前橋SR SB7

様

現場番号

C2735453

プラン番号

7407C-2011-0262T

作成日

2022/4/24

御見積明細 システムバス

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	収納棚	クリアタイプB (3段)	1	+5,000	+5,000
33	どこでもラック	風呂フタフック(チャコールグレー)	1	+2,100	+2,100
34	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500
35	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
36	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			36		\613,900

商品総合計

36

\613,900

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

【参考】別途 商品組付費


システムバス商品組付費

\110,000 (税込 \121,000)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

() 内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

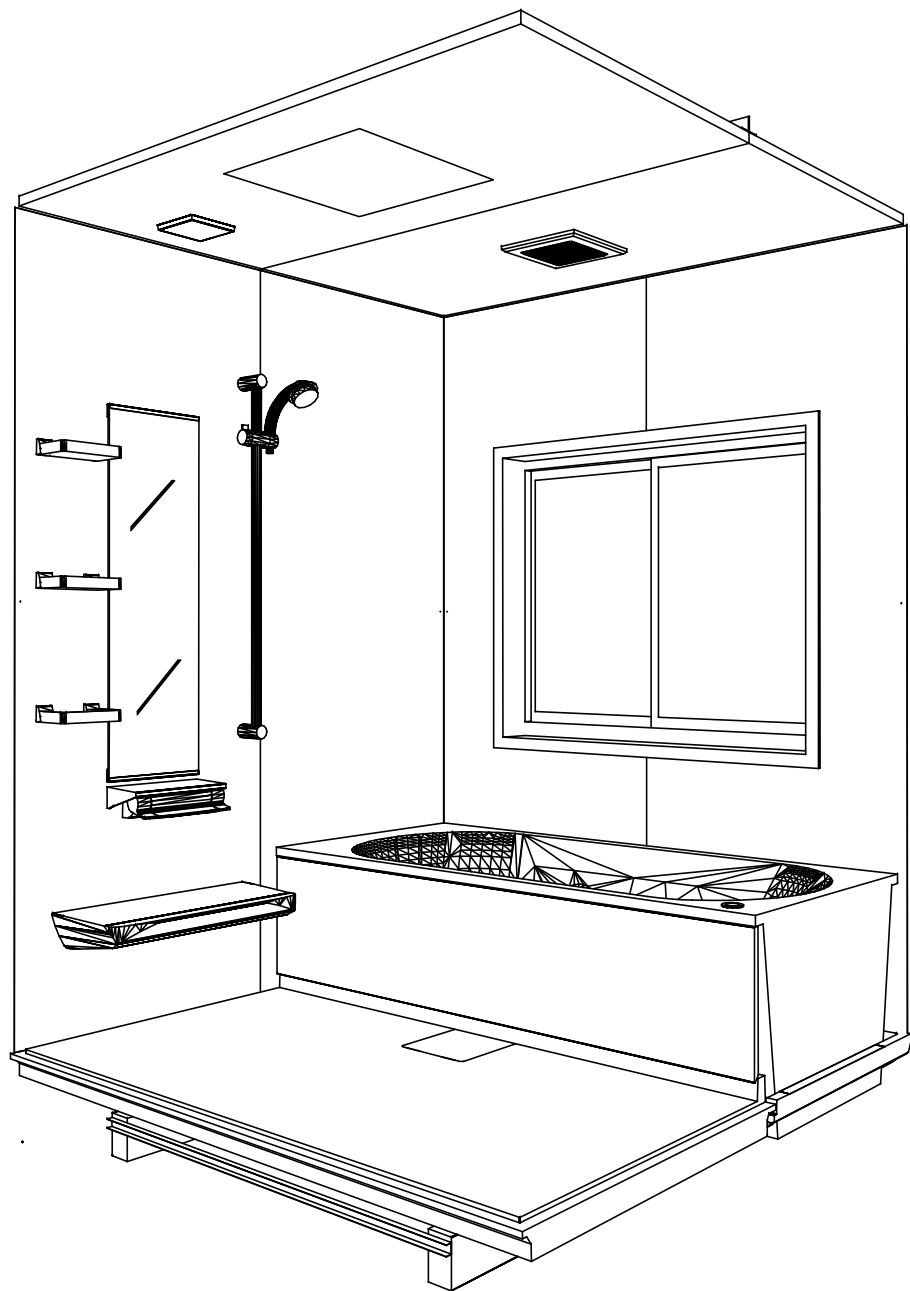

鳥瞰図

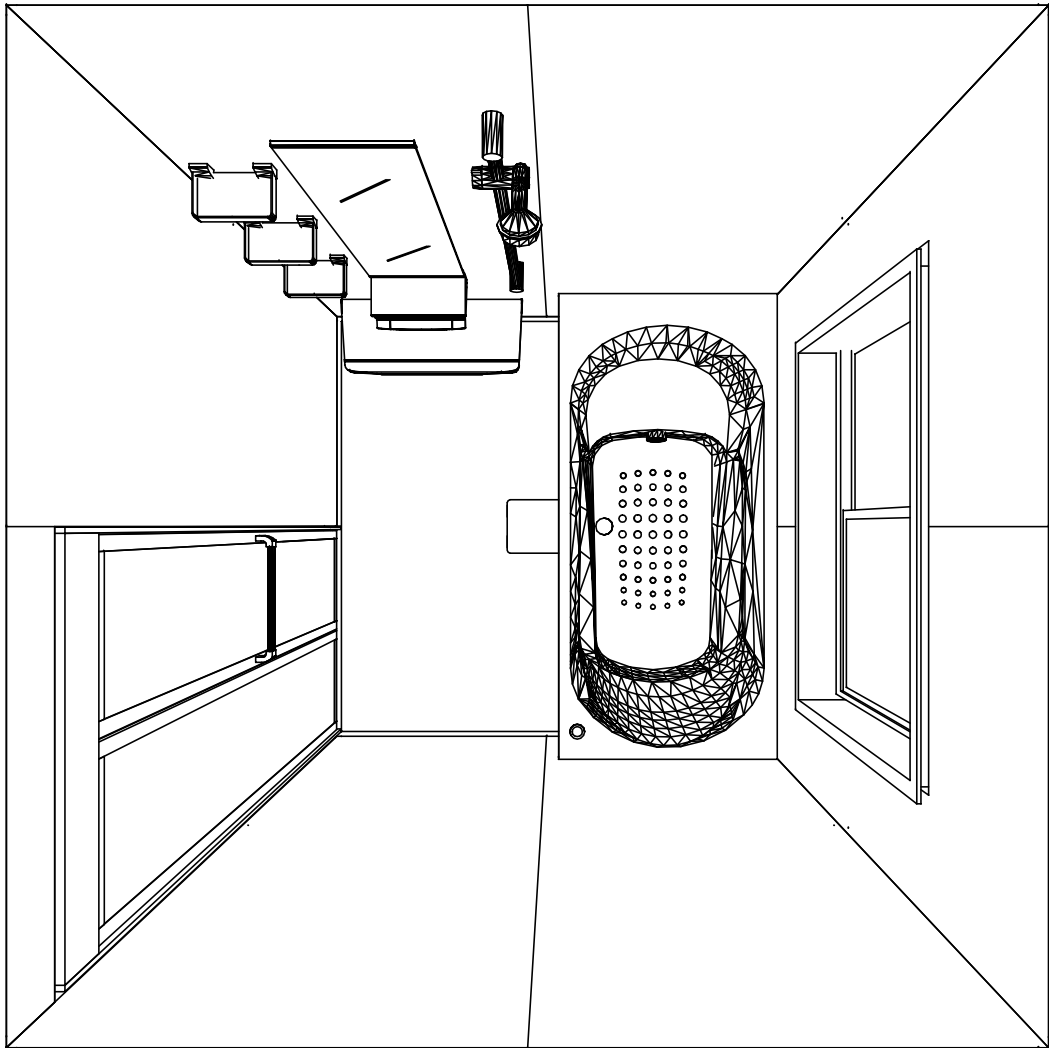

1616
キープクリーン浴槽＜アクリル人造大理石＞
フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・
納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認
して頂きますようお願い致します。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 群馬-前橋SR SB7様邸	M I N A ミーナ	姿図	
	現場番号： C2735453	プラン番号： 7407C-2011-0262T	作成日： 2022年4月24日	
	前橋営業所	担当営業 ：	担当アドバイザー：	

カウンター面


洗場側面

浴槽側面


カウンター対面

■留意事項


※印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

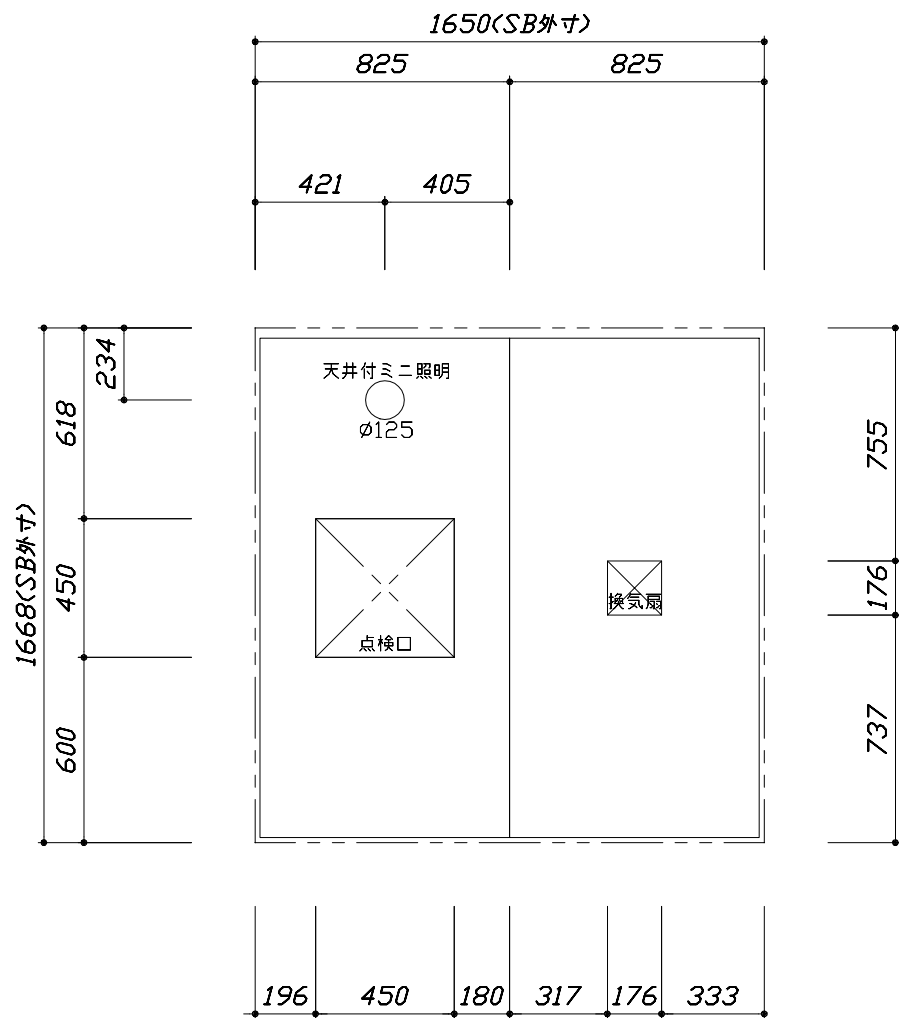

< 天井伏図 >

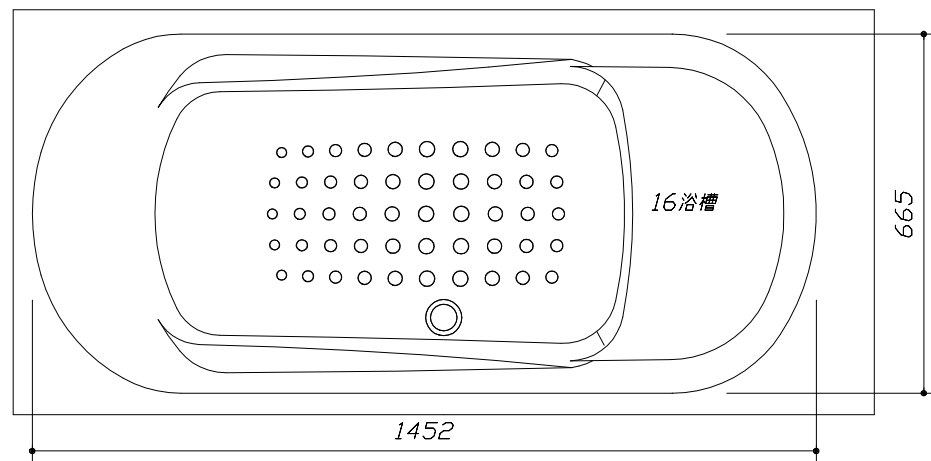



< 浴槽詳細図 >

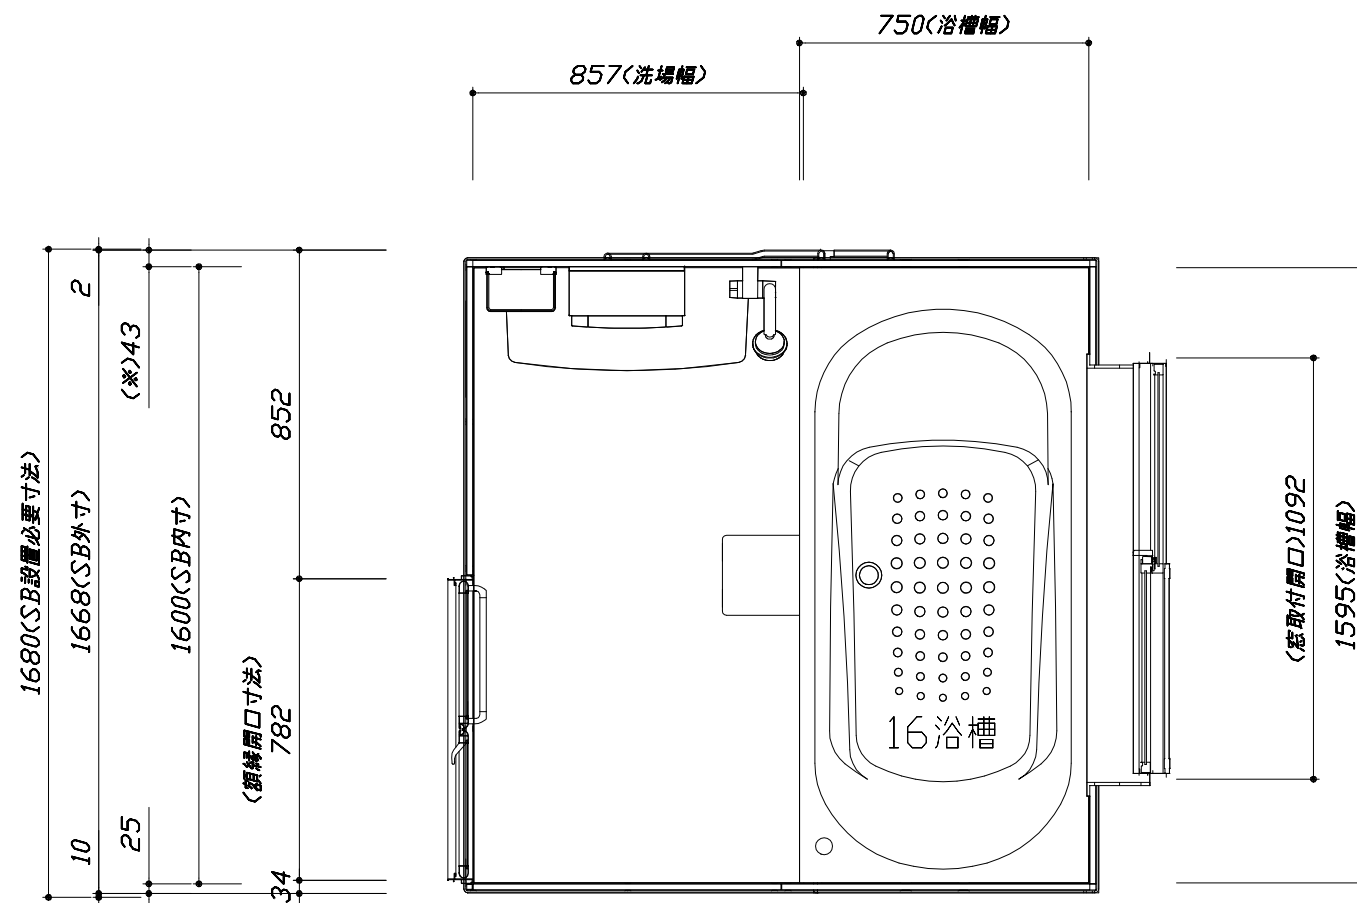

< 平面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・浴槽側面の窓設置位置は参考です。ご確認ください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

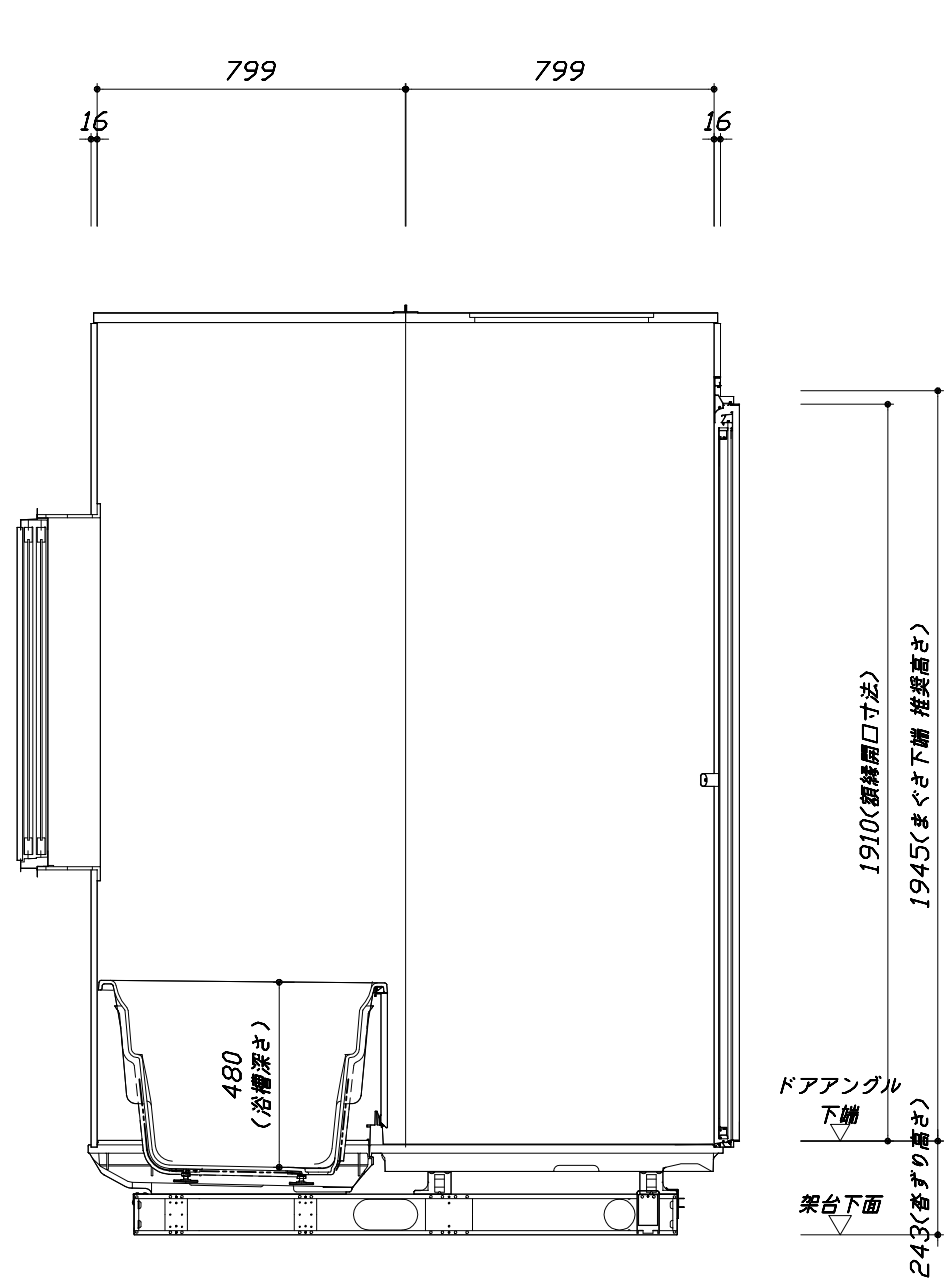

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)



<カウンター対面図>

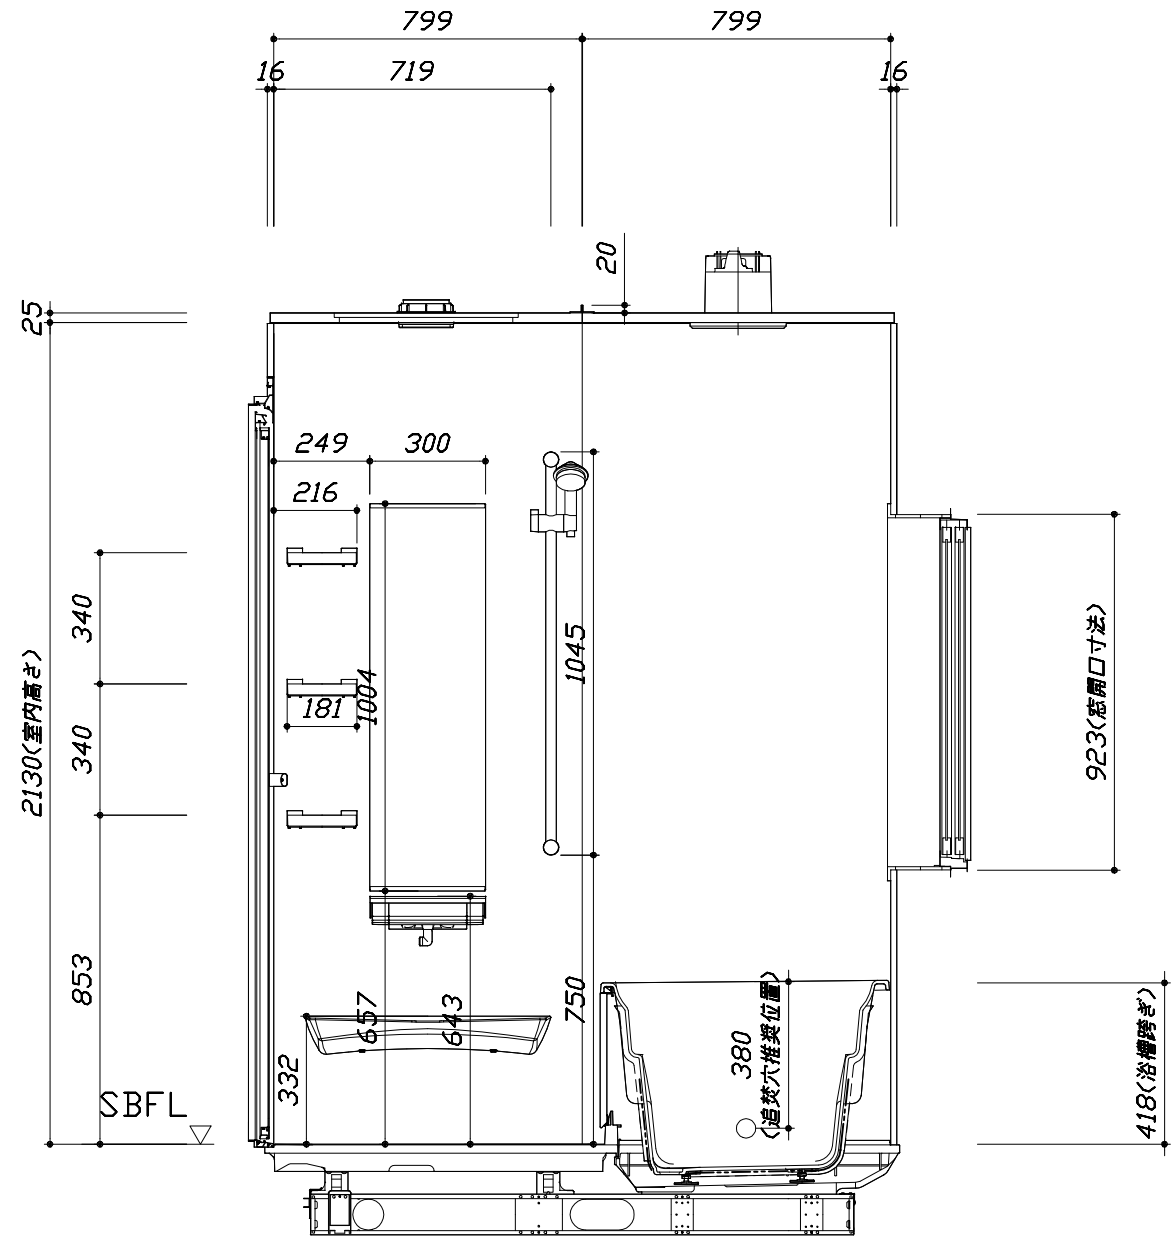

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・浴槽側面の窓設置位置は参考です。ご確認ください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

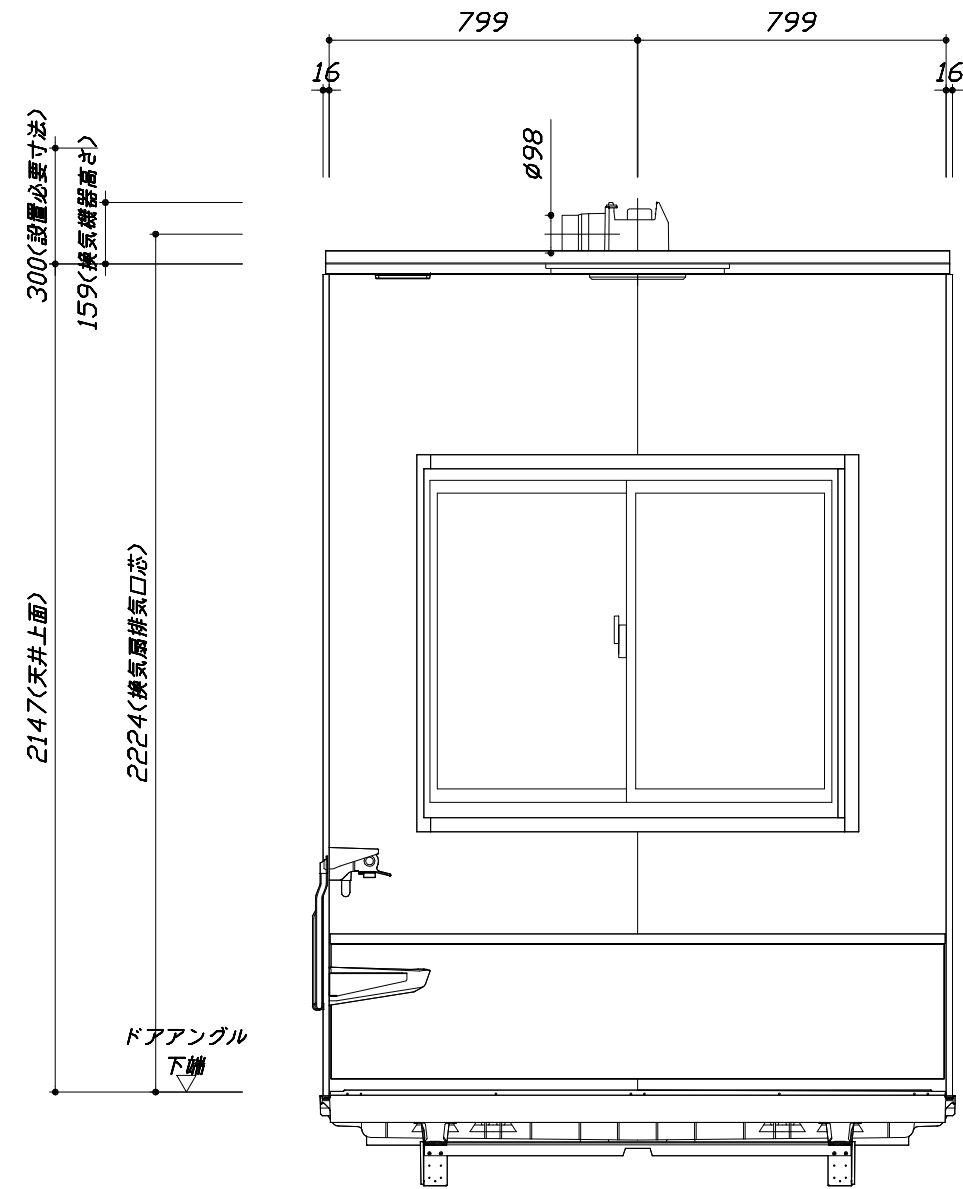

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

< 浴槽側面図 >

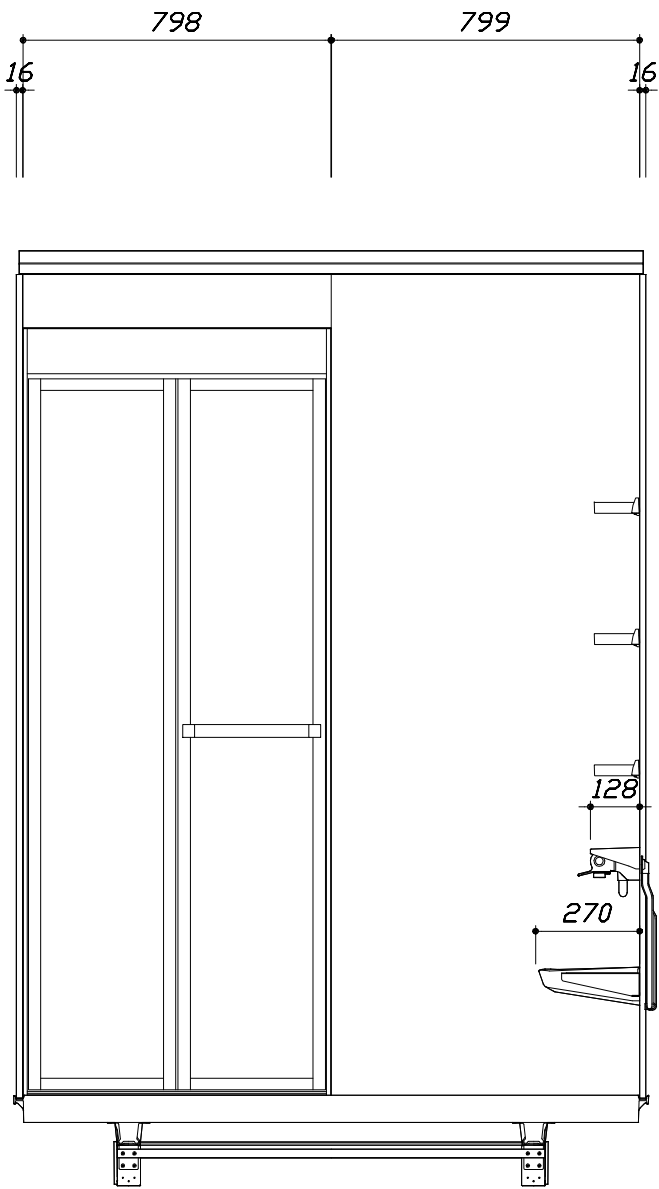

< 洗場側面図 >

現場名称： 群馬-前橋SR SB7様邸	M I N A ミーナ	施工図3	縮 尺： 1:20
現場番号： C2735453	プラン番号： 7407C-2011-0262T	作成日： 2022年4月24日	
前橋営業所	担当営業 ：	担当アドバイザー：	

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	BR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ラウンド浴槽(ベンチ付)（285リットル） 追い焚き穴：あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	ワイドカウンター：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	化粧サントイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓 1	引違い窓S1109(アルミ/ペアガラス) サッシ色 C：シャンパングレー
窓 2	－
窓枠 1	アルミ C：シャンパングレー
窓枠 2	－
排水トラップ	洗い場：A B S 樹脂， 浴槽：A S A 樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	300kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ロングクリアミラー くもり止め加工
収納棚	クリアタイプB：AS樹脂製（3段）
タオル掛け	－
洗場側水栓	サーモスタット(KVK KF9032HN) (樹脂ホース：メタル調)
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
スライドバー	シャワーフックスライドバー（スライドバー-TN-1020）
照明	天井付ミニ照明（LED 6.9W電球色）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W) (ダクト径φ98)
フロタ	組合せ式(アルミ複合板：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	W：シュガーホワイ ト
カウンター	CG：チャコールグ レー
パネル(カウンター面)	XB：ミックスウッ ドダーク
パネル(周辺・3面)	W：ホワイ ト
水栓上部カウンター	CG：チャコールグ レー
浴槽エプロン	W：ホワイ ト
洗場	D：グ レーベージュ
ドア	W：ホワイ ト
収納棚	クリアタイプB
タオル掛け	－
ランドリーセット	－

Takara standard タカラストANDARD株式会社	現場名称： 群馬－前橋SR SB7様邸	M I N A ミーナ	仕様表	
	現場番号： C2735453	プラン番号： 7407C-2011-0262T	作成日： 2022年4月24日	
	前橋営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	



基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

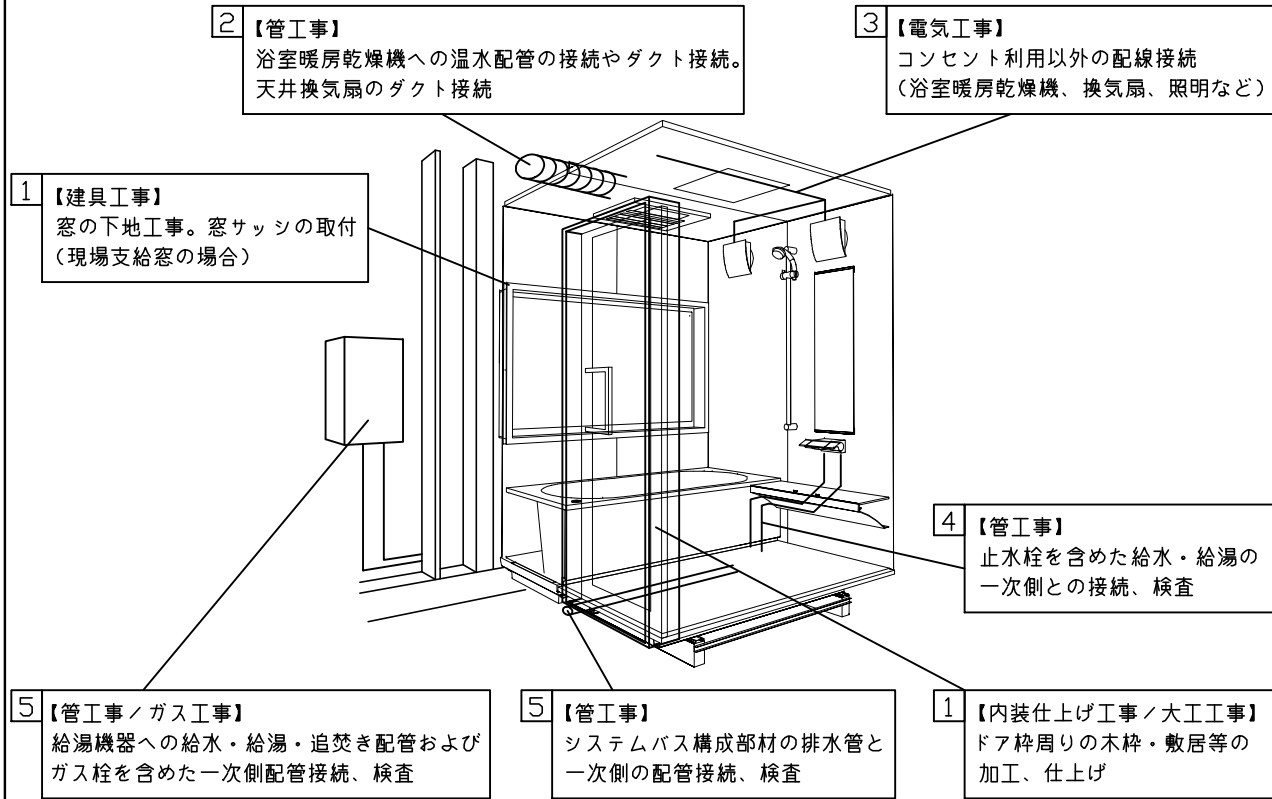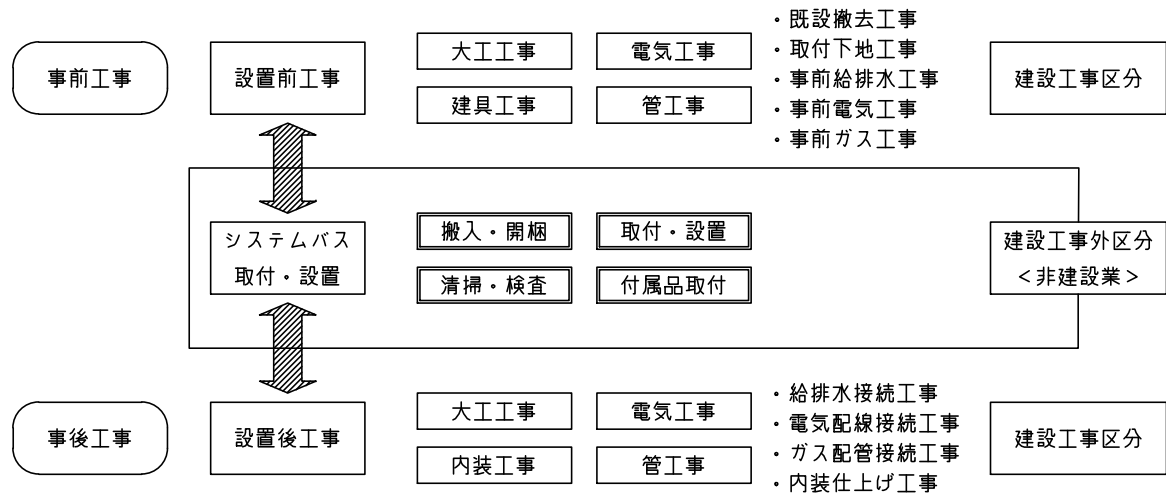

■システムバス 工事区分		参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』									
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	とび 土工 事	建具 工事	管 工事	電気 工事	給湯 機器 設備	シス テム バス 設置	
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
			給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
			架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○			建築の外装仕上げ工事
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
			浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事


※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する

※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。




■ 給水給湯管工事注意事項



- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

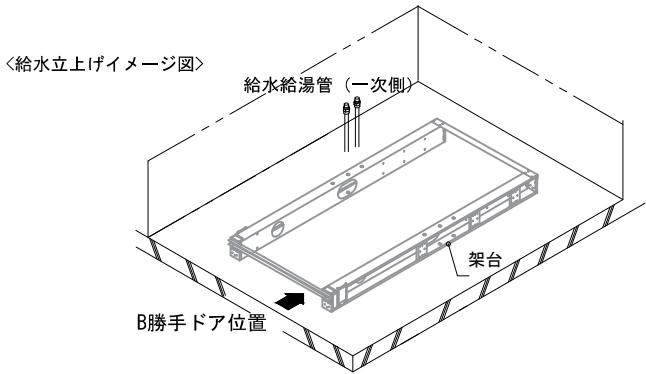

■ 土間コンクリート仕上げ寸法
ドアングル下端より 265mm 下がりで打設してください。

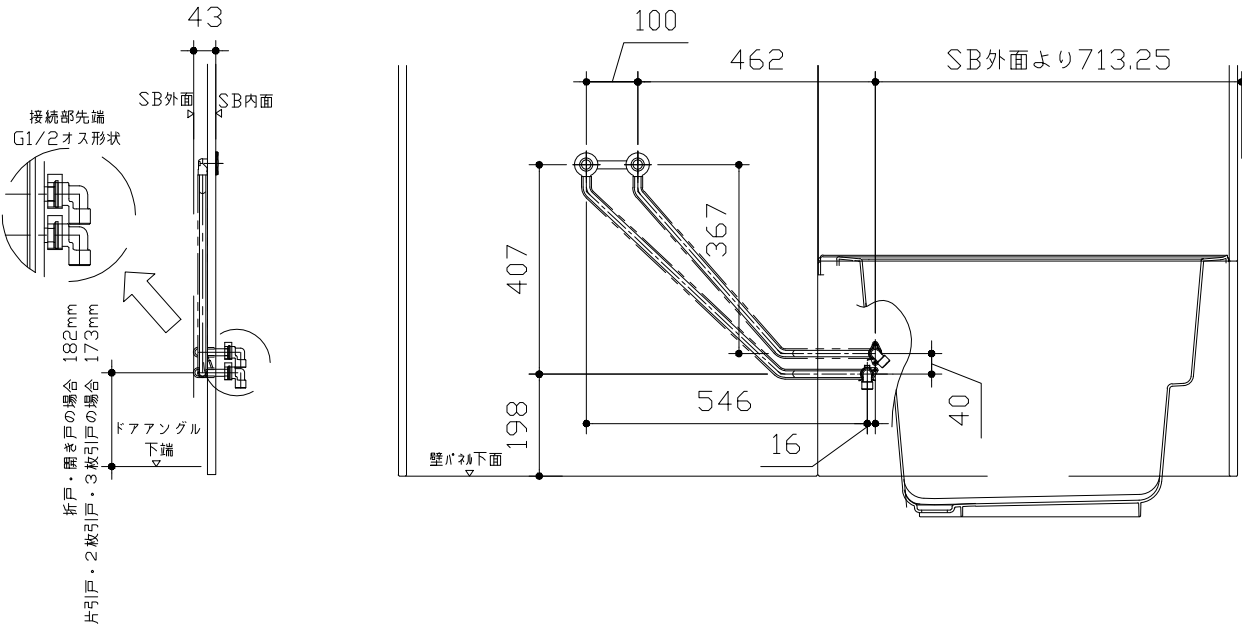


＜給水給湯管取合詳細図＞

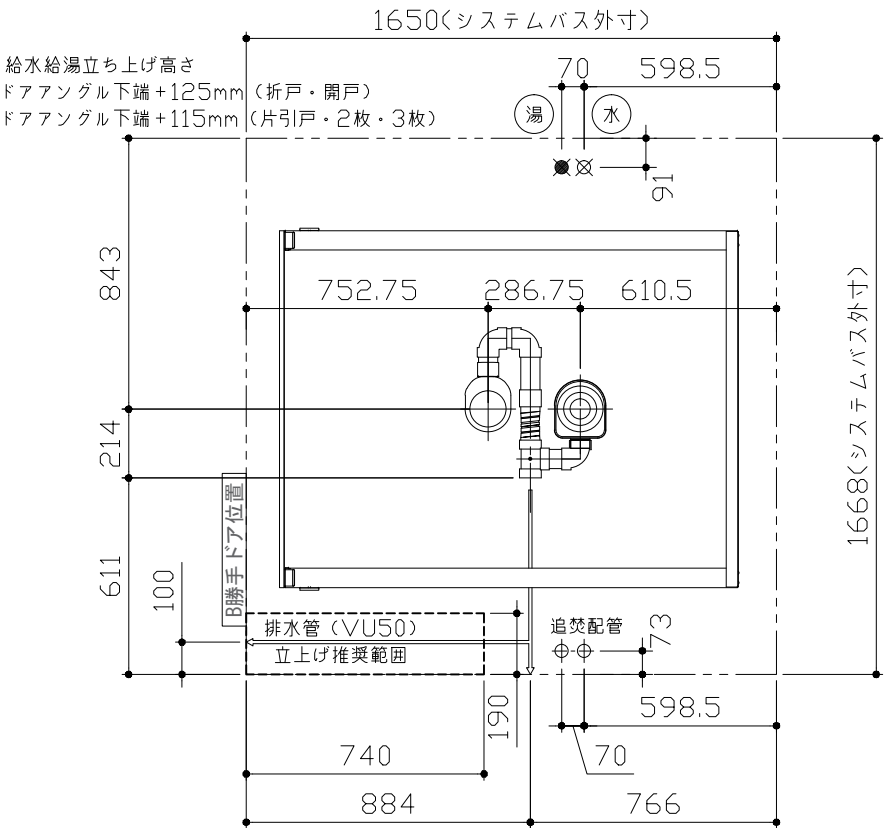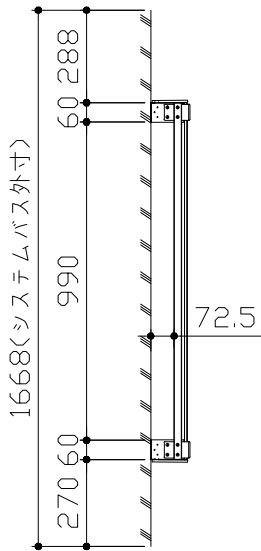

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置



＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞





●必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・浴槽パンの配管導入口下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

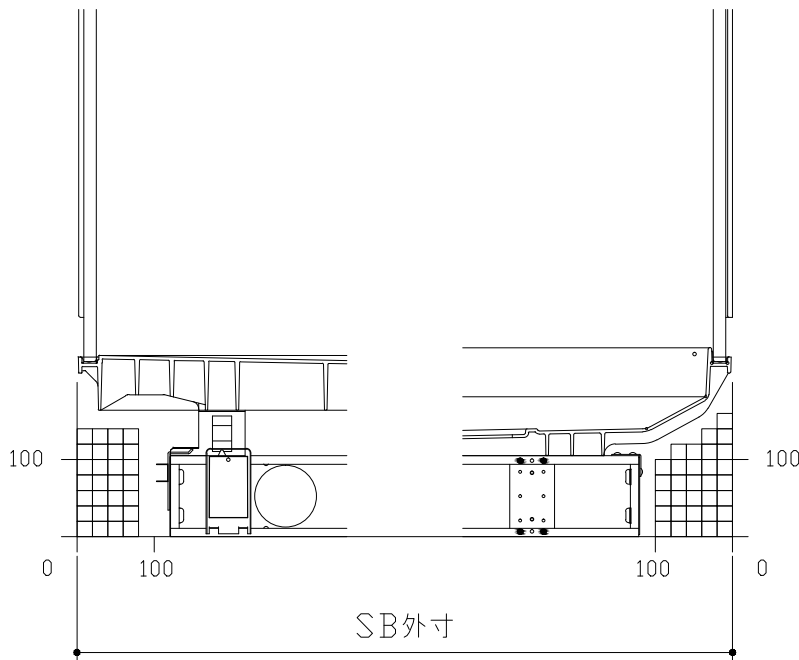


B矢視

A矢視

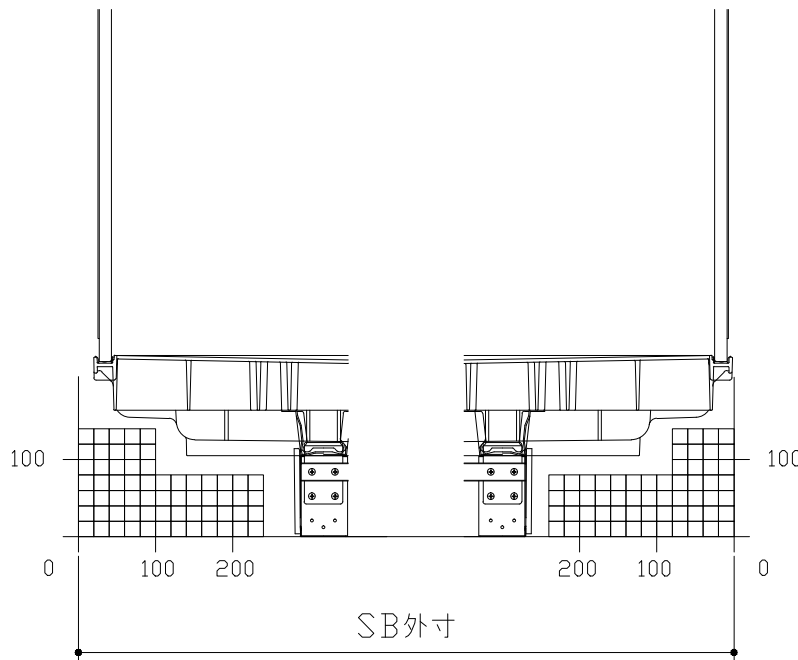

D矢視




C矢視

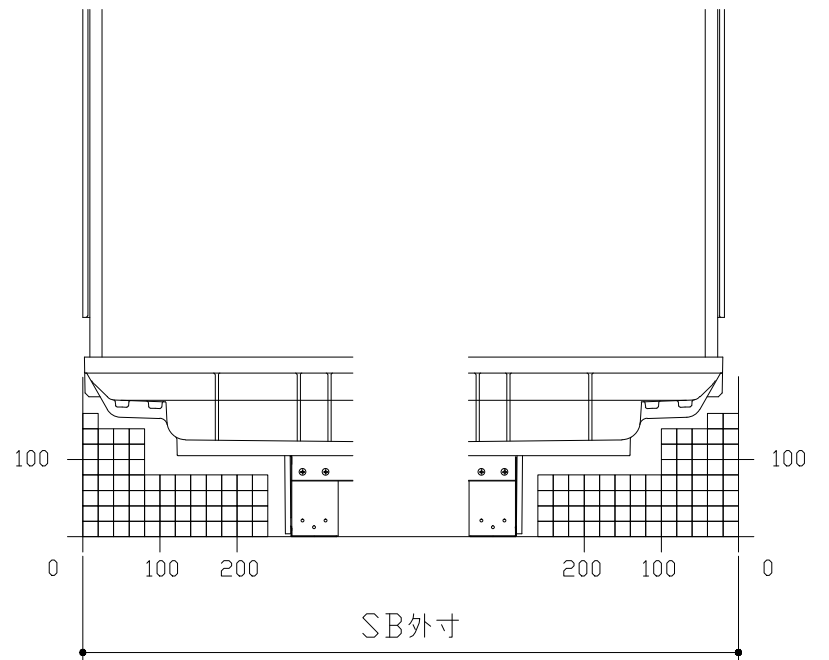

F矢視


E矢視


キープクリーンドア：折戸・上部換気口

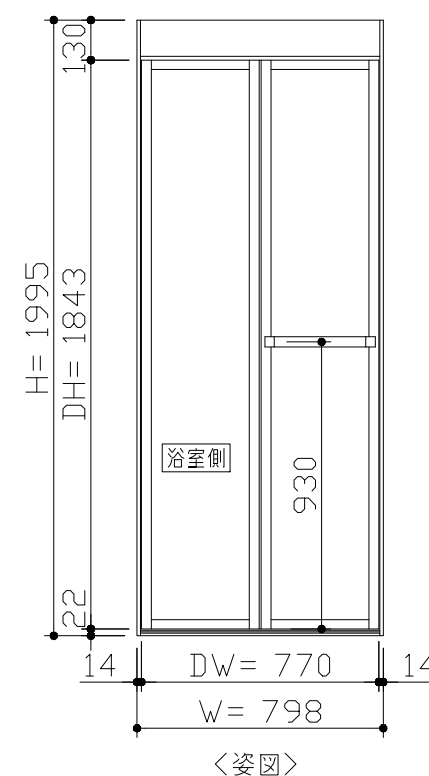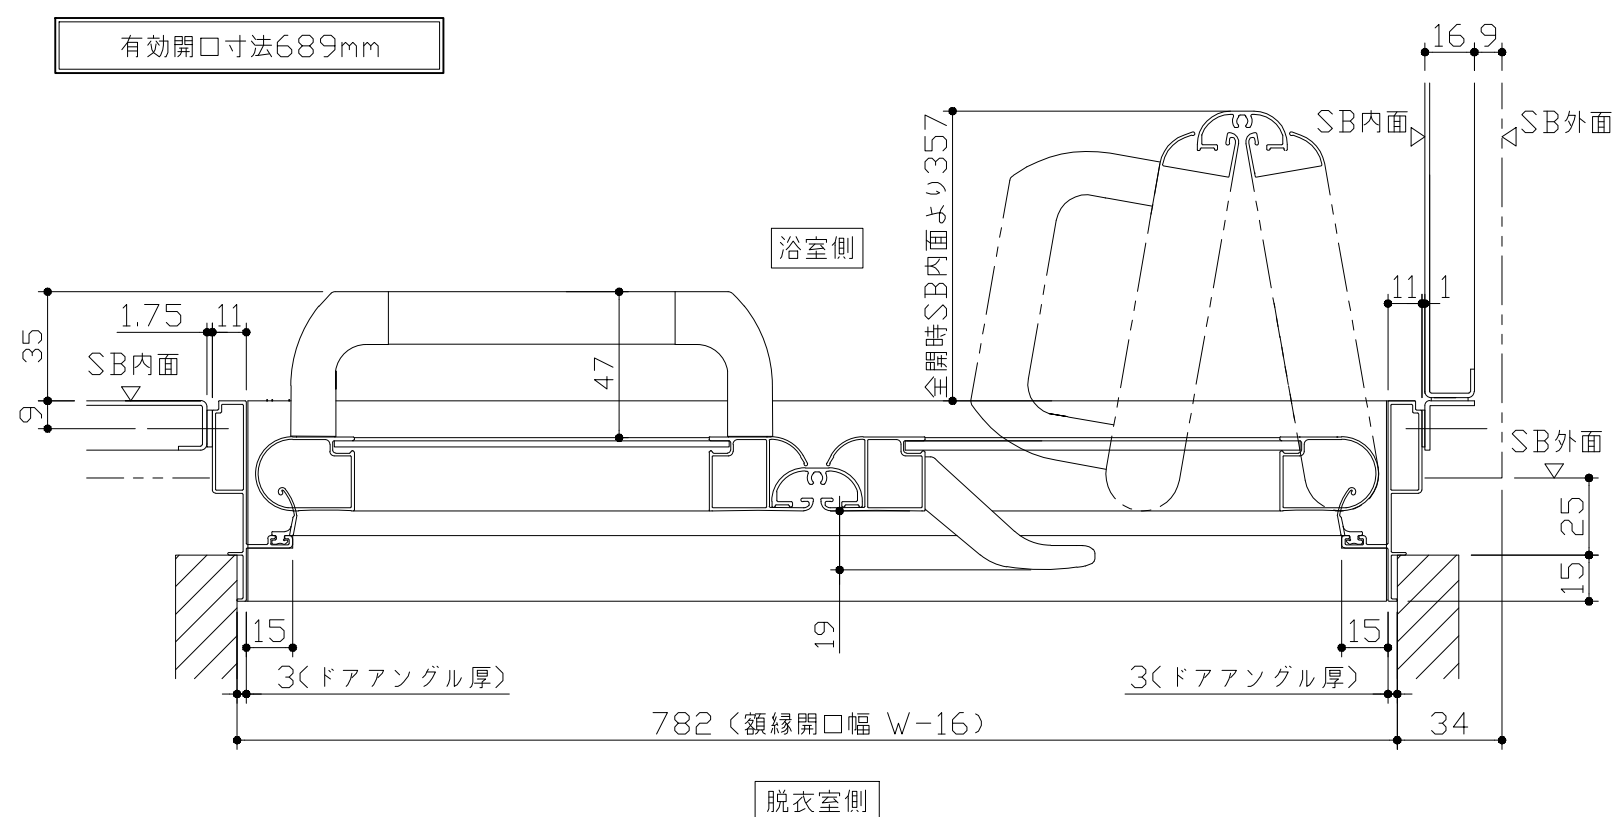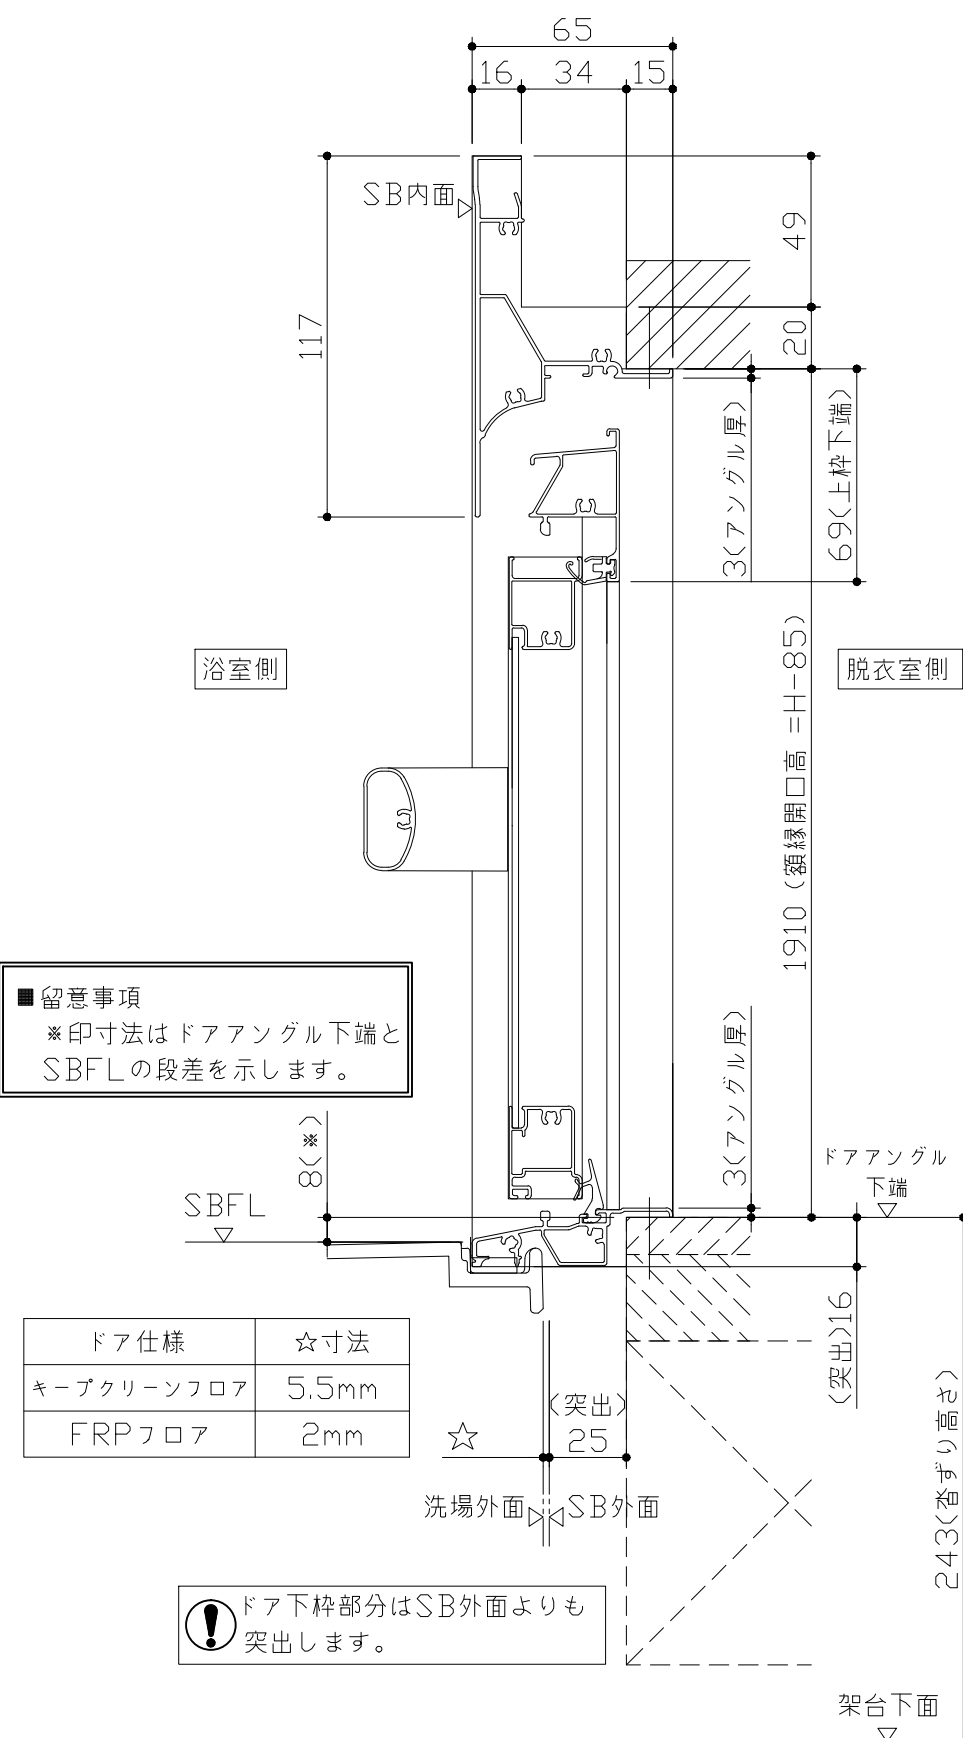

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。







〈参考寸法図〉



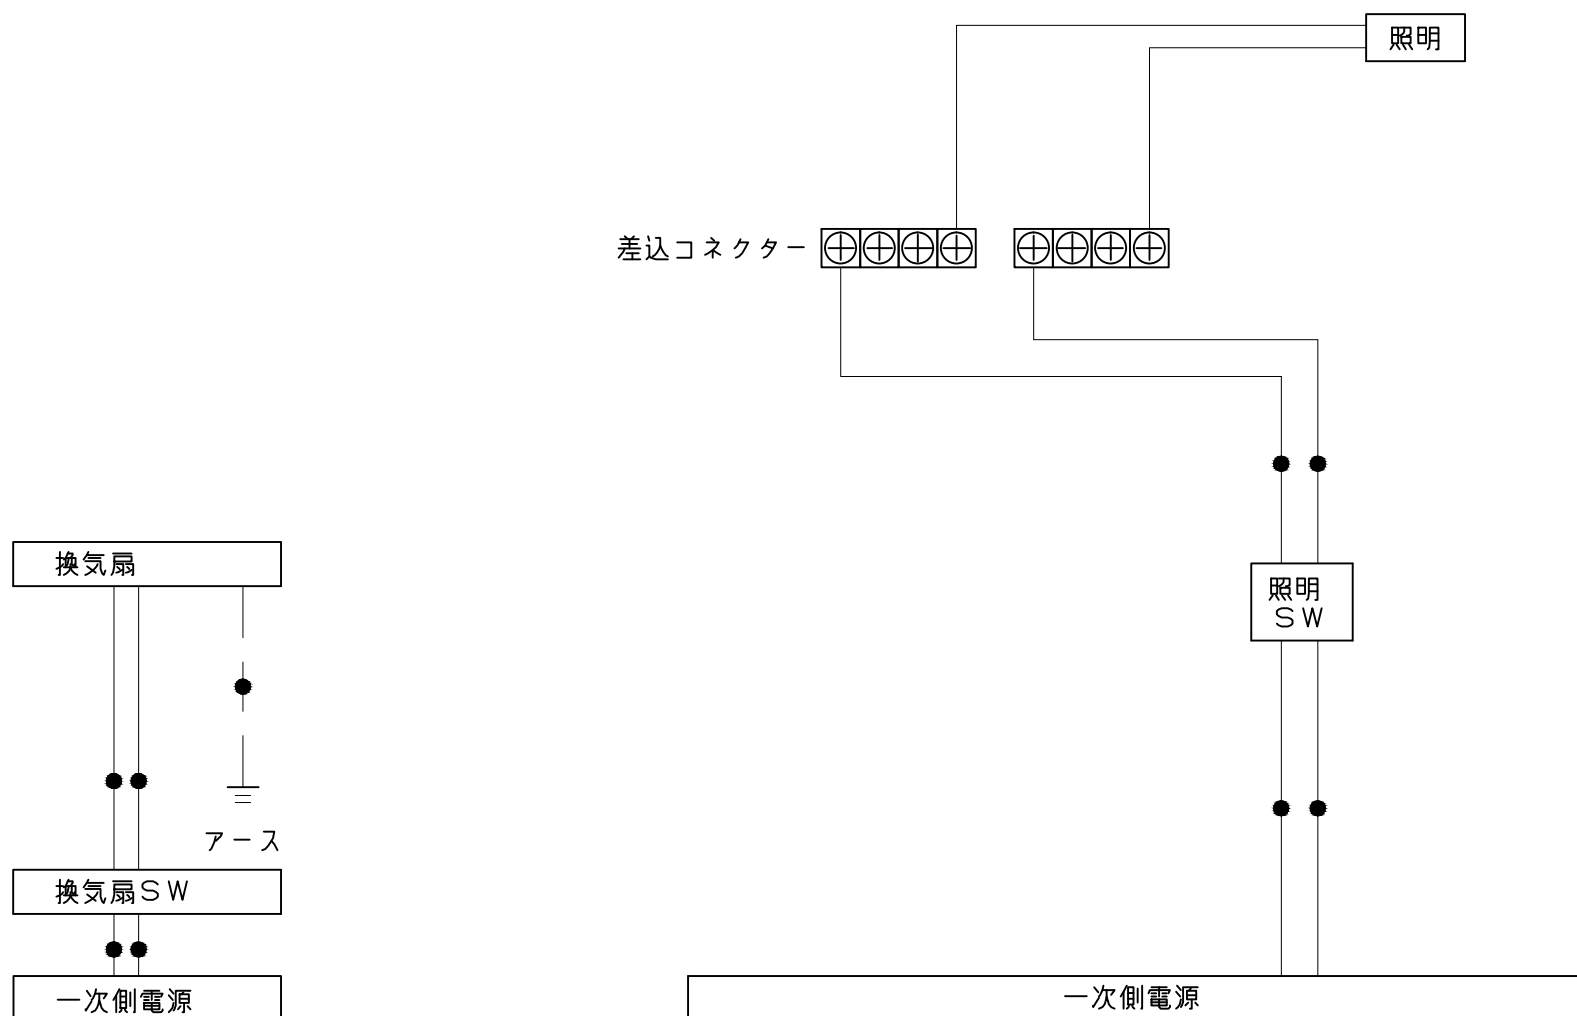

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

浴槽	洗い場用水栓	照明																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">規格</th><th rowspan="2">SB 奥行寸法</th><th colspan="3">浴槽奥行寸法</th></tr> <tr> <th>L</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>1593</td><td>1520</td><td>32.5</td><td>35.5</td></tr> <tr><td></td><td>1618</td><td>1545</td><td>57.5</td><td>35.5</td></tr> <tr><td></td><td>1643</td><td>1570</td><td>82.5</td><td>35.5</td></tr> <tr><td></td><td>1668</td><td>1595</td><td>107.5</td><td>35.5</td></tr> <tr><td></td><td>1693</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1718</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1743</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1768</td><td>1620</td><td>120</td><td>48</td></tr> <tr><td></td><td>1793</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1818</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1843</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1868</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	規格	SB 奥行寸法	浴槽奥行寸法			L	C	D		1593	1520	32.5	35.5		1618	1545	57.5	35.5		1643	1570	82.5	35.5		1668	1595	107.5	35.5		1693					1718					1743					1768	1620	120	48		1793					1818					1843					1868					天井付ミニ照明 LED 6.9W (1灯あたり)		
規格			SB 奥行寸法	浴槽奥行寸法																																																																				
	L	C		D																																																																				
	1593	1520	32.5	35.5																																																																				
	1618	1545	57.5	35.5																																																																				
	1643	1570	82.5	35.5																																																																				
	1668	1595	107.5	35.5																																																																				
	1693																																																																							
	1718																																																																							
	1743																																																																							
	1768	1620	120	48																																																																				
	1793																																																																							
	1818																																																																							
	1843																																																																							
	1868																																																																							
換気機器	カウンター	シャワーフックスライダー																																																																						
管工事	本体：ABS																																																																							
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 群馬ー前橋SR SB7様邸 現場番号： C2735453 前橋営業所	MINA ミーナ プラン番号： 7407C-2011-0262T 担当営業：	部材詳細図 1/2 作成日： 2022年4月24日 担当アドバイザー：																																																																					

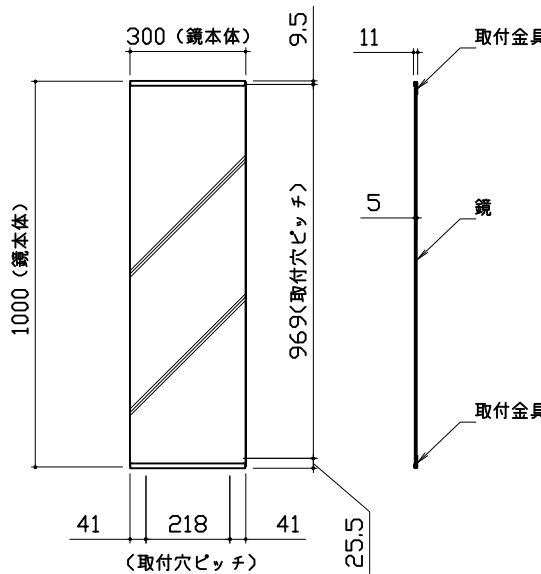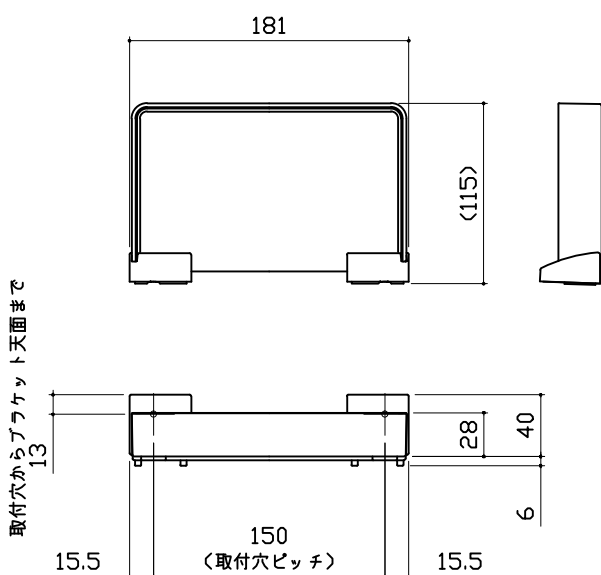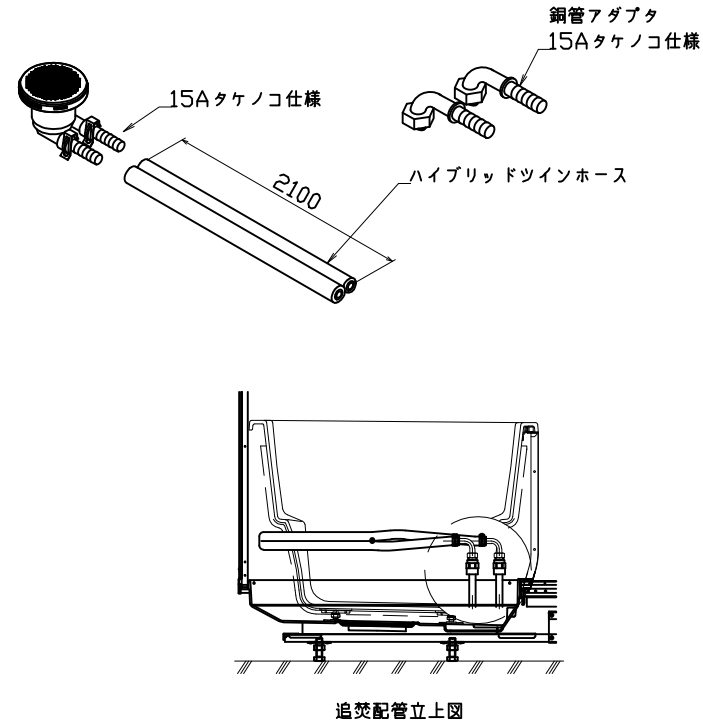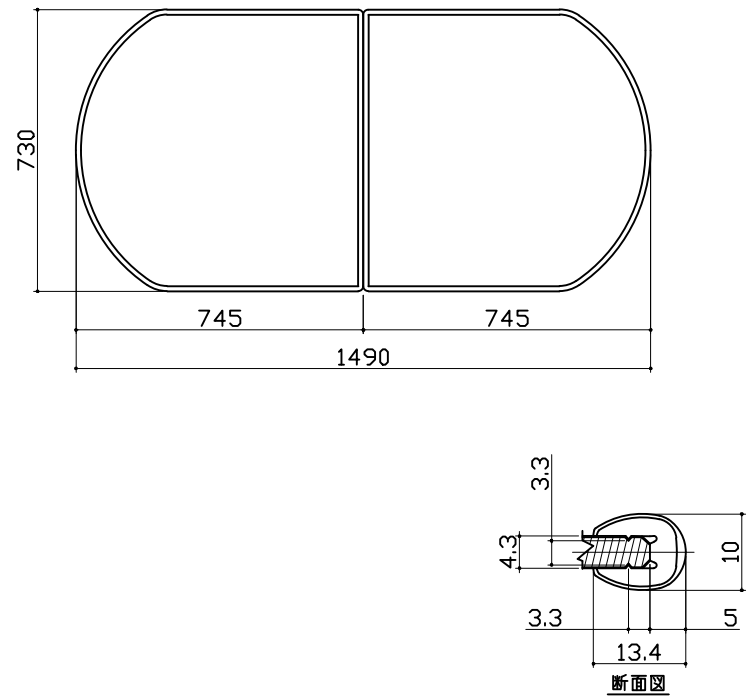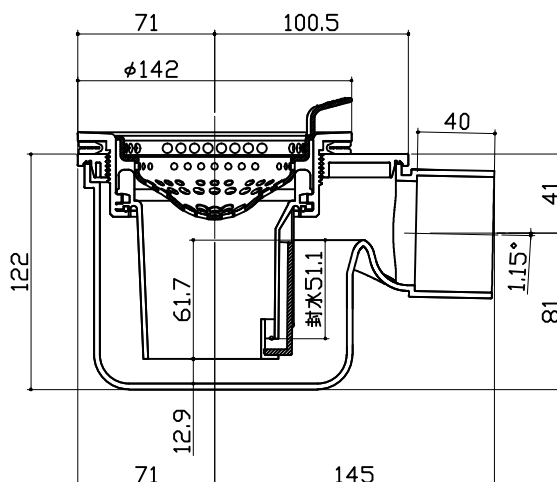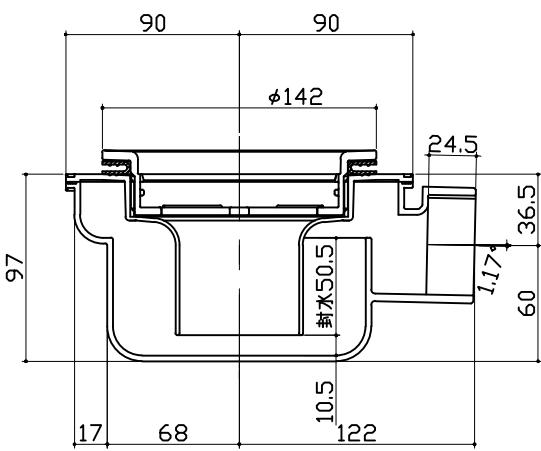ミラー		収納棚		循環金具・フロアダプタ関連	
枠：SUS304 t0.8 ミラー：表面防曇コートあり（ロングクリアミラー-A） 表面防曇コートなし（ロングミラー-A） 		本体：AS 		 銅管アダプタ 15Aタケノコ仕様 15Aタケノコ仕様 ハイブリッドツインホース 追焚配管立上図	
風呂蓋 7407MVA-16YS		洗い場側排水トラップ		浴槽側排水トラップ	
					
Takara standard タカスタンダード株式会社		現場名称： 群馬ー前橋SR SB7様邸 現場番号： C2735453 前橋営業所		MINA ミーナ プラン番号： 7407C-2011-0262T 担当営業：	
				部材詳細図	2/2
				作成日： 2022年4月24日	
				担当アドバイザー：	

パネル割図		ミラー		収納棚	
ハネK16C2Z 0799 LXB ハネK16C1N 0799 RXB ハネK16A 0799 〳 W ハネK16NW 0799 〳 W ハネK16NW 0799 〳 W ハネK16AD 0799 〳 W ハネK16A 0799 〳 W BR勝手		ハネK16C2Z 0799 LXB 799 509 291 1659 690 現地加工：φ3.5		ハネK16C2Z 0799 LXB 799 200 50 860 1200 1540 現地加工：φ3.5	
シャワーフックスライドバー					
ハネK16C2Z 0799 LXB 799 80 1790 770 現地加工：φ3.5					

Takara standard タカスタンダード株式会社	現場名称： 群馬ー前橋SR SB7様邸	M I N A ミーナ	穴開け指示図	1/1
	現場番号： C2735453	プラン番号： 7407C-2011-0262T	作成日： 2022年4月24日	
	前橋営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	
