

システムバス 御見積書

御名前 大阪-南大阪SR SB4 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランスパ

作成日 2024年6月30日
プラン番号 1819G-2405-0063T
現場番号 C5098930

タカラスタンダード株式会社
◆南大阪営業所
大阪府堺市西区鳳中町10-8-2
TEL 072-275-7983 / FAX 072-275-7984

◆南大阪ショールーム
TEL 072-275-8705 / FAX 072-266-1122

商品
御見積金額 ￥1,420,000 (税込 ￥1,562,000)
()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥203,000 (税込 ￥223,300)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616(BR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	グランホワイト
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	クリスタルパールホワイト
浴槽形状	ラウンド浴槽
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ダークグレー / ブラック
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ジオマーブルアイボリー
パネルカラー(周辺)	パールホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 60Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

No.*

御名前 大阪-南大阪SR SB4

様

現場番号	C5098930	プラン番号	1819G-2405-0063T	作成日	2024/6/30
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	761,000	761,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	片引戸<800幅>(ブラック)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1	+61,500	+61,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・全面デザインハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・グランホワイト)	1	+20,000	+20,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(クリスタルパールホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
11	浴槽形状	人大ラウンド浴槽	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	あり クッションピロー:チャコールグレー	1	+199,000	+199,000
14	うるぽか湯	なし	1		
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
17	浴槽パン	あり	1		
18	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)FTB220K 水栓上部カウンター(ダークグレー)	1	+72,000	+72,000
19	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:KVK FTB220K	1		
20	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
21	カウンター	人造大理石カウンター	1		
22	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
23	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザインハイクラス)(Kパネル)	1	+55,000	+55,000
24	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
25	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
26	換気機器	天井換気扇ブラック	1	+3,000	+3,000
27	換気機器開口	工場開口	1		
28	照明	ストレーライン照明(調光機能付・ラグジュアリーミラー対応用)	1	+91,000	+91,000
29	天井照明開口	工場開口	1		
30	ミラー	ラグジュアリーミラー(全幅タイプ)	1	+117,000	+117,000
31	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		

御名前 大阪-南大阪SR SB4 様

現場番号	C5098930	プラン番号	1819G-2405-0063T	作成日	2024/6/30
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
33	収納棚	収納棚なし	1		
34	風呂フタフック	風呂フタフック(固定式)(ホワイト)	1	+4,000	+4,000
35	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
36	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
37	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			37		¥1,420,000

商品総合計	37	¥1,420,000
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥203,000 (税込 ¥223,300)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

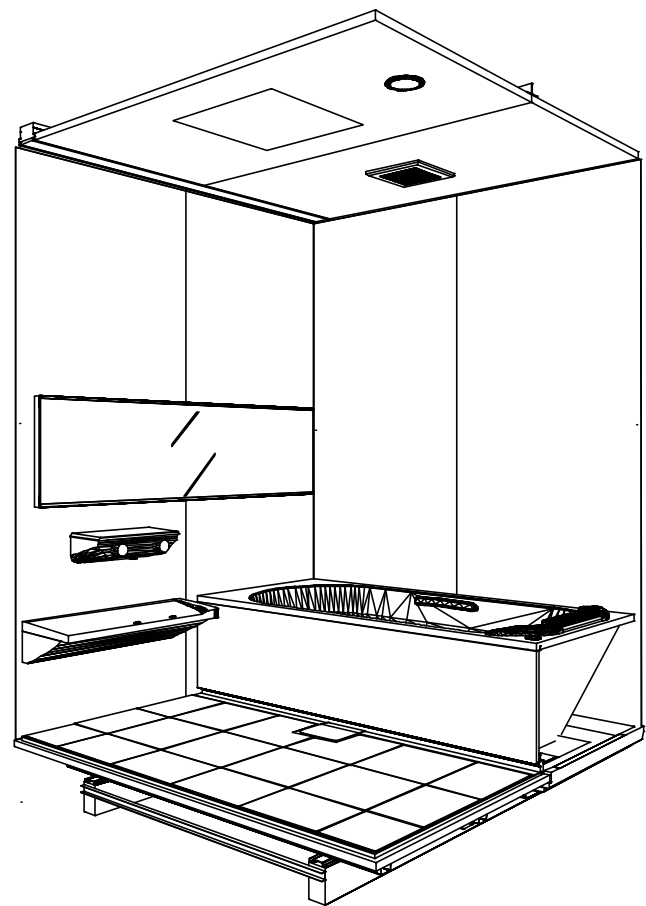

鳥瞰図

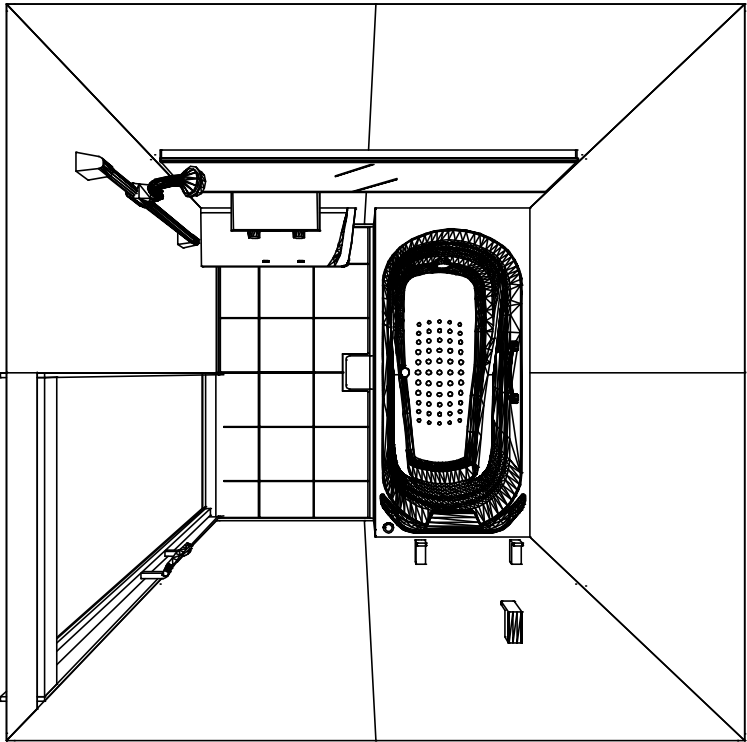

1616

フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： 大阪-南大阪SR SB4様邸	GRANSPA グランスバ	姿図
現場番号： C5098930	プラン番号： 1819G-2405-0063T	作成日： 2024年6月30日
南大阪営業所	担当営業 ：	担当アドバイザー：

カウンター面


浴槽側面

洗面側面


カウンター前面

■ 留意事項


* 印寸法は給水給湯管の突出寸法 18mmを含みます。

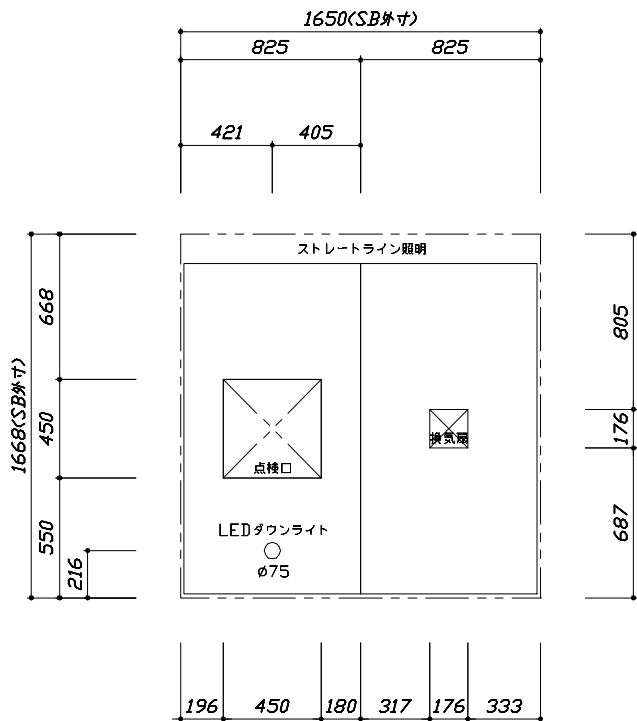

< 天井伏図 >

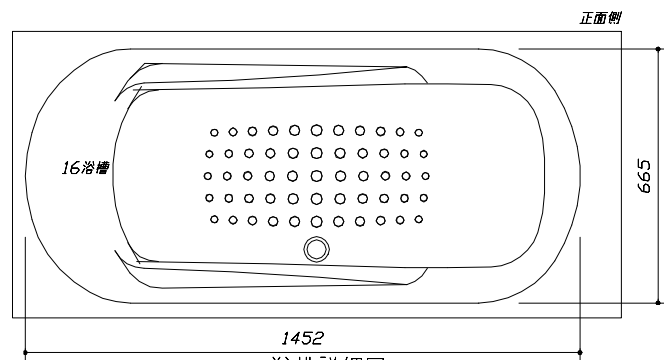

< 浴槽詳細図 >

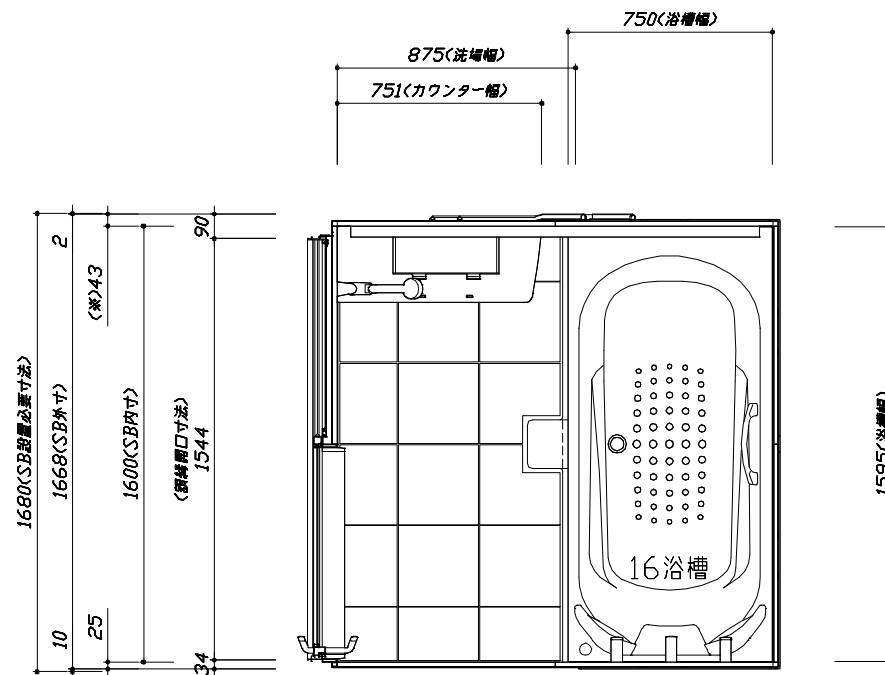

< 平面図 >

Takara standard
タカラスタンダード株式会社


現場名称： 大阪-南大阪SR SB4様邸
現場番号： C5098930
南大阪営業所

GRANSPA グランspa
プラン番号： 1819G-2405-0063T
担当営業：


施工図1
縮尺： 1:25,20
作成日： 2024年6月30日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

Diagram illustrating the layout of the sink unit. The unit is rectangular, with the sink (シンク) located on the right side. The counter (カウンター) is shown above the sink. The cabinet (キャビネット) is shown below the sink. The diagram is labeled with "シンク側面" (Sink side view) on the left, "シンク正面" (Sink front view) on the right, "シンク背面" (Sink back view) on the top, and "シンク底面" (Sink bottom view) on the bottom.





＜カウンタ－対面図＞

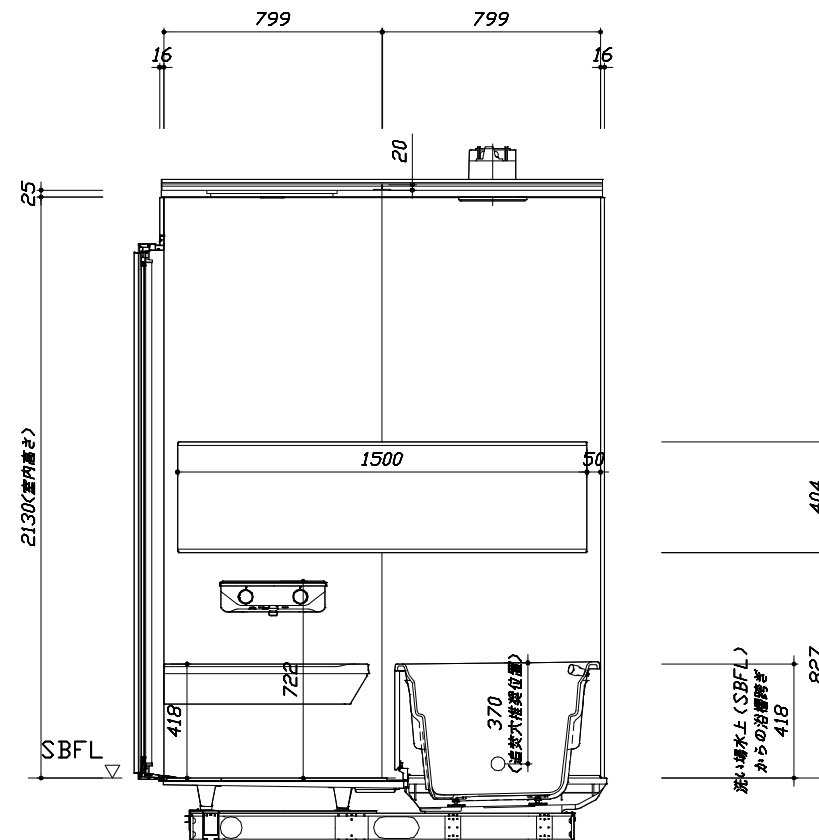

＜カウンタ一面図＞


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間とは架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

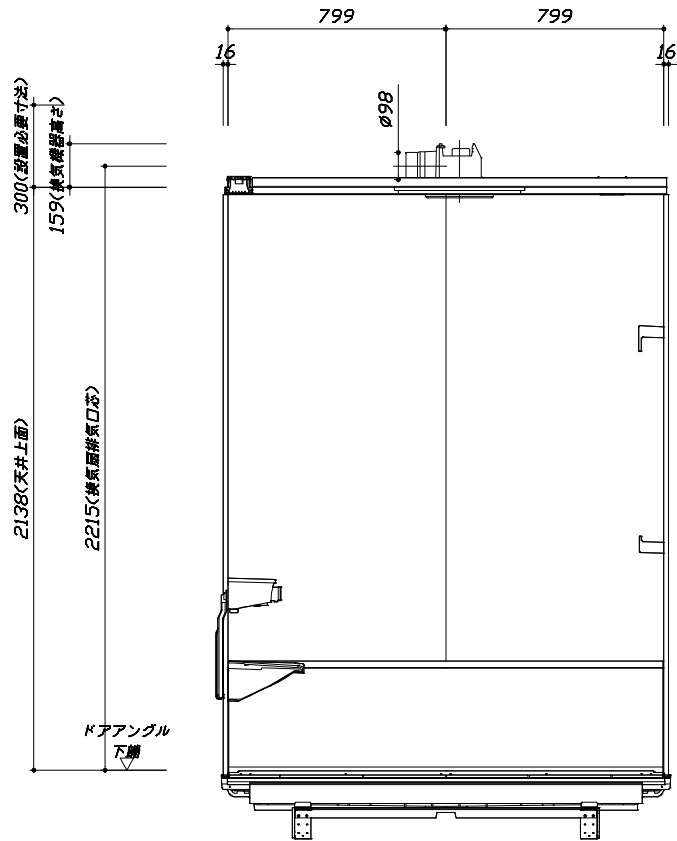

< 浴槽側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

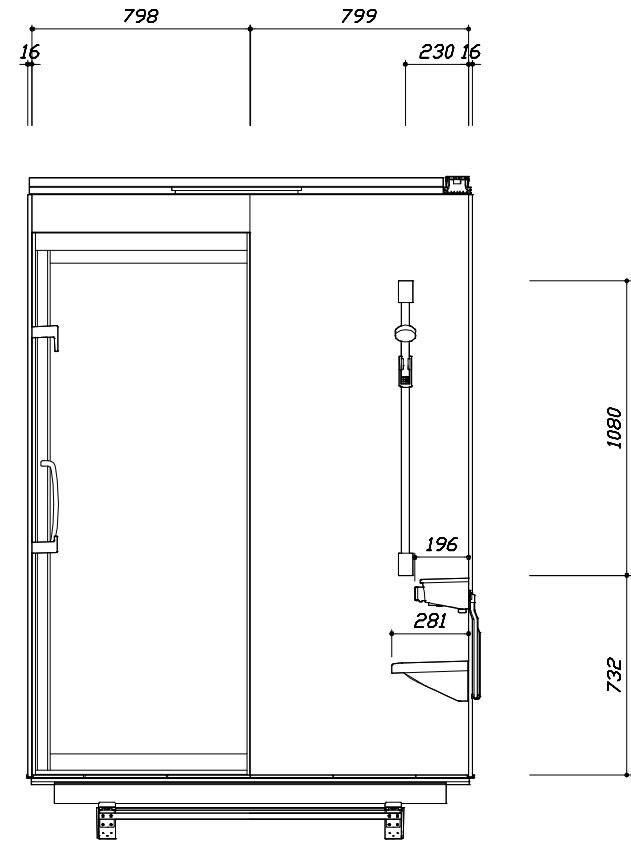

< 洗面側面図 >

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 大阪-南大阪SR SB4様邸
現場番号： C5098930
南大阪営業所

GRANSPA グランスパ
プラン番号： 1819G-2405-0063T
担当営業： 担当アドバイザー：

施工図3 縮尺： 1:20
作成日： 2024年6月30日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	BR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ラウンド浴槽 グリップ付（305リットル）追い焚き穴：あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エブロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	人造大理石カウンター：人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	化粧パドイックパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ片引戸(アルミ框/樹脂ガラス/ﾀｲﾌﾟ換気口)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂 浴槽：ASS樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	300kg

アクセサリ仕様表


ミラー	ラグジュアリーミラー くもり止め加工（13W）
収納棚	－
タオル掛け	－
洗場側水栓	サーモスタット(KVK FTB220K)（樹脂ホース：ﾒﾀﾙ調）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライトバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（スライトバーT1020S MH）
照明	ストレートライン照明（LED 23.7W調光機能付）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W) (ﾀﾞｲｳ径φ98)ブラック
フロタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	WN：クリスタルパールホワイト
カウンター	KA：ダークグレー
パネル(ｶｳﾝﾀｰ面)	JDS：ジオマーブルアイボリー
パネル(周辺・3面)	VW：パールホワイト
水栓上部ｶｳﾝﾀｰ	KA：ダークグレー
浴槽エブロン	K：ブラック
洗場	PW：グランホワイト
ドア / 天井	B：ブラック / B：チャコールブラック
収納棚	－
タオル掛け	－
ランドリースेट	－

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

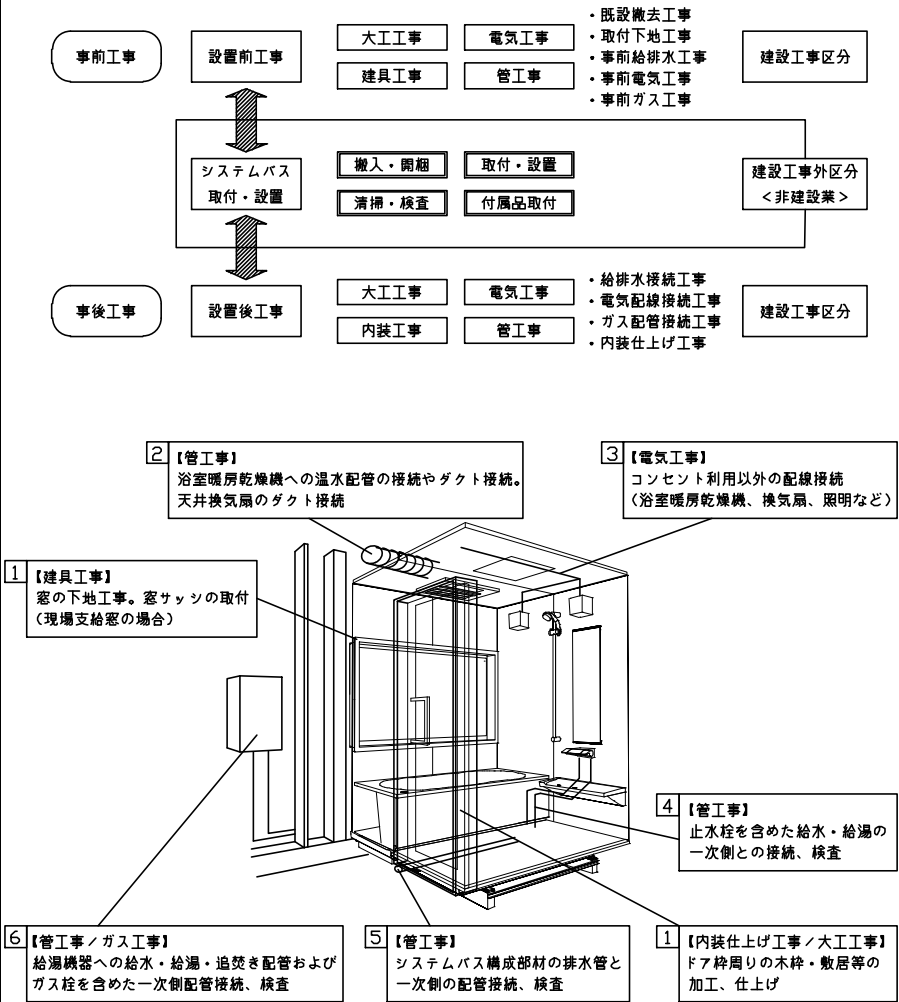

■システムバス 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置	
設置前工事	1 2 3	大工 土 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
		電気	換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
			浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
			架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン、洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トリアップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トリアップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
		大工	排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
		電気	浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
	4 5 6	管	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザークーパーの外壁取付					○	○		建築の外装仕上げ工事
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事					○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
	1 2 3	管	建築側排水配管との接続工事 【注記 3】					○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）					○	□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
		電気 他	内装仕上げ工事	○		○					床、ドア鉋縁、脱衣室仕上げ工事
			浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする

■ 排水配管工事注意事項


- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



■ 給水給湯管工事注意事項



- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

＜給水立上げイメージ図＞





■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より 265mm 下がりで打設してください。

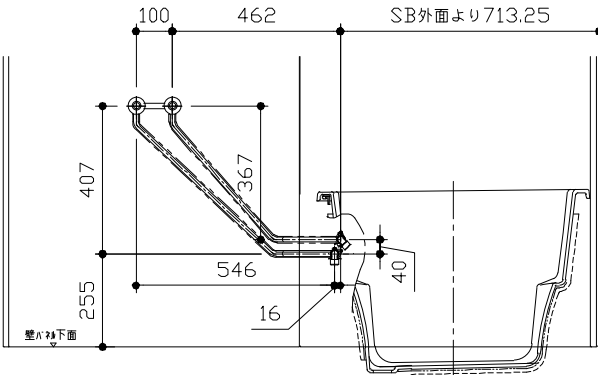


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230

＜給水給湯管取合詳細図＞

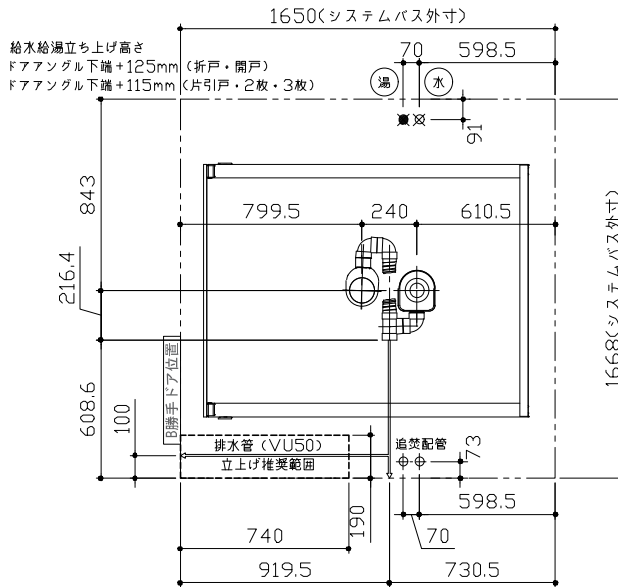

■ 設備記号

記号	記号の意味
×	給水位置
●	給湯位置



＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

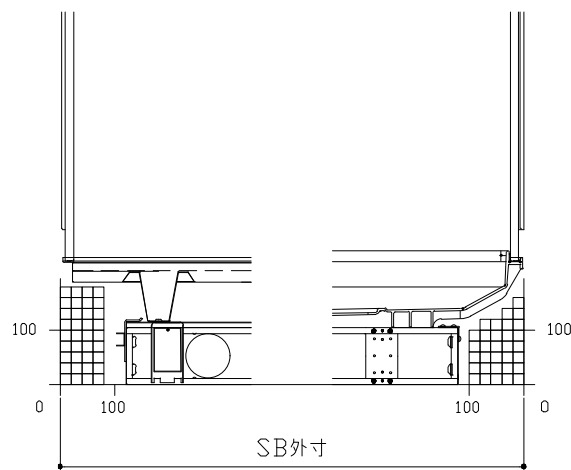


B矢視




A矢視

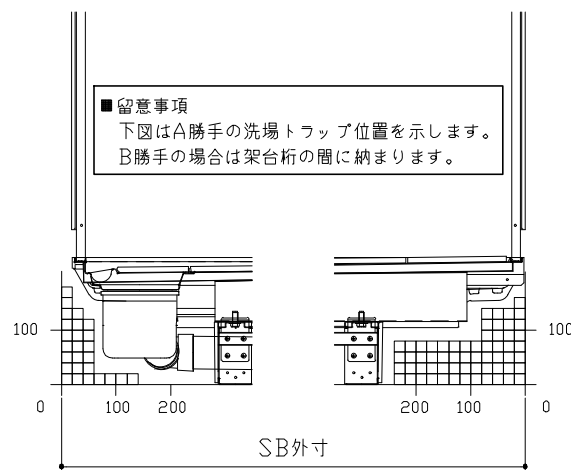


D矢視



C矢視




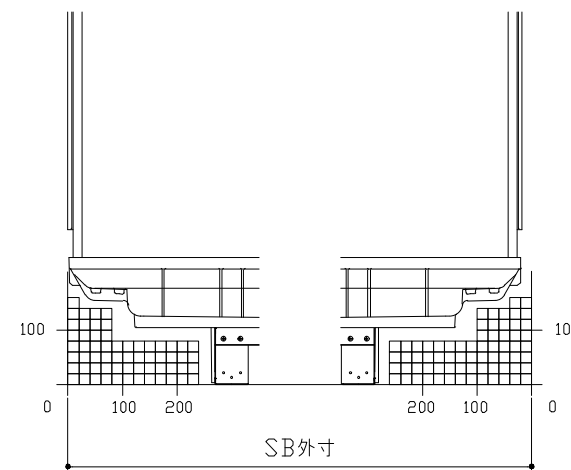



F矢視



E矢視






キープクリーンドア：片引戸・タテ型換気口

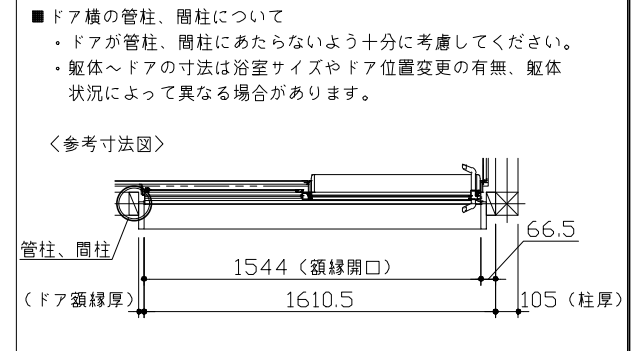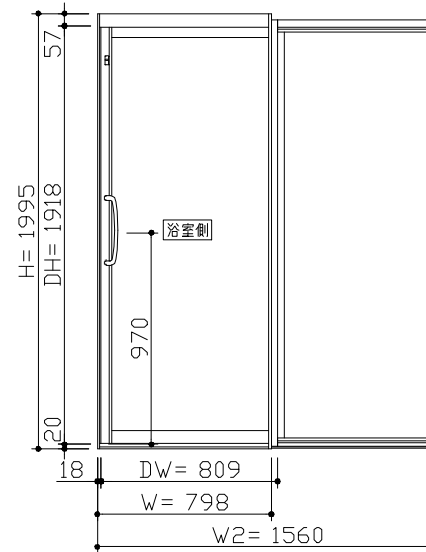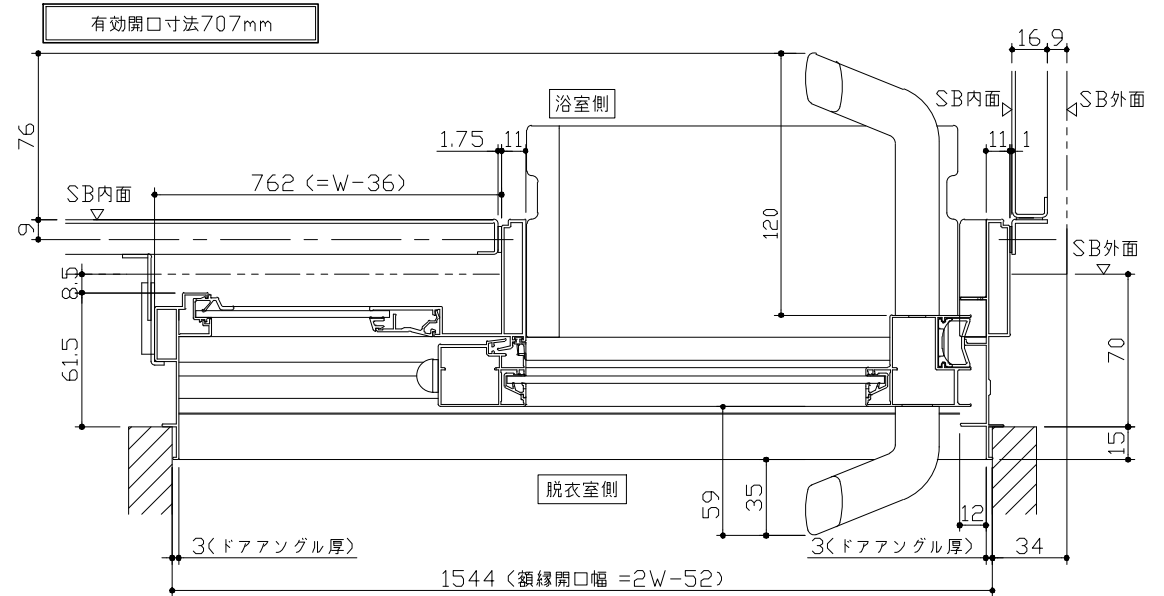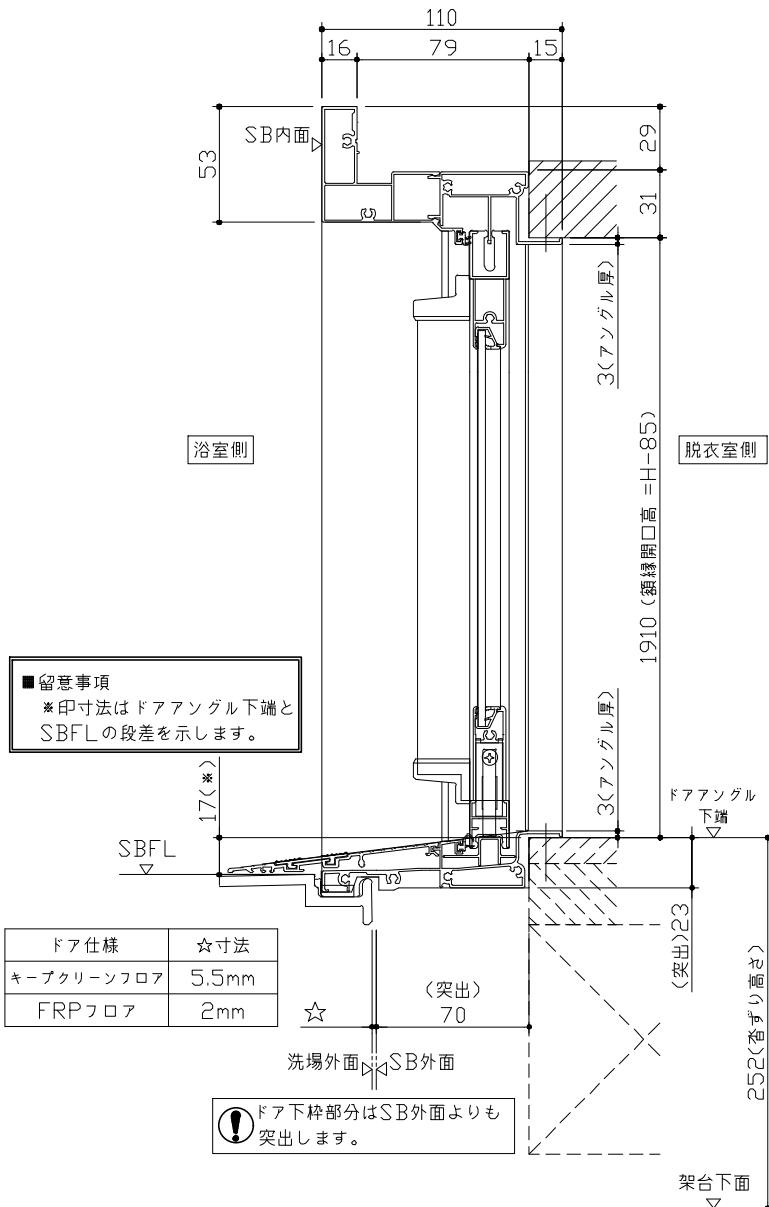





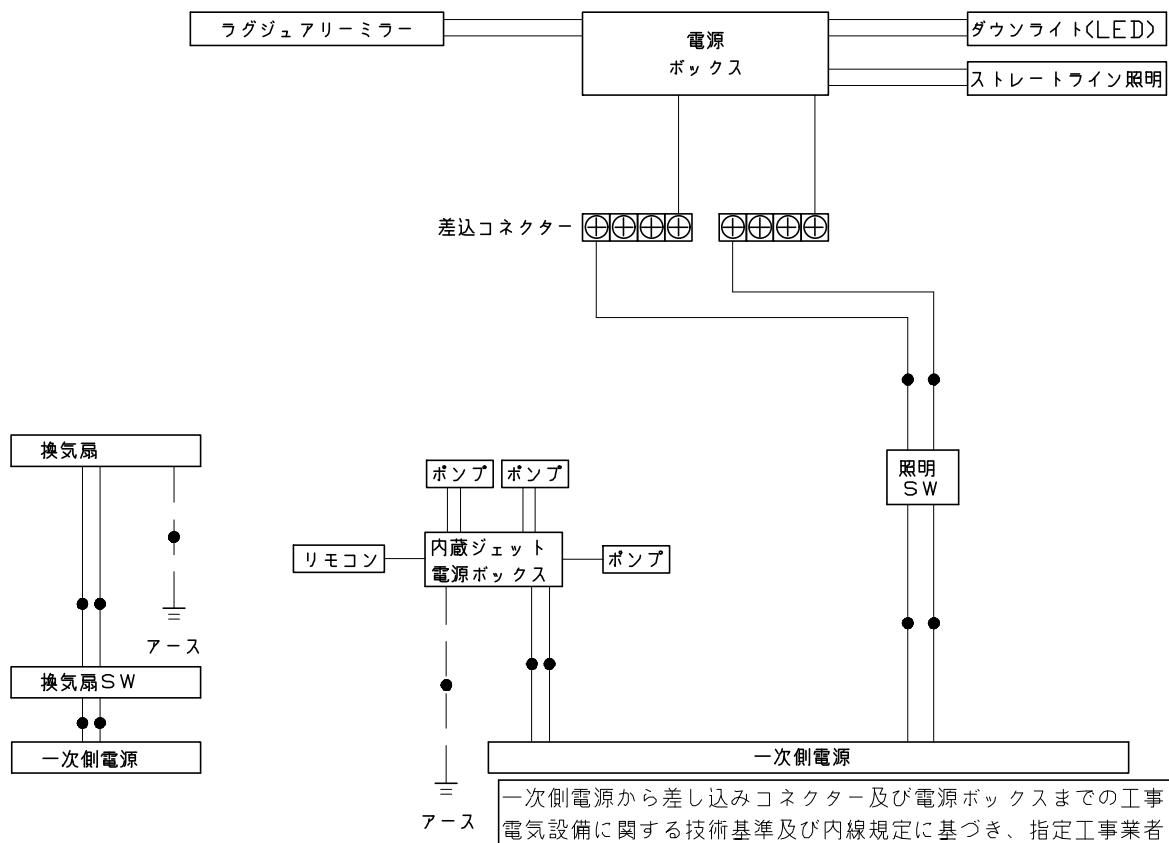


一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

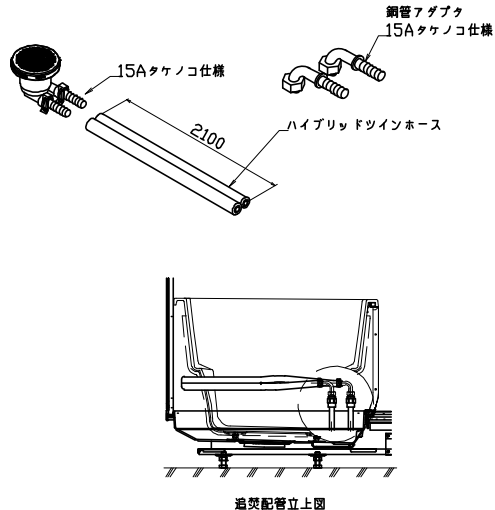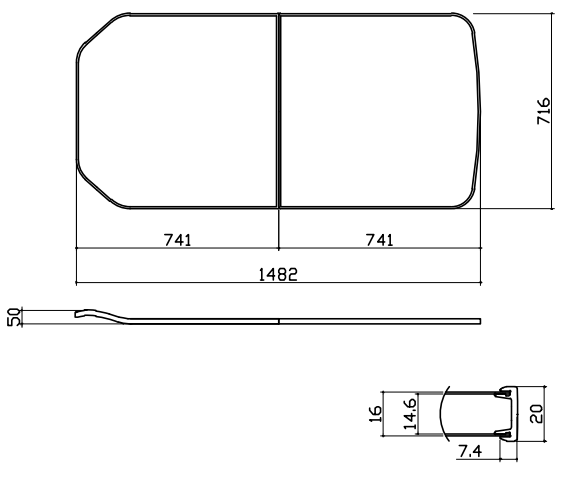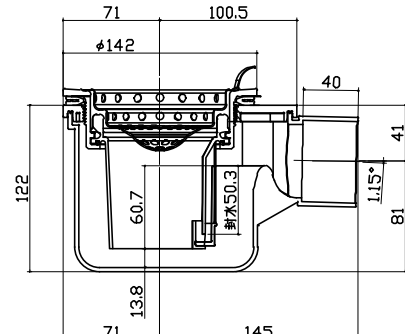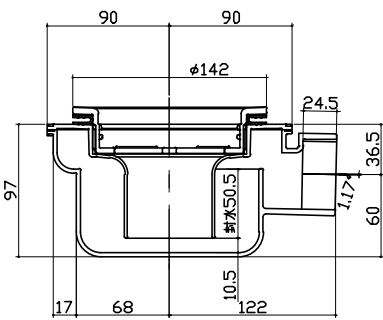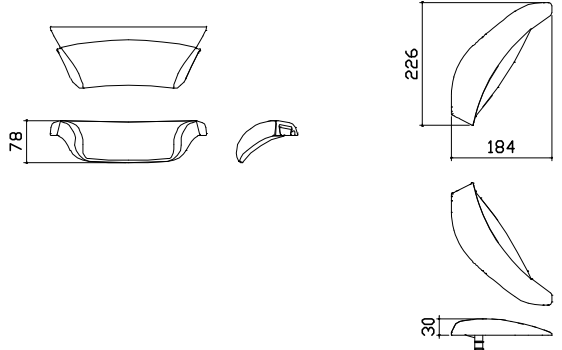循環金具・フロアダプタ関連	風呂蓋 7077MDVH-16KT	洗い場側排水トラップ																	
																			
浴槽側排水トラップ	肩包み湯①	肩包み湯②																	
	リモコン (浴室に設置) ポンプ (浴槽に組み付け) 電源ボックス (天井上設置) 電源端子台 (AC100V、アース接続) <table><tr><td colspan="2">2ヶ所噴流ジェットポンプ仕様</td></tr><tr><td>ポンプ品番</td><td>HJPN-100K</td></tr><tr><td>電源電圧</td><td>AC100V</td></tr><tr><td>周波数</td><td>50/60 Hz共通</td></tr><tr><td>流量</td><td>36 L/min</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>130W</td></tr><tr><td>駆動</td><td>定格運転時にて15μ以下</td></tr><tr><td>常用使用最高水量</td><td>45℃</td></tr></table> ※朝日興業製	2ヶ所噴流ジェットポンプ仕様		ポンプ品番	HJPN-100K	電源電圧	AC100V	周波数	50/60 Hz共通	流量	36 L/min	消費電力	130W	駆動	定格運転時にて15μ以下	常用使用最高水量	45℃	現地組付け部材 クッションピロー (浴槽に組付け) 本体：発泡PE 肩湯セットK (浴槽に組付け) 本体：SAS 	
2ヶ所噴流ジェットポンプ仕様																			
ポンプ品番	HJPN-100K																		
電源電圧	AC100V																		
周波数	50/60 Hz共通																		
流量	36 L/min																		
消費電力	130W																		
駆動	定格運転時にて15μ以下																		
常用使用最高水量	45℃																		
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 大阪-南大阪SR SB4様邸 現場番号： C5098930 南大阪営業所	GRANSPA グランspa プラン番号： 1819G-2405-0063T 担当営業：	部材詳細図 2/3 作成日： 2024年6月30日 担当アドバイザー：																

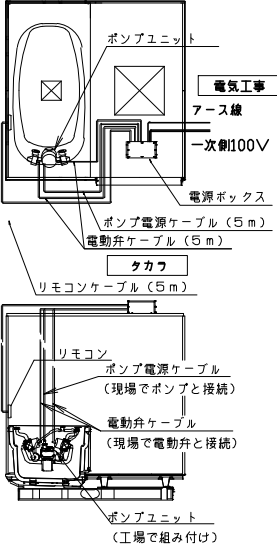肩包み湯③			
【工事範囲】 当社工事範囲 1. 電源ボックスの取付 2. ポンプ電源ケーブルの配線及びポンプユニットと電源ボックスの接続 3. 電動弁ケーブルの配線及び電動弁と電源ボックスの接続 4. リモコンケーブルの配線、電源ボックス及びリモコンの接続 5. リモコンの取付 電気工事業者様 工事範囲 1. 電源ボックスへ一次側100Vの接続 2. アース工事 3. 電源回路に漏電遮断機の設置 ■留意事項 (1) ポンプユニットは、工場で浴槽に組み付けられています。 (2) 消音ポンプを使用しておりますが、騒音や振動のトラブルを避けるため、2階及び集合住宅へは設置しないでください。 電気工事 			
Takara standard タカラストانダード株式会社		現場名称： 大阪-南大阪SR SB4様邸 現場番号： C5098930 南大阪営業所	GRANSPA グランspa プラン番号： 1819G-2405-0063T 担当営業： 部材詳細図 3/3 作成日： 2024年6月30日 担当アドバイザー：

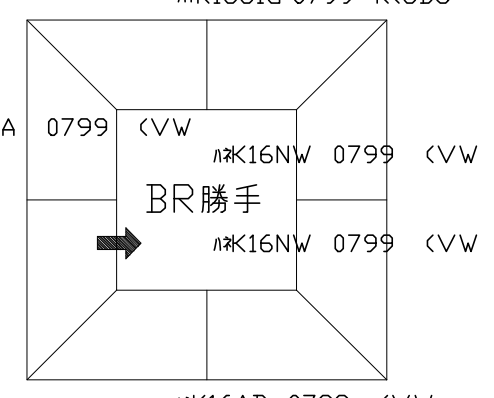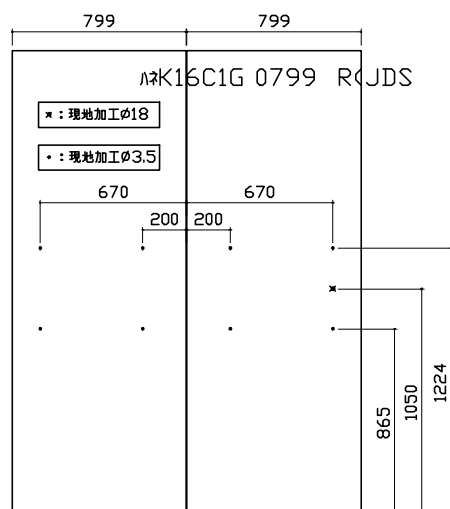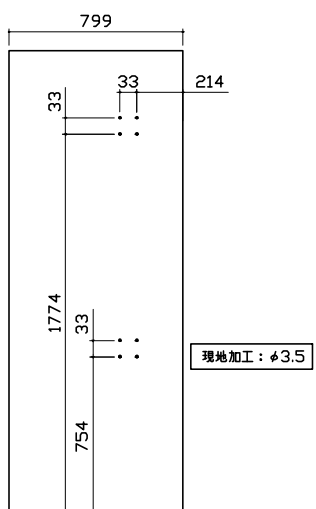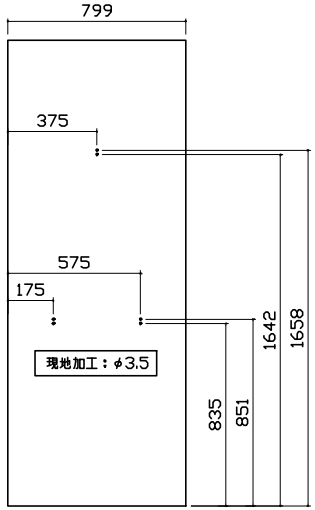パネル割図	ミラー	シャワーフックスライドバー
ΛK16C2B 0799 L<JDS ΛK16C1G 0799 R<JDS ΛK16A 0799 <VW ΛK16NW 0799 <VW BR勝手 ΛK16NW 0799 <VW ΛK16AD 0799 <VW ΛK16A 0799 <VW 	ΛK16C2B 0799 L<JDS ΛK16C1G 0799 R<JDS ※：現地加工φ18 ※：現地加工φ3.5 	ΛK16A 0799 <VW 
風呂蓋収納		
ΛK16AD 0799 <VW  ■留意事項 タオルカケ・ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。		
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 大阪-南大阪SR SB4様邸 現場番号： C5098930 南大阪営業所	GRANSPA グランspa プラン番号： 1819G-2405-0063T 担当営業： 穴開け指示図 1/1 作成日： 2024年6月30日 担当アドバイザー：
