

システムバス 御見積書

御名前 支社 盛岡SR SB8 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランspa

商品
御見積金額 ¥595,000 (税込 ¥654,500)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ¥85,500 (税込 ¥94,050)

《参考》別途 現場配送費 ¥0 (税込 ¥0)

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ 1616(AL勝手)

洗い場仕様 さりらフロア(FRP)

洗い場カラー ホワイトグレー

浴槽材質 FRP

浴槽カラー ライトグレー

浴槽形状 スクエア浴槽

カウンター材質 -

カウンター/下カバーカラー -

浴槽前カウンターカラー -

エプロン材質/カラー 樹脂 / ライトグレー

浴室パネル材質 高品位ホーロー

パネルカラー(正面) フロウストーングレー

パネルカラー(周辺) フロウストーングレー

ガス種 / 周波数 未定 / 50Hz

◆ 御確認事項

☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には、弊社 支店営業所等へお問い合わせ、またはカタログにてよく御確認下さるようお願い致します。

☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

☆この御見積書の有効期間は30日間です。

作成日 2025年10月2日
プラン番号 1303H-2509-0183T
現場番号 C6693705

タカラスタANDARD株式会社
◆盛岡営業所
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割329番地
TEL 019-697-2255 / FAX 019-697-2291

◆盛岡ショールーム
TEL 019-697-2277 / FAX 019-697-2292

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

No.*

御名前 支社 盛岡SR SB8

様

現場番号	C6693705	プラン番号	1303H-2509-0183T	作成日	2025/10/2
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	769,000	769,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台(高沓ずり)	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・周辺ハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	さらりらフロア(FRP)(ホワイトグレー)	1	-85,000	-85,000
7	浴槽	FRP(ライトグレー)	1	-88,000	-88,000
8	浴槽追焚き穴	あり	1		
9	エブロン	FRP浴槽用保温材なし(ライトグレー)	1		
10	浴槽形状	FRPスクエア浴槽	1		
11	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
12	浴槽パン	なし	1		
13	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂ホース(シルバー)KF3000LTTKSTC	1	-22,000	-22,000
14	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド	1		
15	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
16	カウンター	カウンターなし(洗い場1水栓)	1	-37,000	-37,000
17	シャワーフック	シャワーフックKJ	1	+2,000	+2,000
18	シャワーフックスライドバー	なし	1	-5,000	-5,000
19	浴室パネル	ハイクラス(全面デザイン 周辺ハイクラス)(Kパネル)	1	+40,000	+40,000
20	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
21	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
22	換気機器	天井換気扇ブラック	1	+3,000	+3,000
23	換気機器開口	工場開口	1		
24	照明	ダウンライト照明(3灯)(白色)	1	-3,000	-3,000
25	天井照明開口	工場開口	1		
26	ミラー	ワイドクリアミラー(全幅タイプ)	1	+22,000	+22,000
27	風呂フタ	シャッター式風呂フタ	1	-11,500	-11,500
28	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
29	収納棚	収納棚なし	1		
30	循環金具セット	ELX	1	+11,500	+11,500
31	給水給湯管	洗い場1水栓	1		

御名前 支社 盛岡SR SB8 様

現場番号	C6693705	プラン番号	1303H-2509-0183T	作成日	2025/10/2
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	トラップカバー	洗い場側トラップカバー	1		
33	トラップカバー	浴槽側トラップカバー(浴槽パンなし)	1		
システムバス合計			33		¥595,000

商品総合計	33	¥595,000
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費

¥85,500 (税込 ¥94,050)


《参考》別途 現場配送費

¥0 (税込 ¥0)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

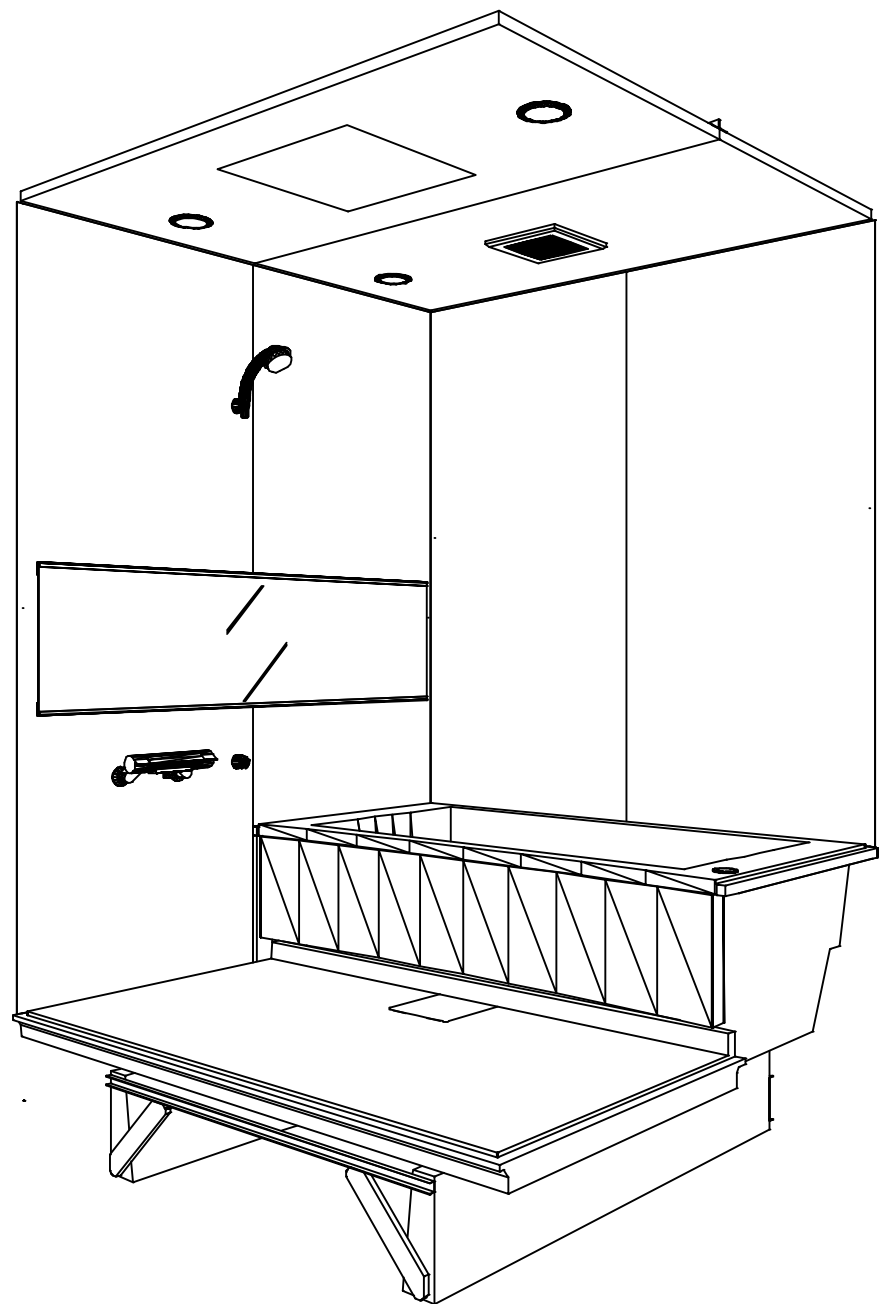

鳥瞰図

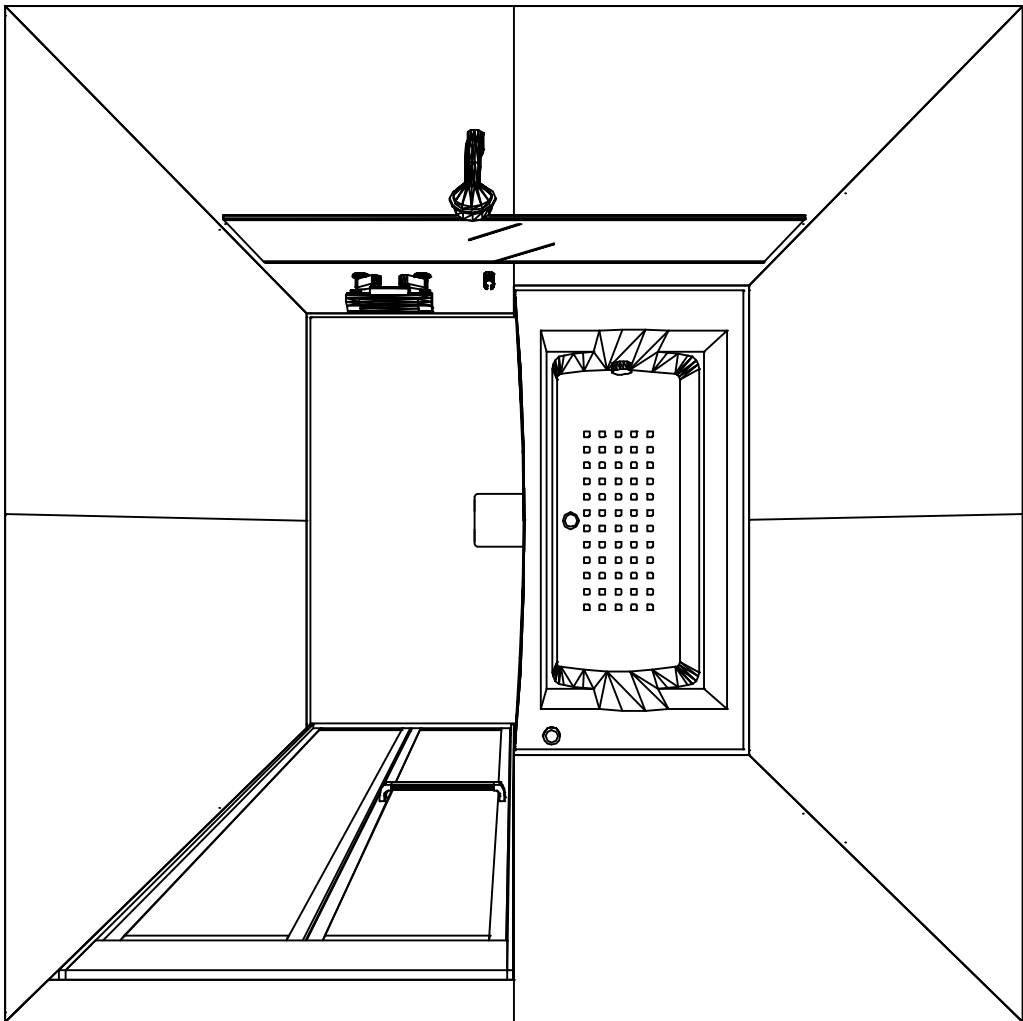

1616

フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： 支社_盛岡SR SB8様邸	GRANSPA グランスパ	姿図	
現場番号： C6693705	プラン番号： 1303H-2509-0183T	作成日： 2025年10月2日	
盛岡営業所	担当営業 ：	担当アドバイザー：	

カウンター面


洗場側面

浴槽側面


カウンター対面

■ 留意事項



* 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

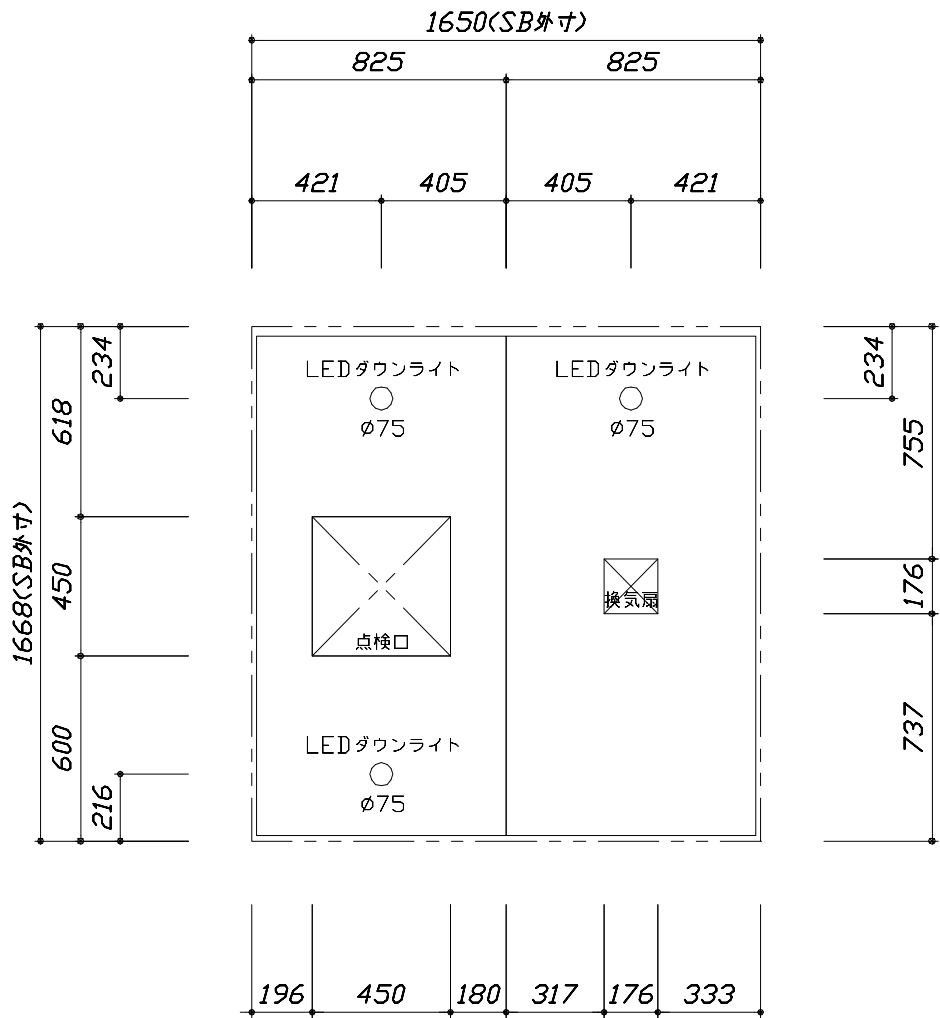

< 天井伏図 >

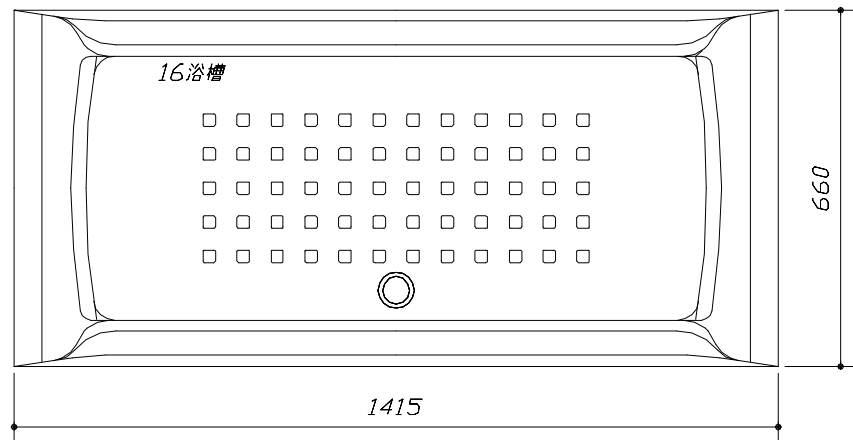




< 浴槽詳細図 >

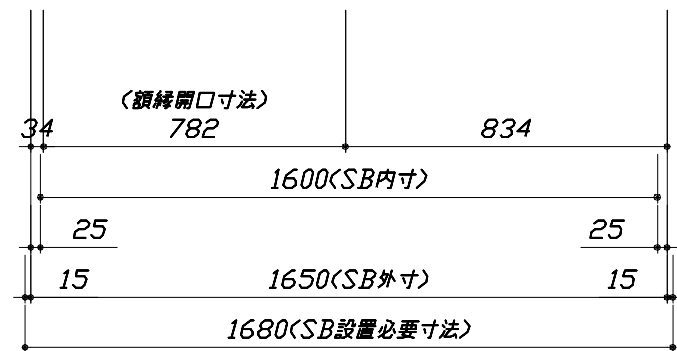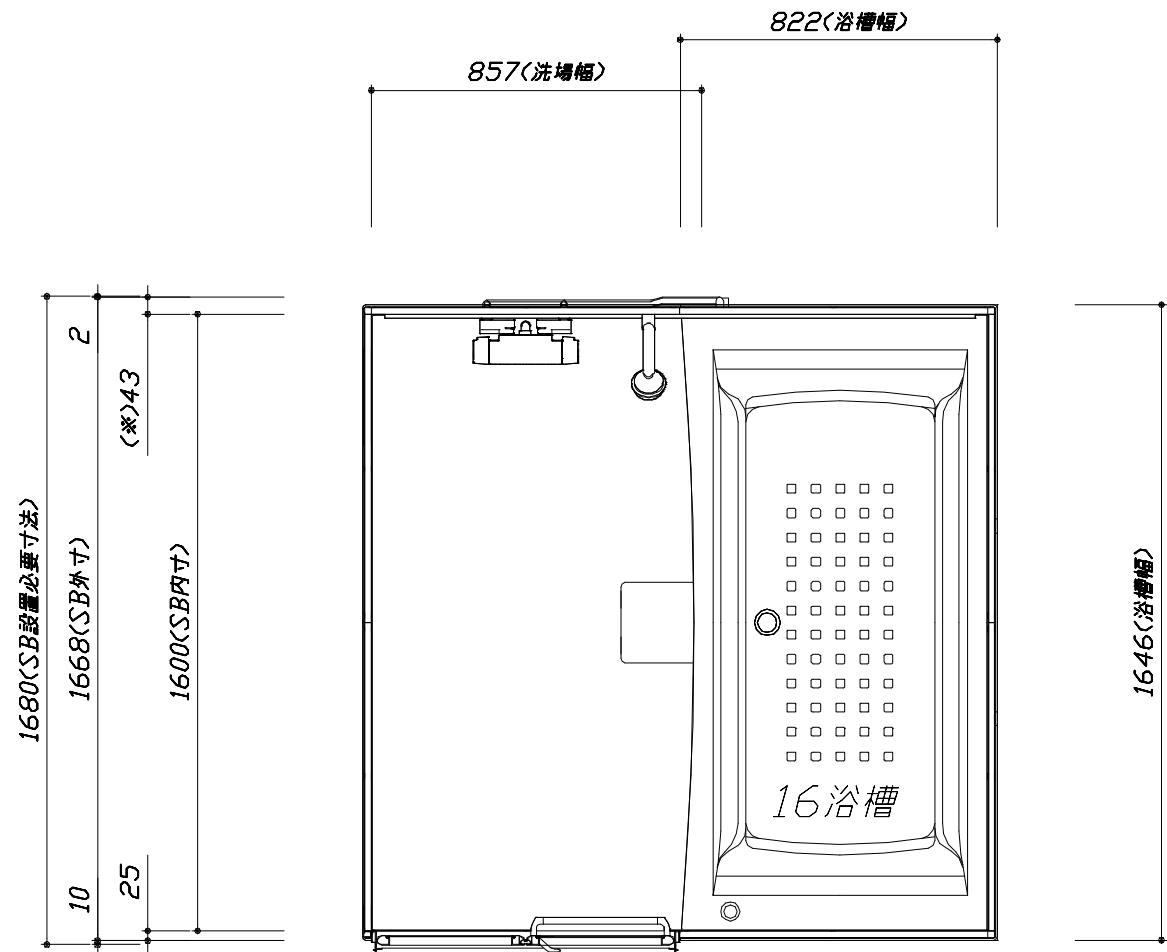

< 平面図 >

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

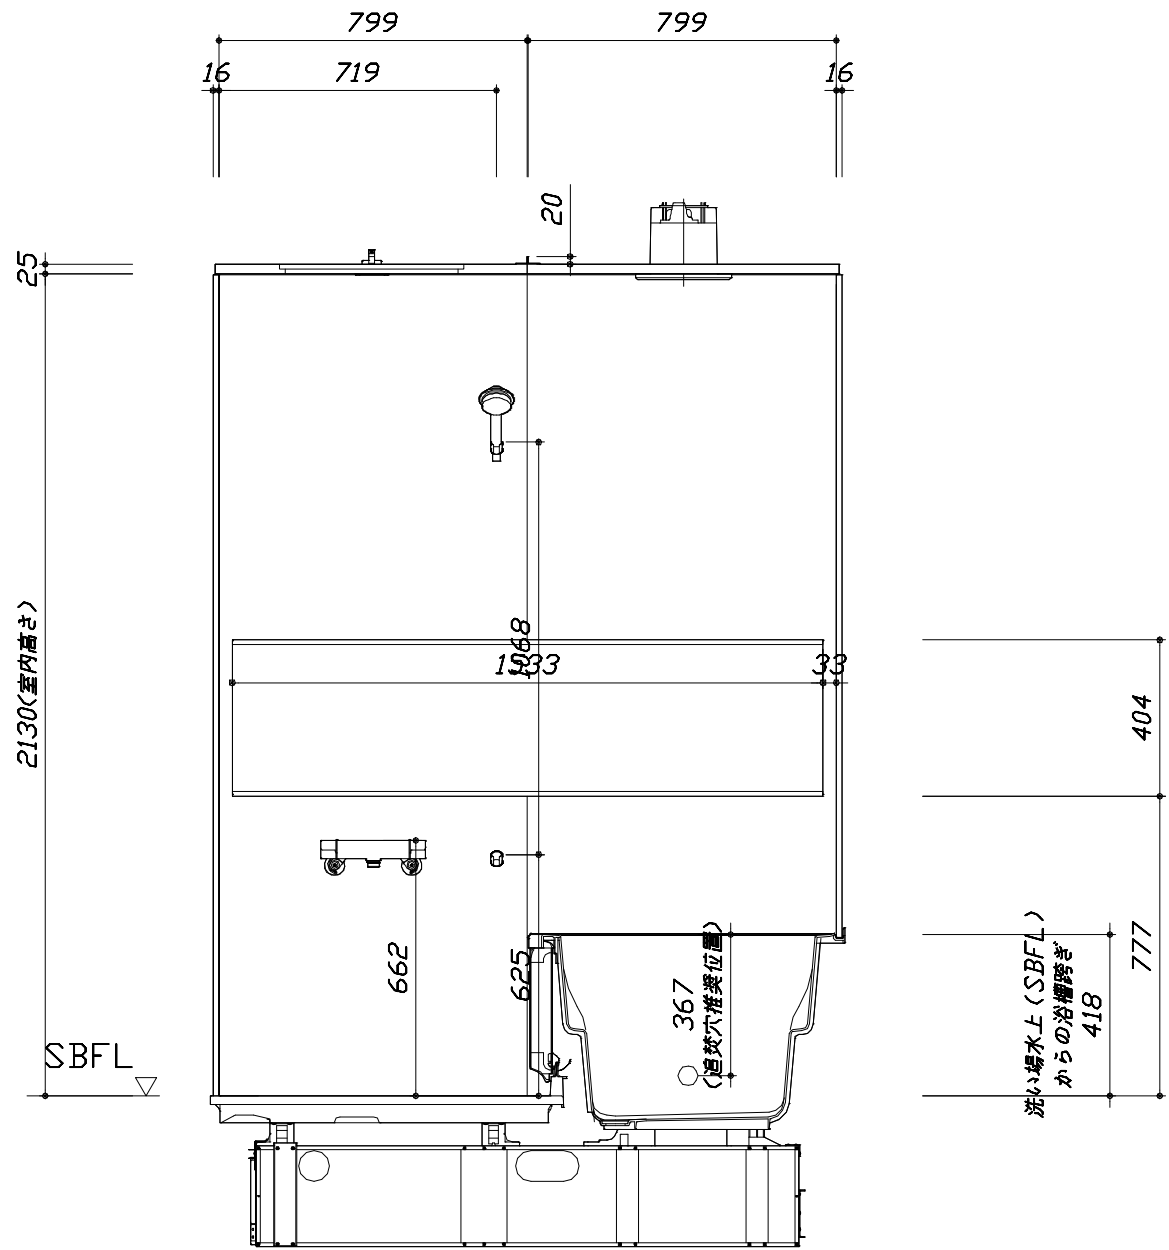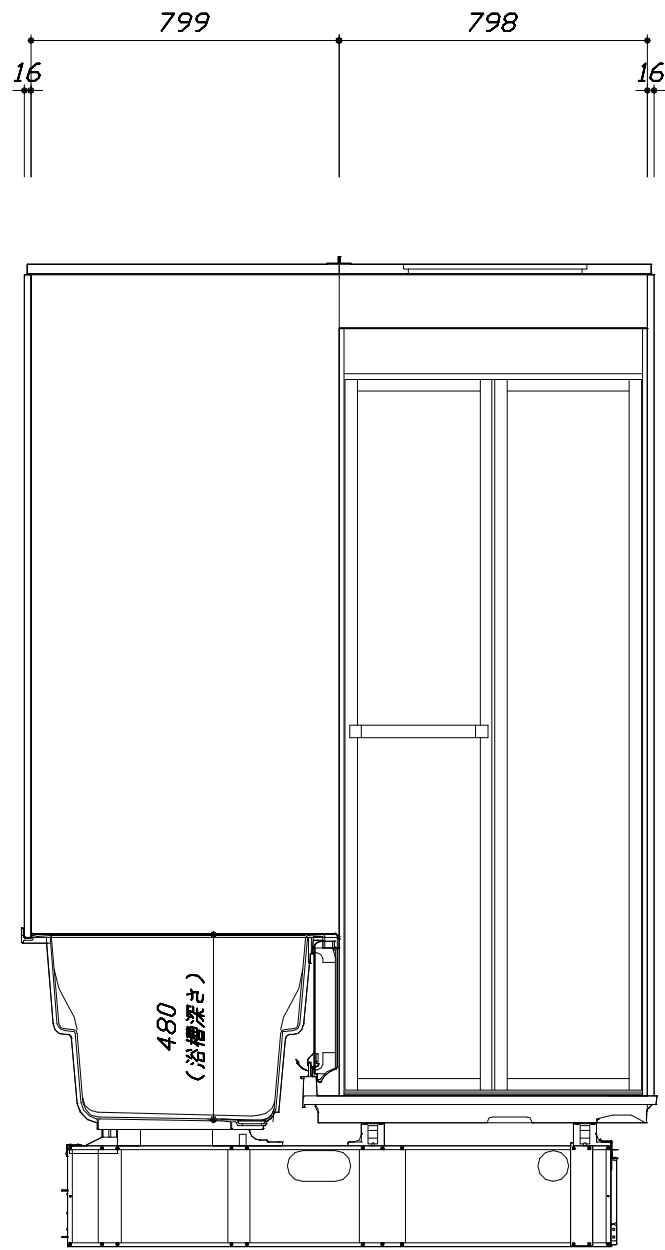



■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
420mm 下がり
(クリア寸法含む)

< カウンター対面図 >

< カウンター面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

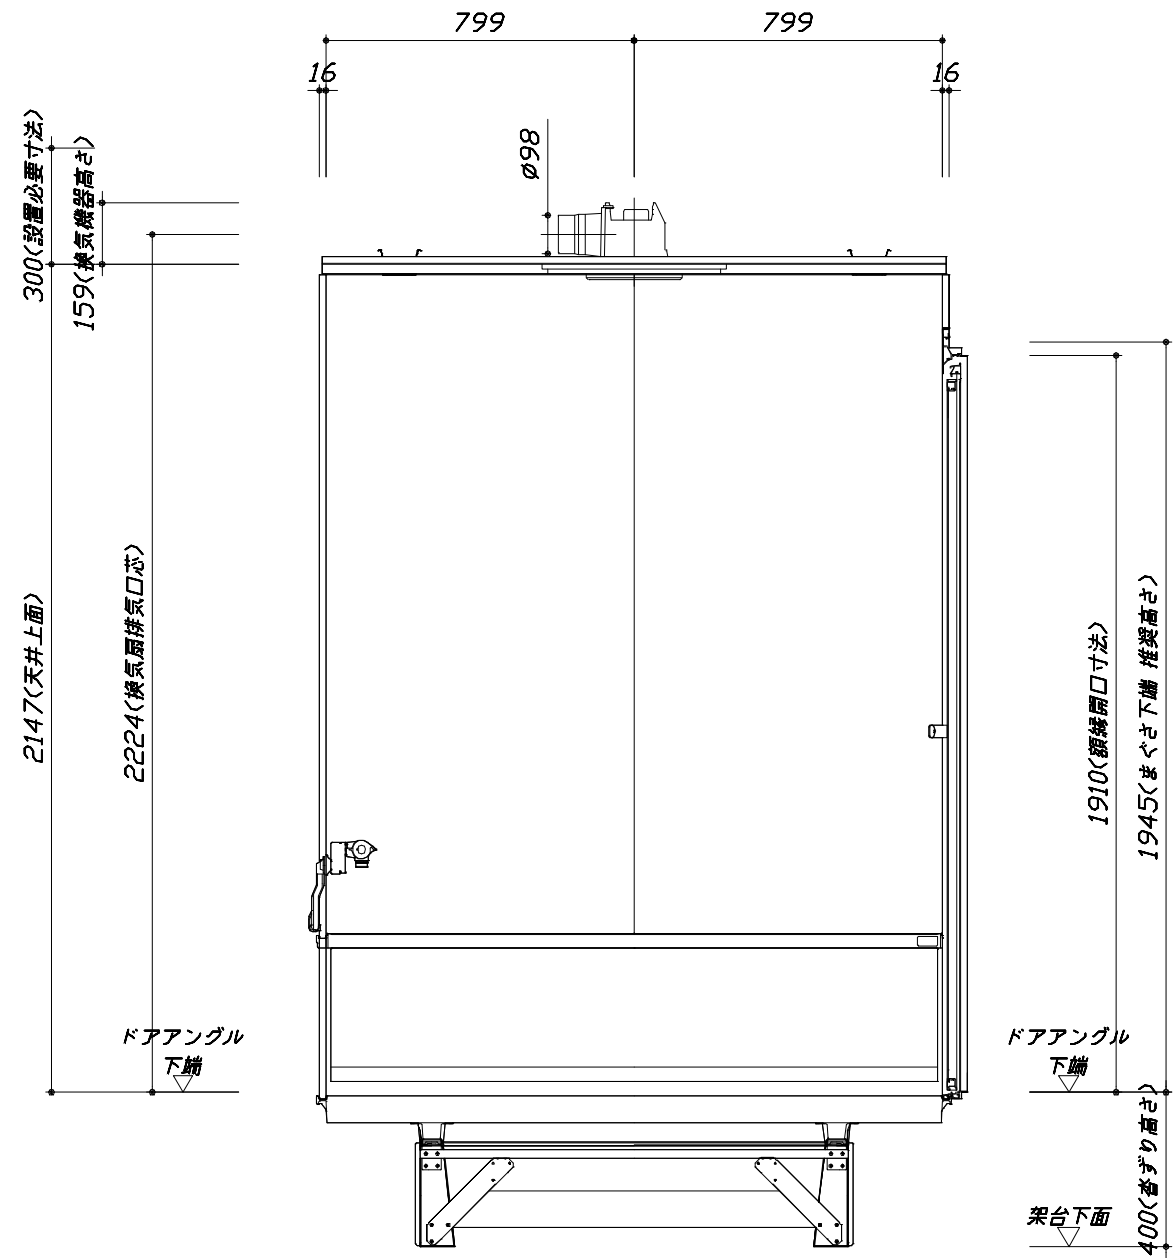

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
420mm下がり
(クリア寸法含む)

< 浴槽側面図 >

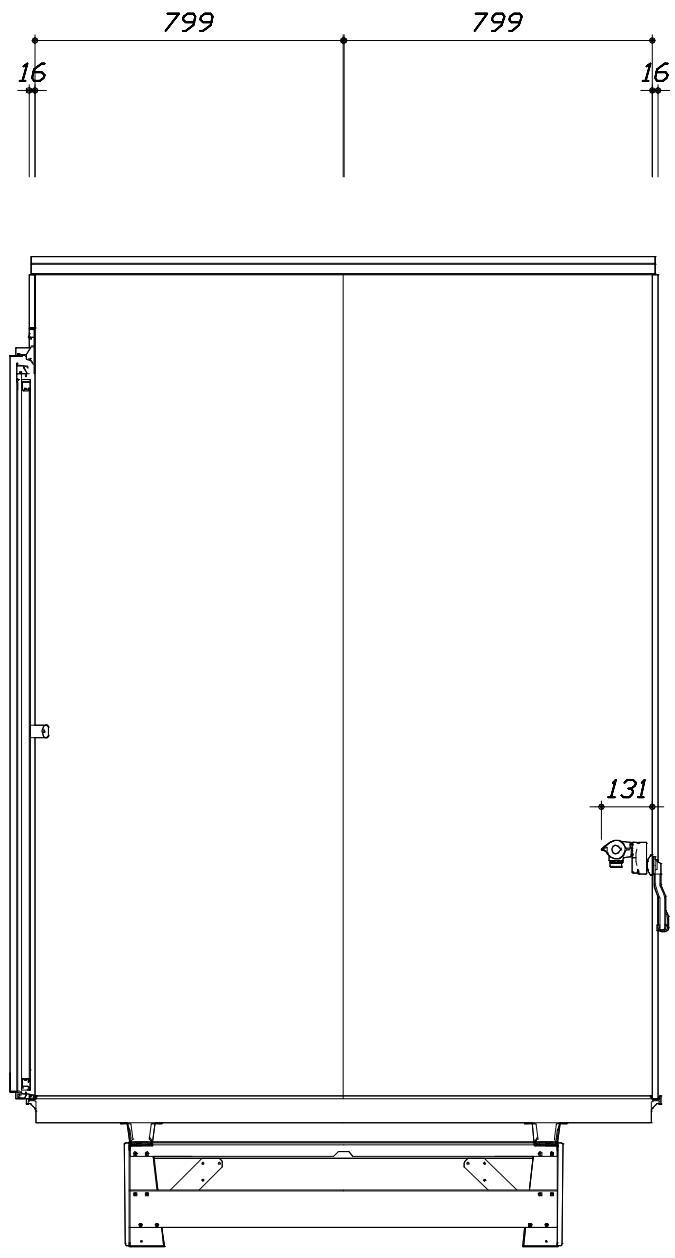

< 洗場側面図 >

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	AL勝手
架台	一体架台(高差ずり)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	さらりらフロア（FRP）
浴槽材質	ガラス繊維強化樹脂（FRP）裏面保温材（発泡ウレタン）
浴槽形状	スクエア浴槽（325リットル）追い焚き穴:あり
浴槽パン	－
浴槽エプロン	A B S 樹脂
カウンター	－
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア:19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	A B S 樹脂・封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	250kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ワイドクリアミラー くもり止め加工
収納棚	－
タオル掛け	－
洗場側水栓	サーモスタット(KF3000LTKSTC) (樹脂ホース:シルバー)
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフック（シャワーフック KJ）
照明	LEDダウンライト（LED 9.3W白色）(3灯)
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W) (ダクト径φ98)ブラック
フロフタ	シャッター式フロフタ（PP）
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットELX：ホース先端部R1/2オスネジ仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－


本体カラー

浴槽	G：ライトグレー
カウンター	－(カウンターなし)
パネル(カウンター面)	TG：フローストーングレー
パネル(周辺・3面)	TG：フローストーングレー
水栓上部カウンター	－
浴槽エプロン	G：ライトグレー
洗場	W：ホワイトグレー
ドア / 天井	W：ホワイト / B：チャコールブラック
収納棚	－
タオル掛け	－
ランドリーセット	－

<div>Takara standard</div> <div>タカラストانダード株式会社</div>	現場名称： 支社_盛岡SR SB8様邸	GRANSPA グランspa	仕様表	
	現場番号： C6693705	プラン番号： 1303H-2509-0183T	作成日： 2025年10月2日	
	盛岡営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

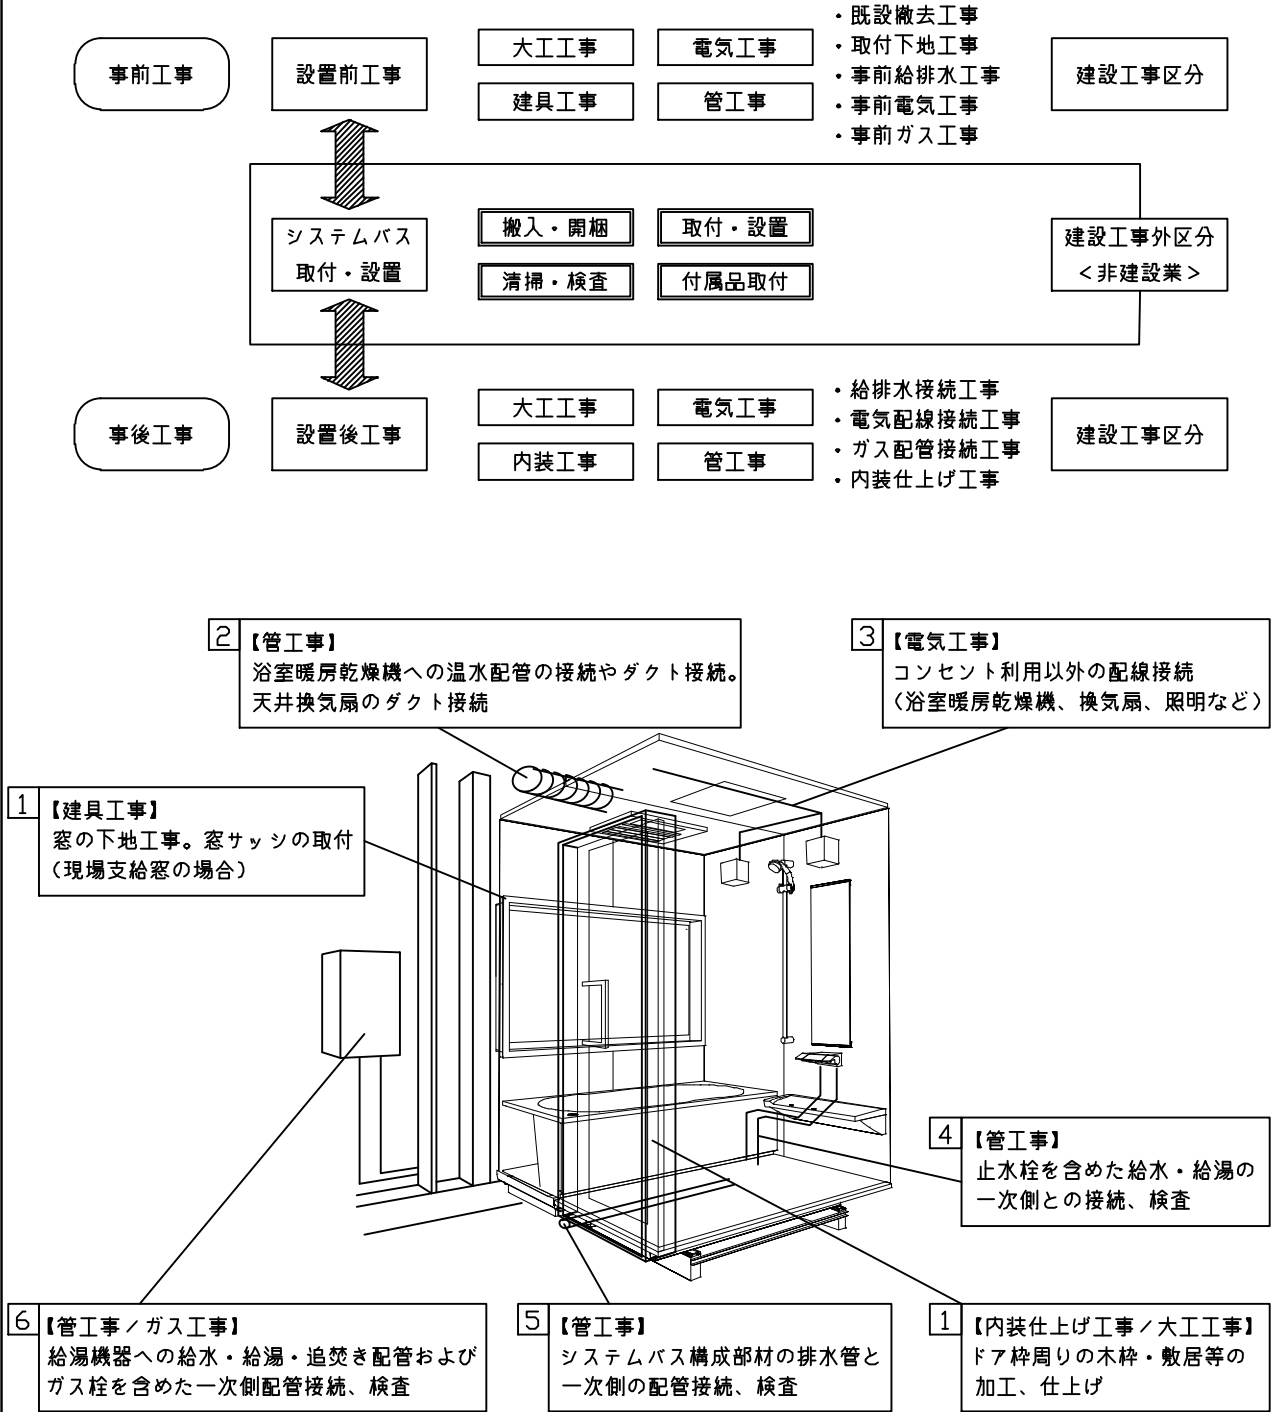

■システムバス 工事区分			参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』								
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	<div>1</div> <div>2</div> <div>3</div>	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	<div>1</div> <div>2</div> <div>3</div>	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事	
	<div>4</div> <div>5</div> <div>6</div>	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○		給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査		
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
	<div>1</div> <div>3</div>	電気 他	内装仕上げ工事	○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
			浴室用電源配線、接続工事					○		浴室機器の事後電気工事	
浴室天井裏の電源、スイッチ工事							○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする

■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。
- 貫通スリーブを使用する場合は45度エルボなどを接続し、バンドなどで固定してください。



マス状に仕上げ
排水管（横引き管・エルボ）が
土間コンクリート上に露出しない高さで配管




バンドで固定
斜めで接続しないよう配管

■ 給水給湯管工事注意事項



- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

＜給水立上げイメージ図＞

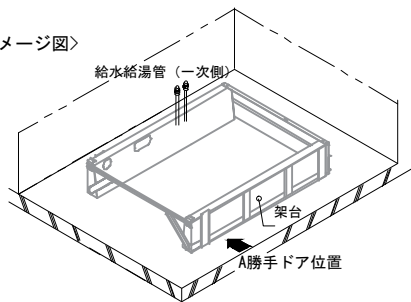



■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より420mm下がりで打設してください。

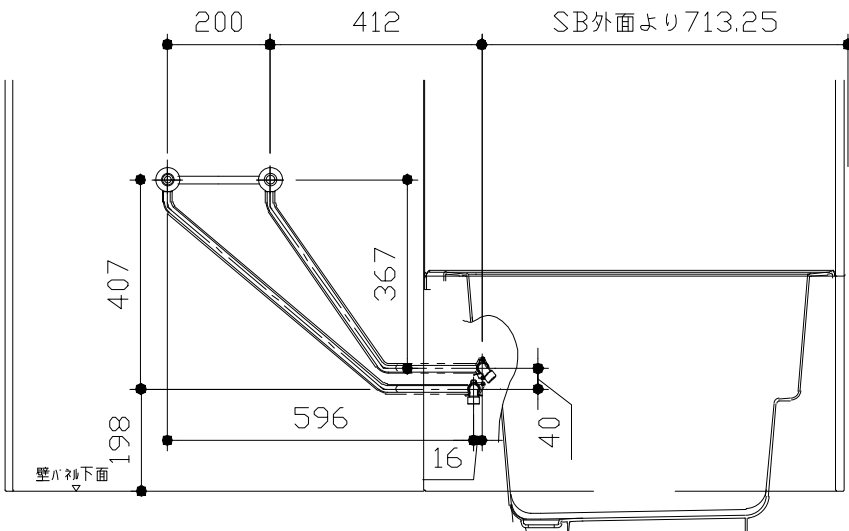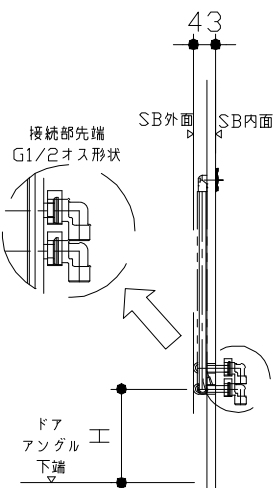



ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	182
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	173

＜給水給湯管取合詳細図＞

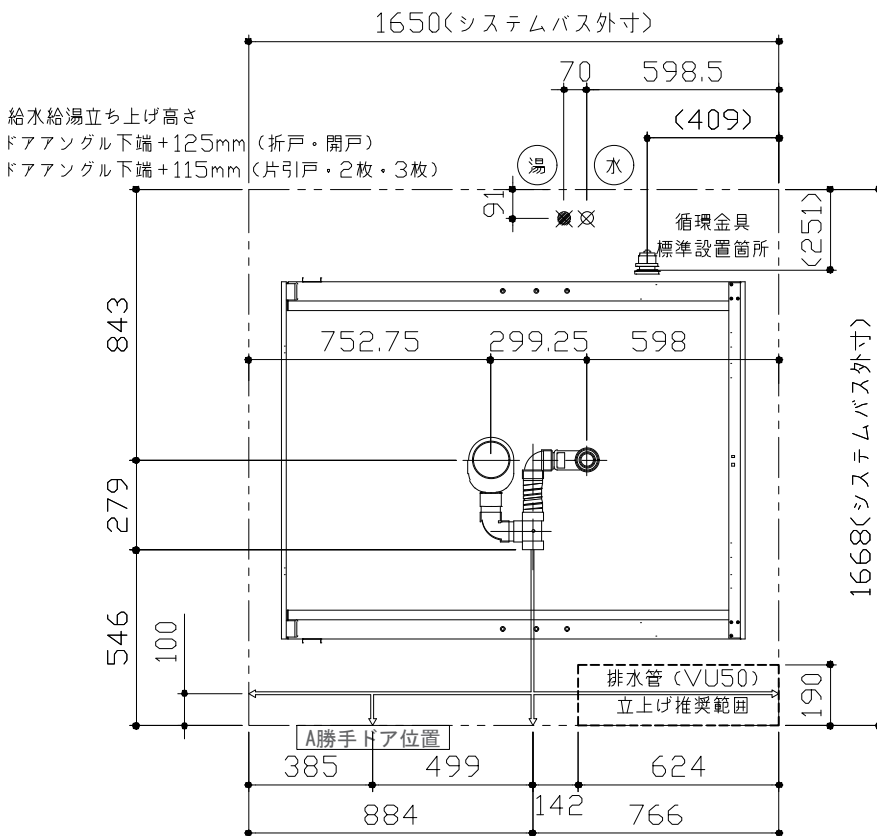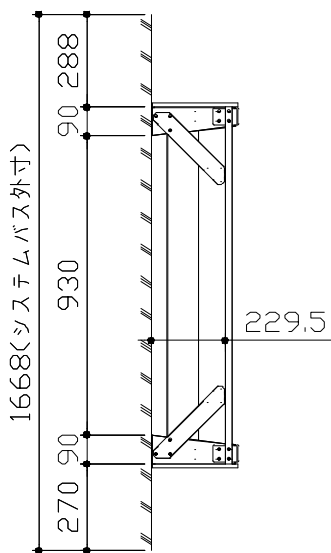


■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置



＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

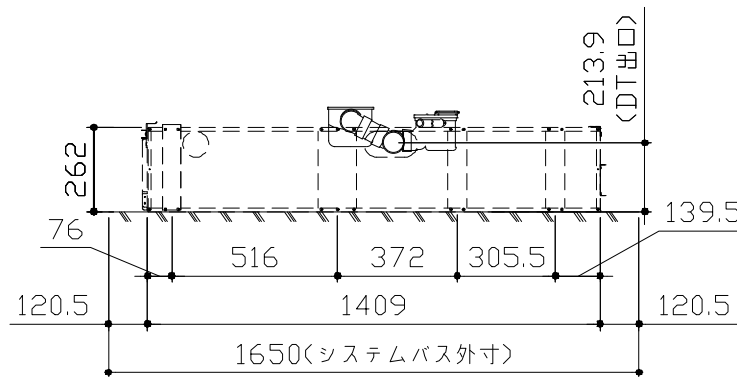


■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・カウンター面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

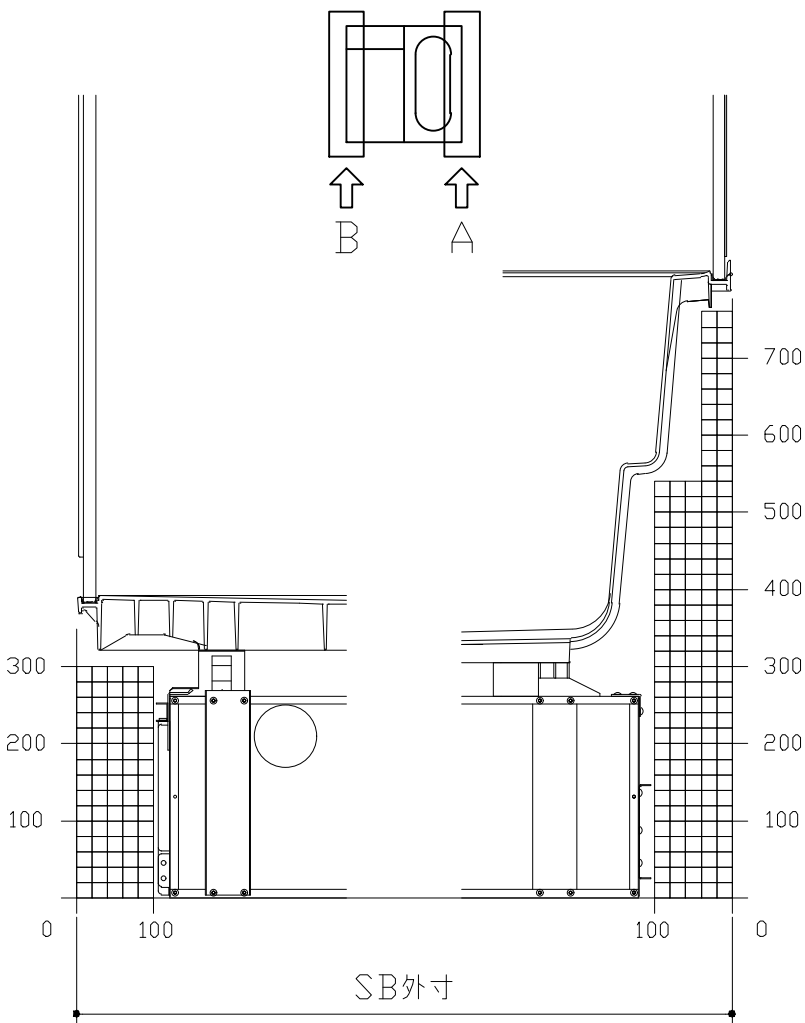


B矢視

A矢視

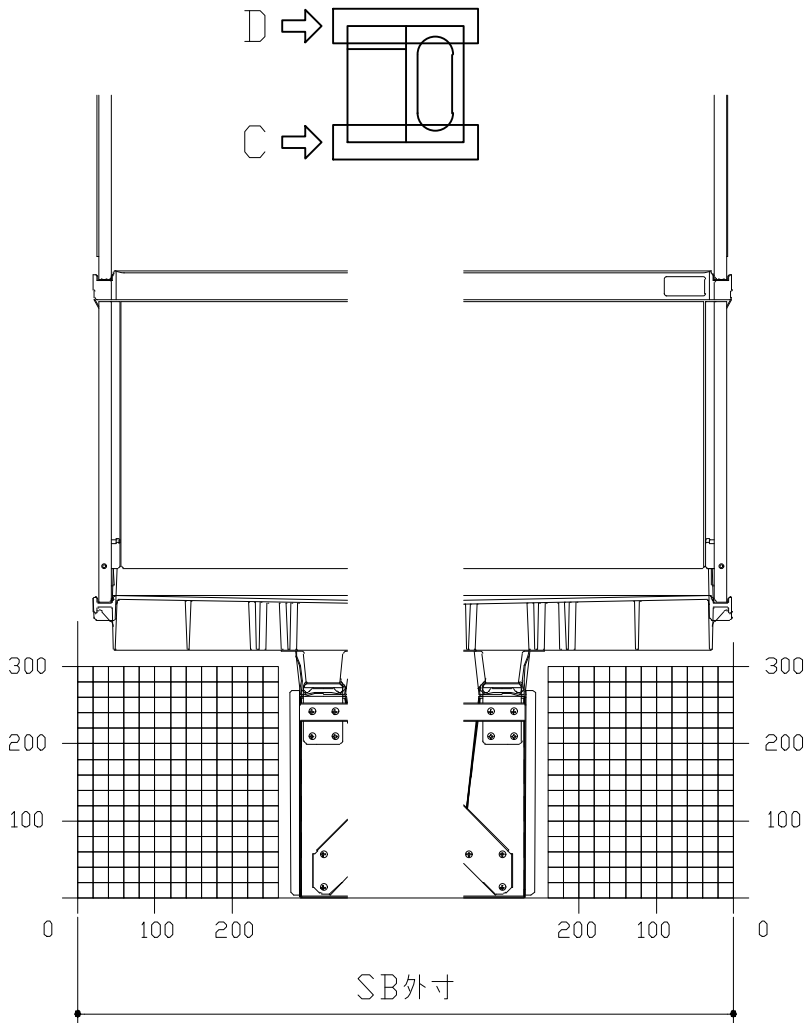

D矢視




C矢視

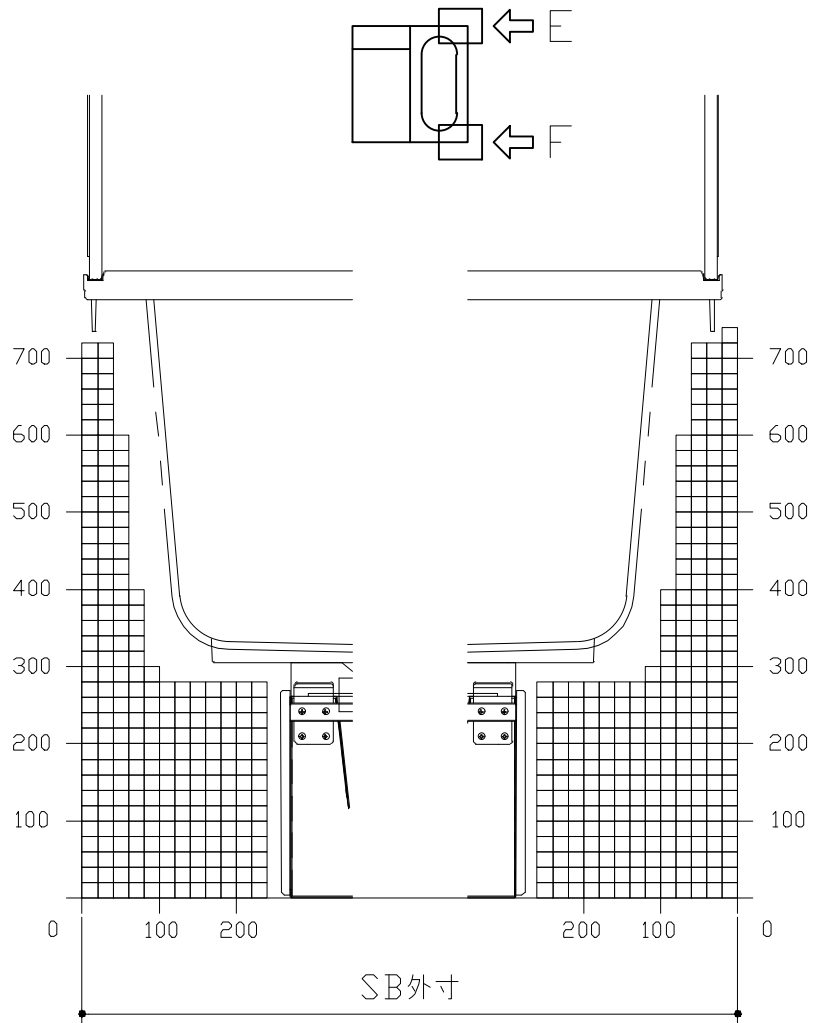

F矢視


E矢視


キープクリーンドア：折戸・上部換気口

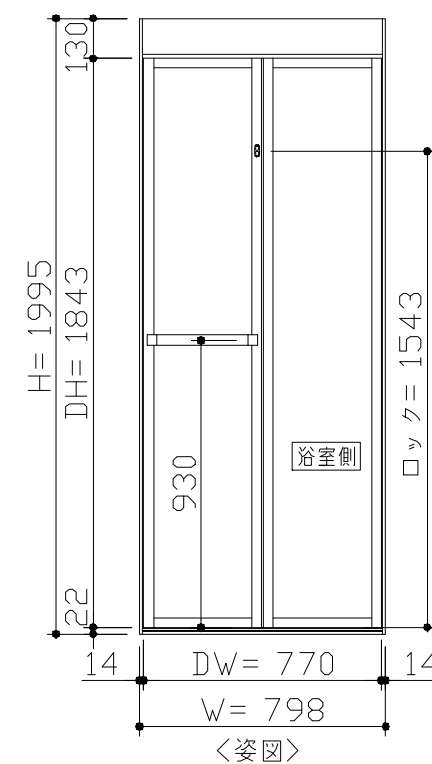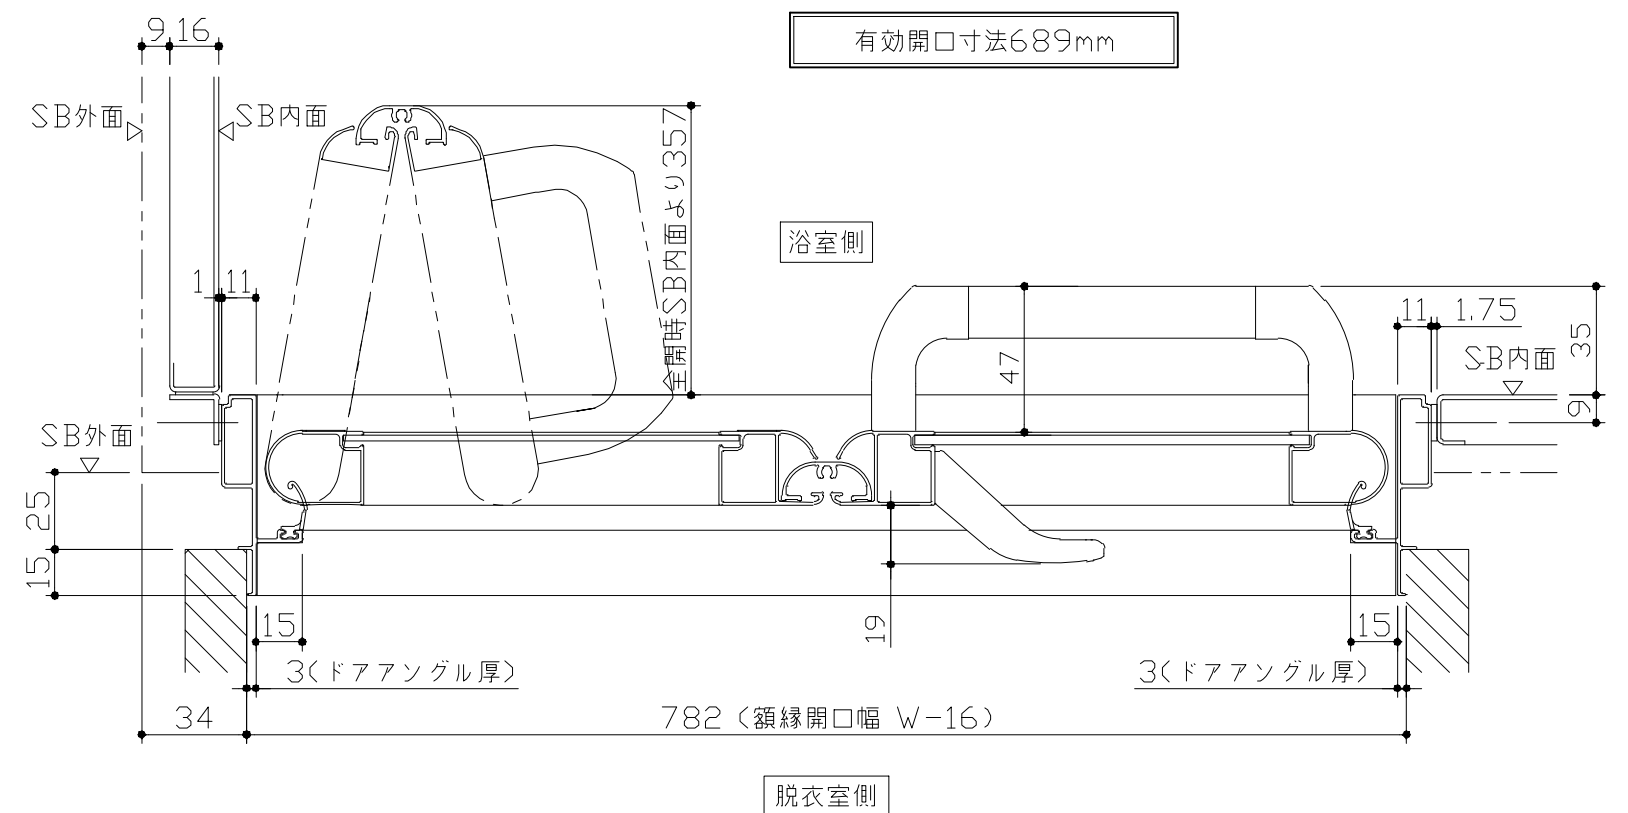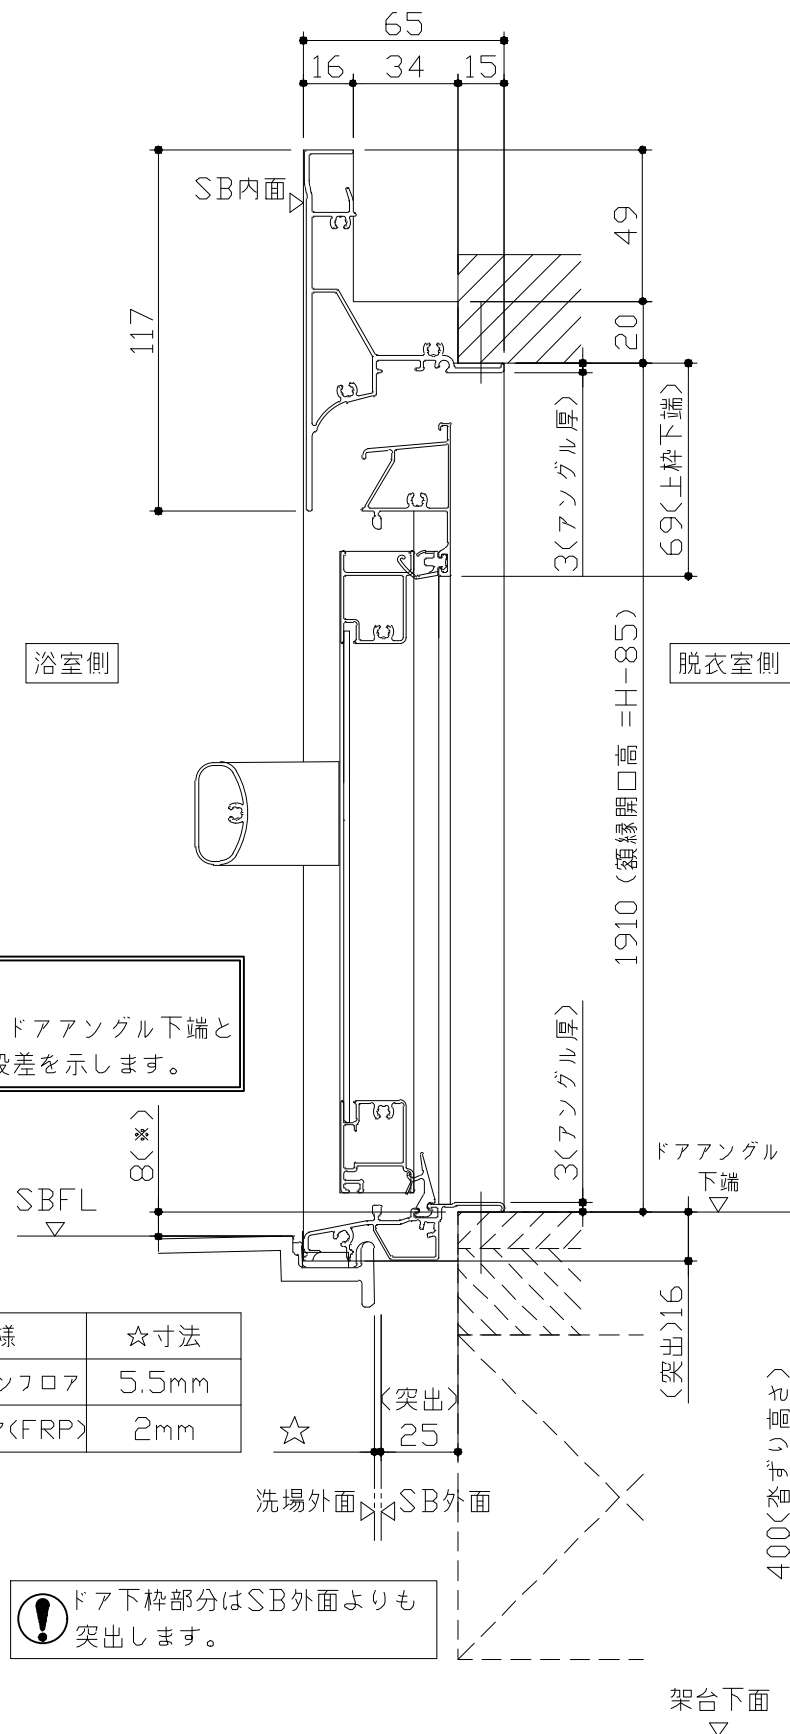


- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉







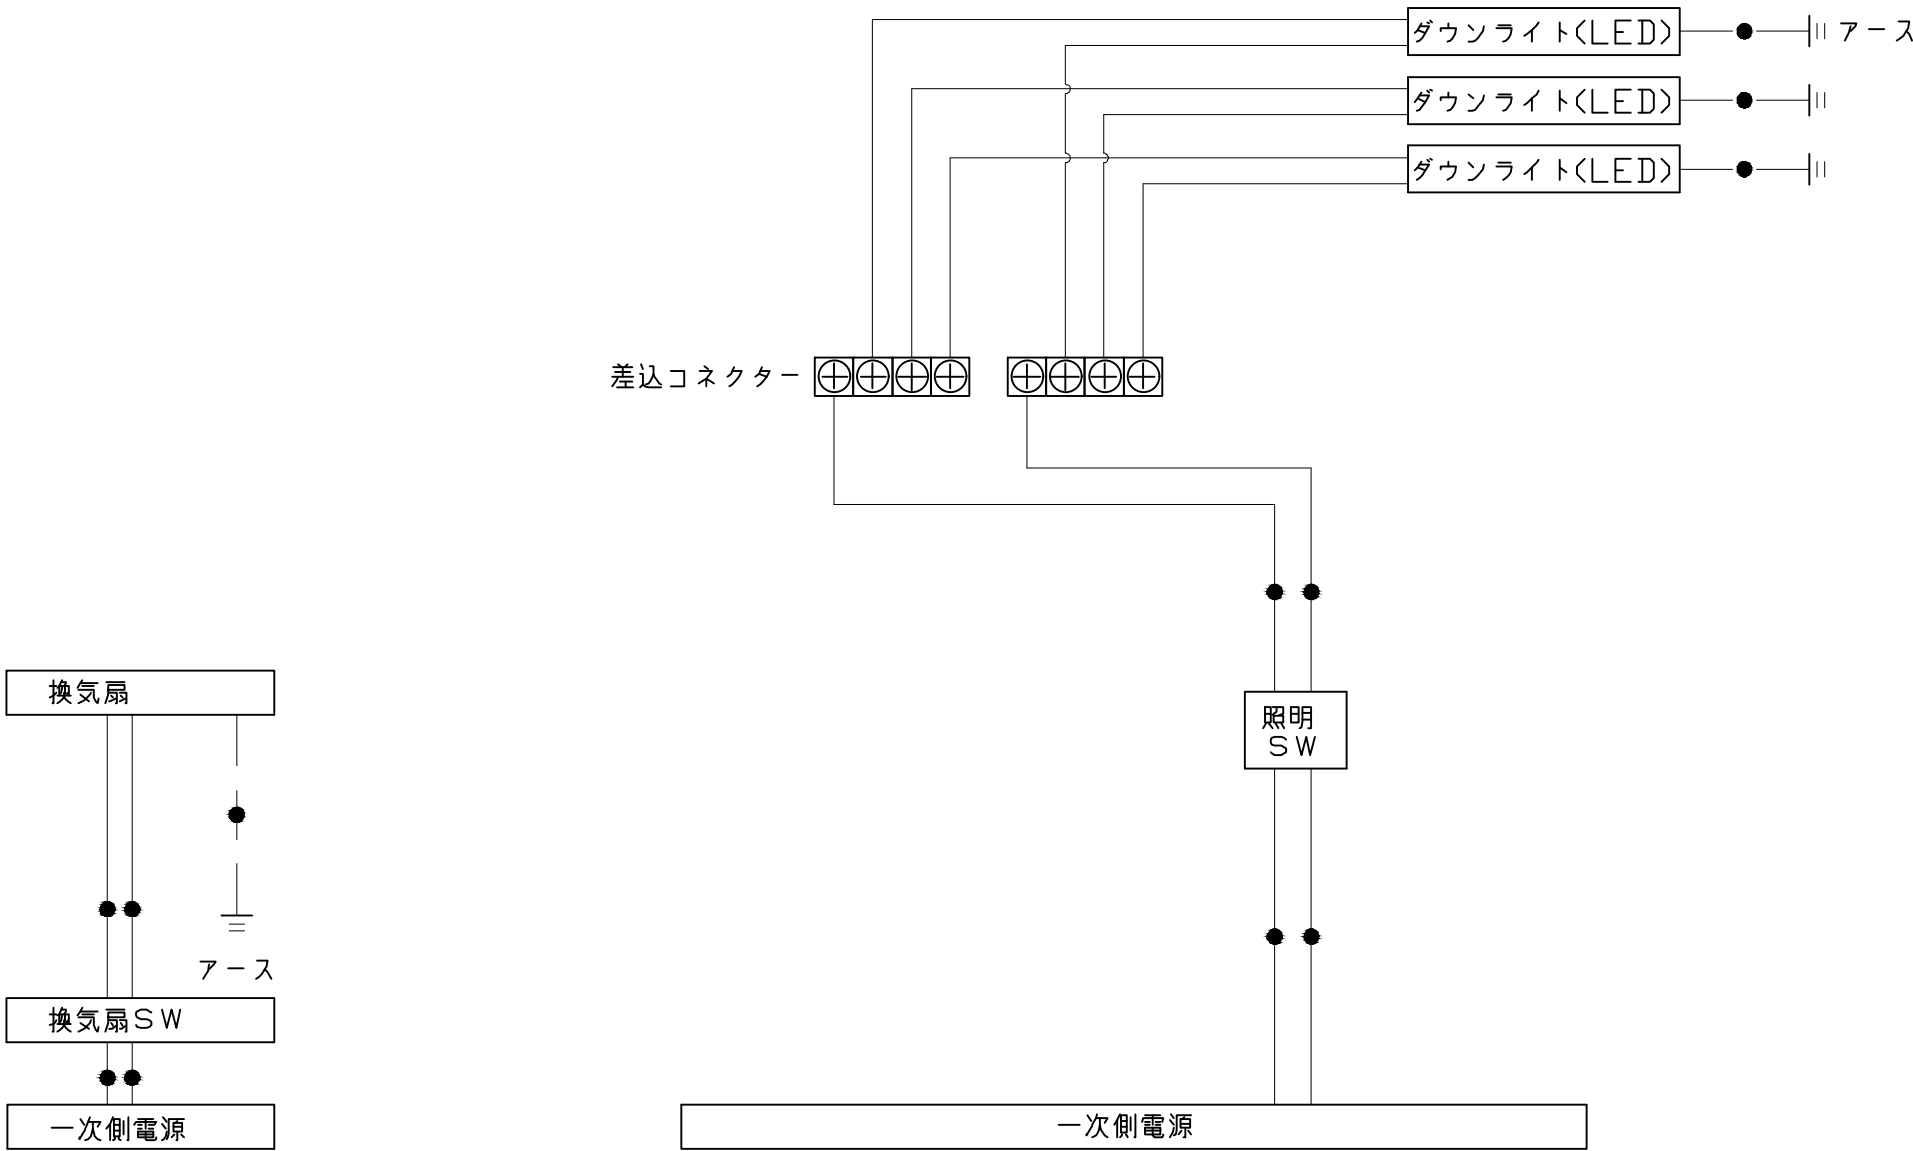

一次側電源から差し込みコネクタ及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

 アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

浴槽		洗い場用水栓		照明	
<div></div>					

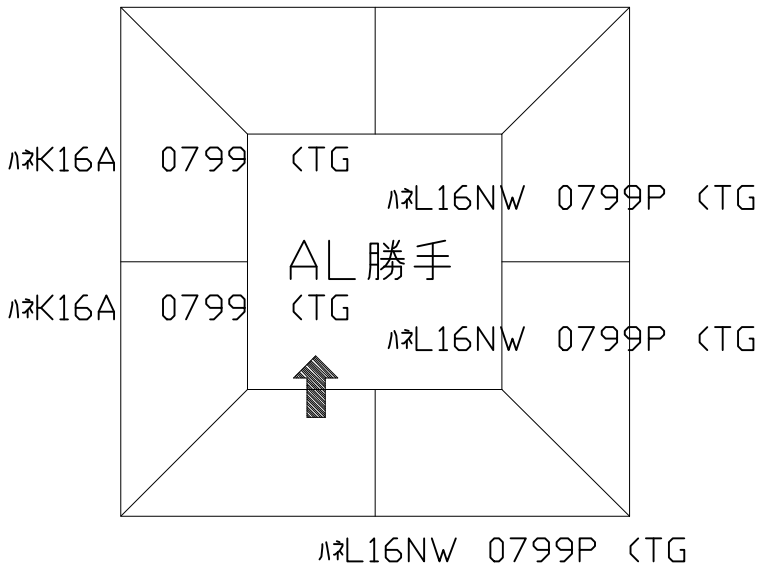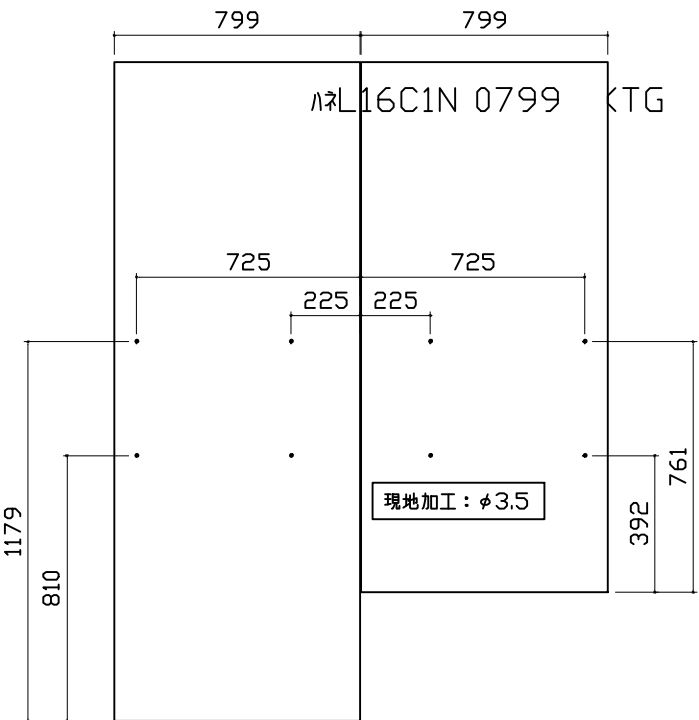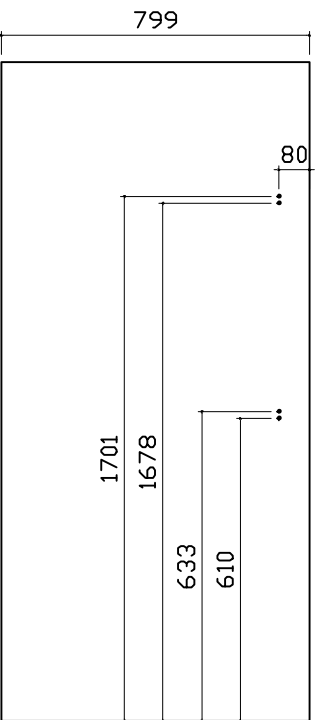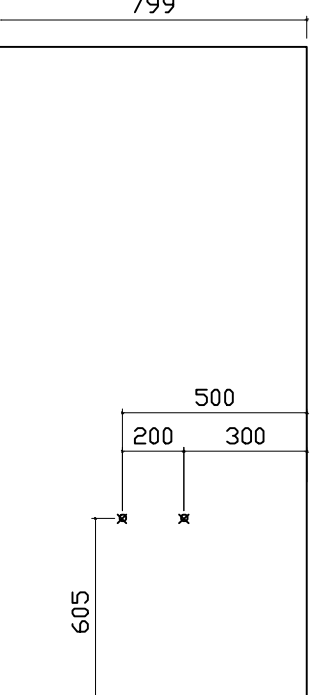パネル割図		ミラー		シャーフック			
<div><p>ハネK16C2G 0799 L<TG</p><p>ハネL16C1N 0799 <TG</p><p>ハネK16A 0799 <TG</p><p>ハネL16NW 0799P <TG</p><p>ハネK16A 0799 <TG</p><p>ハネL16NW 0799P <TG</p><p>AL勝手</p></div>		<div><p>ハネK16C2G 0799 L<TG</p><p>ハネL16C1N 0799 <TG</p><p>ハネK16A 0799 <TG</p><p>ハネL16NW 0799P <TG</p><p>ハネK16A 0799 <TG</p><p>ハネL16NW 0799P <TG</p><p>AL勝手</p></div>		<div><p>ハネK16C2G 0799 L<TG</p><p>ハネL16C1N 0799 <TG</p><p>ハネK16A 0799 <TG</p><p>ハネL16NW 0799P <TG</p><p>ハネK16A 0799 <TG</p><p>ハネL16NW 0799P <TG</p><p>AL勝手</p></div>			
洗い場水栓取付穴							
<div><p>ハネK16C2G 0799 L<TG</p><p>ハネL16C1N 0799 <TG</p><p>ハネK16A 0799 <TG</p><p>ハネL16NW 0799P <TG</p><p>ハネK16A 0799 <TG</p><p>ハネL16NW 0799P <TG</p><p>AL勝手</p></div>							
<div><p>Takara standard</p><p>タカラスタンダード株式会社</p></div>		<div><p>現場名称： 支社_盛岡SR SB8様邸</p><p>現場番号： C6693705</p><p>盛岡営業所</p></div>		<div><p>GRANSPA グランスパ</p><p>プラン番号： 1303H-2509-0183T</p><p>担当営業：</p></div>		<div><p>穴開け指示図</p><p>1/1</p><p>作成日： 2025年10月2日</p><p>担当アドバイザー：</p></div>	
