

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 四国-新居浜SR SB9 様

業者 様

商品名 PREDECENCIA プレデンシア

作成日 2025年6月29日
 プラン番号 2211G-2505-0139T
 現場番号 C3394113

タカラスタンダード株式会社
 ◆新居浜営業所
 愛媛県新居浜市松木町2-20
 TEL 0897-40-3237 / FAX 0897-40-3239

◆新居浜ショールーム
 TEL 0897-40-3230 / FAX 0897-40-3231

商品
 御見積金額 ￥1,302,400 (税込 ￥1,432,640)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥200,000 (税込 ￥220,000)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616(BL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームホワイト
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	プレシャスホワイト
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ホワイト / ホワイト
浴槽前カウンターカラー	ホワイト
エプロン材質/カラー	ステンレス / ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ホワイトオニキス
パネルカラー(周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 60Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
新居浜SR	新居浜SR	新居浜SR

◆ 備考

No.*

御名前 四国-新居浜SR SB9

様

現場番号	C3394113	プラン番号	2211G-2505-0139T	作成日	2025/6/29
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1616サイズ		1	1,227,000	1,227,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	片引戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1	+50,500	+50,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・1面デザイン/周辺レギュラークラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キーブクリーンフロア(ハイクラス・カームホワイト)	1		
7	排水口カバー	ステンレス	1		
8	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(プレシャスホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ホワイト)	1		
11	浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付)	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
16	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB181-5UTH	1	-32,000	-32,000
17	洗い場用水栓	ヒロカルシャワー:SB181-5UTHB1HK	1		
18	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
19	カウンター	人造大理石カウンター	1		
20	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
21	浴室パネル	プレミアムクラス(一面デザイン)(Kパネル)	1	+15,000	+15,000
22	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
23	天井	高光沢フラット天井	1		
24	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ホワイト	1	+45,500	+45,500
25	換気機器	ランドリーパイプなし	1	-2,800	-2,800
26	換気機器開口	工場開口	1		
27	照明	ダウンライト照明(3灯)(電球色)	1	-3,000	-3,000
28	天井照明開口	工場開口	1		
29	ミラー	ラウンドクリアミラー	1	+15,000	+15,000
30	風呂フタ	風呂フタなし	1	-18,500	-18,500
31	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-4,000	-4,000

御名前 四国-新居浜SR SB9 様

現場番号	C3394113	プラン番号	2211G-2505-0139T	作成日	2025/6/29
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	収納棚	クリアタイプ クリア(2段)	1	-4,000	-4,000
33	どこでもラック	タオルハンガーS(ホワイト)	1	+1,300	+1,300
34	どこでもラック	小物置きL(ホワイト)	1	+3,400	+3,400
35	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
36	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			36		¥1,302,400

商品総合計	36	¥1,302,400
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥200,000 (税込 ¥220,000)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

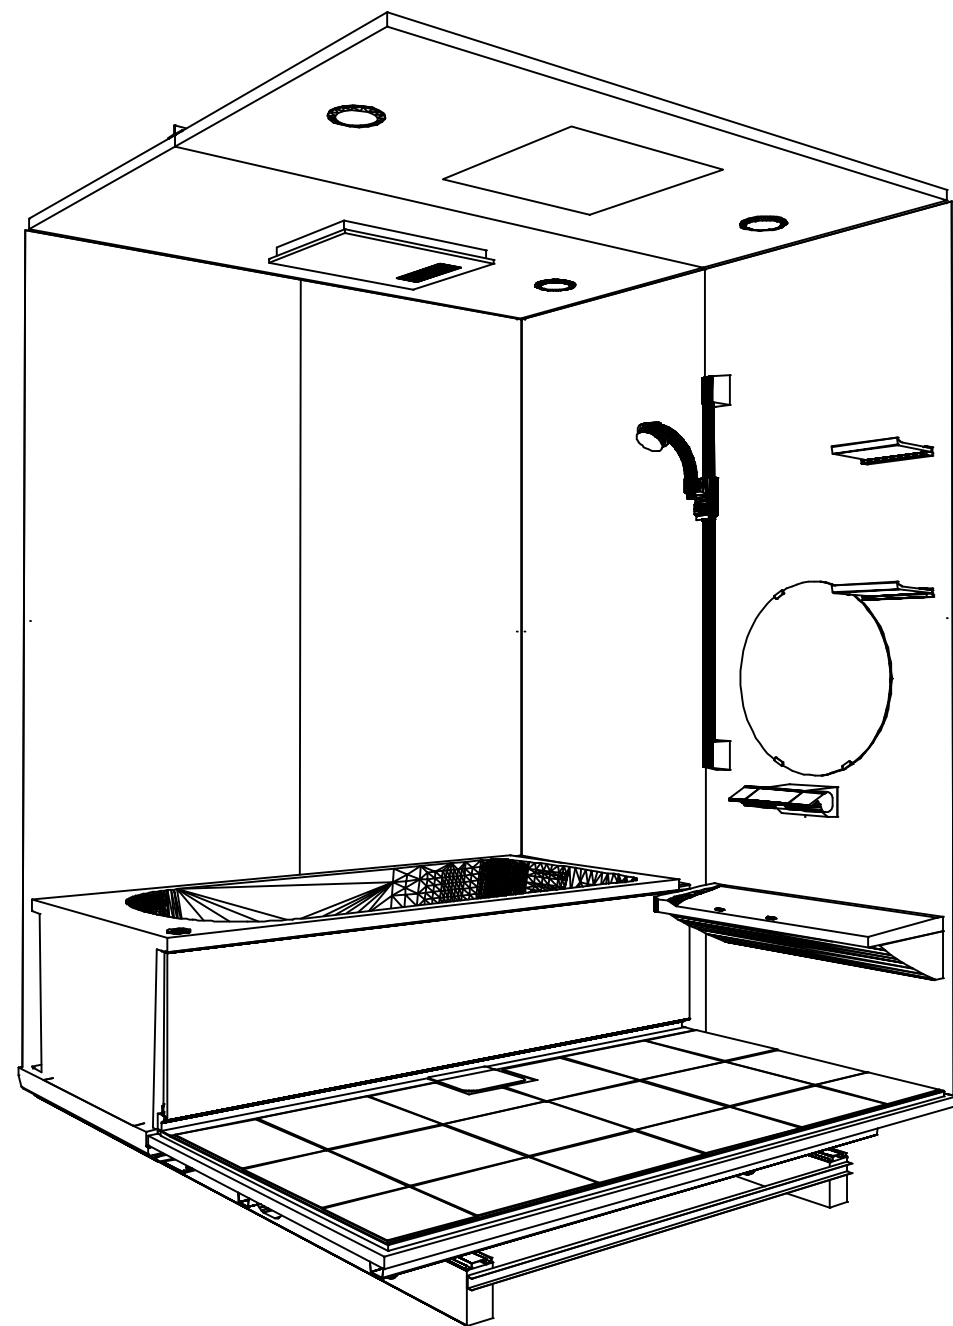

鳥瞰図

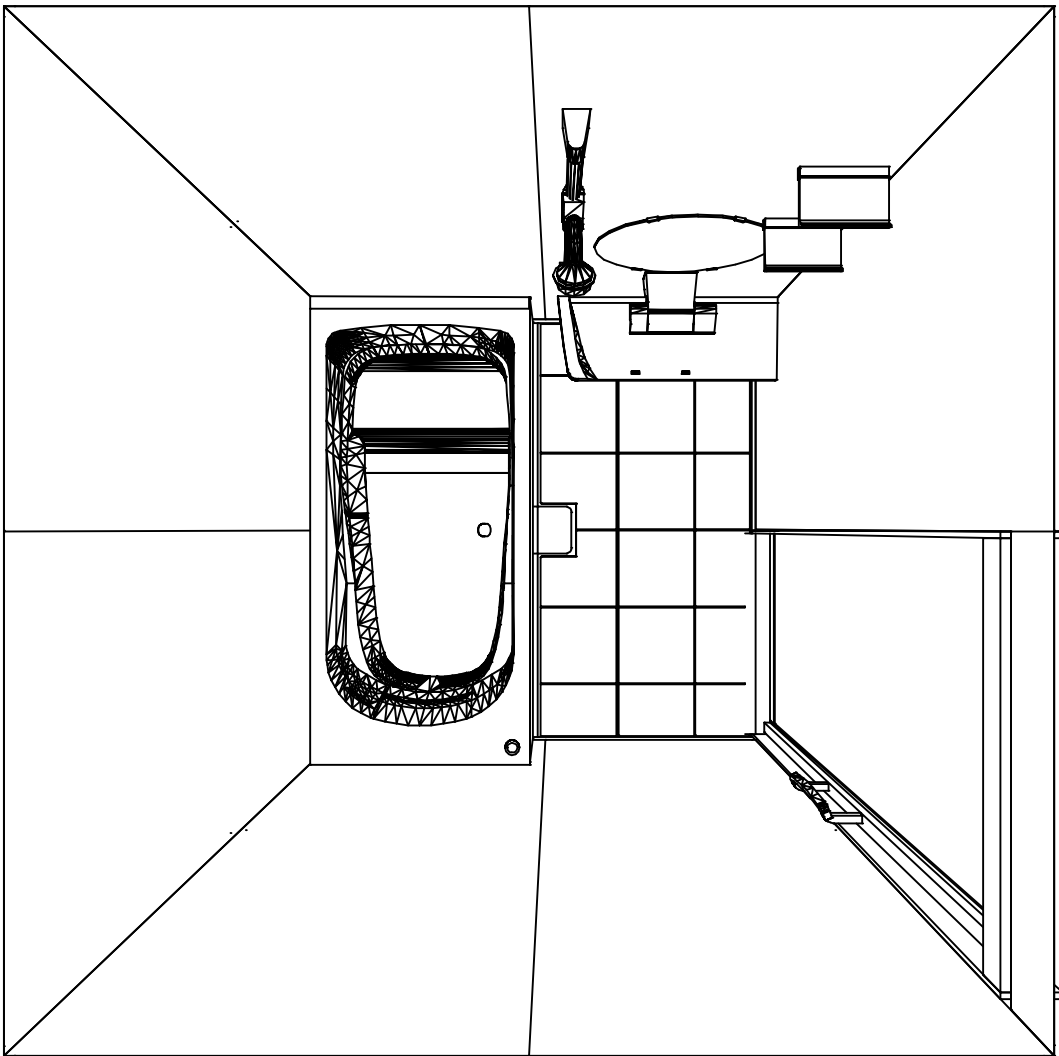

1616

高光沢フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： 四国-新居浜SR SB9様邸	PREDENCIA プレデンスIA	姿図	
現場番号： C3394113	プラン番号： 2211G-2505-0139T	作成日： 2025年6月29日	
新居浜営業所	担当営業： 新居浜SR	担当アドバイザー： 新居浜SR	

カウンター面


浴槽側面

洗場側面


カウンター対面

■ 留意事項


* 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

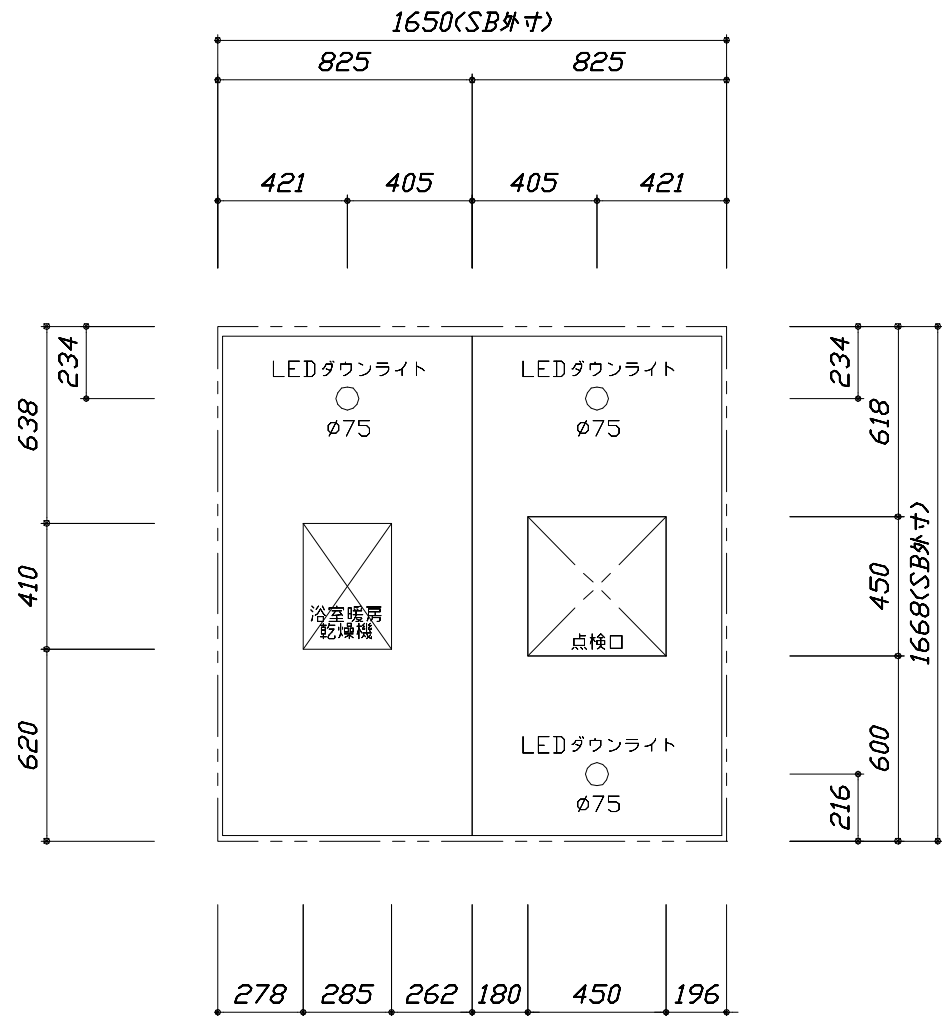

< 天井伏図 >

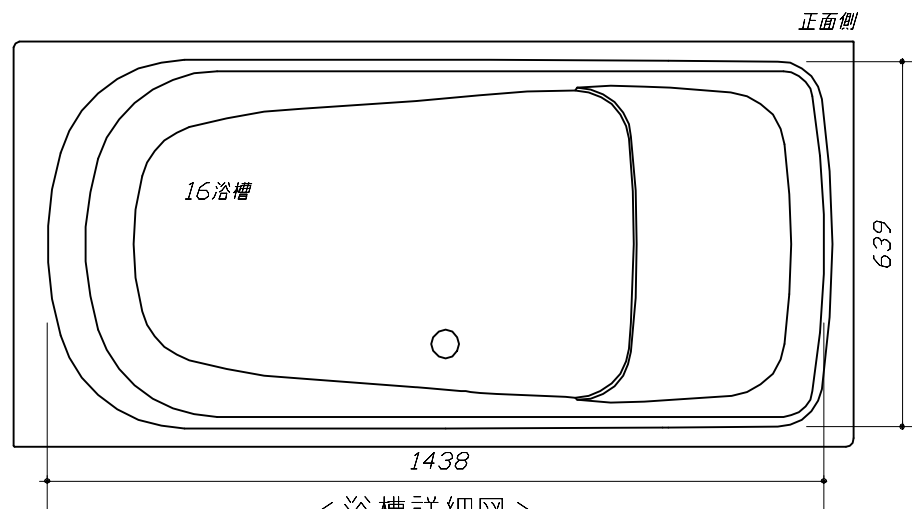


< 浴槽詳細図 >

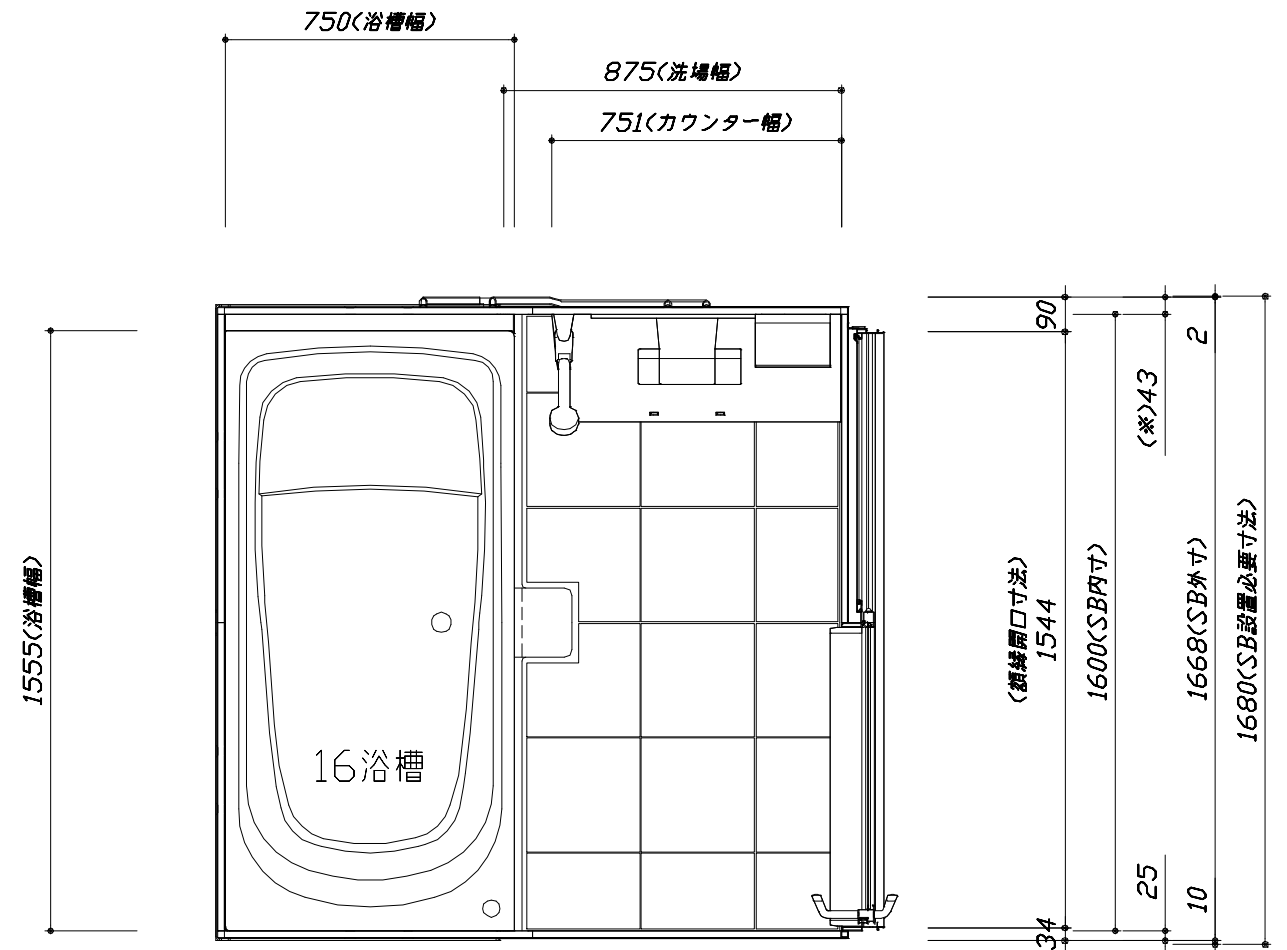

< 平面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

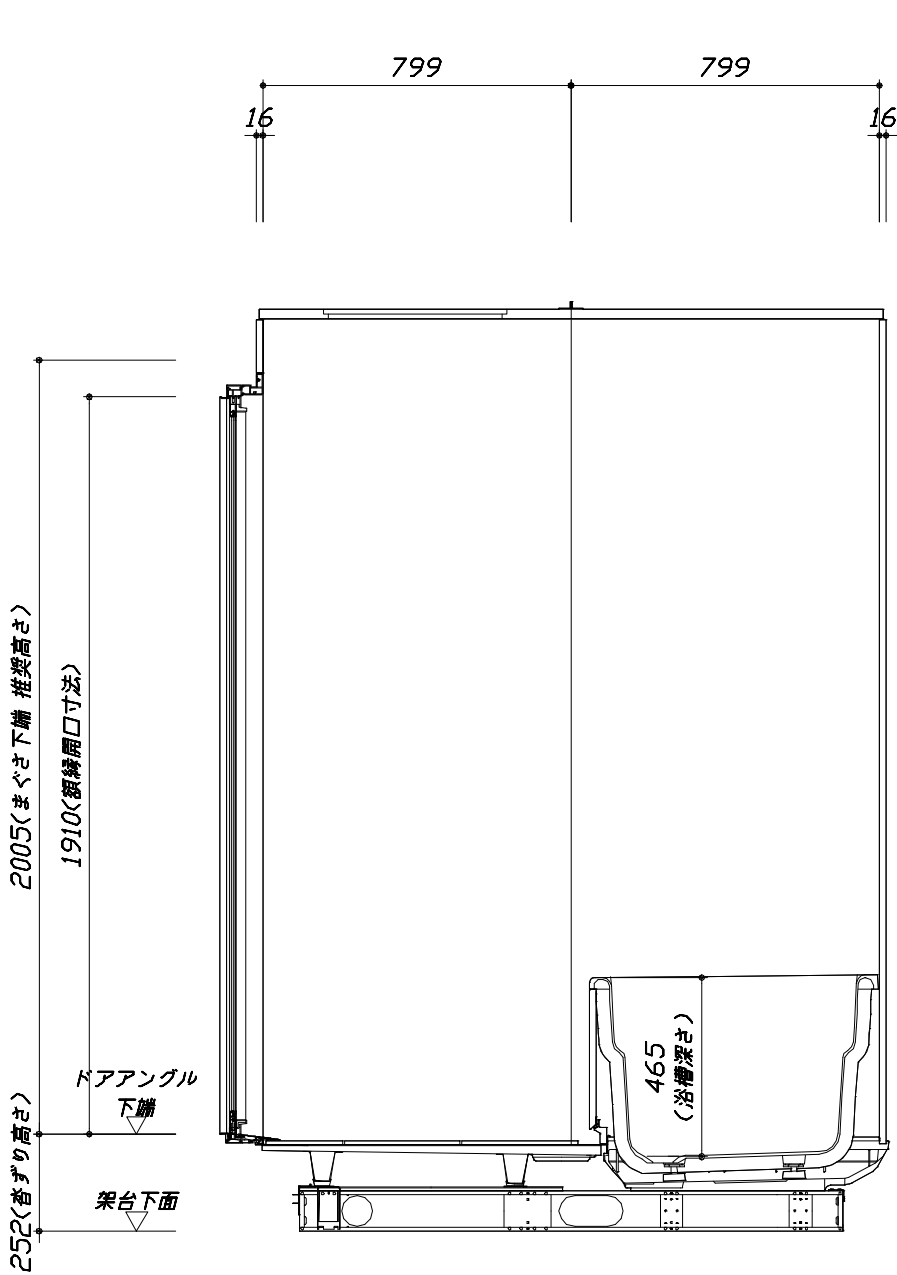

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)



<カウンター対面図>

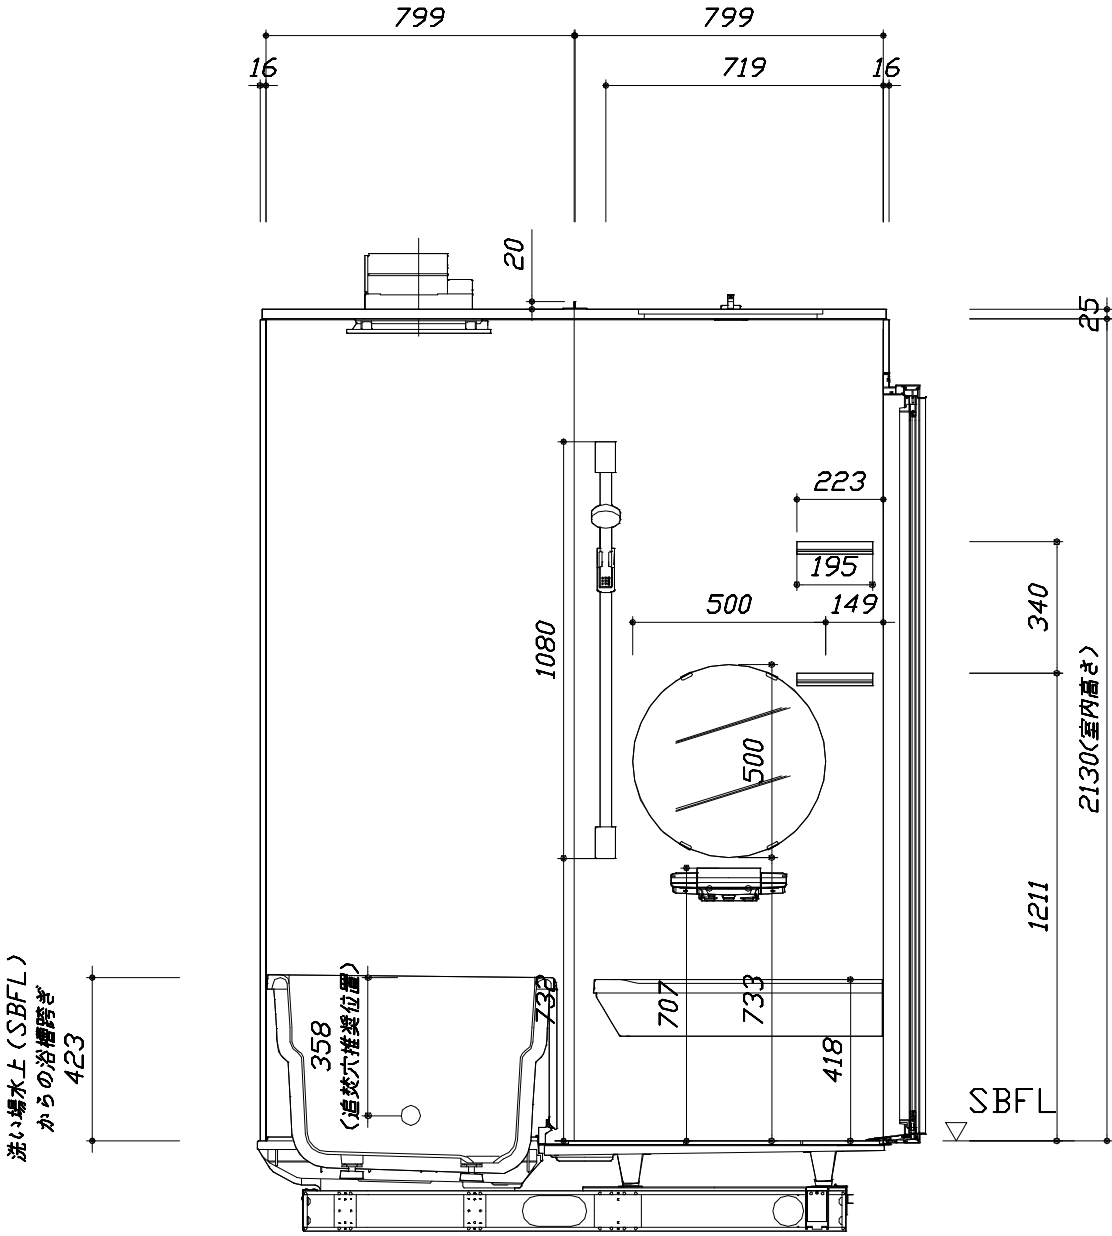

<カウンター面図>

Diagram of the bathtub side view. The diagram shows a rectangular bathtub with a central oval-shaped opening. The labels and dimensions are as follows:

- Top label: カウンター面 (Counter surface)
- Left label: 浴槽側面 (Bathtub side view)
- Right label: 洗場側面 (Washing area side view)
- Bottom label: カウンター対面 (Counter opposite side)

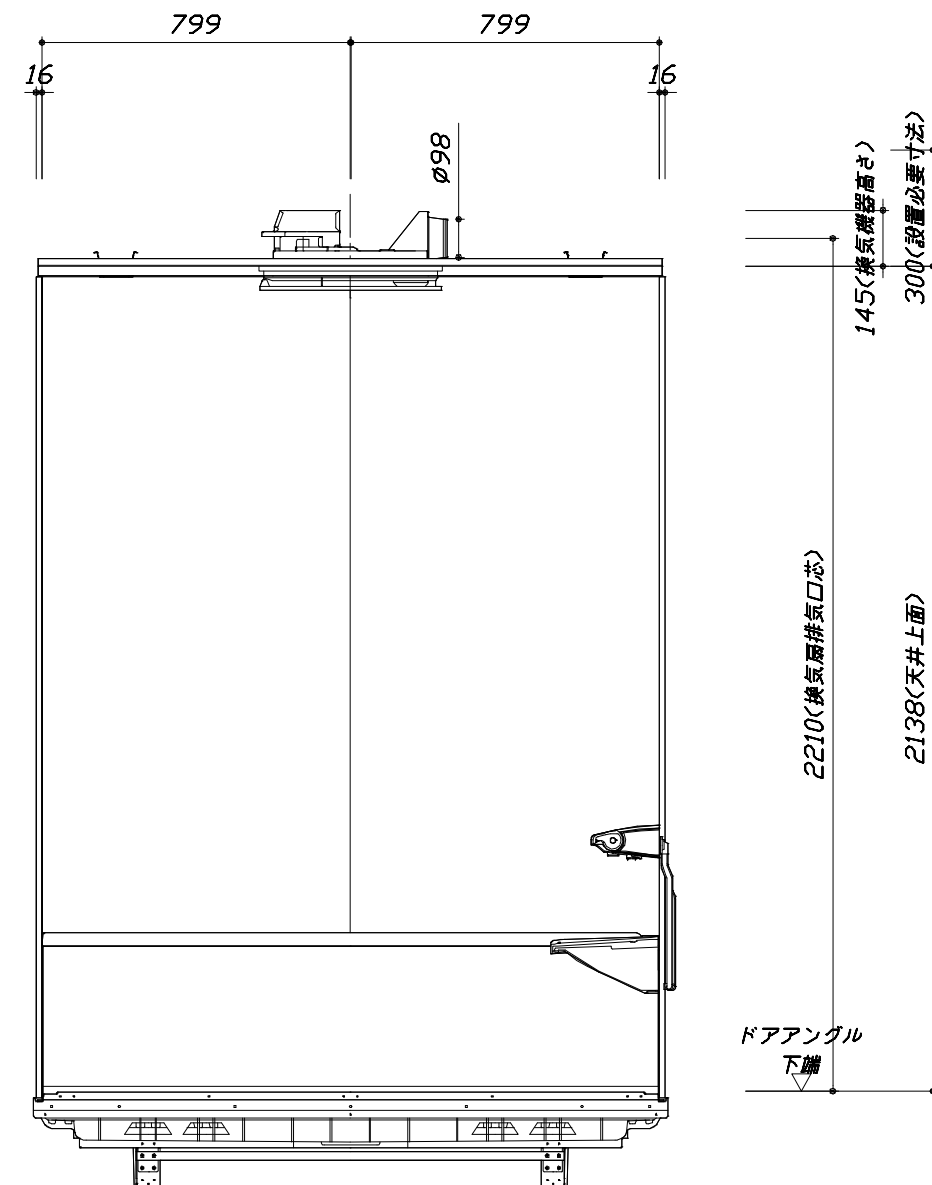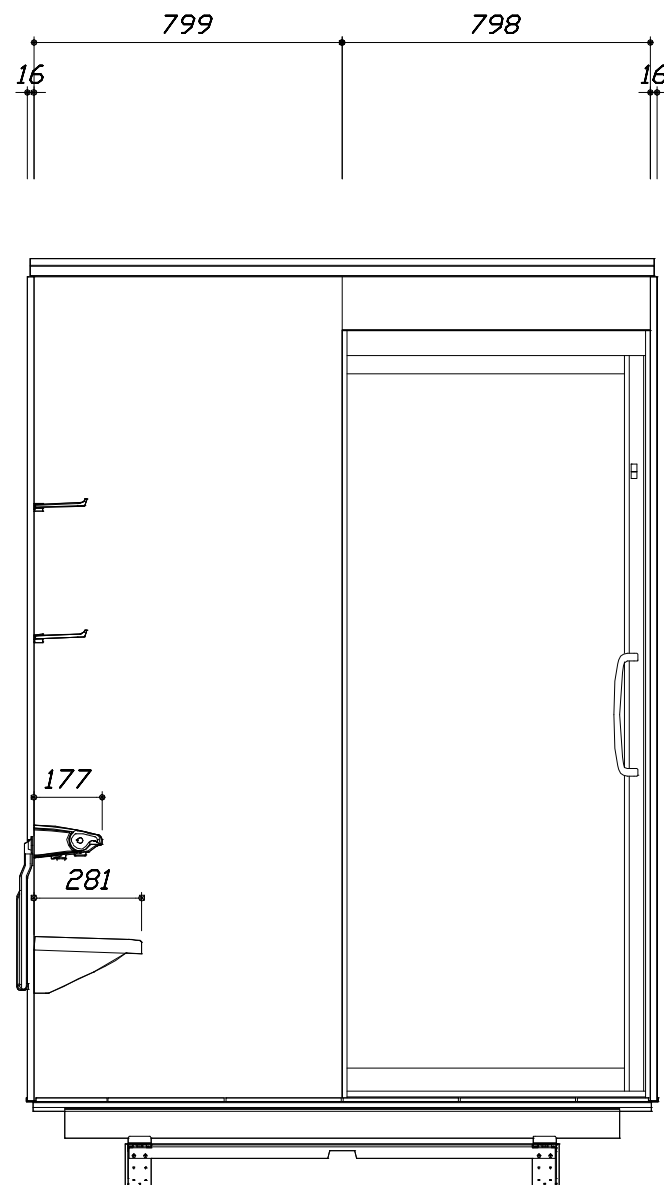

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

< 浴槽側面図 >

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	BL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	鋳物ホーロー 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付)（290リットル）追い焚き穴：あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	人造大理石カウンター：人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	高光沢パネリッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ片引戸(アルミ框/樹脂ガラス/ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型換気口)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	洗い場：ＡＢＳ樹脂， 浴槽：ＡＳＡ樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	410kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ラウンドクリアミラー
収納棚	クリアタイプ：アクリル樹脂製（2段）
タオル掛け	－
洗場側水栓	サーモスタット(SB181-5UTHB1HK)（樹脂ホース：ﾏﾙﾃﾞﾙ調）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ-T1020S MH）
照明	LEDダウンライト（LED 12.3W電球色）（3灯）
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V・最大消費電力1250W) (ﾀﾞｲｱﾐｰﾀﾞ 外径φ98)（常時換気対応品）ホワイト
フロフタ	－
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	－
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	WP：プレシヤスホワイト
カウンター	WA：ホワイト
パネル(カウンター面)	JWX：ホワイトオニキス
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カウンター	－
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	HW：カームホワイト
ドア / 天井	W：ホワイト / HW：ホワイト
収納棚	クリアタイプ(クリア)
タオル掛け	－
ランドリーセット	－

Takara standard タカラストANDARD株式会社	現場名称： 四国－新居浜SR SB9様邸	PREDENCIA プレデンシア	仕様表	
	現場番号： C3394113	プラン番号： 2211G-2505-0139T	作成日： 2025年6月29日	
	新居浜営業所	担当営業：新居浜SR	担当アドバイザー： 新居浜SR	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
			設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○	
排気ダクトの敷設工事							○				浴室換気機器のダクト敷設工事
浴室換気機器と排気ダクト接続工事							○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
浴室換気機器の電気・アース接続工事								○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
ウェザーカバーの外壁取付							○	○			建築の外装仕上げ工事
4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事					○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
		建築側排水配管との接続工事 【注記 3】					○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
		給湯機器本体工事（試運転・確認）					○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
1 3	電気 他	内装仕上げ工事		○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
		浴室用電源配線、接続工事						○			浴室機器の事後電気工事
		浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事	

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。




■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

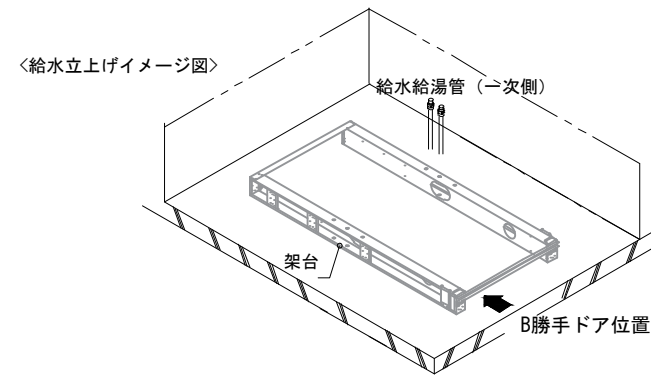

■ 土間コンクリート仕上げ寸法



ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

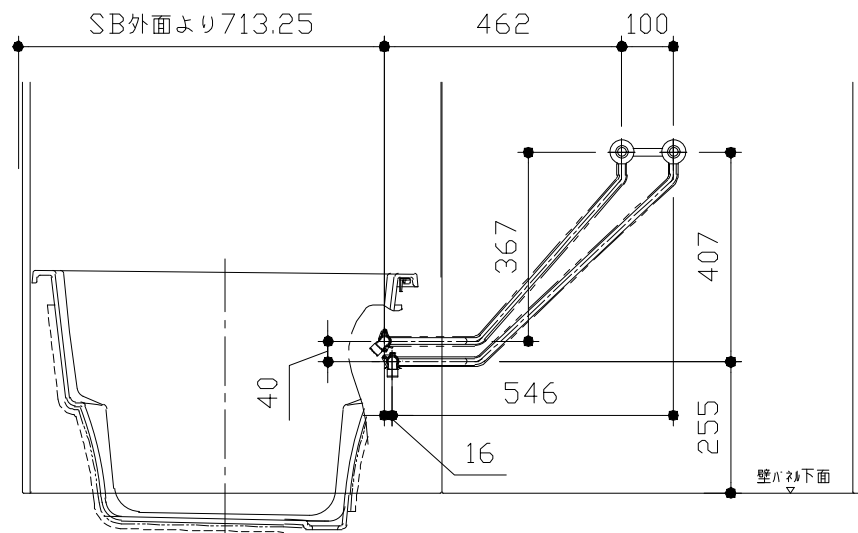


＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号


記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置

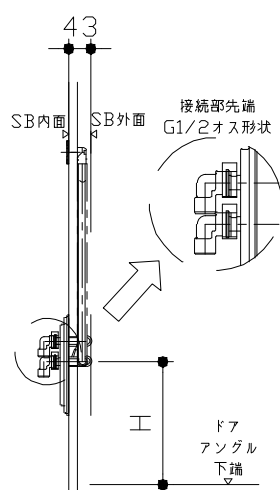

ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230

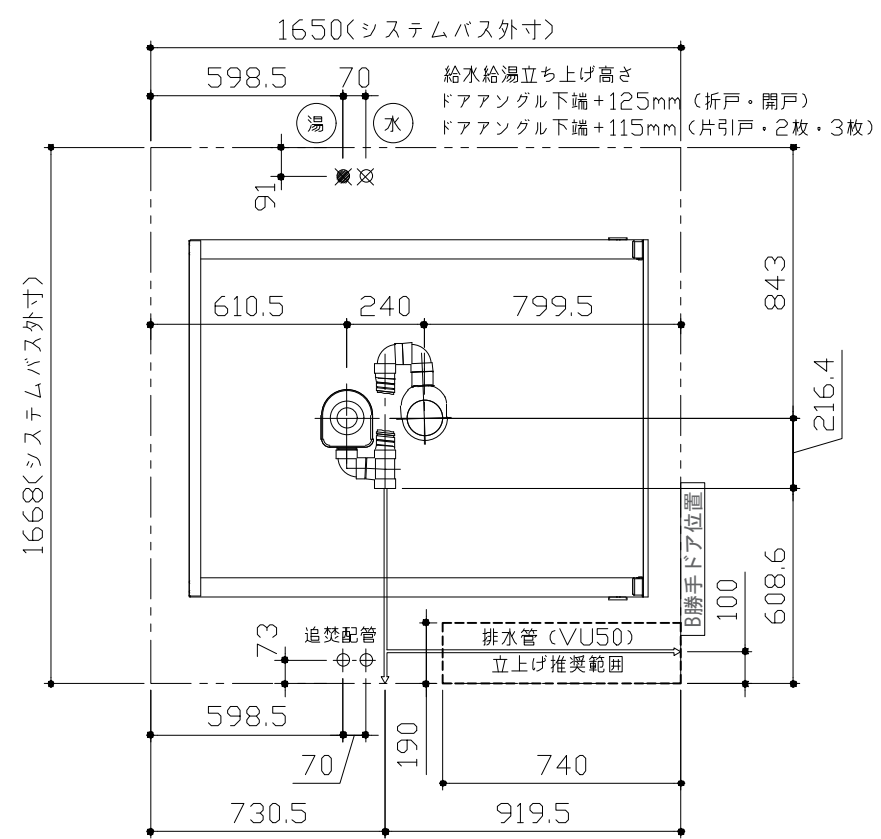

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

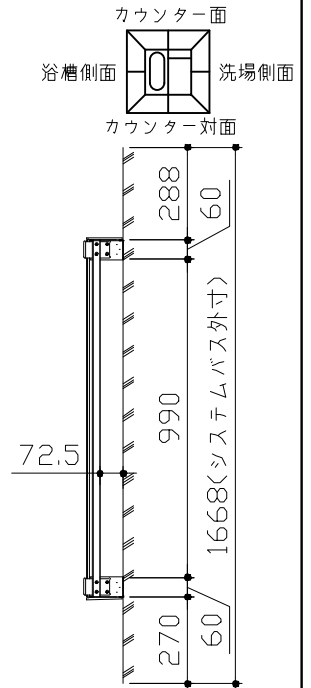



■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。




A矢視

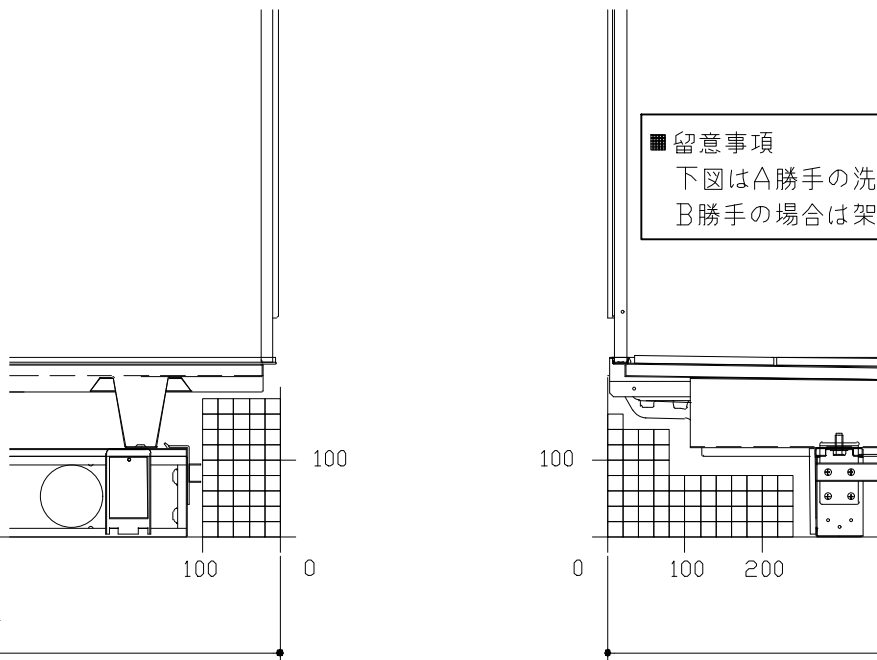


B矢視

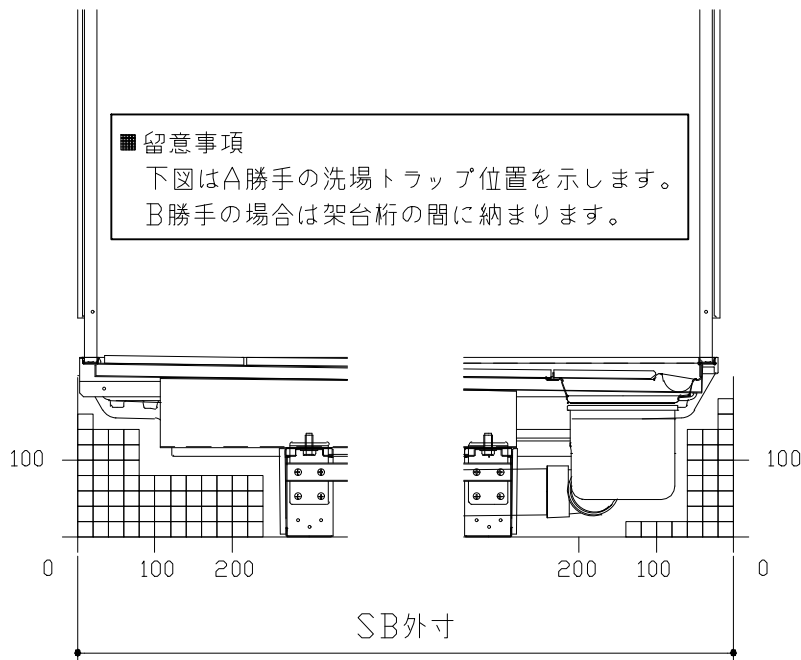


C矢視

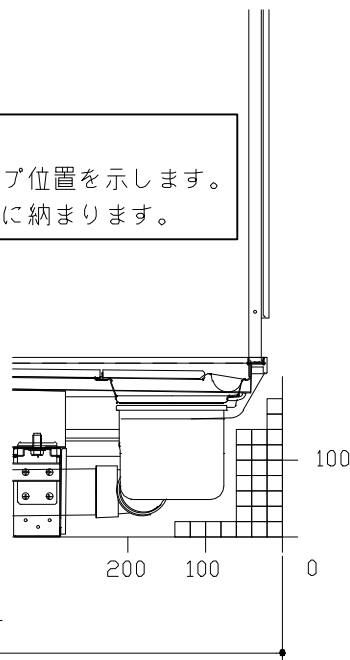

D矢視



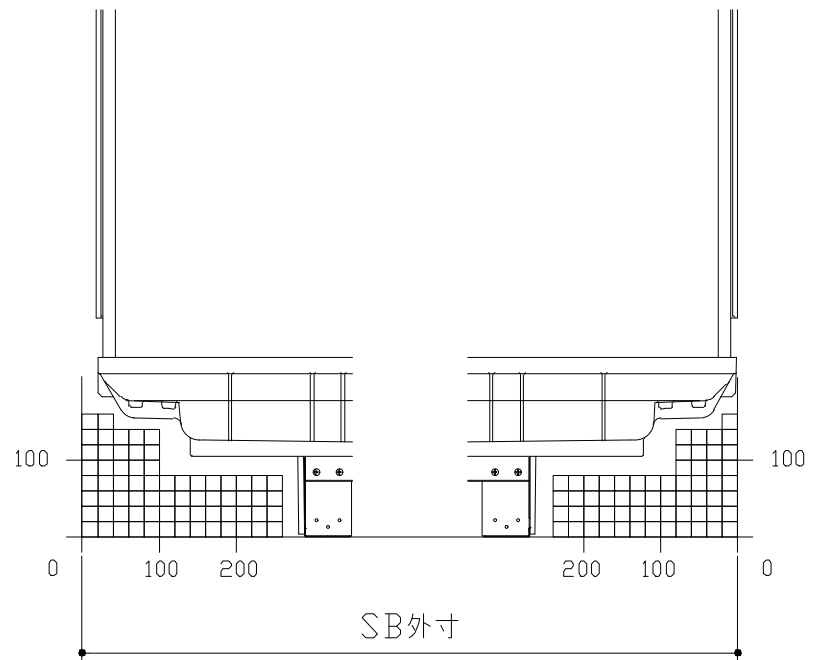


E矢視

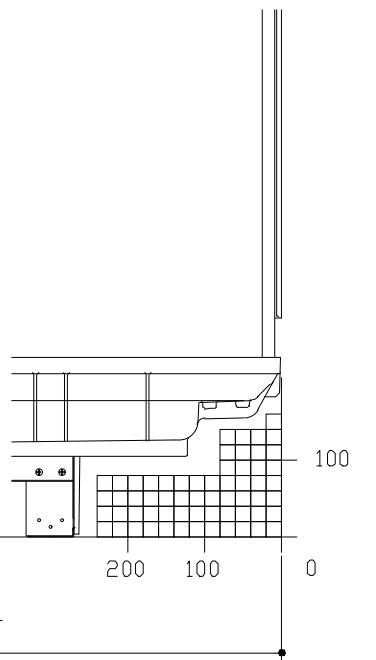

F矢視


キープクリーンドア：片引戸・タテ型換気口

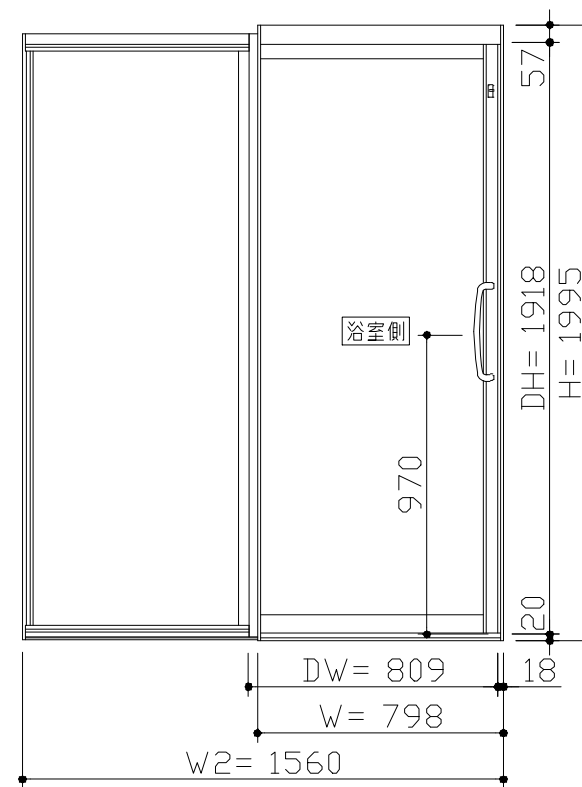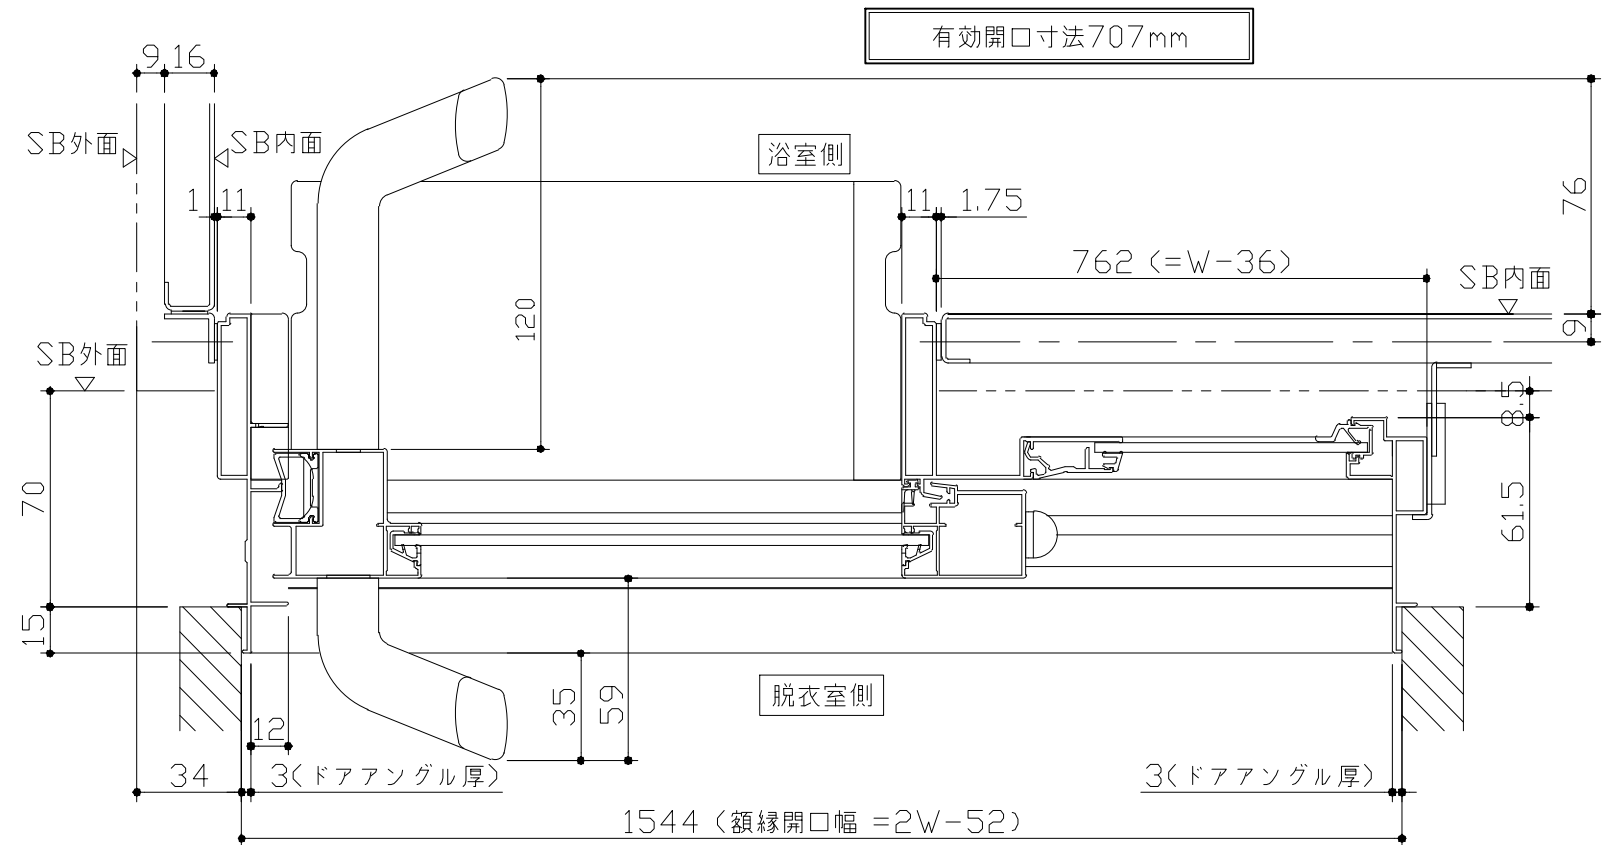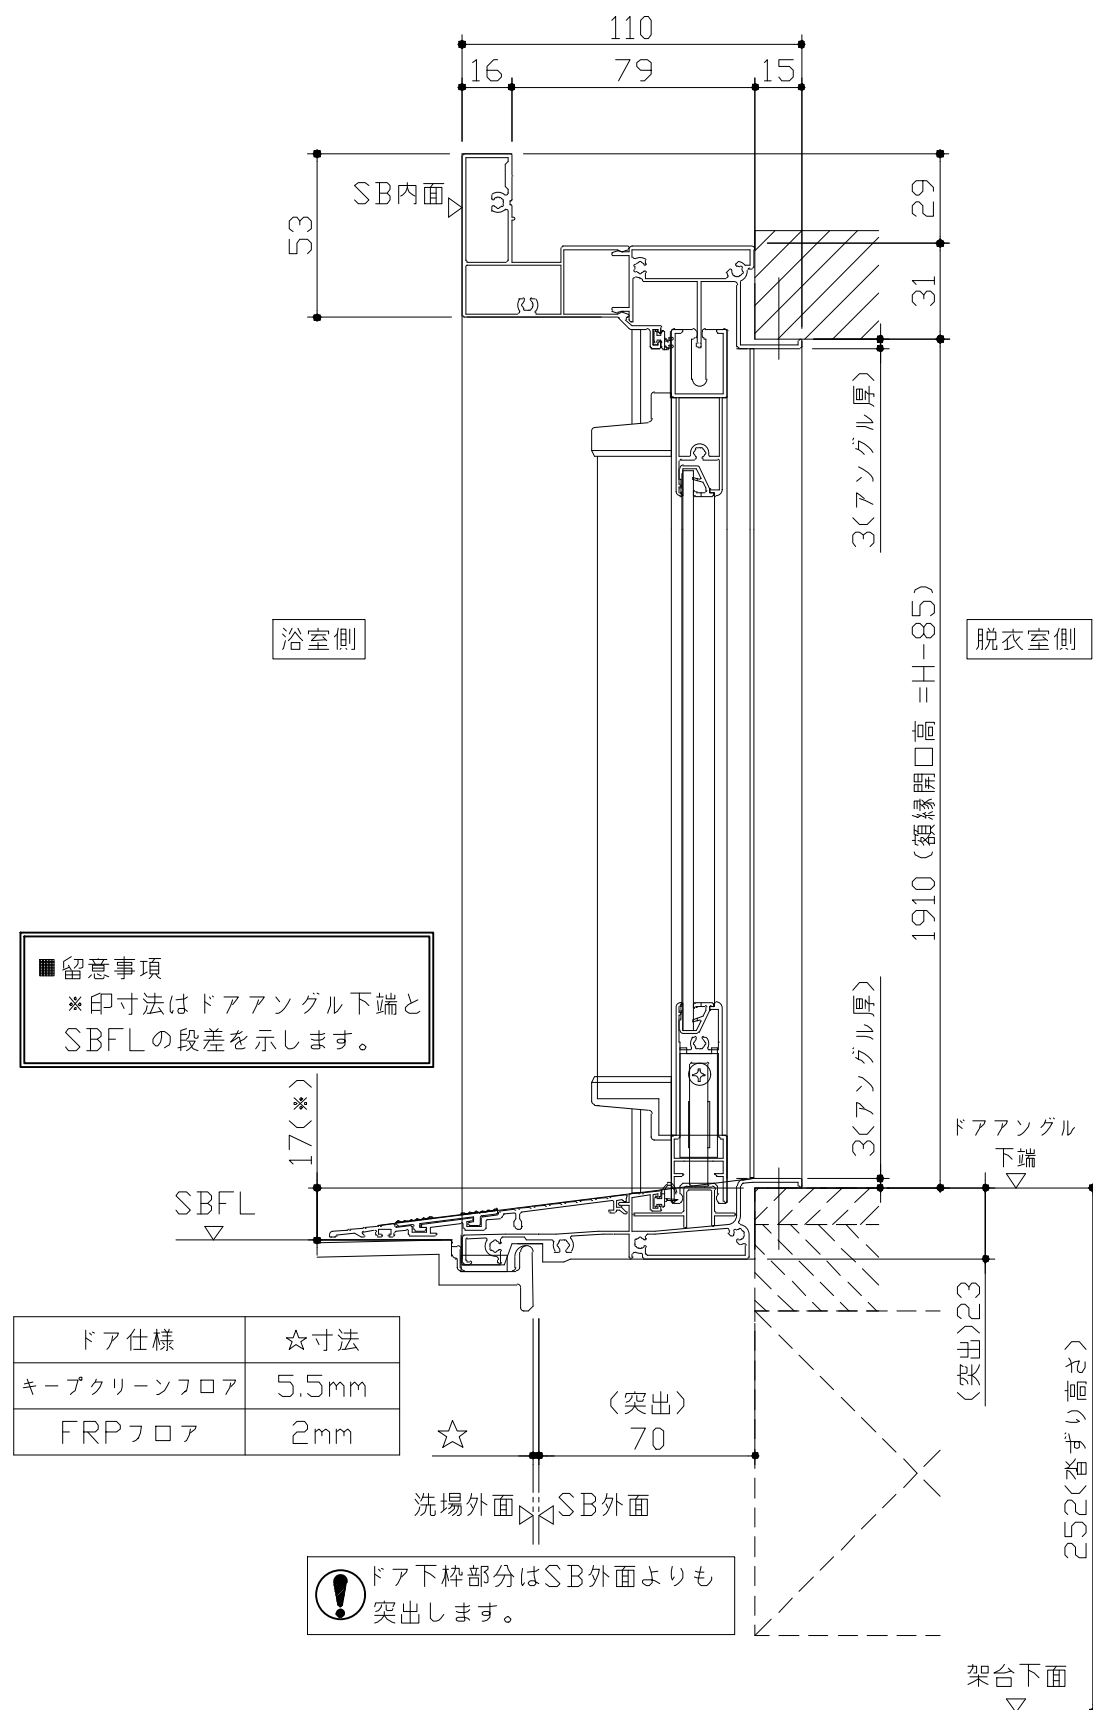


〈姿図〉

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉








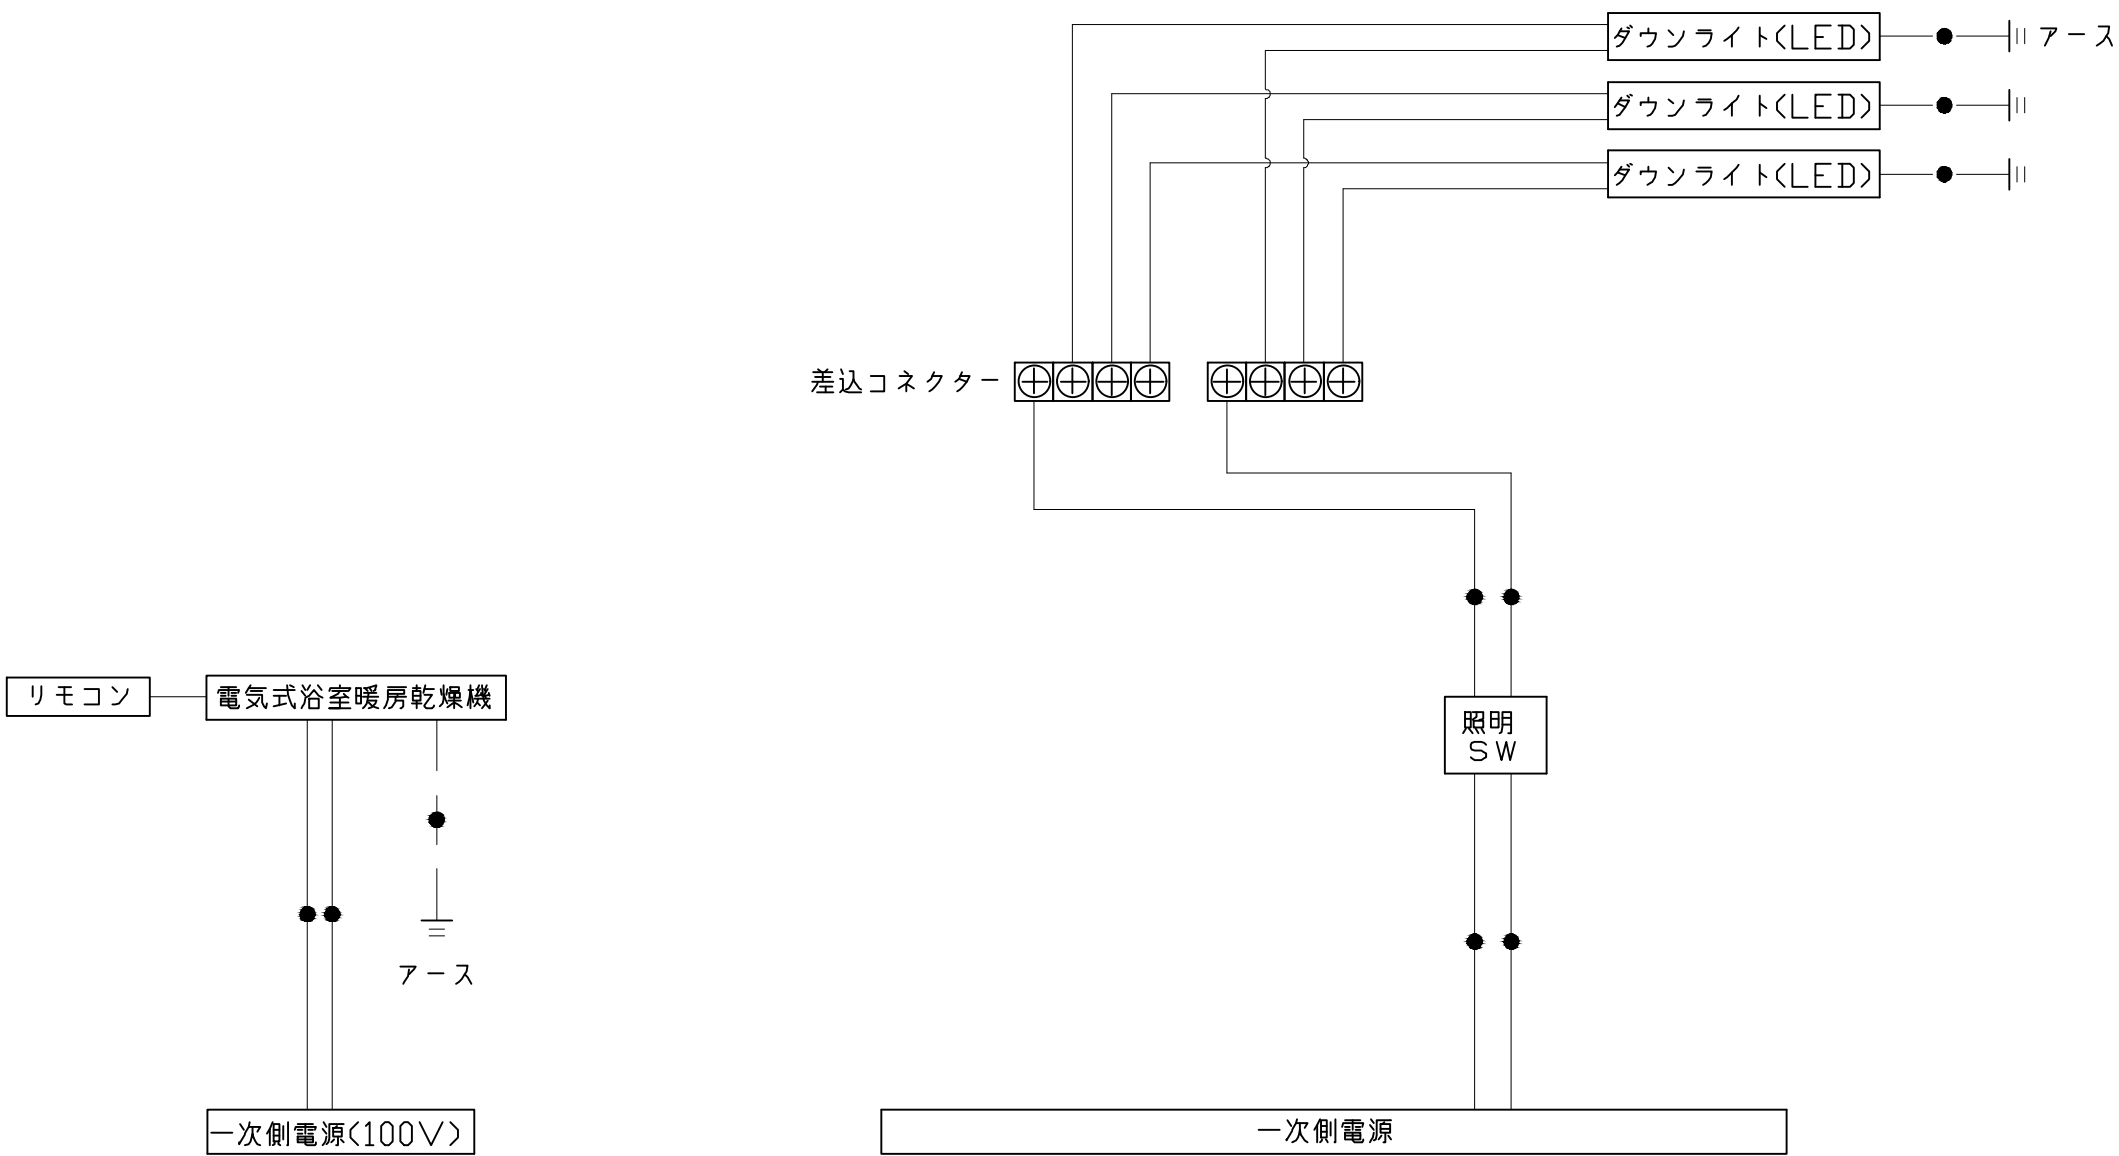





※浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。





一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

Takara standard タカラストانダード株式会社	現場名称： 四国－新居浜SR SB9様邸	PREDENCIA プレデンシア	電気配線図	
	現場番号： C3394113	プラン番号： 2211G-2505-0139T	作成日： 2025年6月29日	
	新居浜営業所	担当営業：新居浜SR	担当アドバイザー： 新居浜SR	

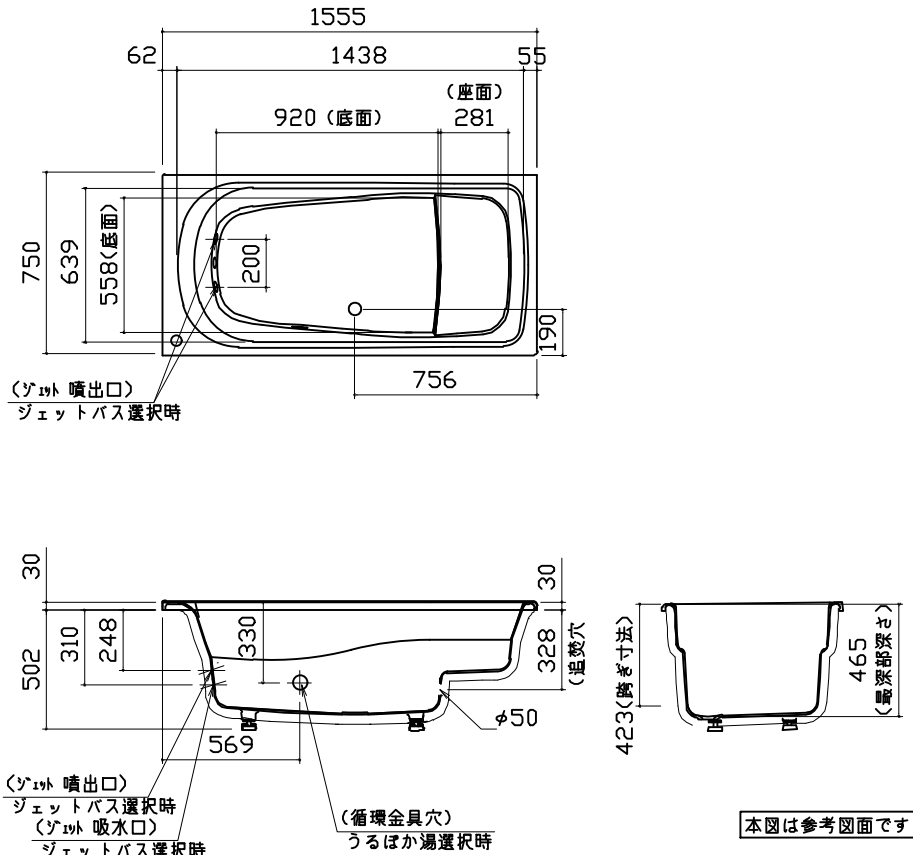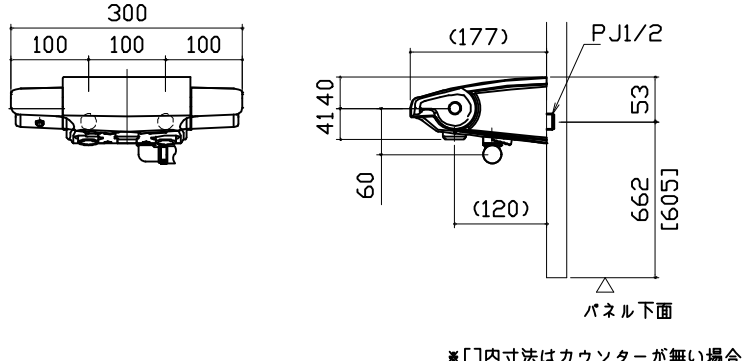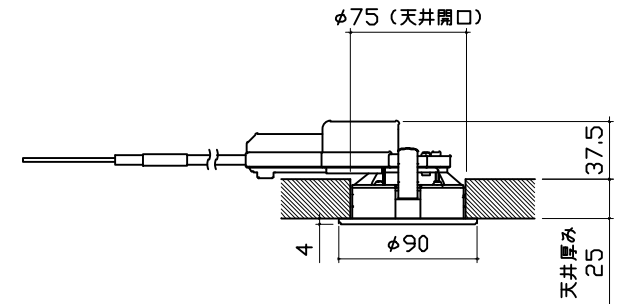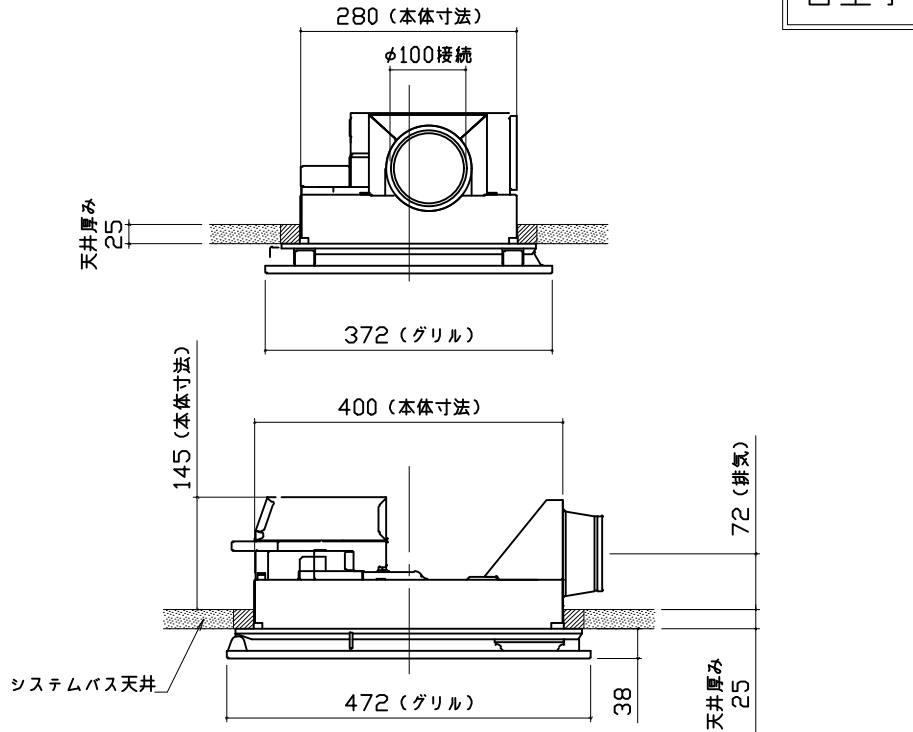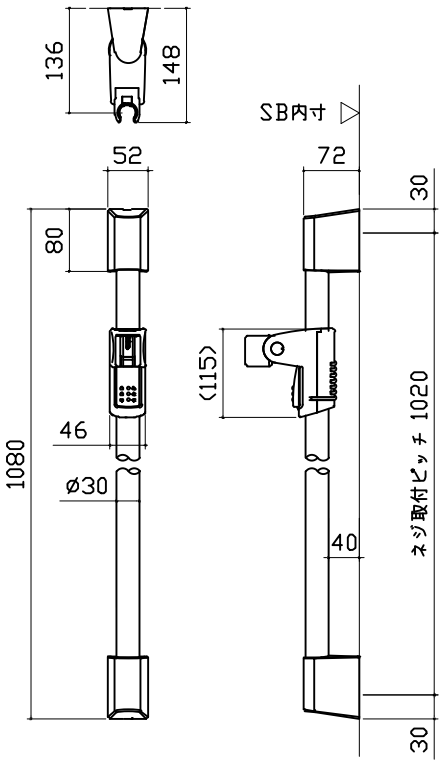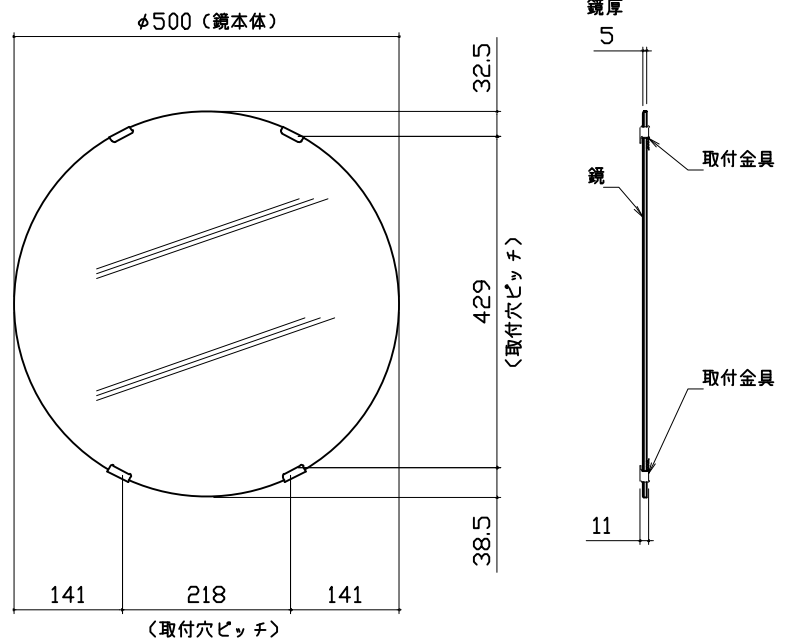浴槽	洗い場用水栓	照明		
 （ジェット噴出口） ジェットバス選択時 （ジェット噴出口） ジェットバス選択時 （ジェット吸水口） ジェットバス選択時 （循環金具穴） うるぼか湯選択時 本図は参考図面です	 ※[]内寸法はカウンターが無い場合	ダウンライト LED 3.1W (1灯あたり) 		
換気機器	シャワーフックスライドバー	ミラー		
リモコンコード長さ：5m 外形：縦120mm×横116mm 管工事 	 材質 パイプ部：ステンレス 台座部：ABS、POM等 フック部：ABS等 取付部分詳細	取付金具：SUS304 t0.8 ミラー：表面防曇コートあり 		
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 四国－新居浜SR SB9様邸 現場番号： C3394113 新居浜営業所		PRE D E N C I A プレデンシア プラン番号： 2211G-2505-0139T 担当営業： 新居浜SR 部材詳細図 1/2 作成日： 2025年6月29日 担当アドバイザー： 新居浜SR

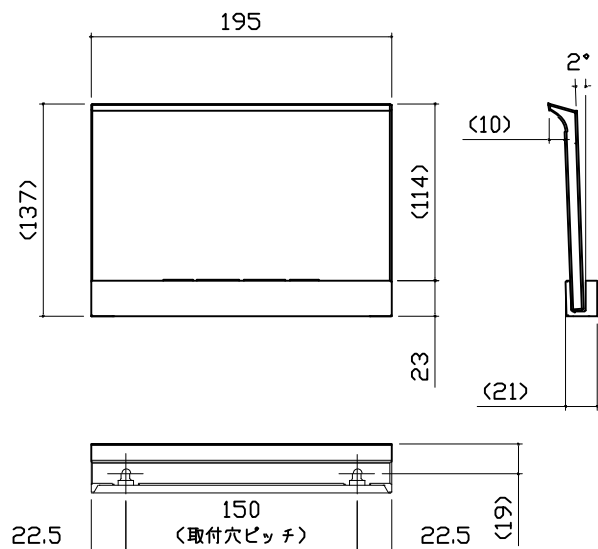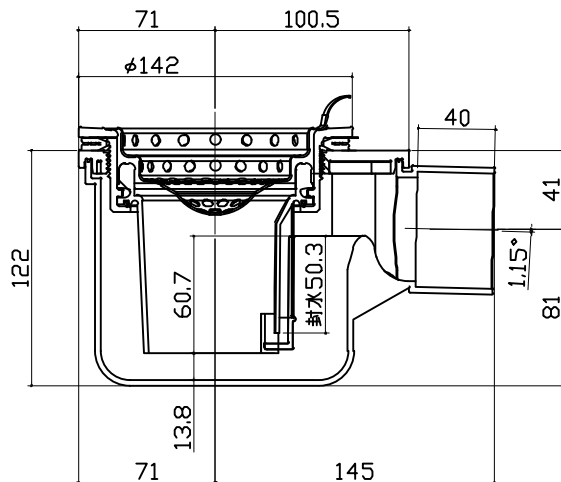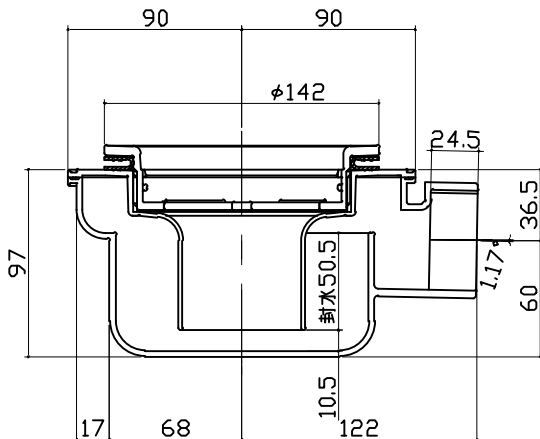収納棚		洗い場側排水トラップ		浴槽側排水トラップ	
本体：PMMA 					
Takara standard タカスタンダード株式会社	現場名称： 四国－新居浜SR SB9様邸		PRE DENC I A プレデンシア		部材詳細図
	現場番号： C3394113		プラン番号： 2211G-2505-0139T		作成日： 2025年6月29日
	新居浜営業所		担当営業：新居浜SR		担当アドバイザー： 新居浜SR
					2/2

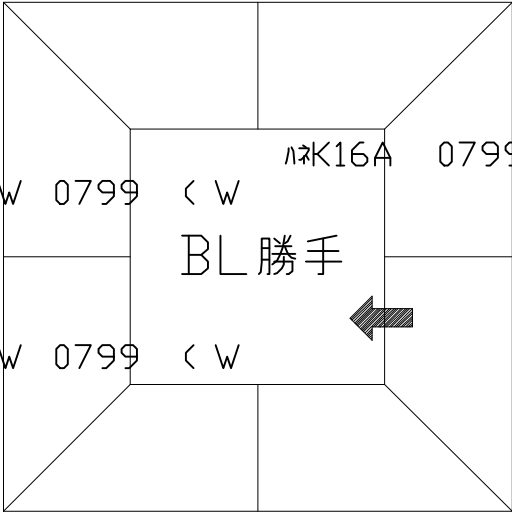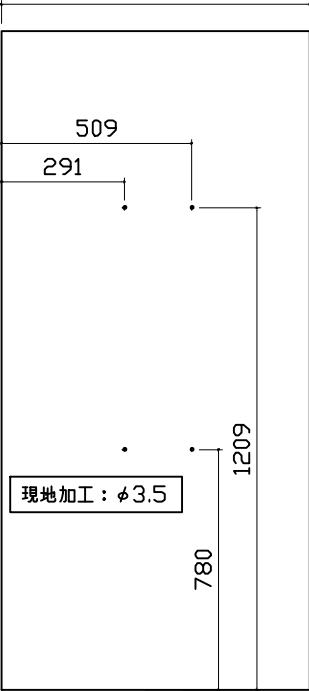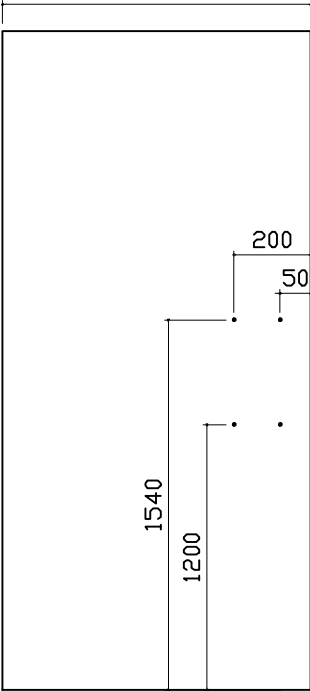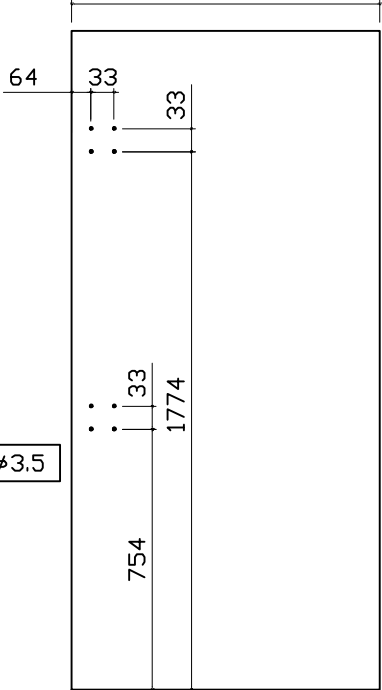パネル割図		ミラー		収納棚	
ハネK16C2B 0799 R<JWX ハネK16C1G 0799 L<JWX ハネK16NW 0799 < W ハネK16NW 0799 < W ハネK16AD 0799 < W ハネK16A 0799 < W BL勝手 		ハネK16C2B 0799 R<JWX 799 509 291 1209 780 現地加工：φ3.5 		ハネK16C2B 0799 R<JWX 799 200 50 1540 1200 現地加工：φ3.5 	
シャフーフックスライドバー					
ハネK16C2B 0799 R<JWX 799 64 33 33 33 1774 754 現地加工：φ3.5 					
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 四国－新居浜SR SB9様邸		PRE D E N C I A プレデンシア	
		現場番号： C3394113		プラン番号： 2211G-2505-0139T	
		新居浜営業所		担当営業：新居浜SR	
				穴開け指示図	1/1
				作成日： 2025年6月29日	
				担当アドバイザー： 新居浜SR	
