

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 北陸-能登SR SB7 様

業者 様

商品名 PREDENCIA プレデンシア

商品
御見積金額 \1,229,200 (税込 \1,352,120)

() 内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 \172,000 (税込 \189,200)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

作成日 2020年12月2日
プラン番号 1612G-2011-0084T
現場番号 A6401373

タカスタンダード株式会社
◆能登ショールーム
石川県七尾市飯川町い66

TEL 0767-57-0062 / FAX 0767-57-0063

◆北陸支店 販売課
TEL 076-269-4400 / FAX 076-269-4499

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		竹中

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616 (BL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームベージュ
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	プレシャスホワイト
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ハンチ付)
浴槽・風呂フタ	高断熱仕様
カウンター材質	アクリル人造大理石
カウンターカラー	プレシャスホワイト
エプロン材質/カラー	ステンレス / ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー (正面)	ノルディックグリーン
パネルカラー (周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 60Hz

◆ 御確認事項

◆2021.2 展示

◆ 備考

--	--

No.*

御名前 北陸-能登SR SB7

様

現場番号	A6401373	プラン番号	1612G-2011-0084T	作成日	2020/12/2
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1616サイズ		1	1,038,000	1,038,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台 (高沓ずり)	1		
3	ドア	3枚引戸<1400幅> (ホワイト) / 樹脂ガラス (半透明) (19サイズ)	1	+65,500	+65,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	洗い場	キープクリーンフロア (ハイクラス・カームベージュ)	1		
6	排水口カバー	ステンレス	1		
7	浴槽	鋳物ホーロー浴槽 (高断熱浴槽) (プレシャスホワイト)	1		
8	浴槽追い焚き穴	あり	1		
9	エプロン	カラーステンレス (保温材あり) (ホワイト)	1		
10	浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽 (ベンチ付)	1	+50,000	+50,000
11	ヘルシージェット	なし	1		
12	浴槽ハンドグリップ	2本仕様	1	+7,000	+7,000
13	ガス温水式床暖房	なし	1		
14	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース (メタル調) SB181-5UTH	1	-26,000	-26,000
15	洗い場用水栓	エコシャワー (節水) :SB181-5UTHEN	1	+10,000	+10,000
16	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
17	カウンター	人大スクエアカウンター	1		
18	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー (手すりタイプ)	1	+5,200	+5,200
19	浴室パネル	プレミアムクラス (一面デザイン) (Kパネル)	1	+15,000	+15,000
20	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
21	天井	高光沢フラット天井	1		
22	換気機器	浴室暖房乾燥機 (100V規格)	1	+41,000	+41,000
23	換気機器	ランドリーパイプメタルタイプ (1本)	1	+1,500	+1,500
24	換気機器開口	工場開口	1		
25	照明	天井付スクエア照明+ダウンライト (1灯) (白色)	1		
26	天井照明開口	工場開口	1		
27	ミラー	ロングクリアミラー	1		
28	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
29	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-4,000	-4,000
30	ハンドバー	樹脂製 I型600タイプ (風呂フタフック付) (ホワイト)	1	+13,500	+13,500
31	収納棚	クリアタイプ ブラック (3段)	1		

御名前 北陸-能登SR SB7 様

現場番号	A6401373	プラン番号	1612G-2011-0084T	作成日	2020/12/2
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500
33	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
34	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			34		\1,229,200

商品総合計	34	\1,229,200
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。


〔参考〕別途 商品組付費

システムバス商品組付費 \172,000 (税込 \189,200)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

() 内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

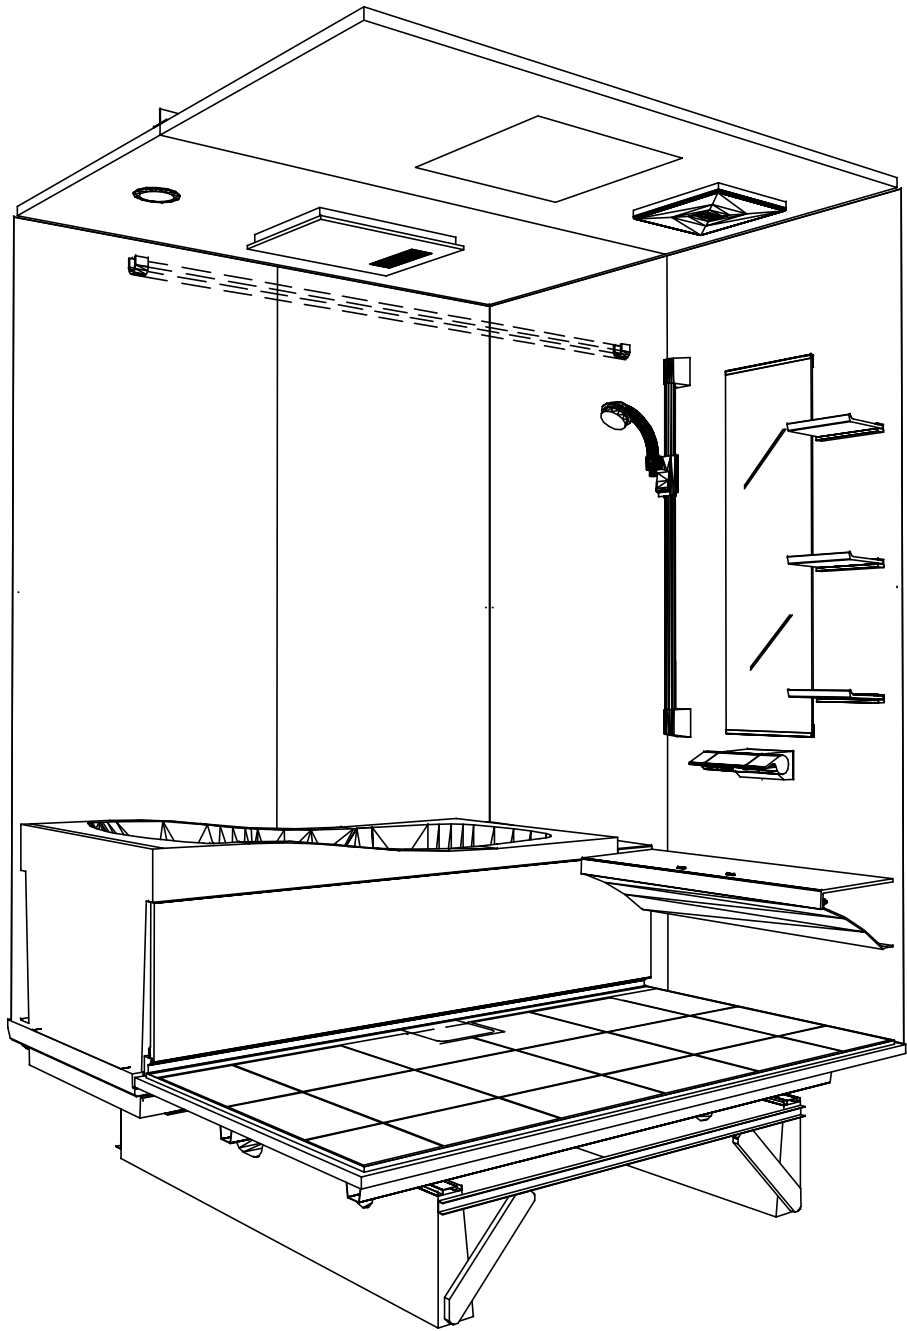

鳥瞰図

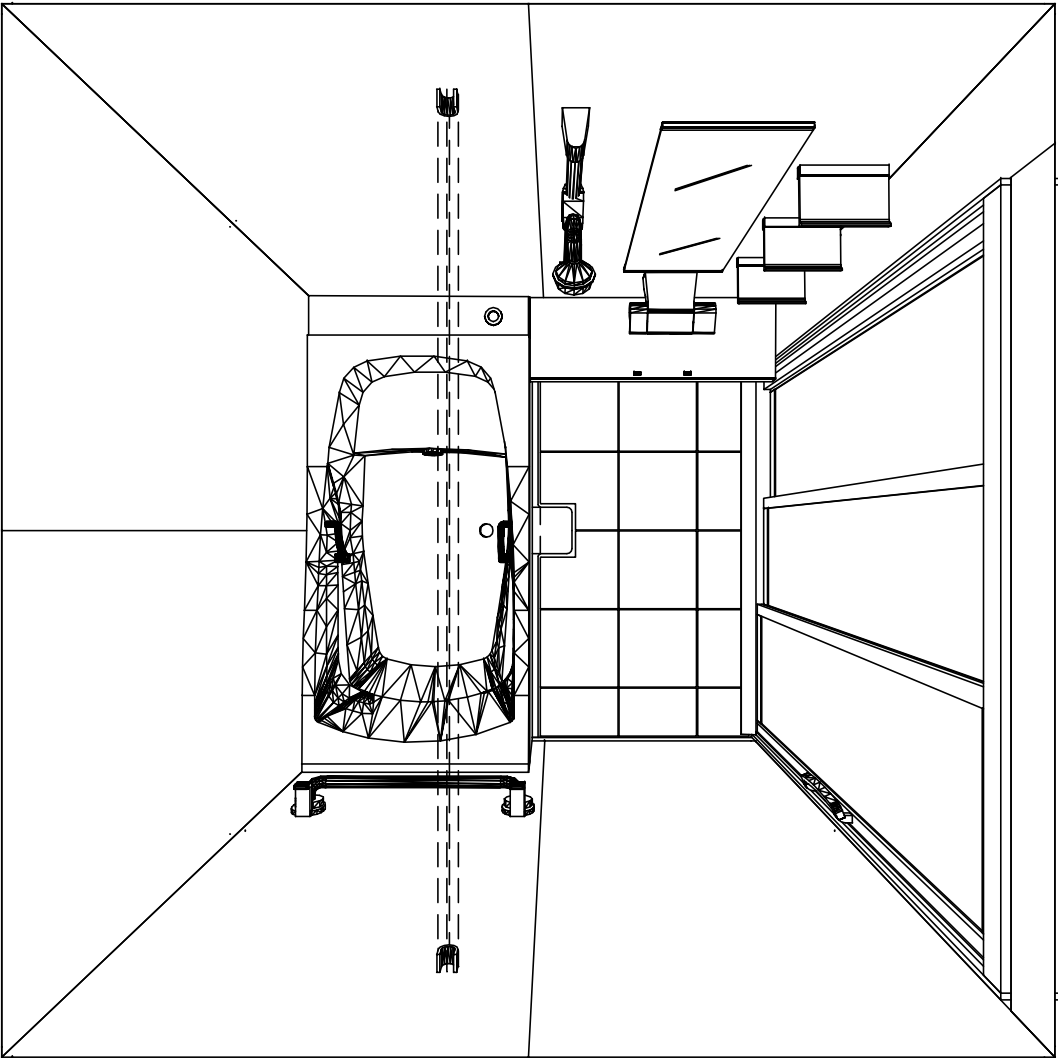

1616
鋳物ホーロー浴槽
高光沢フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・
納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認
して頂きますようお願い致します。

Takara standard タカラストンダード株式会社	現場名称： 北陸-能登SR SB7様邸	PREDENCIA プレデンスシア	姿図	
	現場番号： A6401373	プラン番号： 1612G-2011-0084T	作成日： 2020年12月2日	
	能登ショールーム	担当営業：	担当アドバイザー：	

カウンター面


浴槽側面

洗場側面


カウンター対面

■留意事項



※印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

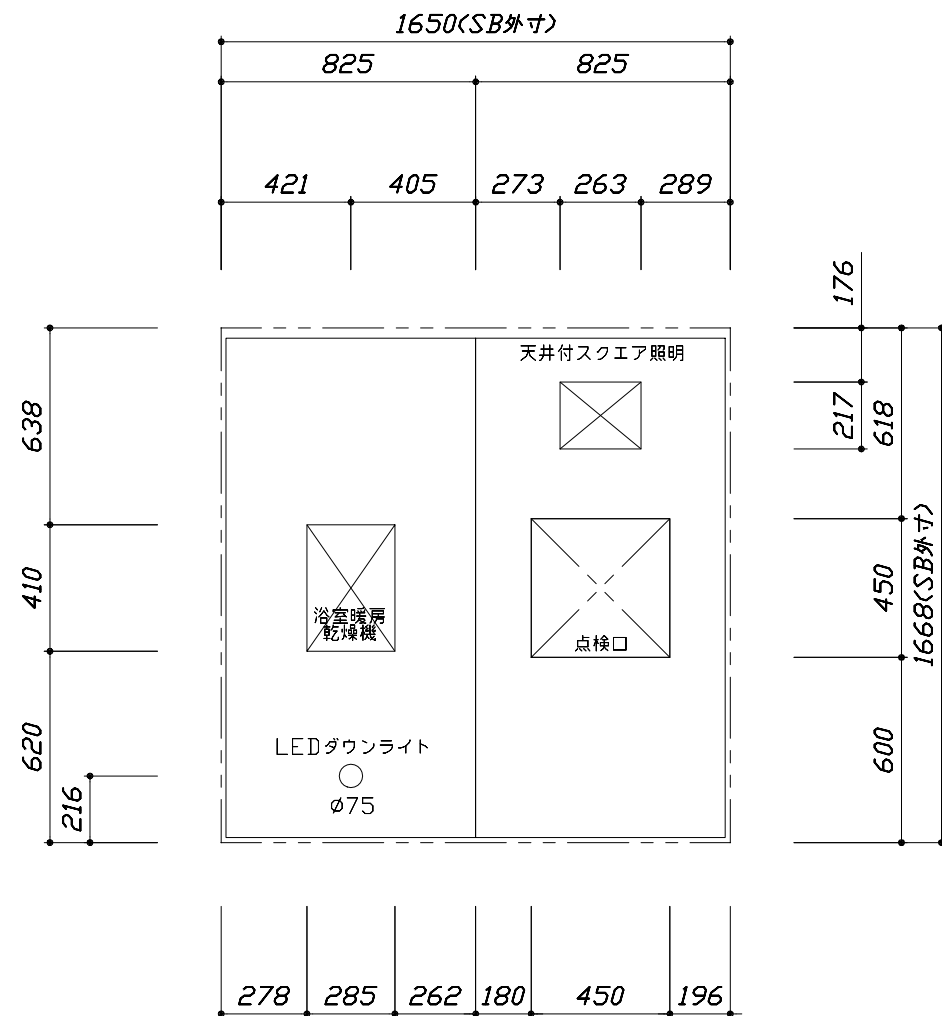

< 天井伏図 >

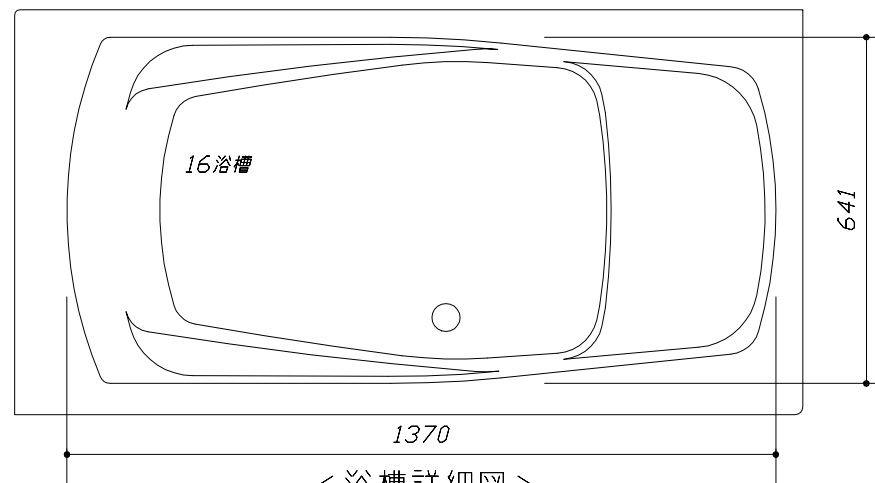



< 浴槽詳細図 >

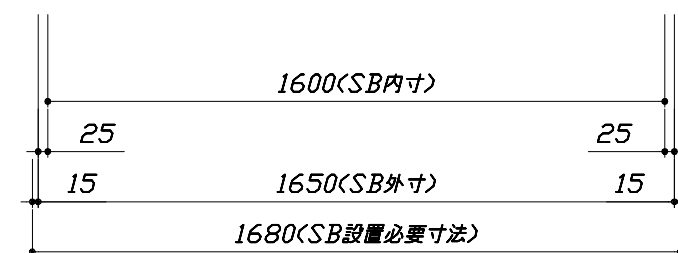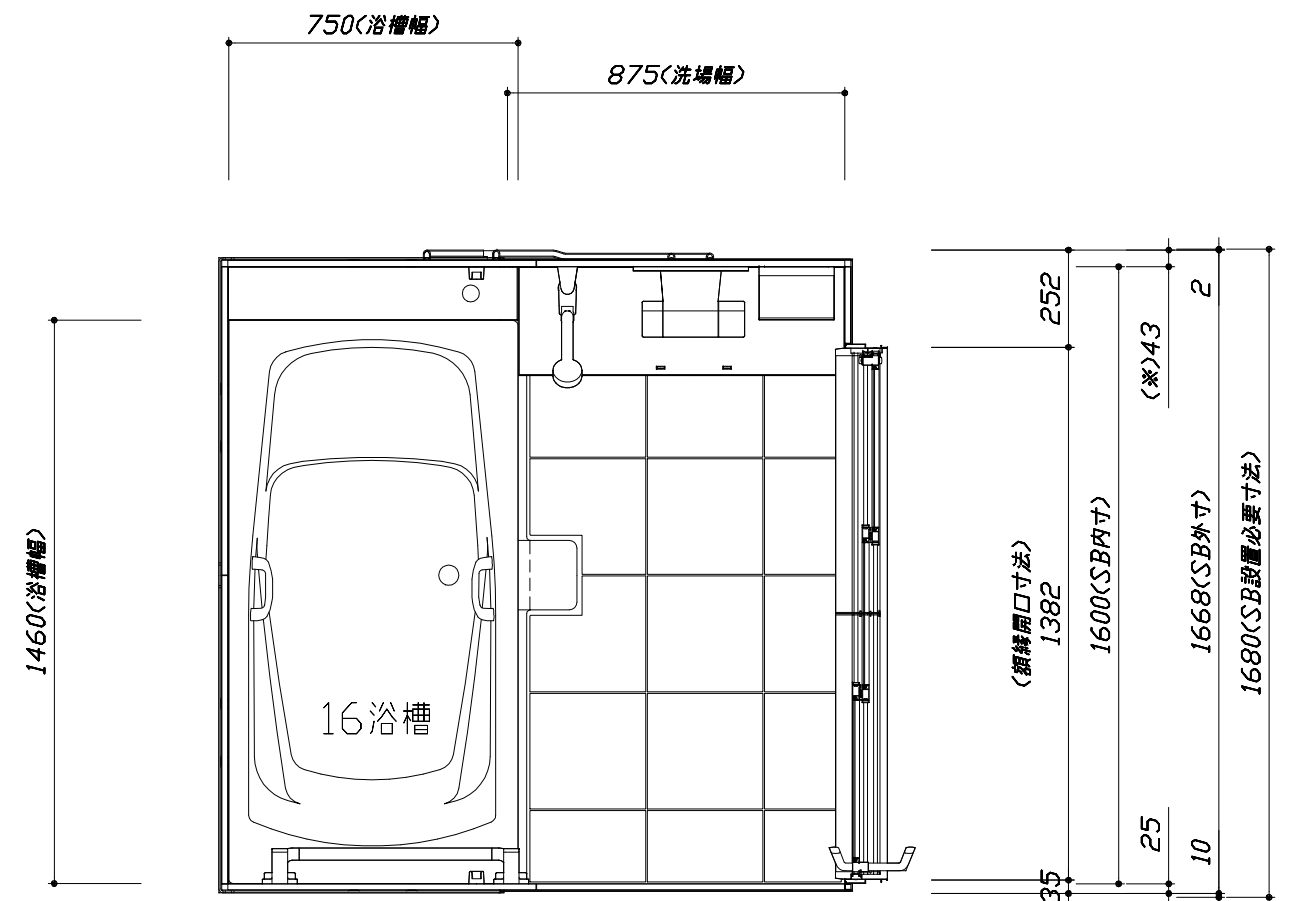

< 平面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認お願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

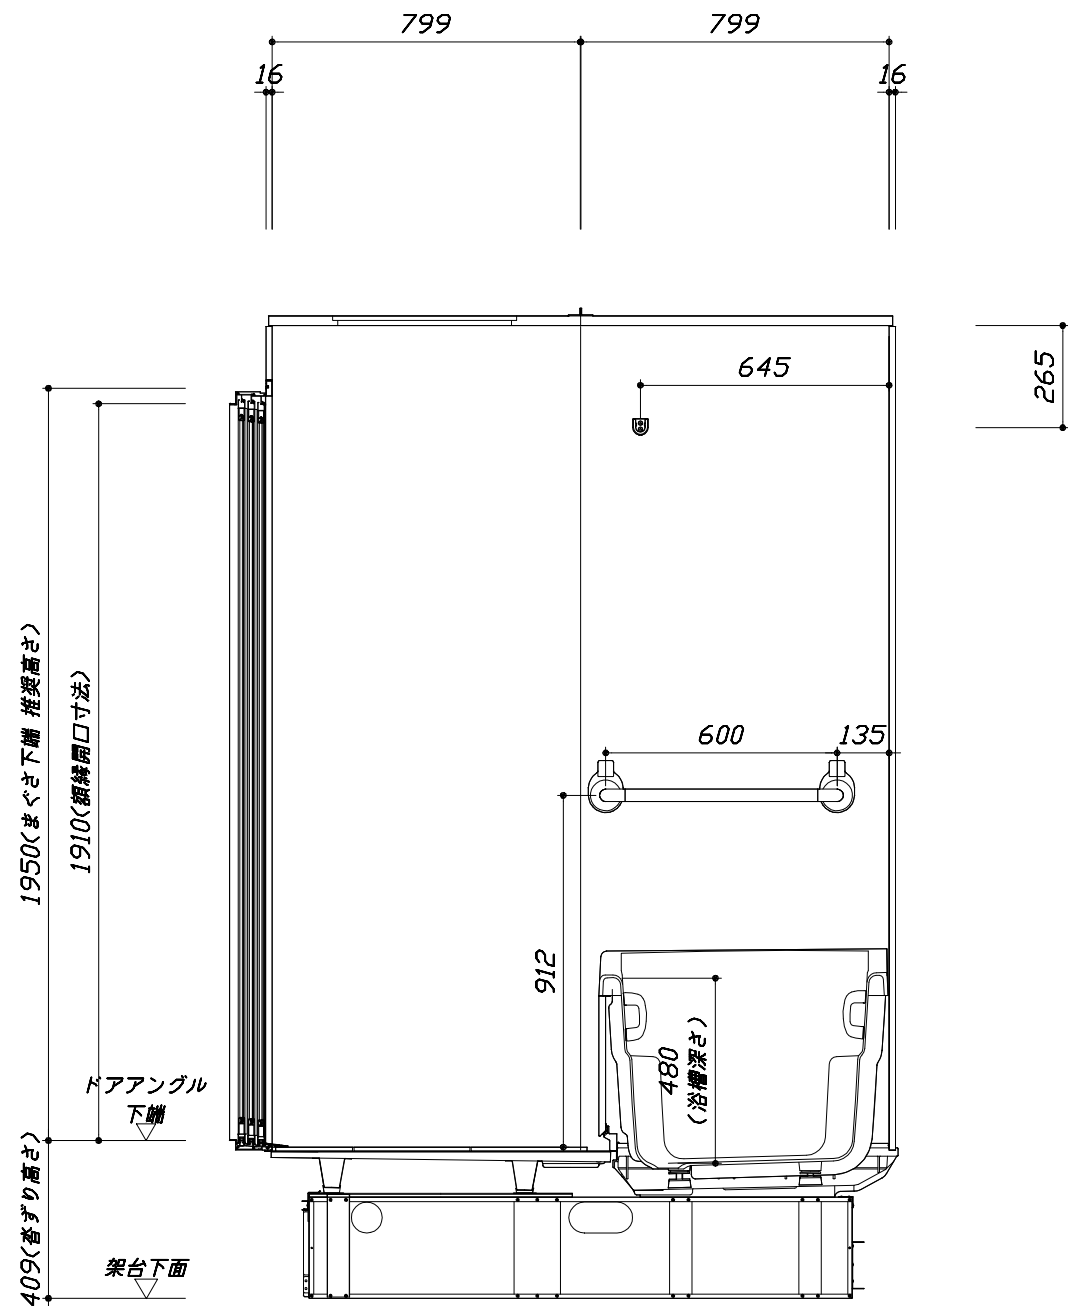

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
420mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

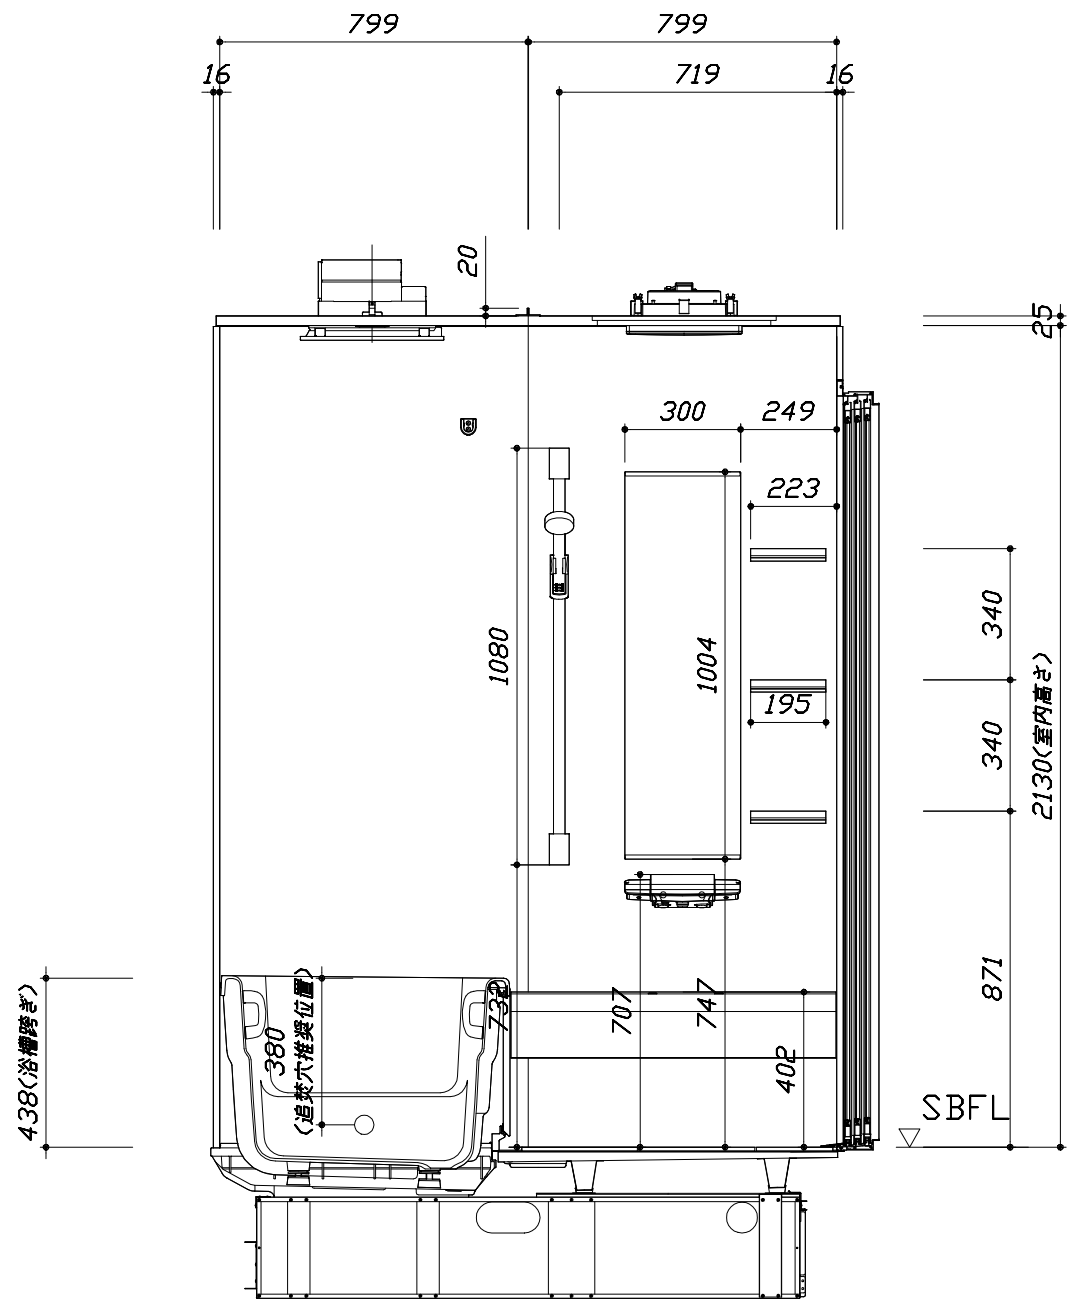

<カウンター面図>

Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： 北陸-能登SR SB7様邸
現場番号： A6401373
能登ショールーム



PREDENCIA プレデンスシア
プラン番号： 1612G-2011-0084T
担当営業：

施工図2 縮尺： 1:20
作成日： 2020年12月2日
担当アドバイザー：


縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認お願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

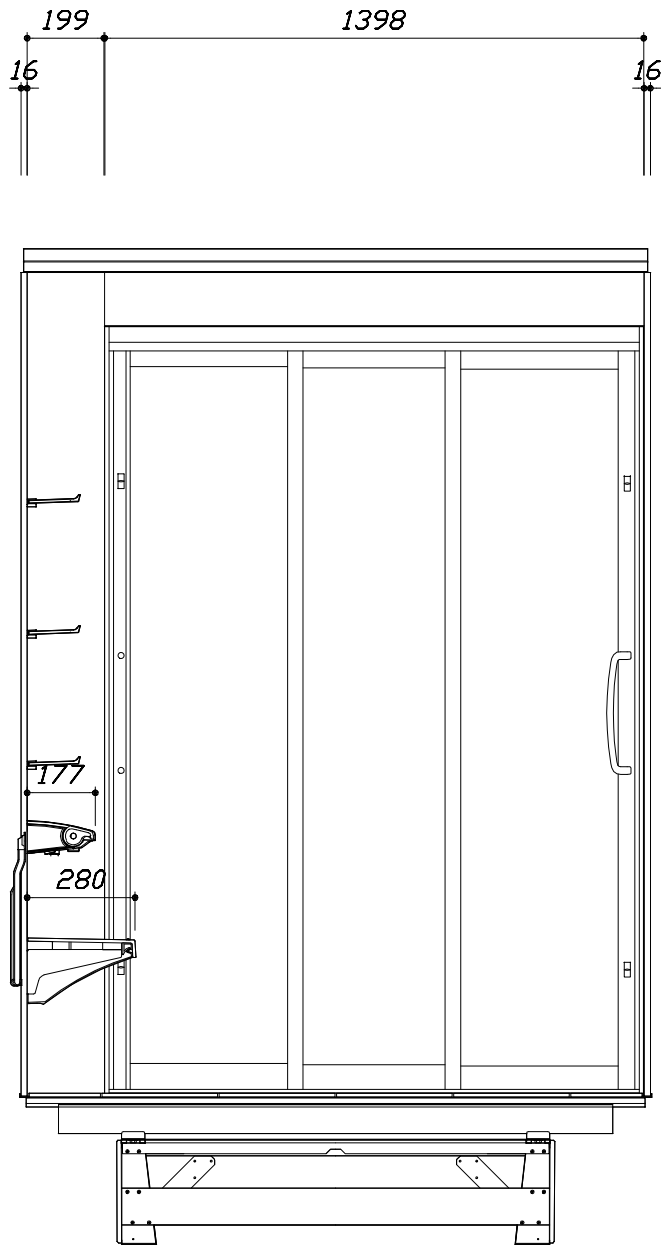

< 洗場側面図 >

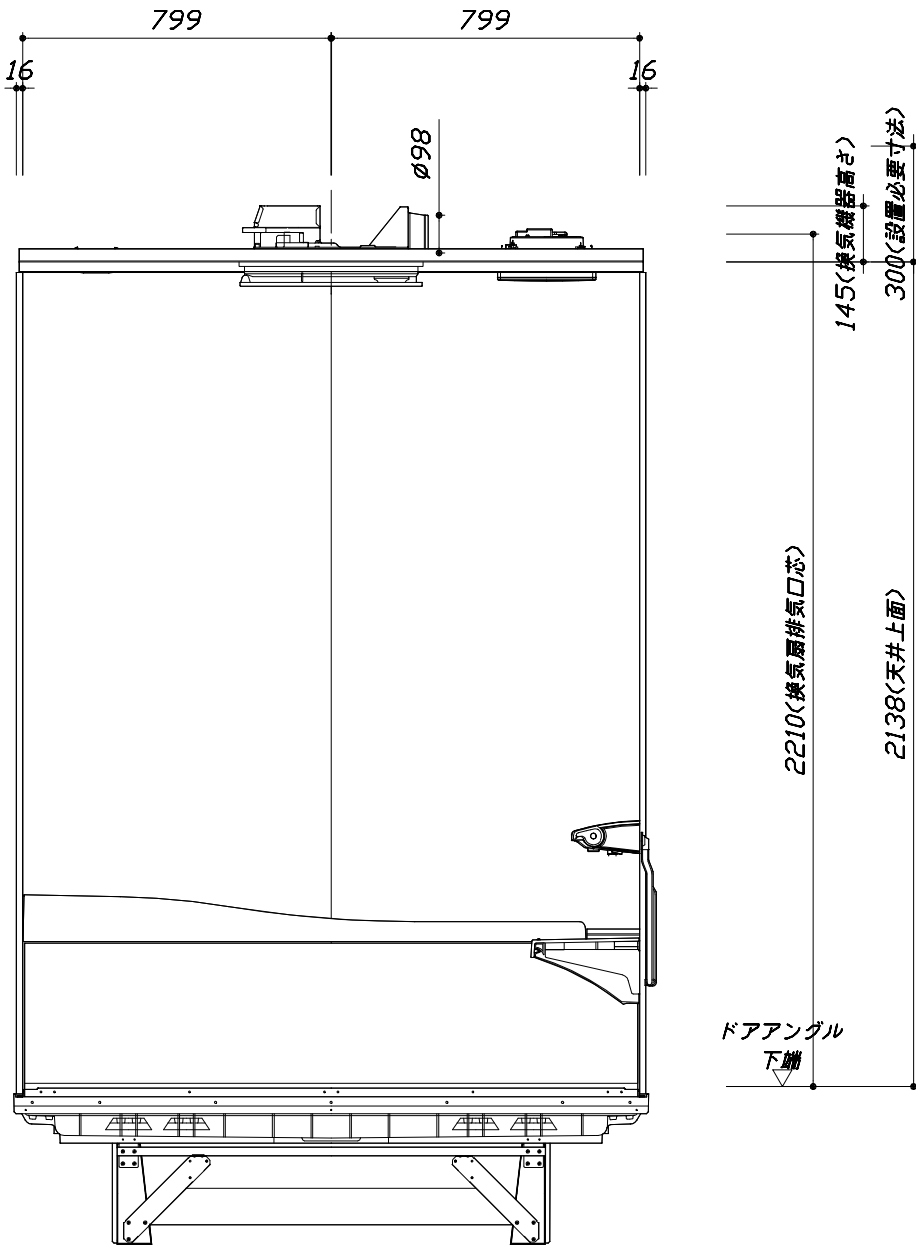

< 浴槽側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
420mm下がり
(クリア寸法含む)


基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

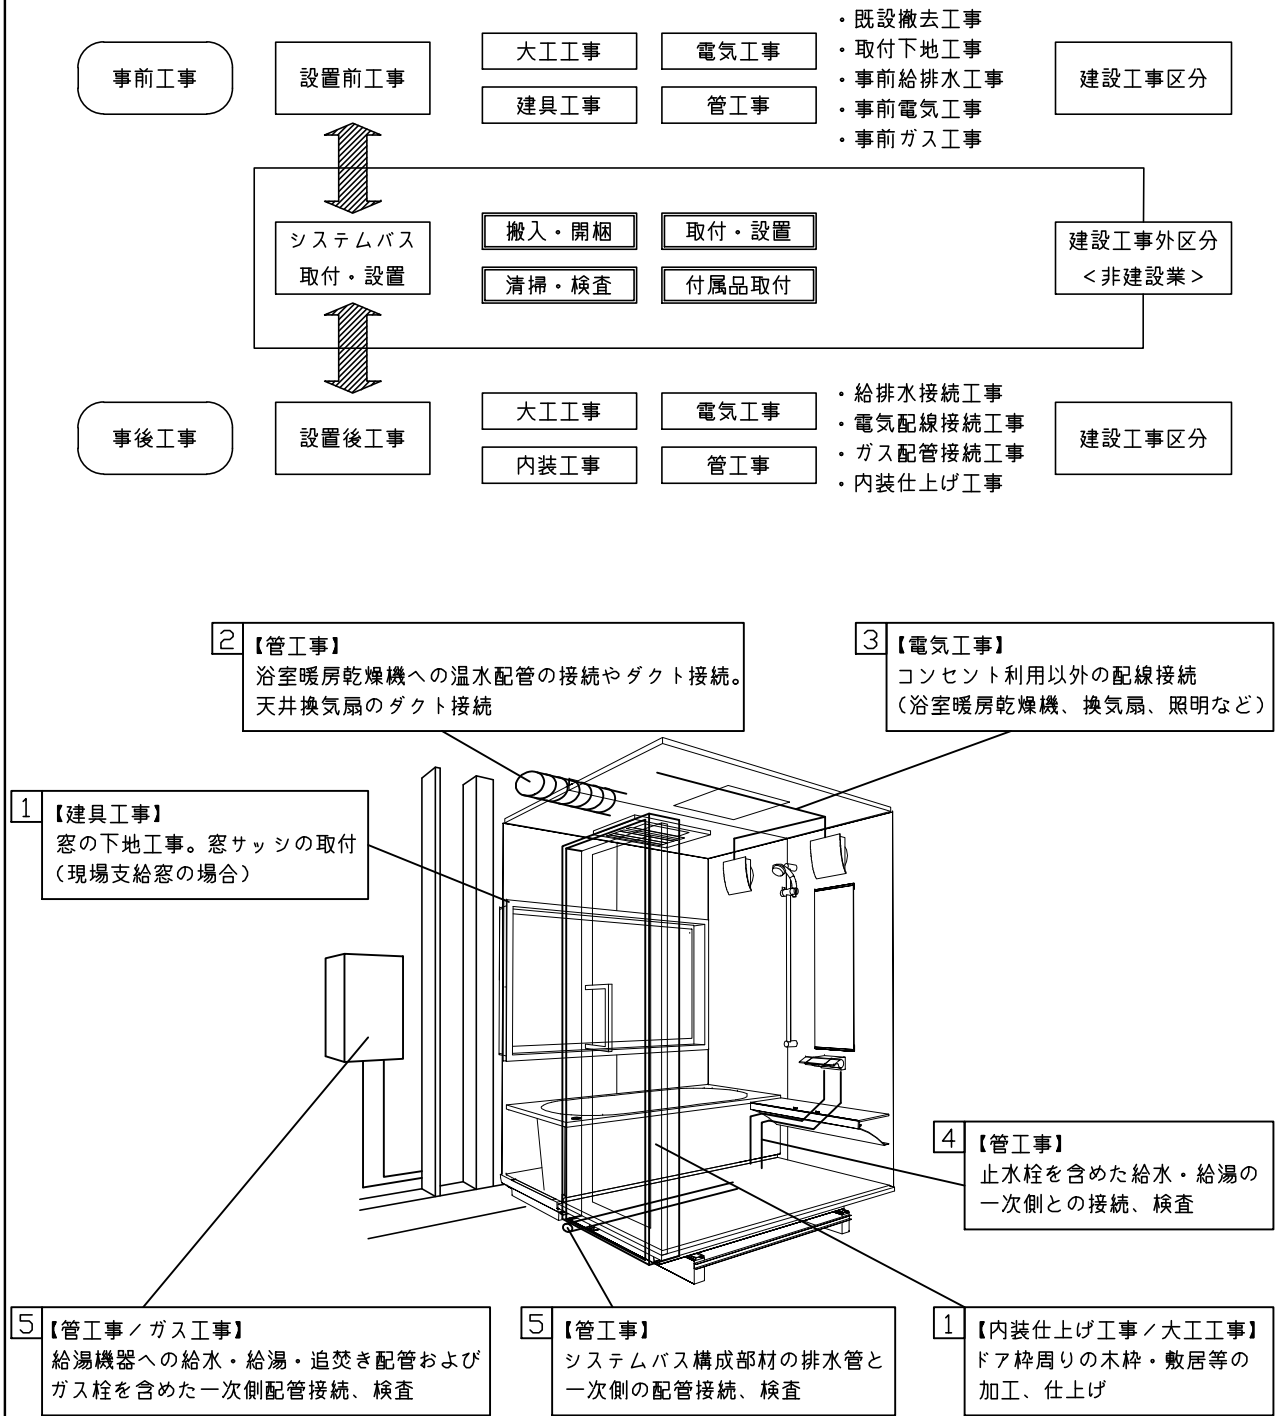

■システムバス 工事区分		参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』									
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	とび 土工 事	建具 工事	管 工事	電気 工事	給湯 機器 設備	シス テム バス 設置	
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
			給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
			架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○			建築の外装仕上げ工事
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
			浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする


※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する

※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする

Takara standard タカラストANDARD株式会社	現場名称： 北陸－能登SR SB7様邸	PREDENCIA プレデンスシア	工事区分表
	現場番号： A6401373	プラン番号： 1612G-2011-0084T	作成日： 2020年12月2日
	能登ショールーム	担当営業： 〃	担当アドバイザー： 〃


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

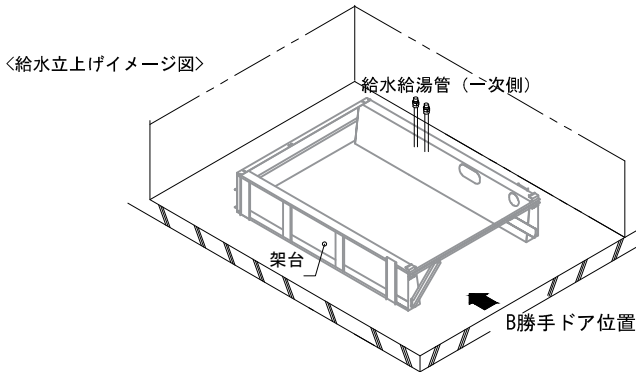



■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より 420mm 下がりで打設してください。

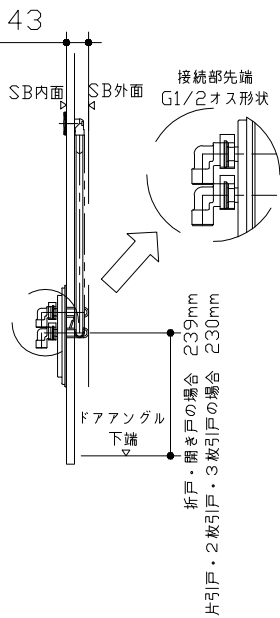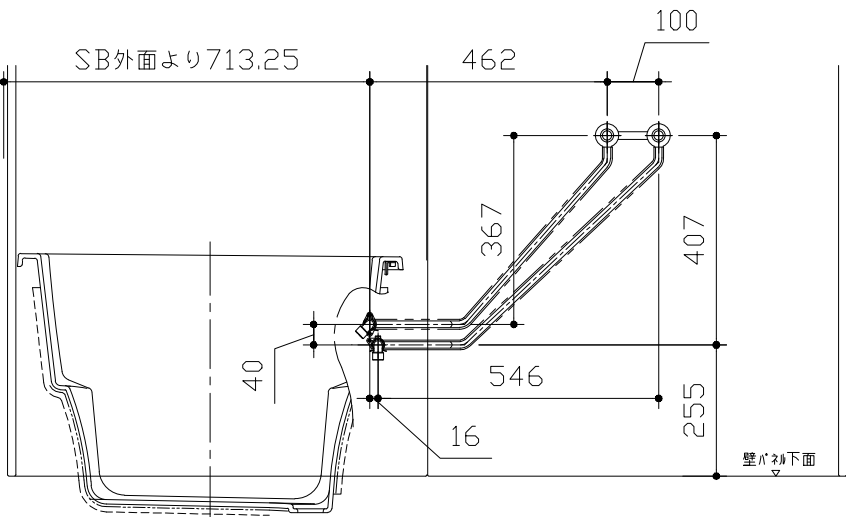

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置

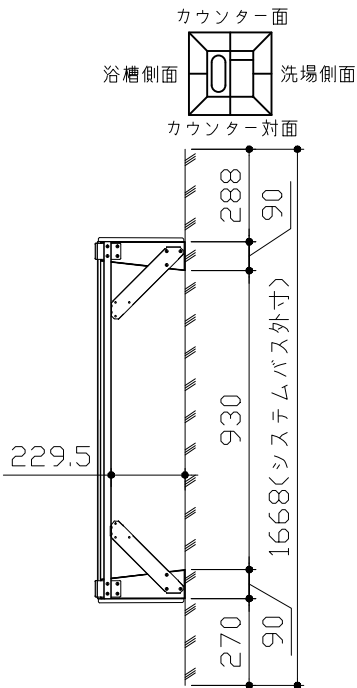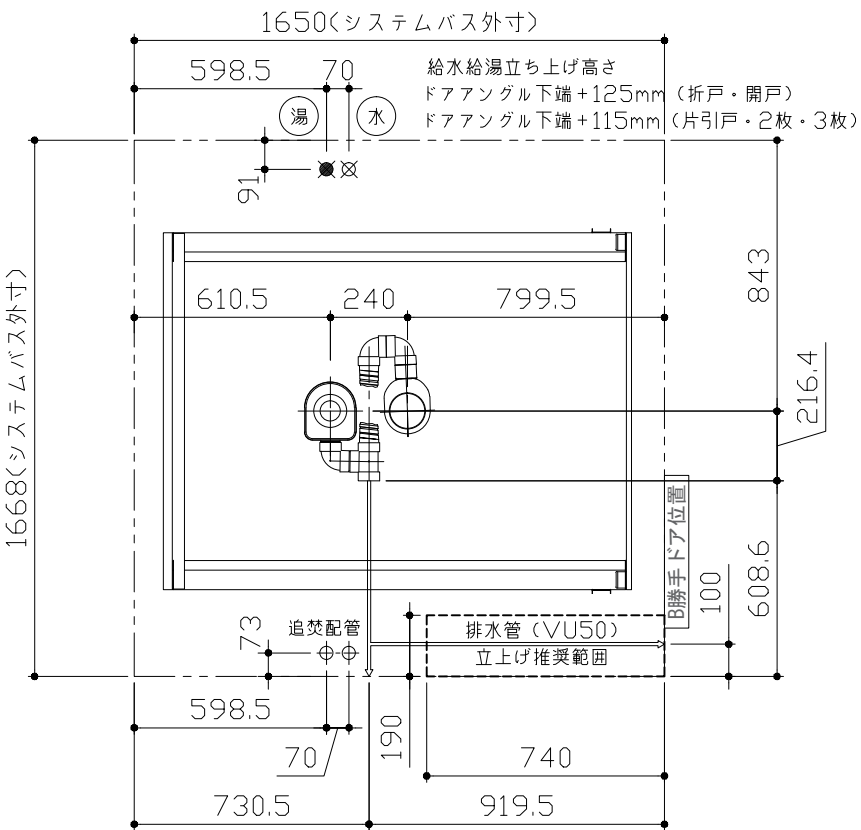

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉



■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項



- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

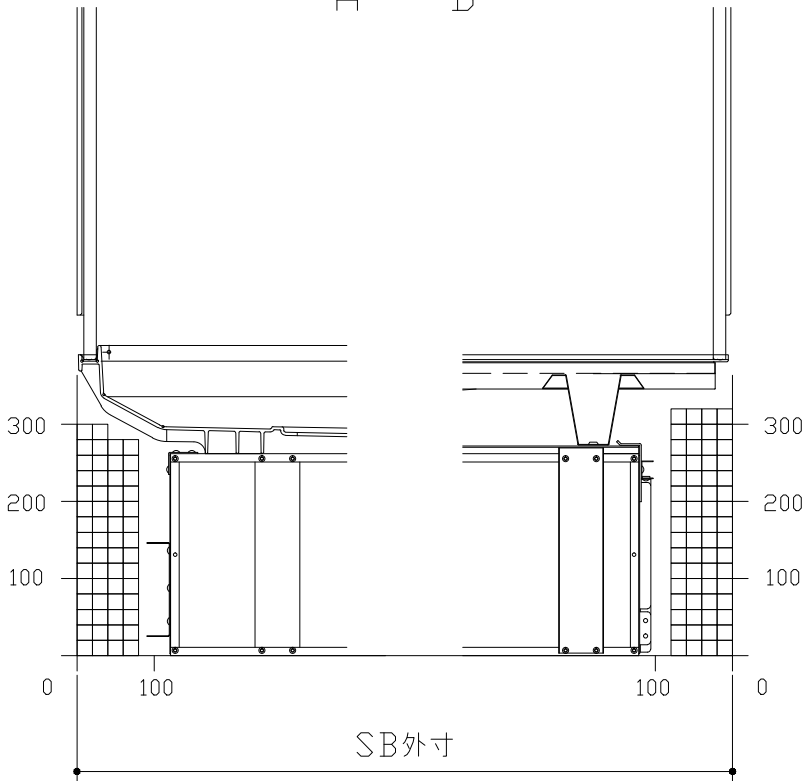


A矢視

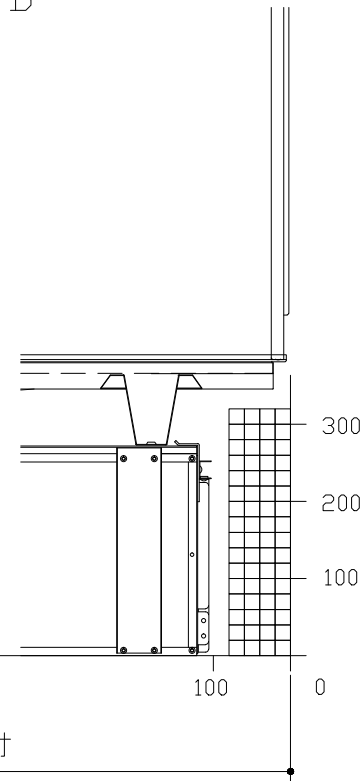



B矢視

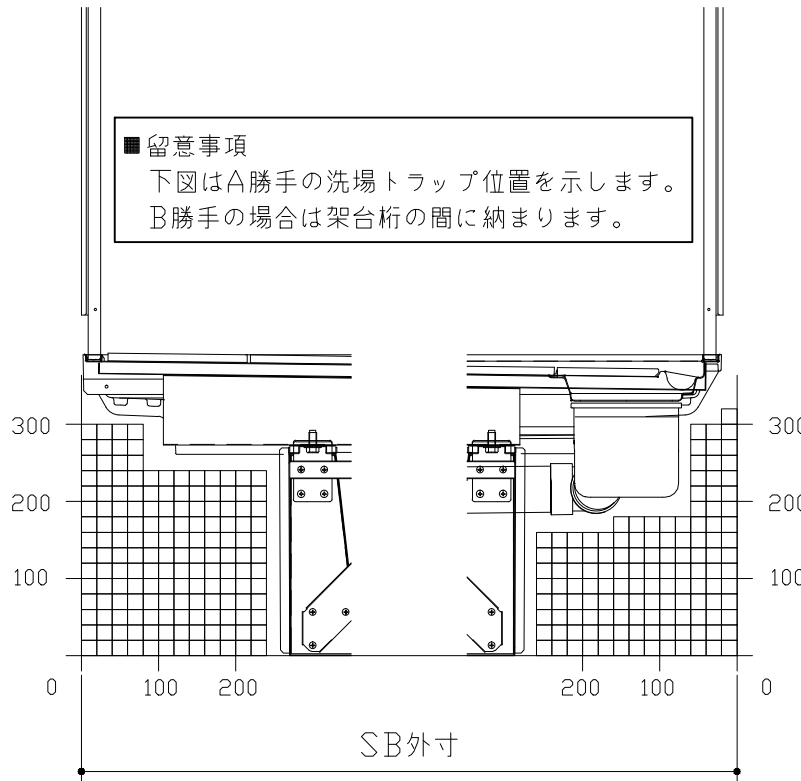


C矢視

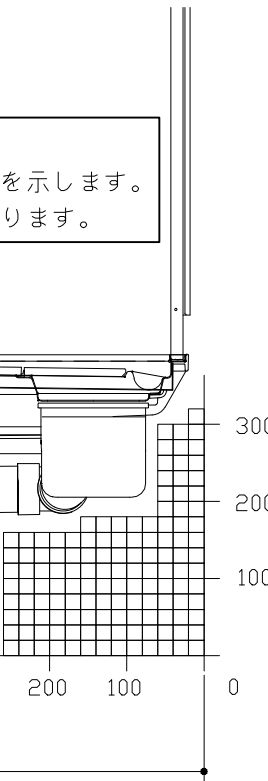

D矢視

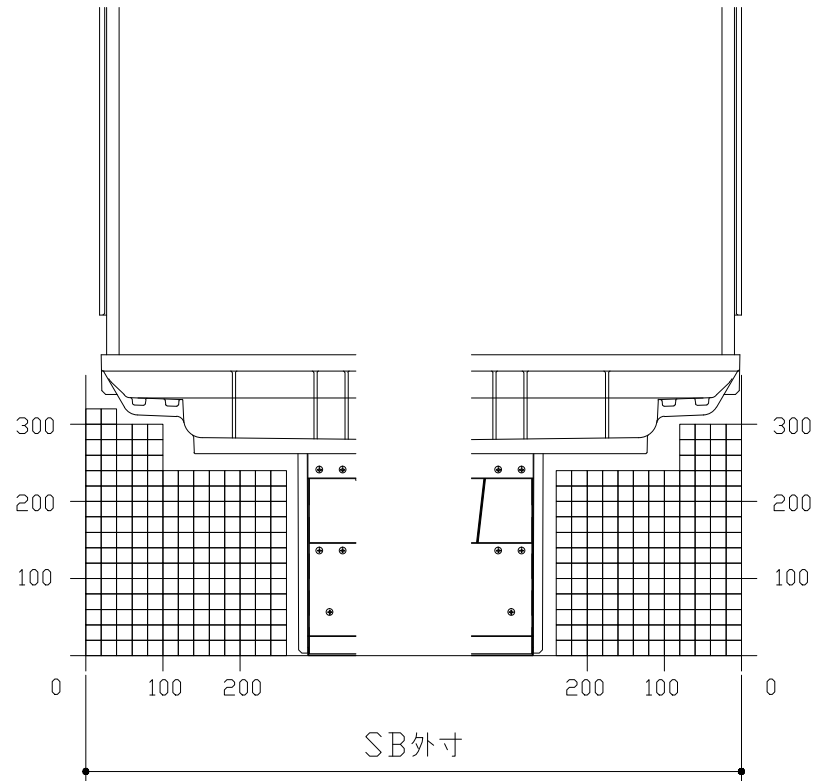




E矢視

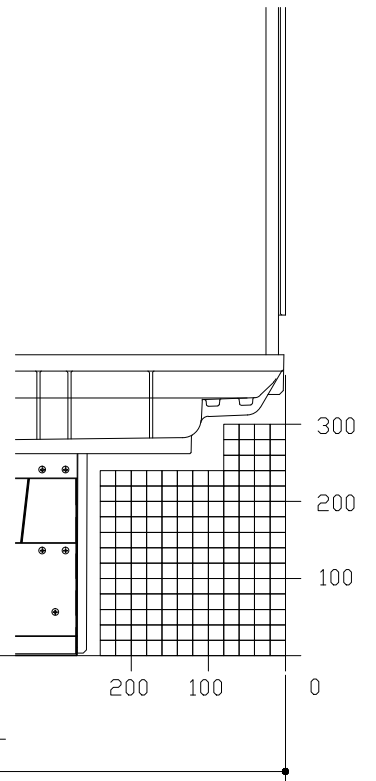

F矢視

キープクリーンドア：3枚引戸・タテ型換気口

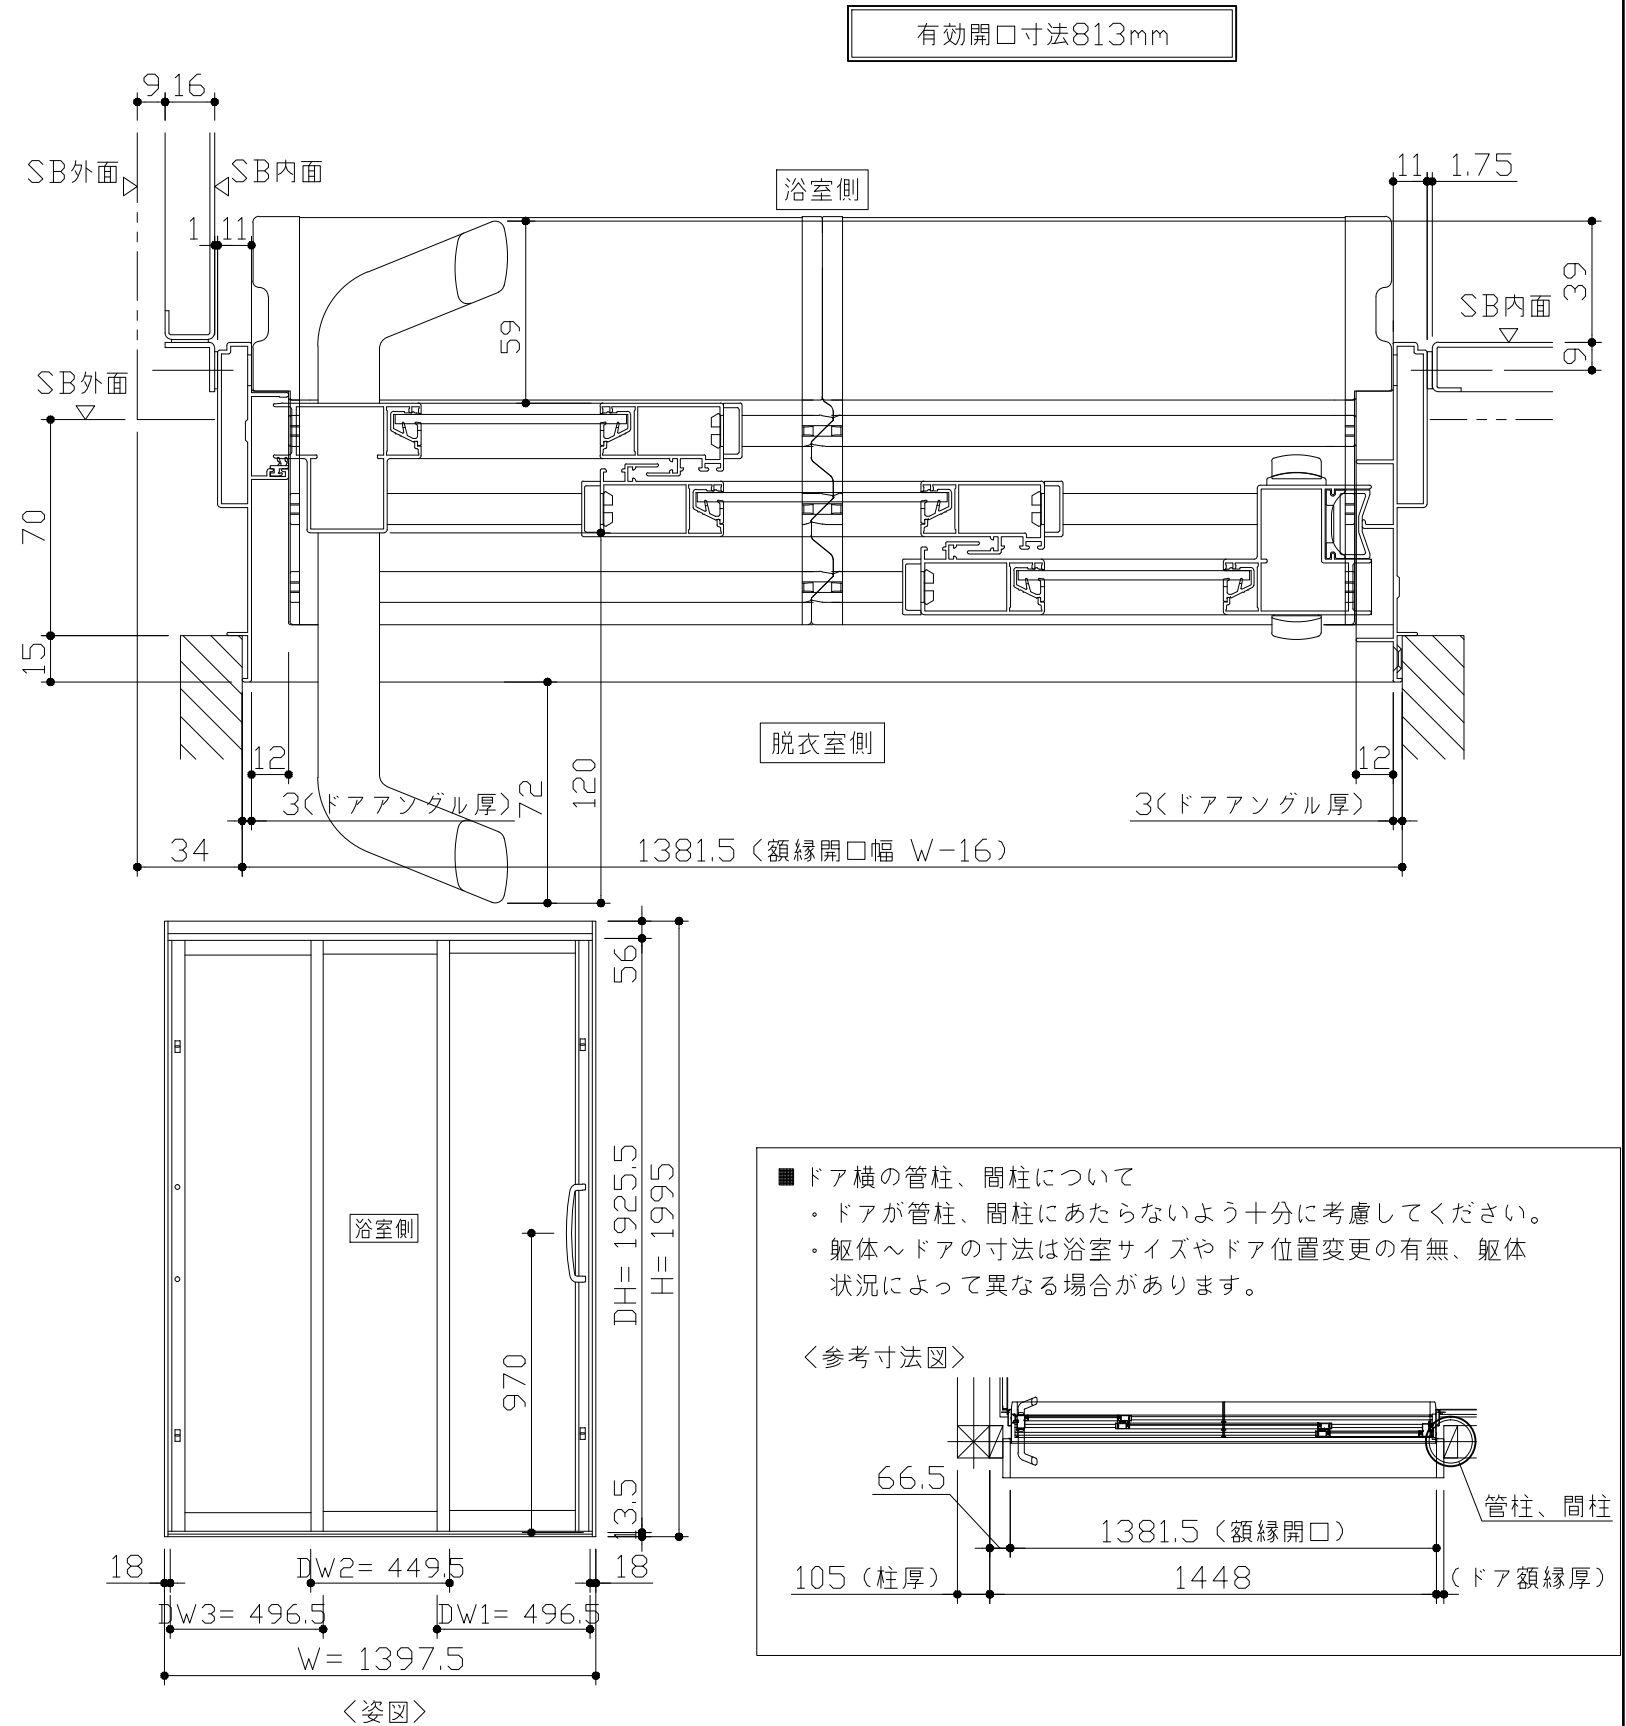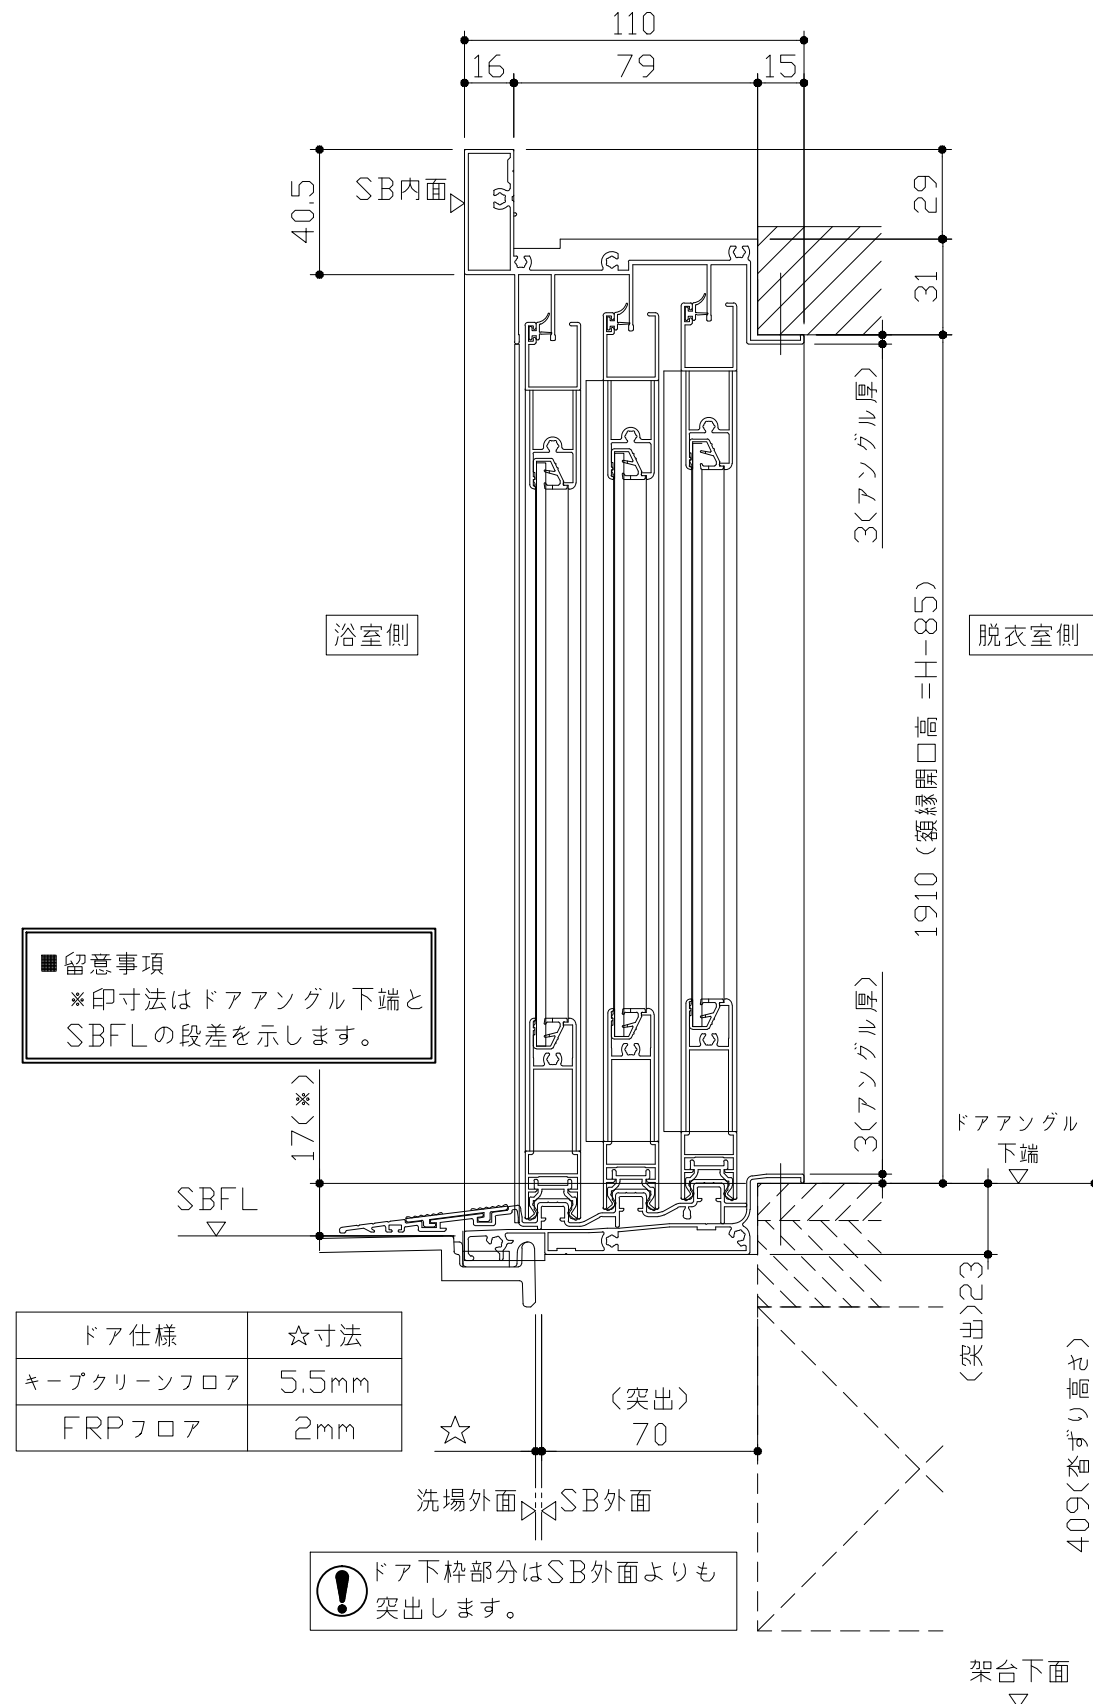


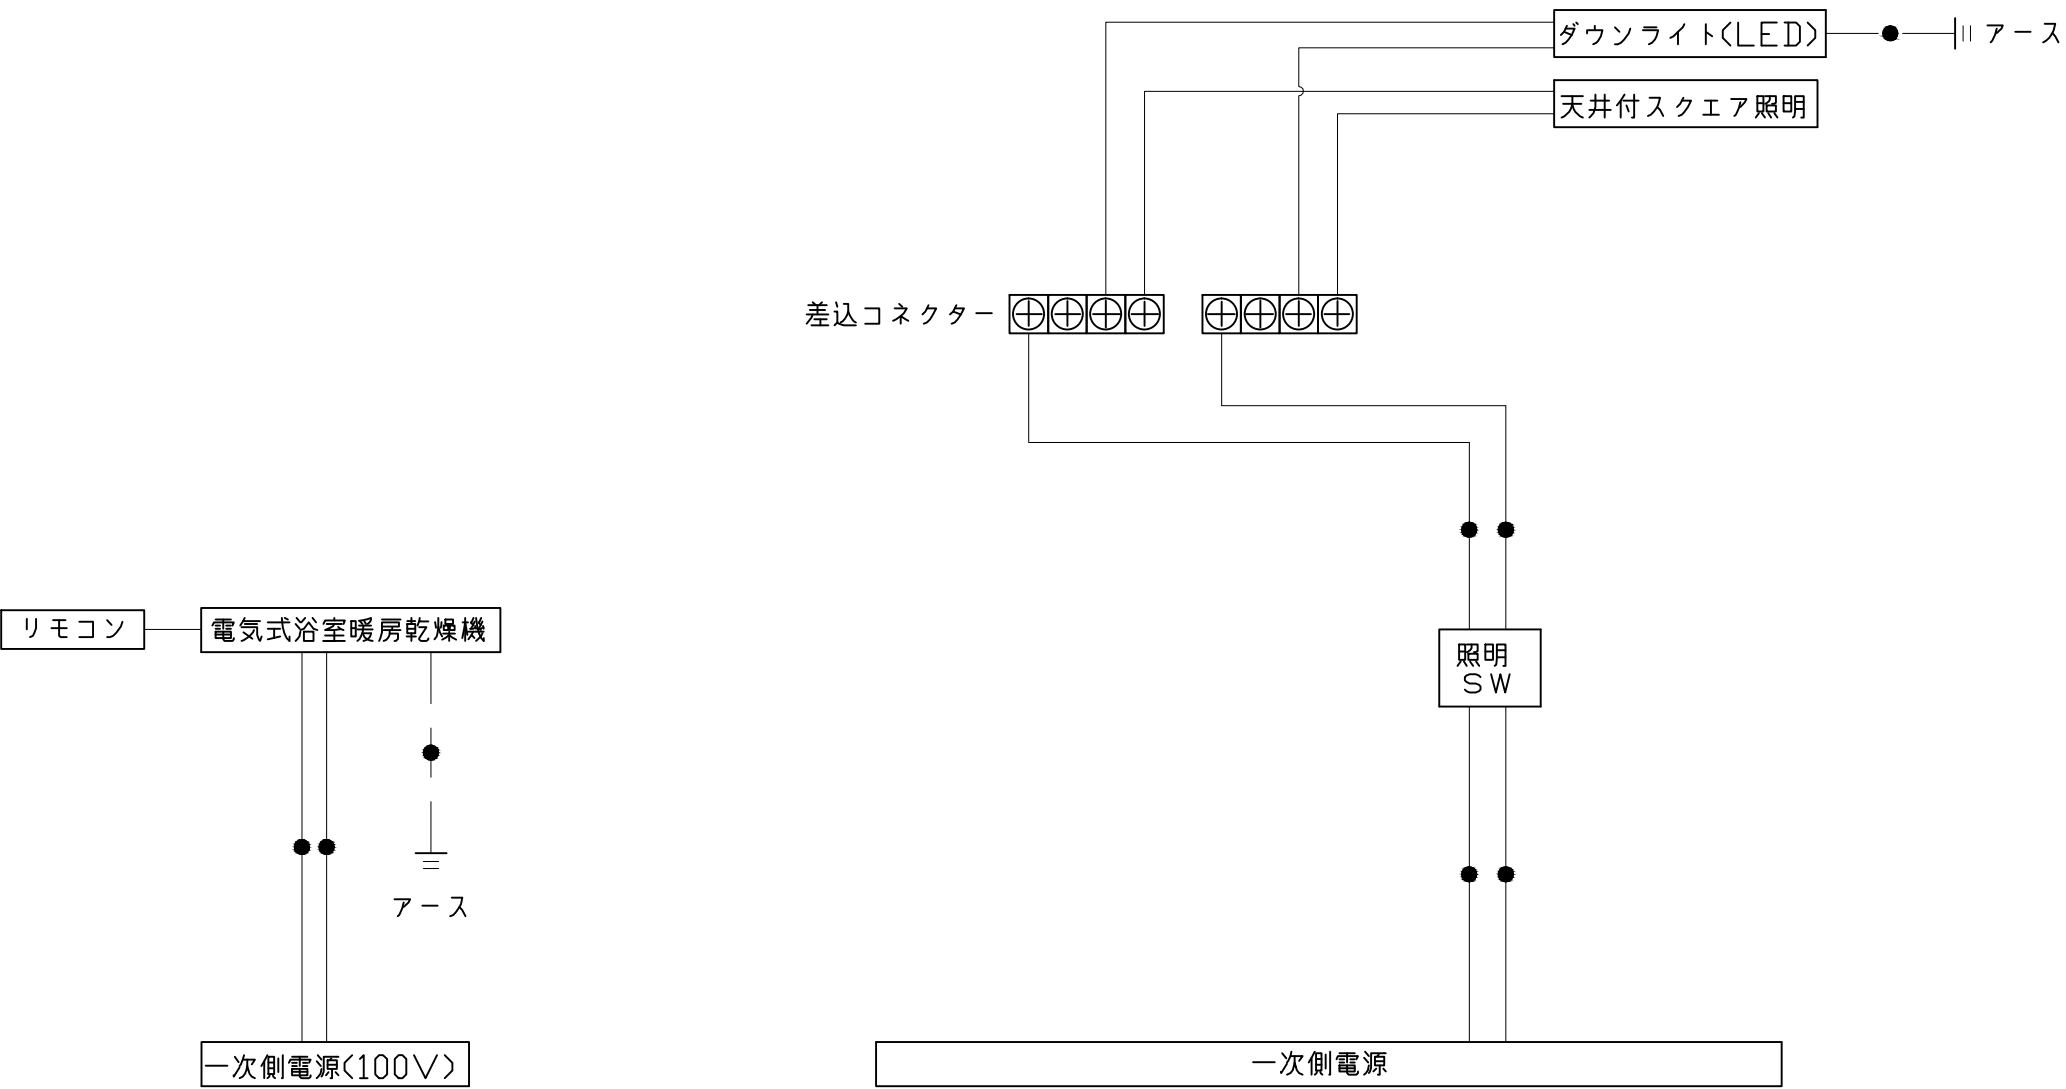


一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。

Takara standard タカラストンダード株式会社	現場名称： 北陸-能登SR SB7様邸	PREDENCIA プレデンスシア	電気配線図	
	現場番号： A6401373	プラン番号： 1612G-2011-0084T	作成日： 2020年12月2日	
	能登ショールーム	担当営業：	担当アドバイザー：	

浴槽

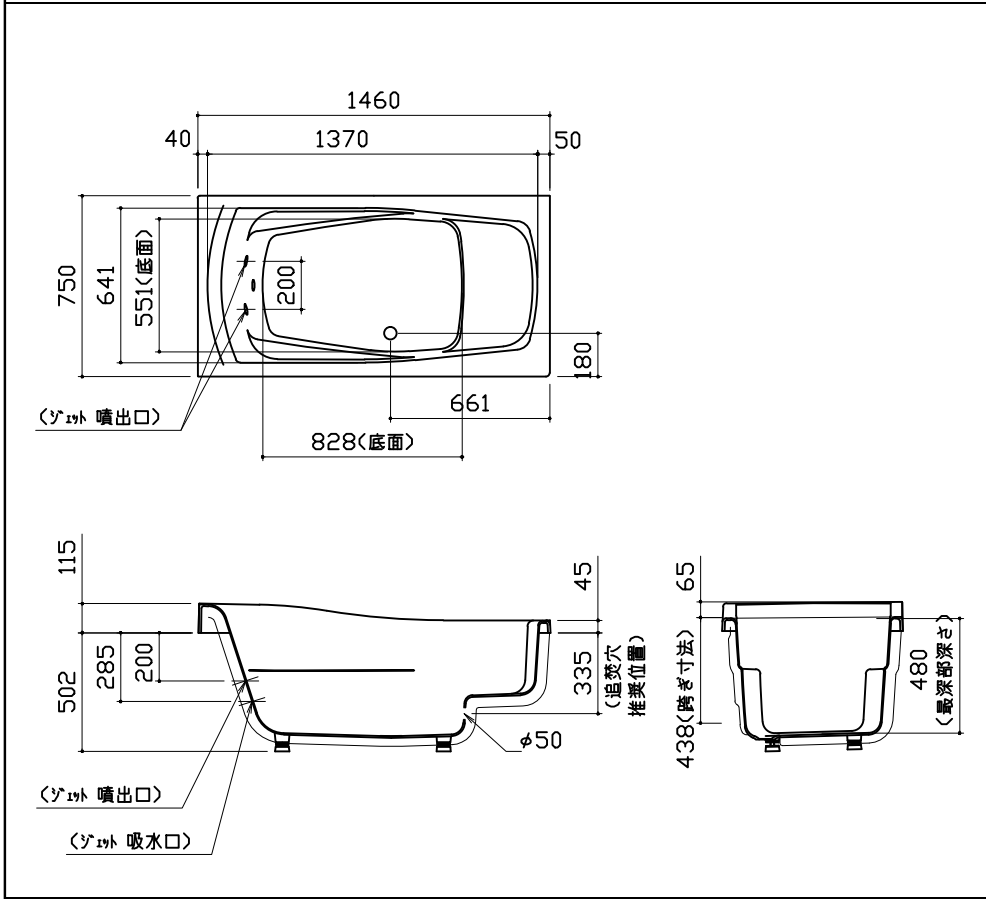

洗い場用水栓

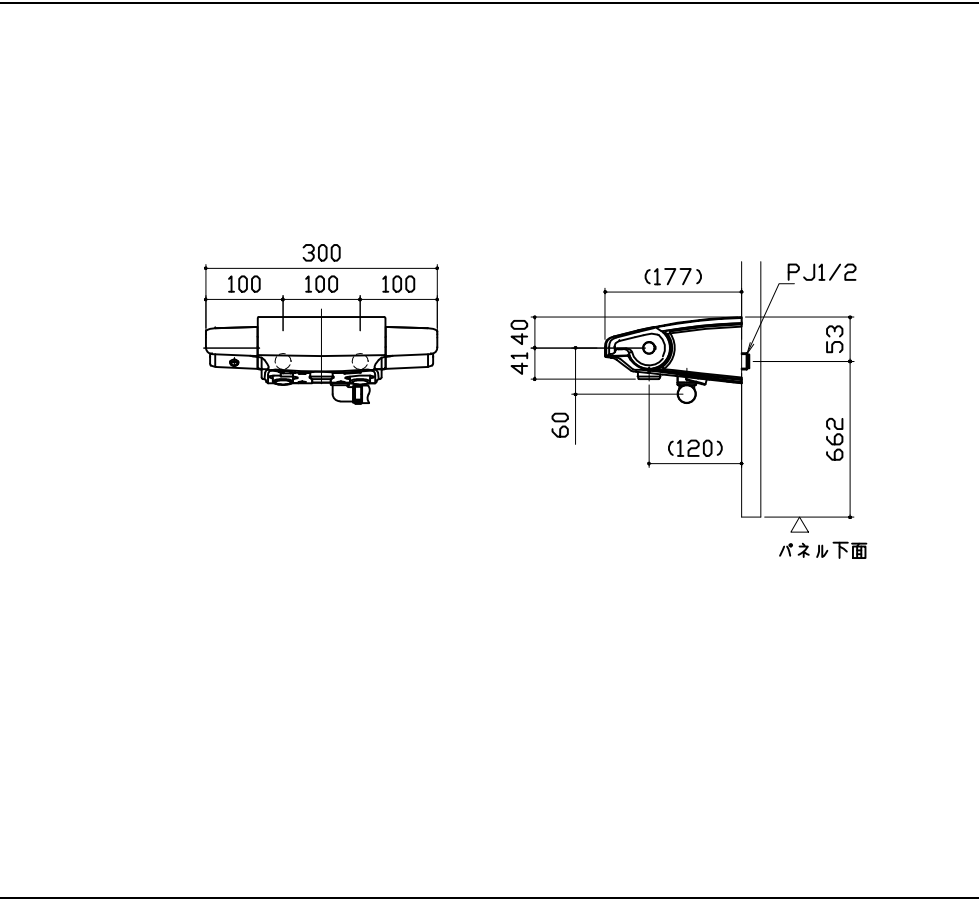

照明

天井付スクエア照明
LED 11W (1灯あたり)

正面図

263(天井開口)

85

25

天井厚み

25

300

システムバス
天井表面

スクエア照明本体

側面図

217(天井開口)

255

Detailed description: The image shows a technical drawing of a square ceiling-mounted LED light fixture. It includes two views: a front view (正面図) and a side view (側面図). The front view shows a square base with a width of 300mm. The light fixture itself is 263mm wide, matching the ceiling opening. The height of the fixture is 85mm, and the ceiling thickness is 25mm. The side view shows the fixture's depth is 217mm, also matching the ceiling opening, and its width is 255mm. Labels indicate the 'システムバス 天井表面' (system bathroom ceiling surface) and the 'スクエア照明本体' (square light fixture body).

ダウンライト
LED 4.1W (1灯あたり)

Technical drawing of the LED downlight showing dimensions and components. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a cylindrical body with a diameter of 75mm at the top (天井開口). The top view shows a square base with a side length of 85mm. The height of the main body is 64mm, and the height of the base is 25mm. The base is labeled '天井厚み' (ceiling thickness). A dimension of 3mm is shown for the base thickness. The drawing also shows the internal components, including the LED chip and the heat sink.

φ75 (天井開口)

64

3

φ85

天井厚み
25

換氣機器


リモコンコード長さ：5m
外形：縦120mm×横116mm

管工事

The drawing shows two views of the remote control receiver unit. The top view is a front elevation showing a square body with a circular lens in the center. Dimensions include a body width of 280mm, a lens diameter of 100mm, and a base width of 372mm (grille). The bottom view is a side elevation showing the unit's profile. Dimensions include a body height of 145mm, a total height of 400mm, a base width of 472mm (grille), and a base height of 38mm. A label 'システムバス天井' (System Bath Ceiling) points to the unit. A note '天井厚み 25' (Ceiling thickness 25) is shown on the left. A side view dimension of 72mm (exhaust) is shown on the right.

管工事

シャーフックスライドバー

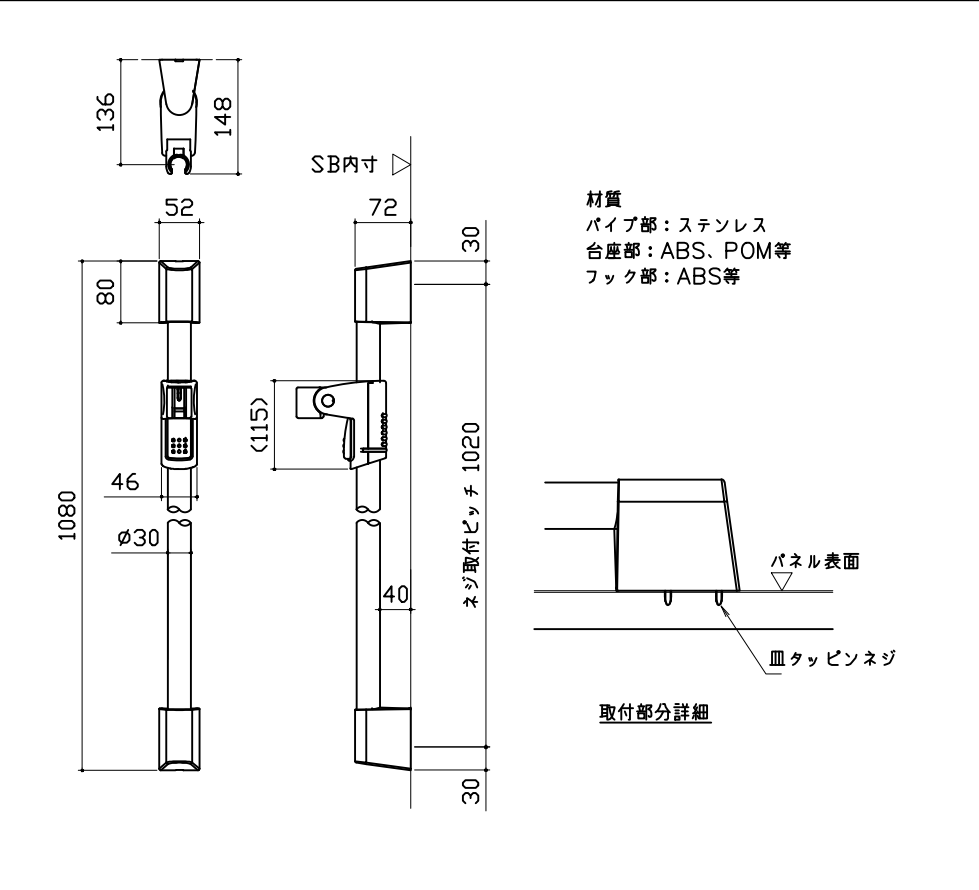

ミラー

枠: SUS304 t0.8
 ミラー: 表面防曇コートあり (ロングクリアミラー-A)
 表面防曇コートなし (ロングミラー-A)

The drawing shows a rectangular mirror frame. The front view (left) has a total width of 300 (mirror body) and a total height of 1000 (mirror body). The mirror body itself is 218 wide. The frame has a thickness of 9.5. The mounting holes are spaced 41 from the sides and 25.5 from the bottom. The side view (right) shows a total height of 969 (mounting hole pitch). The mirror body is 5 thick. The mounting holes are 11 from the top and bottom edges. The mounting hardware is labeled '取付金具' (mounting hardware).

Takara standard

タカラストンダード株式会社

現場名称：	北陸-能登SR SB7様邸
-------	---------------

現場番号： A6401373

能登シヨールム

PREDENCIA プレデソシア

プラン番号： 1612G-2011-0084T








担当営業	:	
------	---	--

部材詳細図

1/2

作成日： 2020年12月2日

担当アドバイザー：

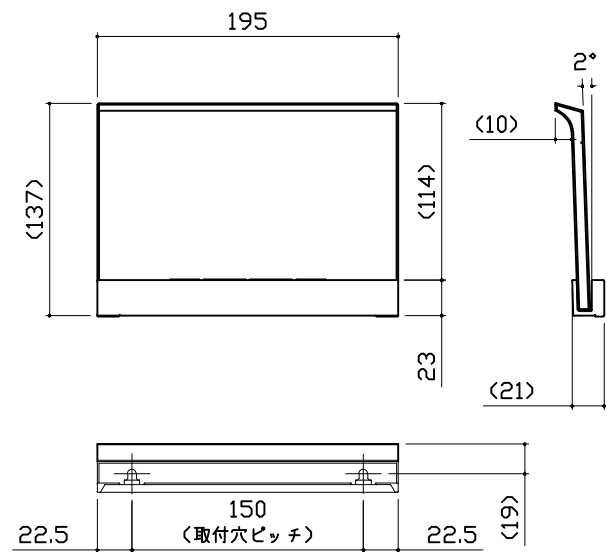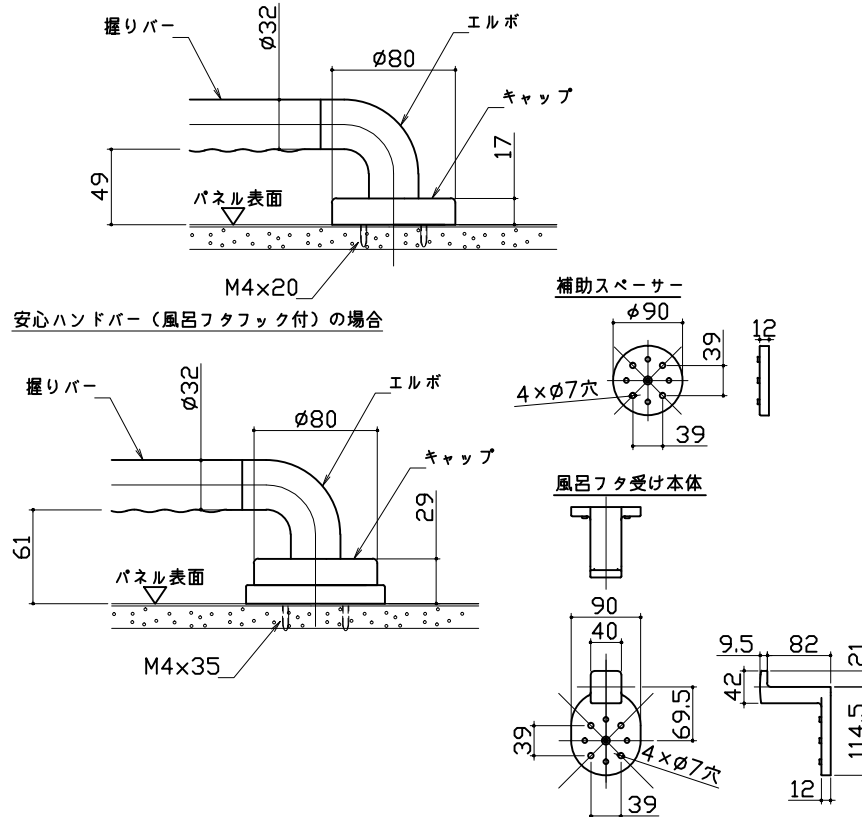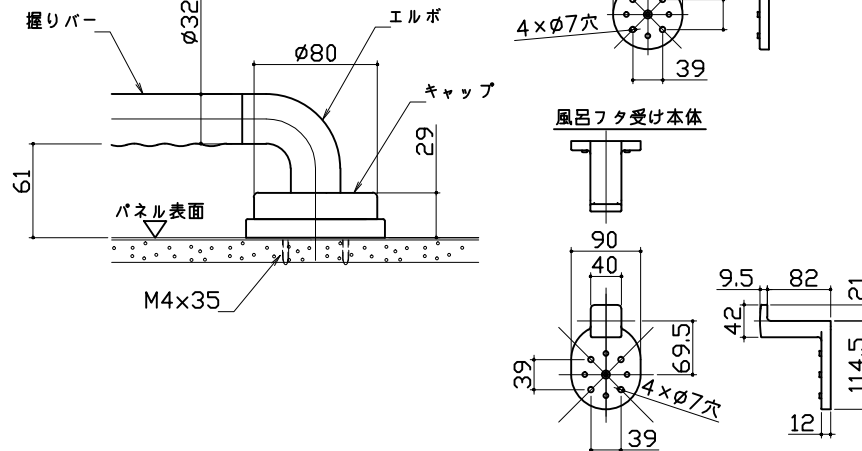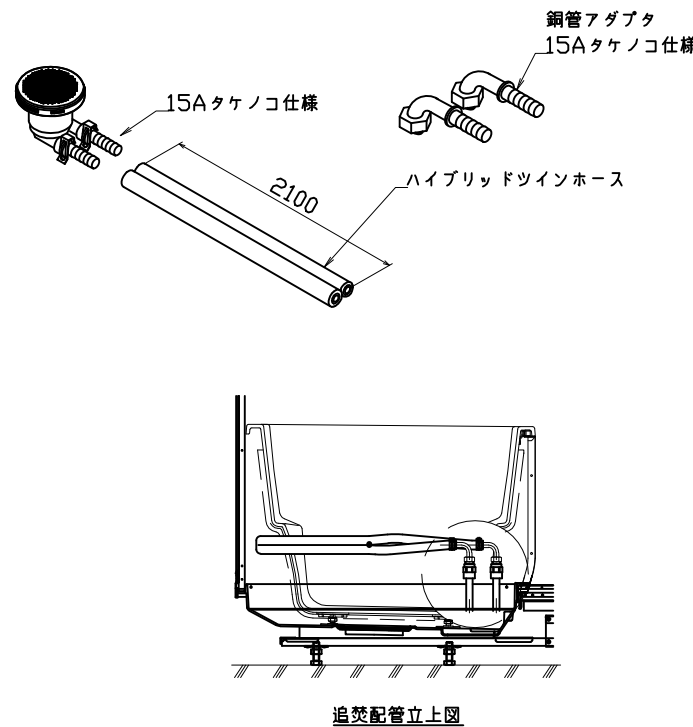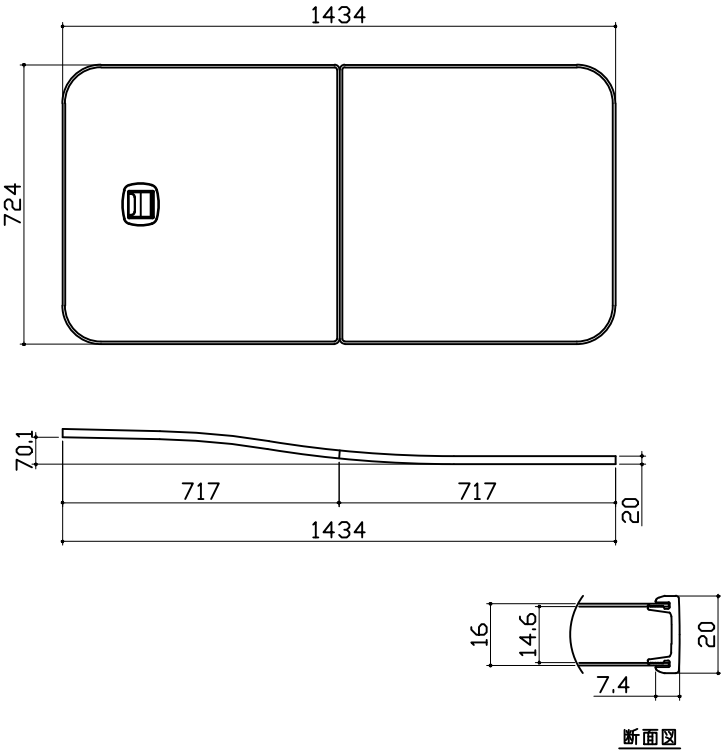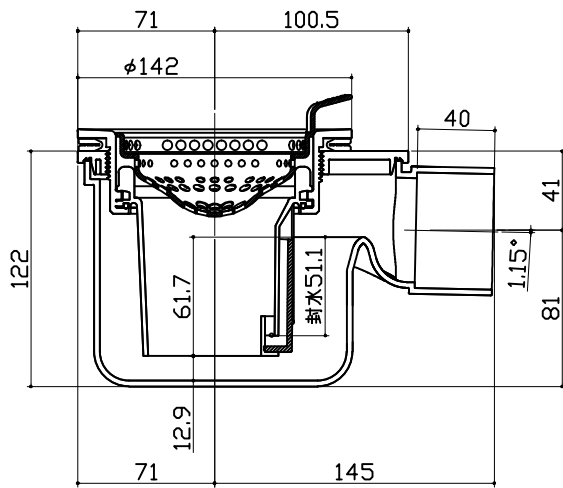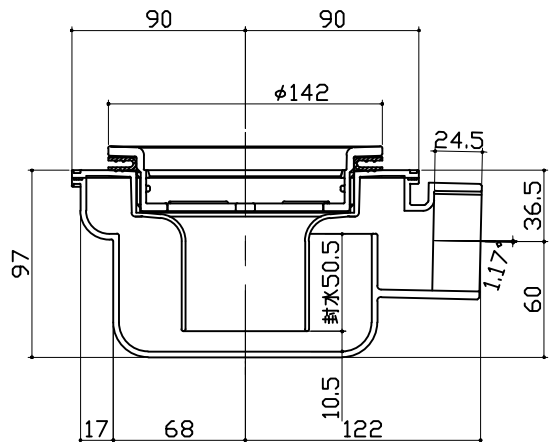収納棚		ハンドバー支持部取合詳細図		循環金具・フロアダプタ関連			
本体：PMMA 		安心ハンドバー（風呂フタフック付）以外の場合  安心ハンドバー（風呂フタフック付）の場合 					
風呂蓋 フタMDH-16XST		洗い場側排水トラップ		浴槽側排水トラップ			
 断面図							
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 北陸-能登SR SB7様邸		PREDENCIA プレデンスシア		部材詳細図	2/2
		現場番号： A6401373		プラン番号： 1612G-2011-0084T		作成日： 2020年12月2日	
		能登ショールーム		担当営業：		担当アドバイザー：	

