

システムバス 御見積書

御名前 静岡-沼津SR SB [4] 様

業者 様

商品名 RELAGE レラージュ

作成日 2020年4月30日
プラン番号 2305C-2004-0717T
現場番号 A6669983

タカラスタンダード株式会社
沼津営業所
静岡県沼津市沼北町1丁目17番地12号
TEL 055-924-3670 / FAX 055-924-3671

沼津ショールーム
TEL 055-924-3219 / FAX 055-924-3802

商品御見積金額 **¥790,200 (税込 ¥869,220)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 ¥301,000 (税込 ¥331,100)

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

御見積仕様

(システムバス)

ユニットサイズ 1616(AL勝手)

洗い場仕様 キーブクリンフロア(ハイクラス)

浴槽材質 アクリル人造大理石

カラー シュガーライトグレー

形状 スクエア浴槽(ベンチ付)

カウンター材質 アクリル人造大理石

カラー シュガーライトグレー

エプロン材質 ステンレス(カラーコーティング)

カラー ホワイト

浴室パネル材質 高品位ホーロー

カラー ブリックグレー

ガス種 13A

周波数 50Hz

備考

御確認事項

商品の仕様価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には弊社へお問い合わせ、またはカタログにてよく御確認下さいませよう願致します。

工事費には給排水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

この御見積書の有効期間は30日間です。

--	--

No.*

御名前 静岡-沼津SR SB【4】

様

現場番号	A6669983	プラン番号	2305C-2004-0717T	作成日	2020/4/30
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	レラージュ 1616サイズ		1	684,000	684,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	キーブクリーンドア:折戸<800mm幅>(ホワイト)(20サイズ)	1		
4	洗い場	キーブクリーンフロア(ハイクラス・カームホワイト)	1		
5	浴槽	キーブクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)	1		
6	排水口カバー	ステンレス	1		
7	浴槽追炊き穴	あり	1		
8	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)	1		
9	浴槽形状	16スクエア浴槽(ベンチ付)	1		
10	ヘルシージェット	なし	1		
11	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1		
12	ガス温水式床暖房	あり	1	+48,300	+48,300
13	洗い場用水栓	サーモ水栓(メタルホース)SB181-5UT	1		
14	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド	1		
15	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
16	カウンター	人大スクエアカウンター	1		
17	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(TN-116)	1		
18	浴室パネル	ハイクラス(一面デザイン)	1		
19	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
20	天井	高光沢フラット天井	1		
21	換気機器	天井換気扇	1		
22	換気機器開口	工場開口	1		
23	照明	ダウンライト照明(3灯)(白色)	1	-8,000	-8,000
24	天井照明開口	工場開口	1		
25	ミラー	横長クリアミラー	1	-1,500	-1,500
26	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
27	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,500	-1,500
28	収納棚	スクエアタイプ(2段)<ホワイト>	1	+1,200	+1,200
29	どこでもラック	マルチラック+フック+タオルハンガー(チャコールグレー)	1	+5,000	+5,000
30	どこでもラック	小物置きM(チャコールグレー)	1	+1,900	+1,900
31	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500

御名前 静岡-沼津SR SB【4】

様

現場番号	A6669983	プラン番号	2305C-2004-0717T	作成日	2020/4/30
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
33	トラップカバー	なし	1		
34	温水配管	床暖房用	1	+48,300	+48,300
35	給湯機器	暖房乾燥タイプ(6,200kcal/h)	1	+81,400	+81,400
	給湯機器 別途		1	-81,400	-81,400
システムバス合計			36		¥790,200
商品総合計			36		¥790,200

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥301,000 (税込 ¥331,100)


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

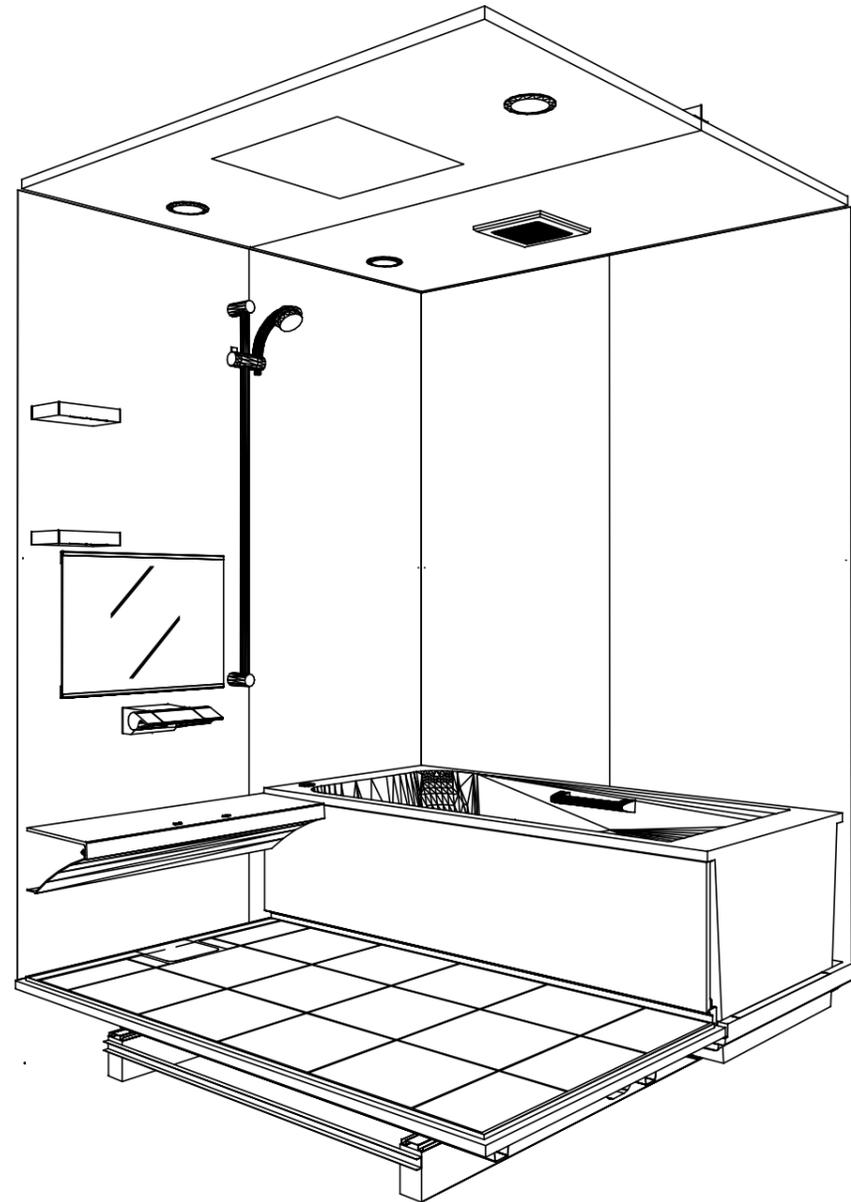

鳥瞰図

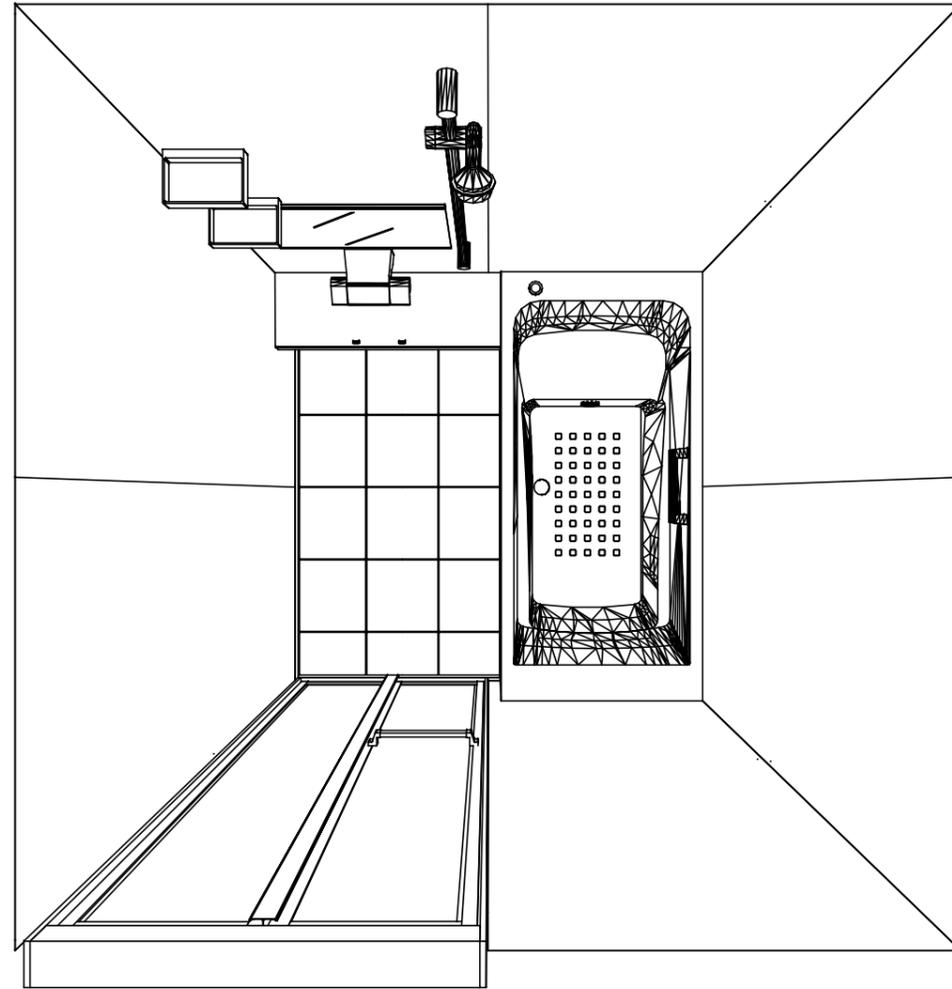

1616
 キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>
 高光沢フラット天井
 天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・
 納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認
 して頂きますようお願い致します。

Takara standard
 タカラストANDARD株式会社


現場名称： 静岡-沼津SR SB【4】様邸
 現場番号： A6669983
 沼津営業所

RELAGE レラージュ
 プラン番号： 2305C-2004-0717T
 担当営業：


姿図
 作成日： 2020年4月30日
 担当アドバイザー：




■留意事項
 ※印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

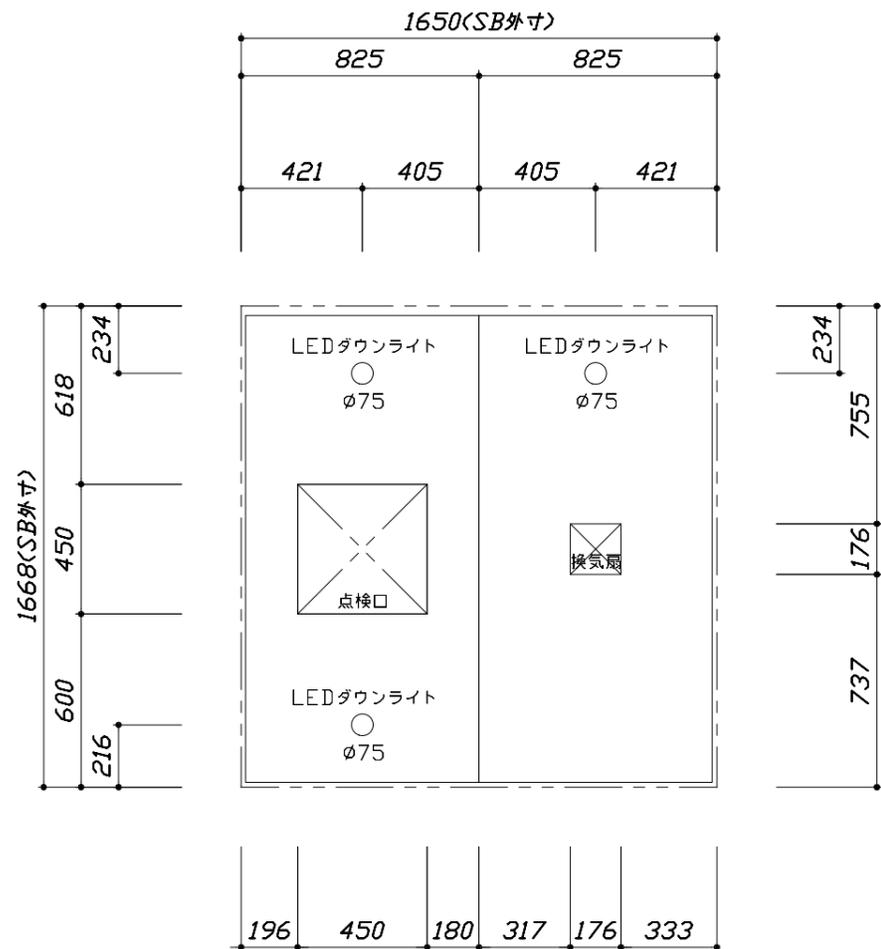

<天井伏図>

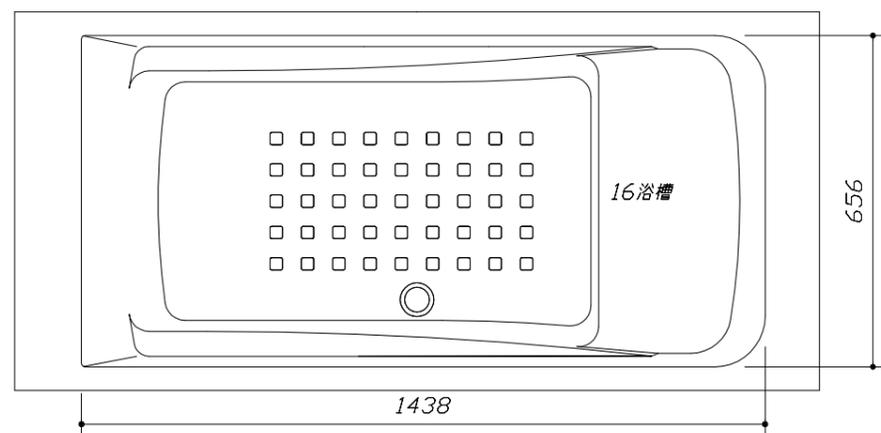

<浴槽詳細図>

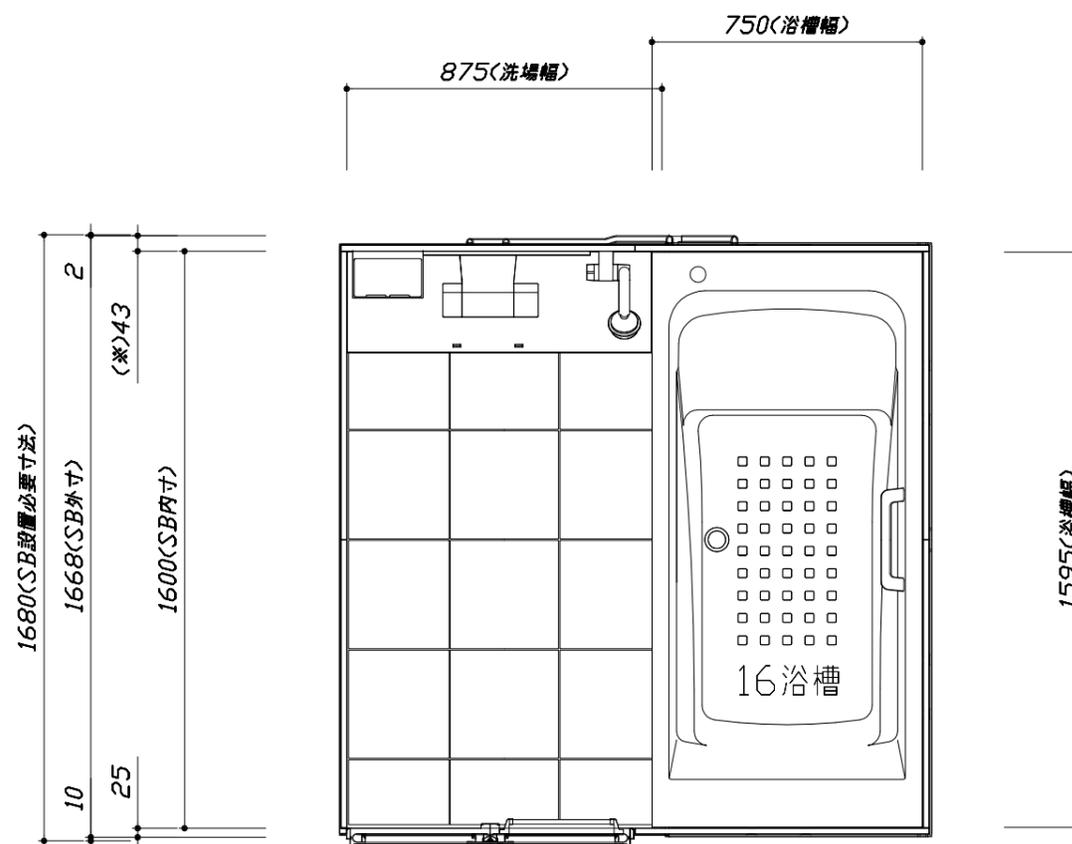

1680(SB設置必要寸法)


10

25

1600(SB内寸)

2

(※)43

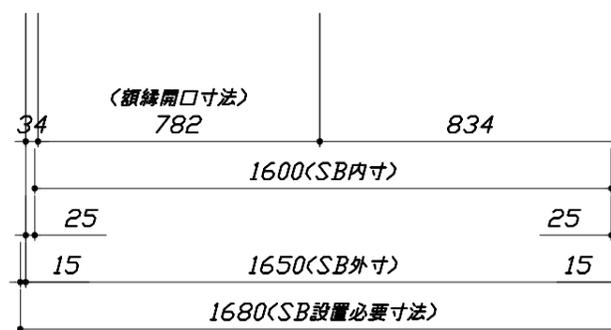

<平面図>

Takara standard
 タカラスタンダード株式会社



現場名称： 静岡-沼津SR SB【4】様邸
 現場番号： A6669983
 沼津営業所

RELAGE レラージュ
 プラン番号： 2305C-2004-0717T
 担当営業：


施工図1
 縮尺： 1:25,20
 作成日： 2020年4月30日
 担当アドバイザー：

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・温水床暖房を設置する場合、カウンター面に配管が外寸より60mm程度突出します。躯体とのクリアランスを十分に確保してください。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

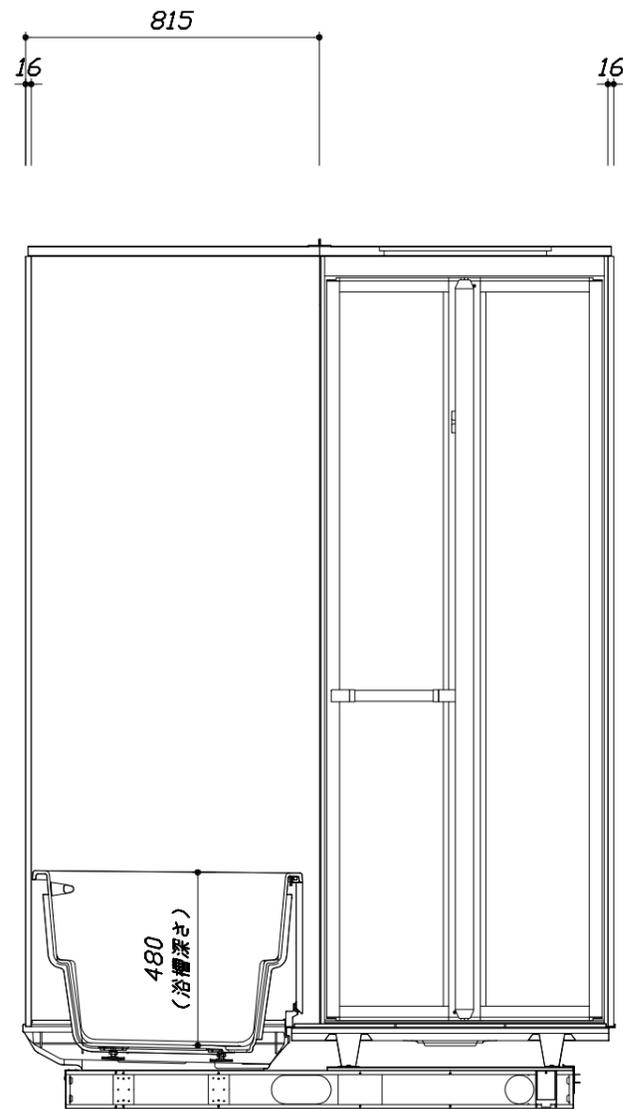

<カウンター対面図>


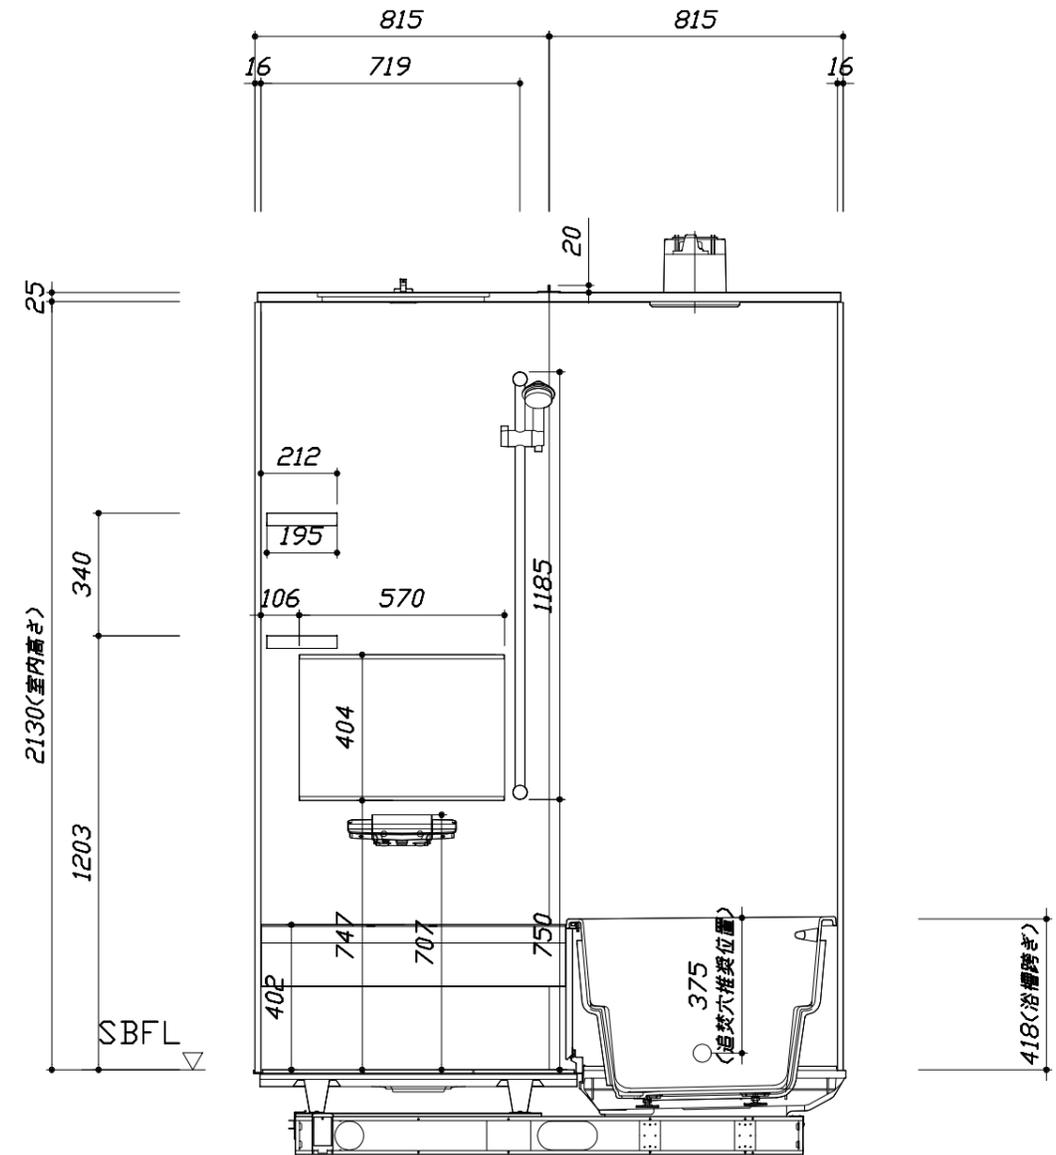


<カウンター面図>

■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げて下さい。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・温水床暖房を設置する場合、カウンター面に配管が外寸より60mm程度突出します。躯体とのクリアランスを十分に確保して下さい。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

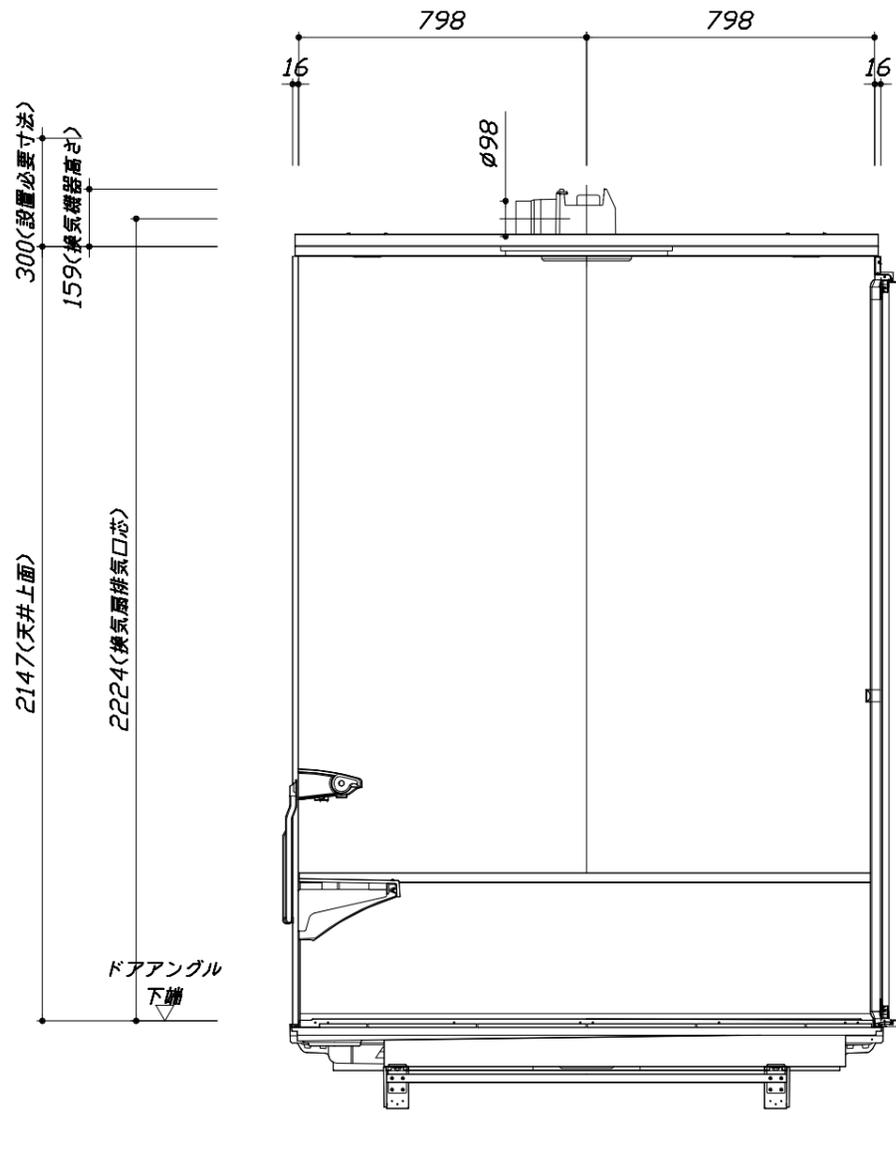

■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)

< 浴槽側面図 >

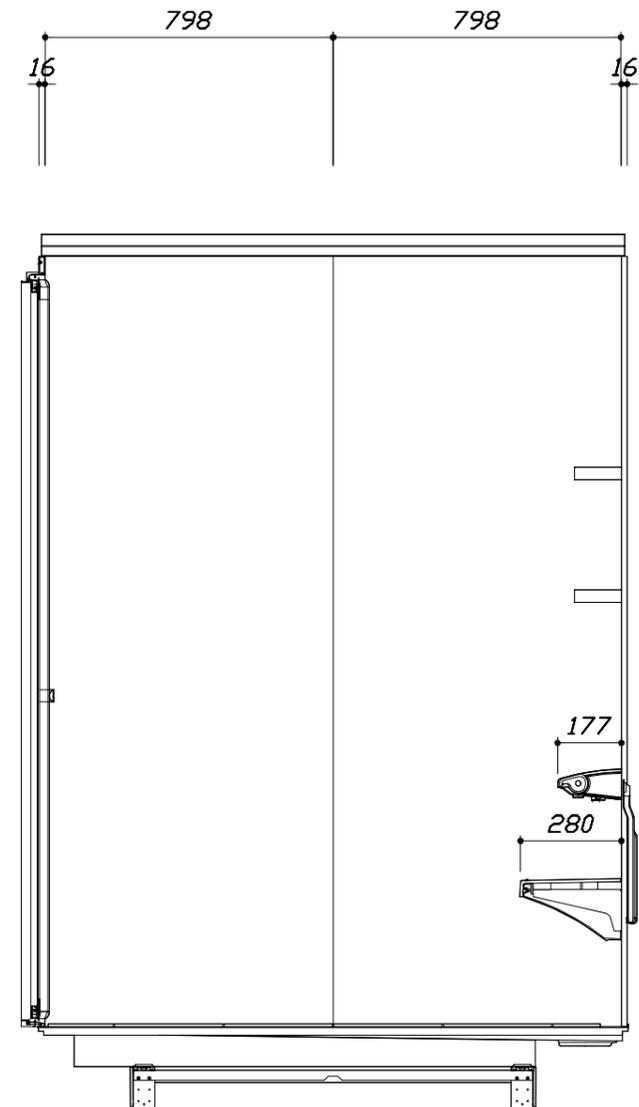

< 洗場側面図 >

Takara standard
 タカラストANDARD株式会社


現場名称： 静岡-沼津SR SB【4】様邸
 現場番号： A6669983
 沼津営業所

RELAGE レラージュ
 プラン番号： 2305C-2004-0717T
 担当営業：

施工図3
 縮尺： 1:20
 作成日： 2020年4月30日
 担当アドバイザー：


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。







■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

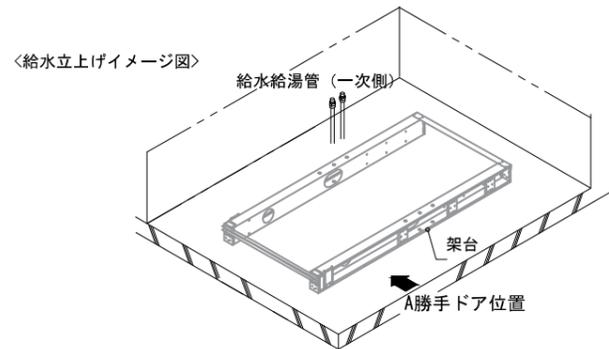


■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

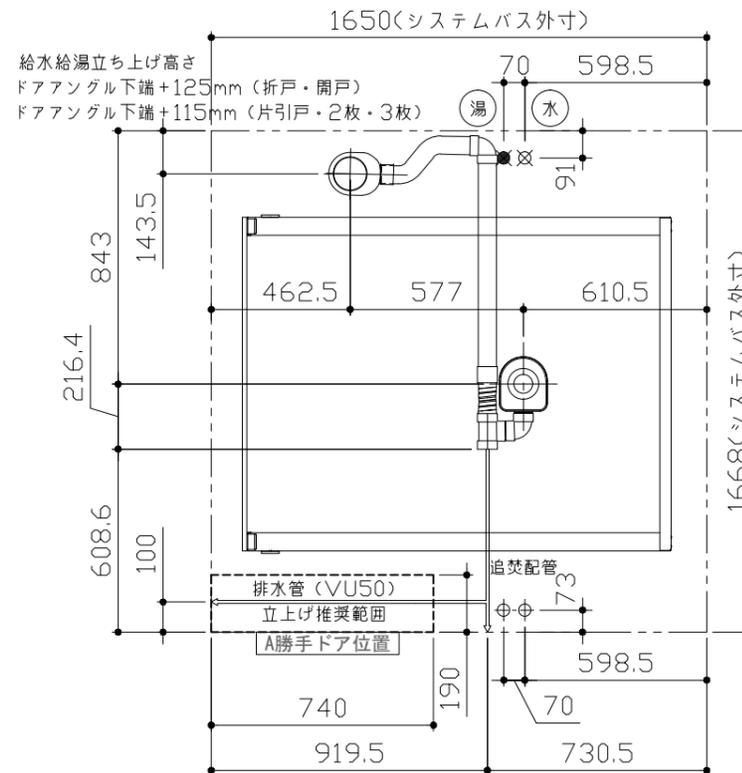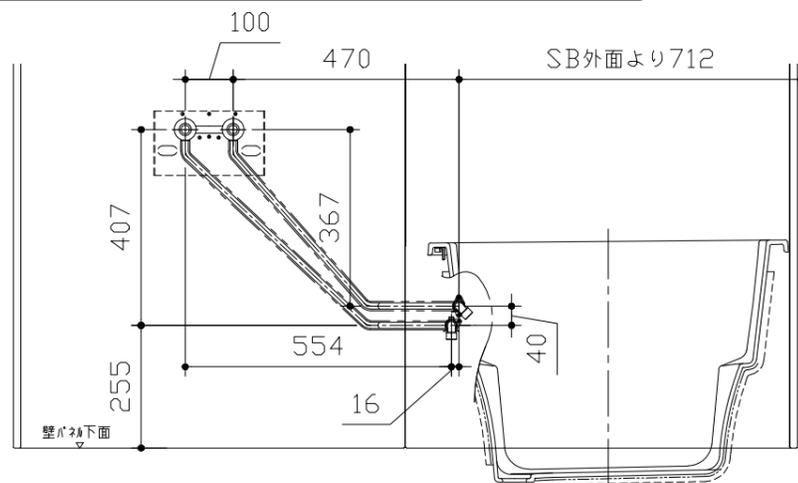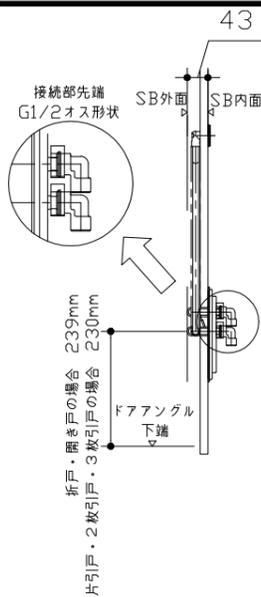

■ 設備記号

記号	記号の意味
⊗	給水位置
⊙	給湯位置

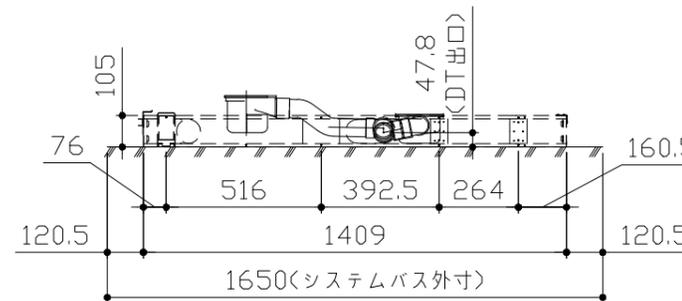

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

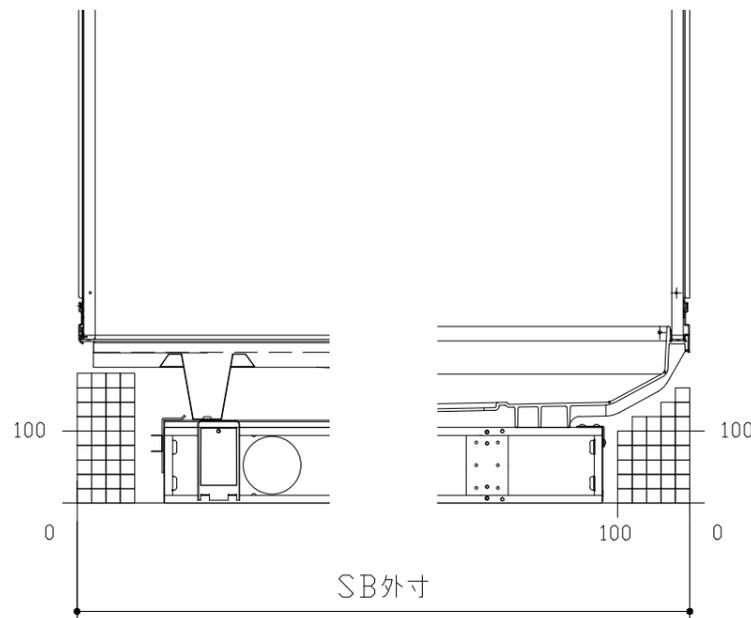


B矢視

A矢視

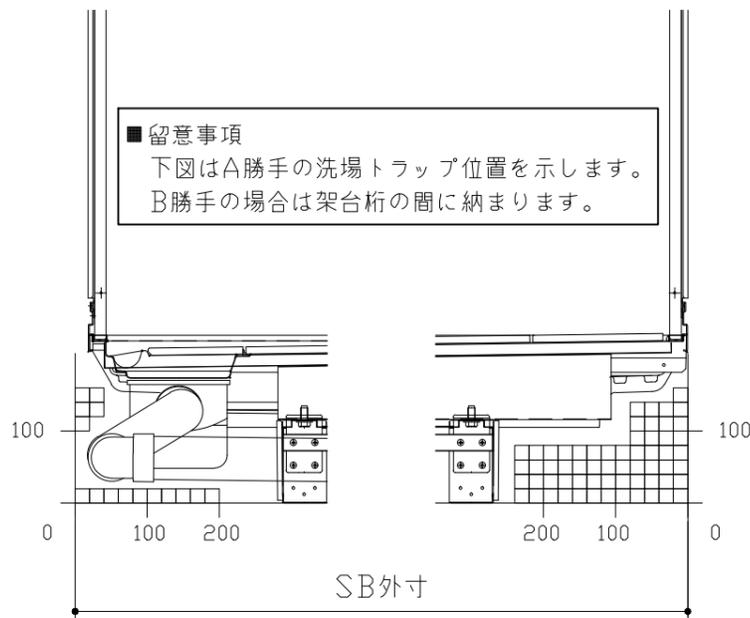


D矢視

C矢視

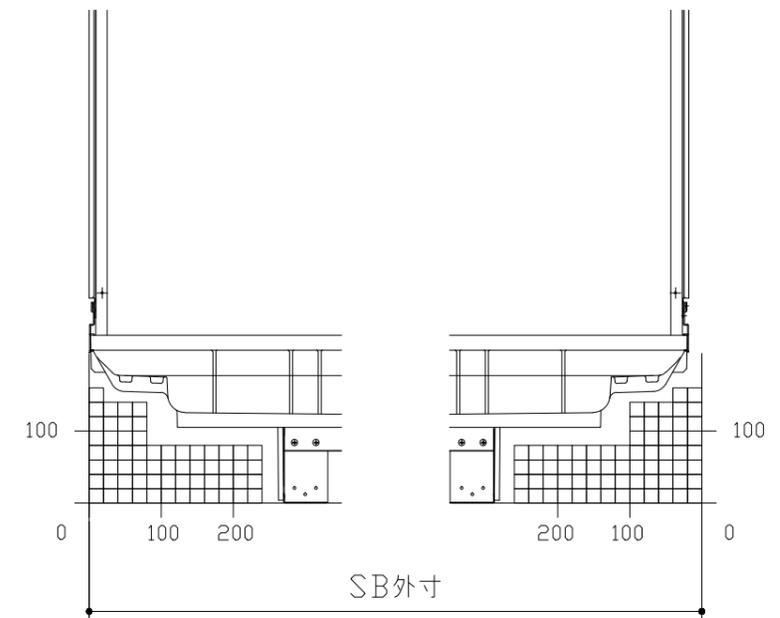

F矢視

E矢視


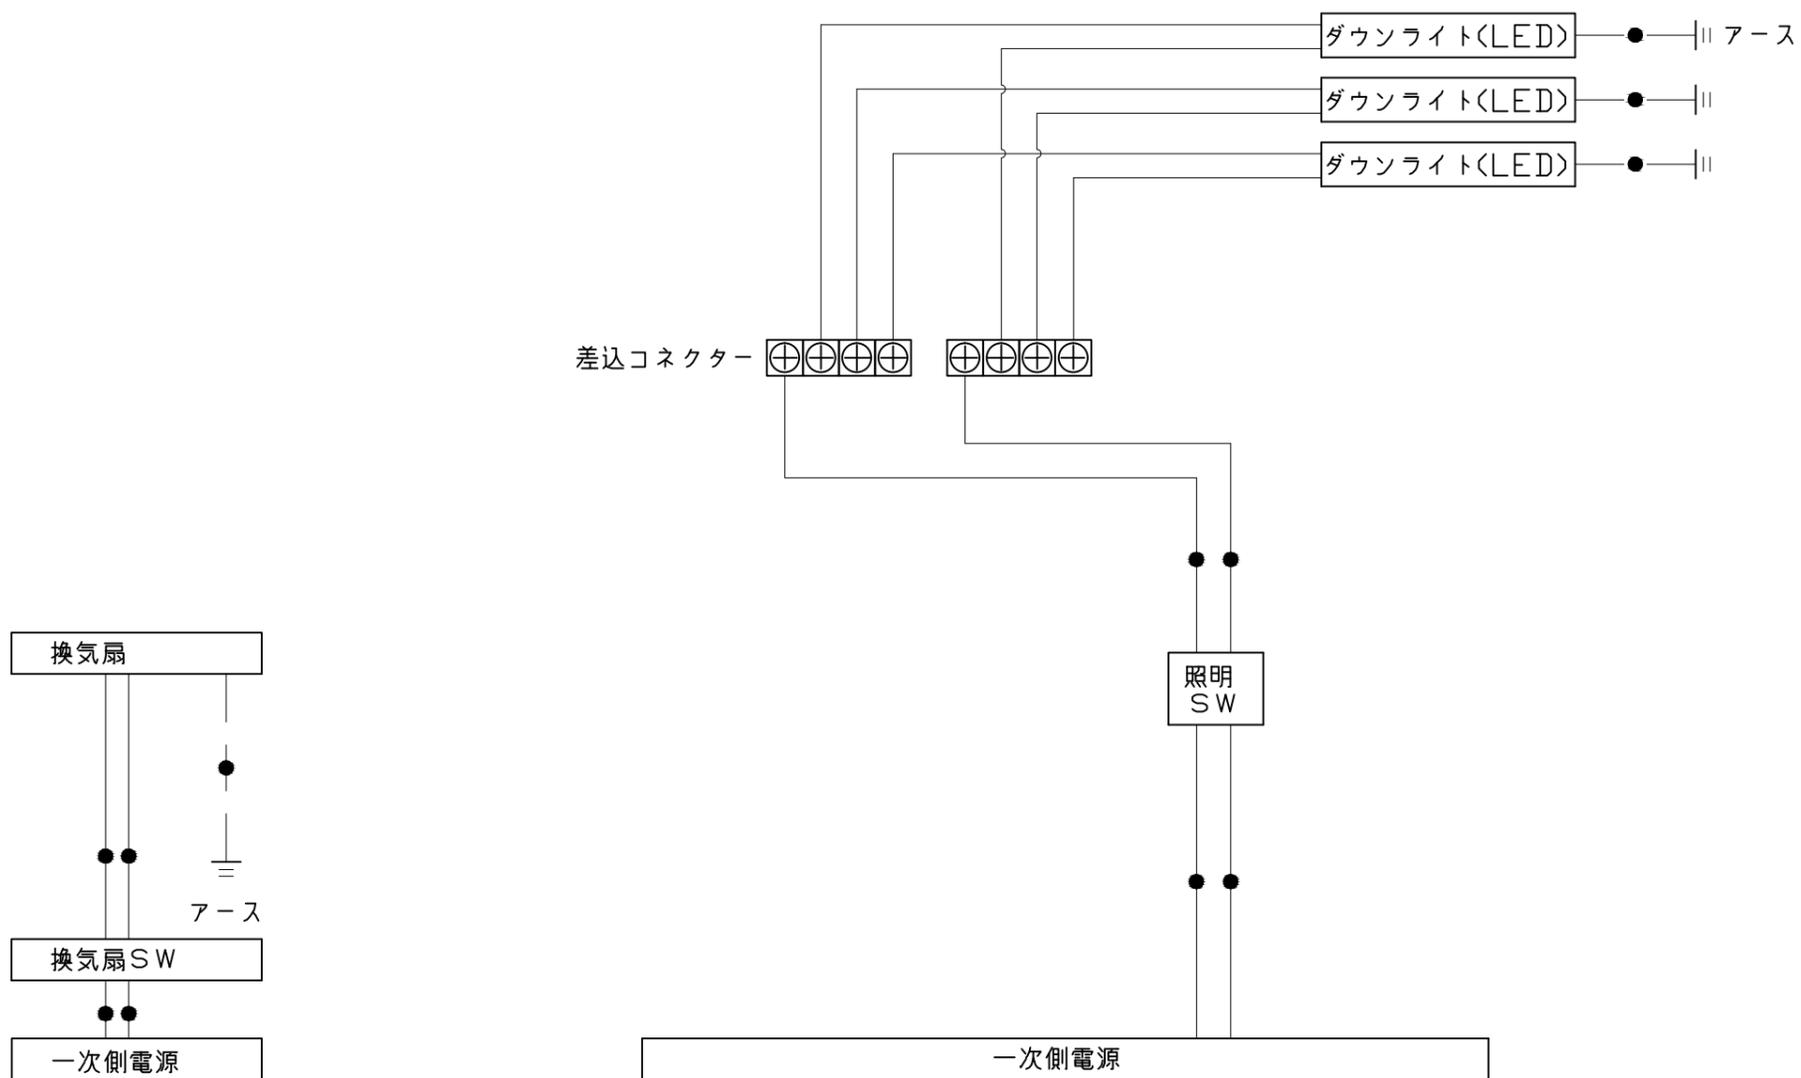


一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。


浴槽

洗い場用水栓

照明

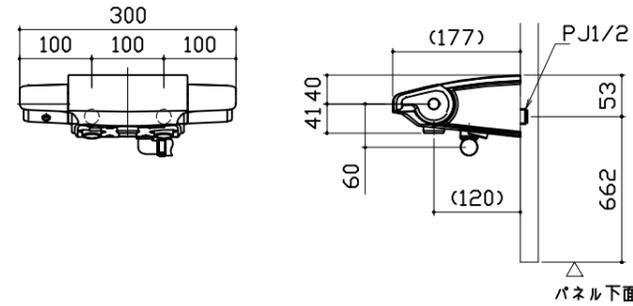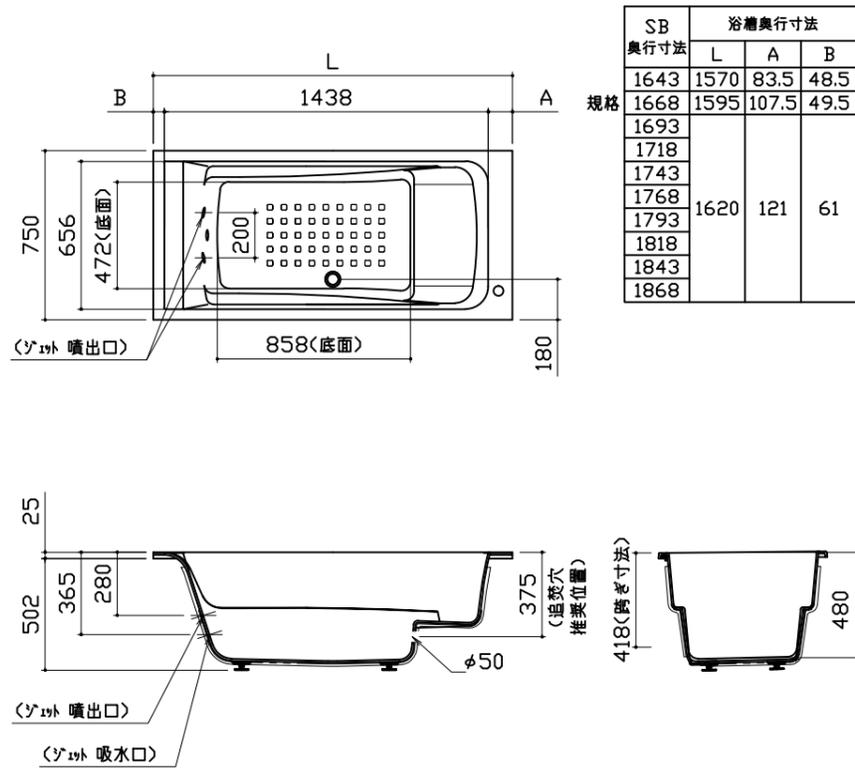



ダウンライト
LED 5W (1灯あたり)




換気機器

シャワーフックスライドバー

ミラー

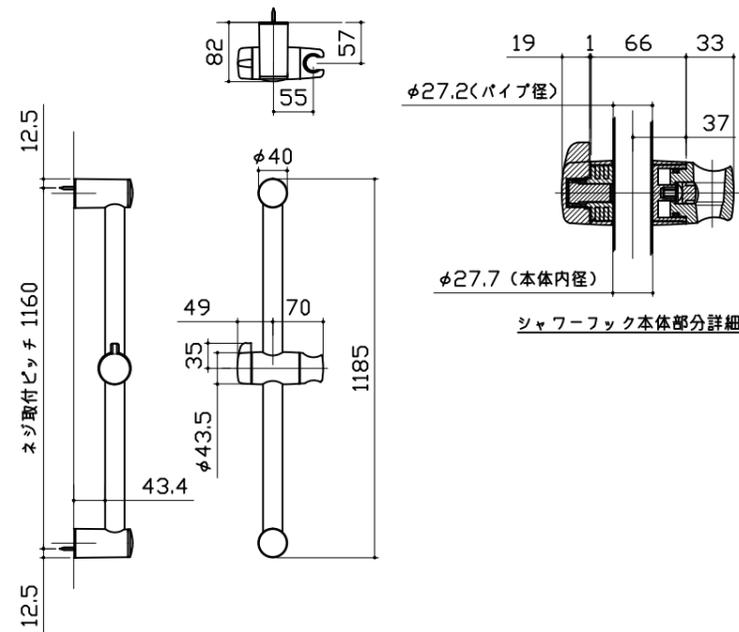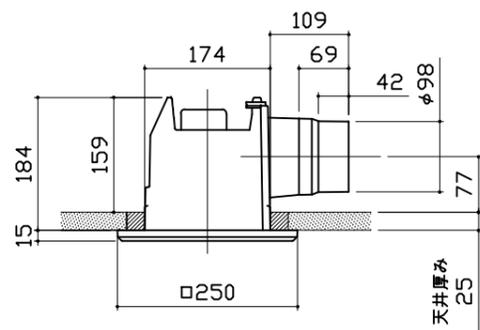


枠: SUS304 t0.8
ミラー: 表面防曇コートあり (横長クリアミラー)
表面防曇コートなし (横長ミラー)

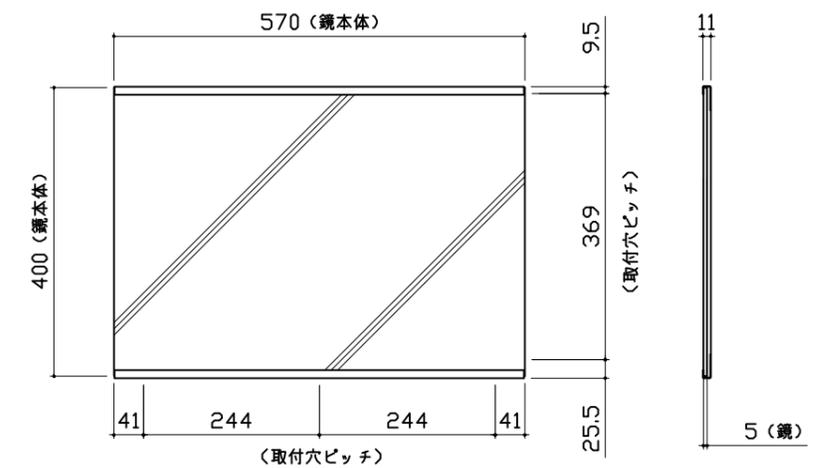


収納棚


本体：ABS

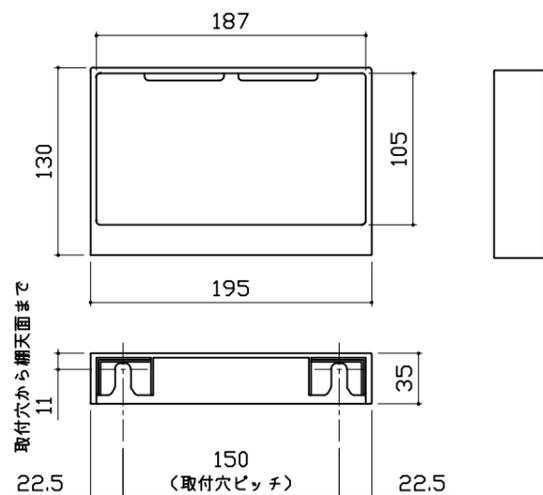


循環金具・フロアダプタ関連

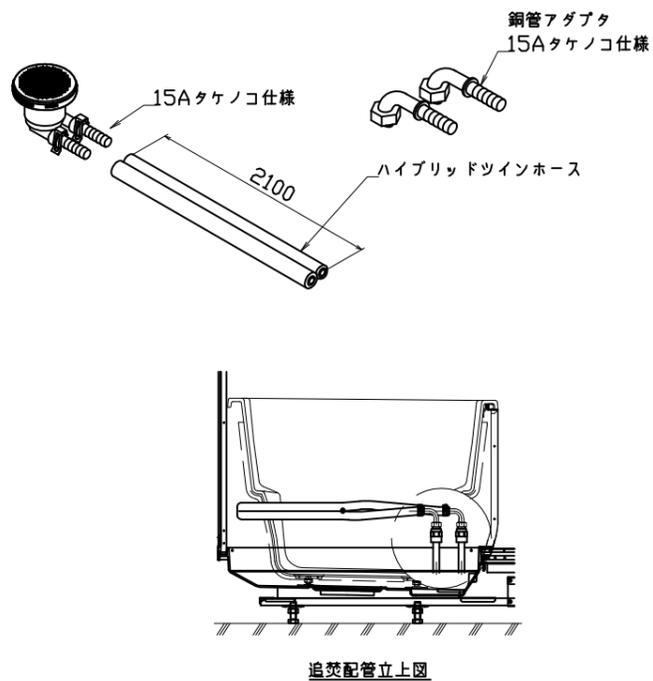


風呂蓋 707MVA-16XS

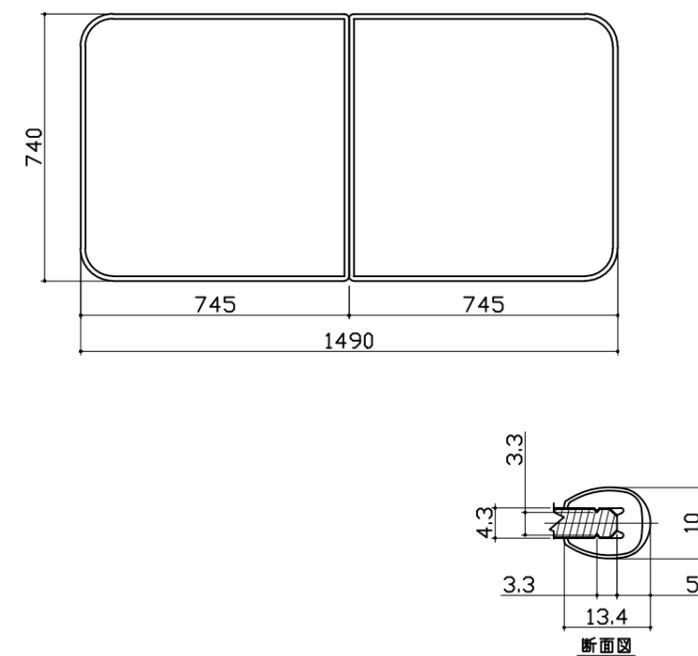

洗い場側排水トラップ

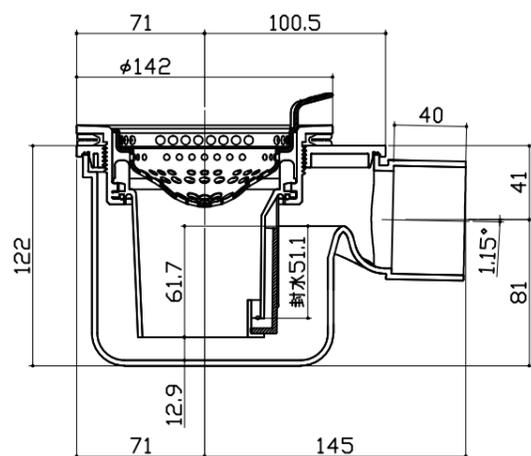

浴槽側排水トラップ

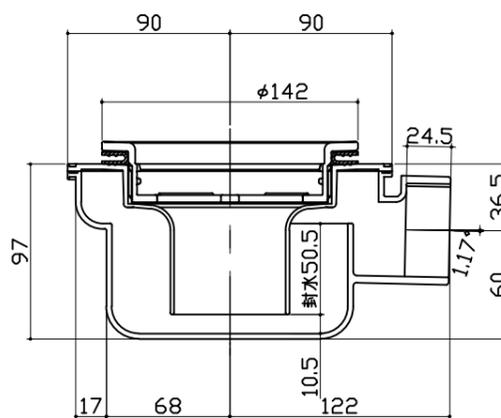

ガス温水式床暖房

【工事範囲】

当社工事範囲


1. ガス温水式床暖房洗場の設置
 2. 天井上での温水配管の配管及び接続
(温水式湯濯暖房洗場～熱源機間)
 3. 信号線の接続
(温水配管～熱源機間)
 4. リモコン線の逃がし
- * 床暖房リモコンの接続及び取付は行いません。




管工事業者様 工事範囲

1. 熱源機の取付
2. 熱源機と給水管の接続

電気工事業者様 工事範囲

1. 床暖房リモコンの接続及び取付
 2. 熱源起用浴室リモコン、メインリモコンの接続及び取付
- * 暖房・給湯タイプのみ

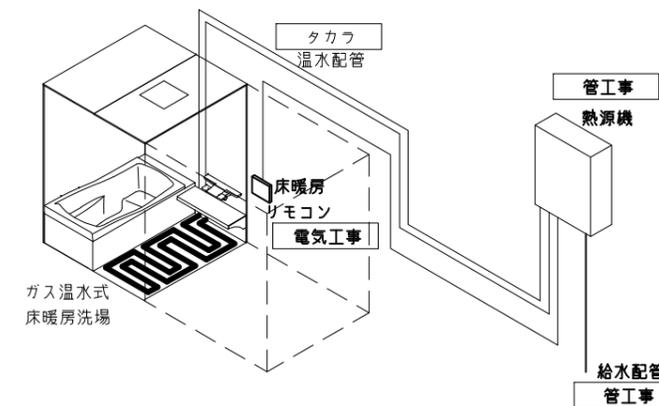

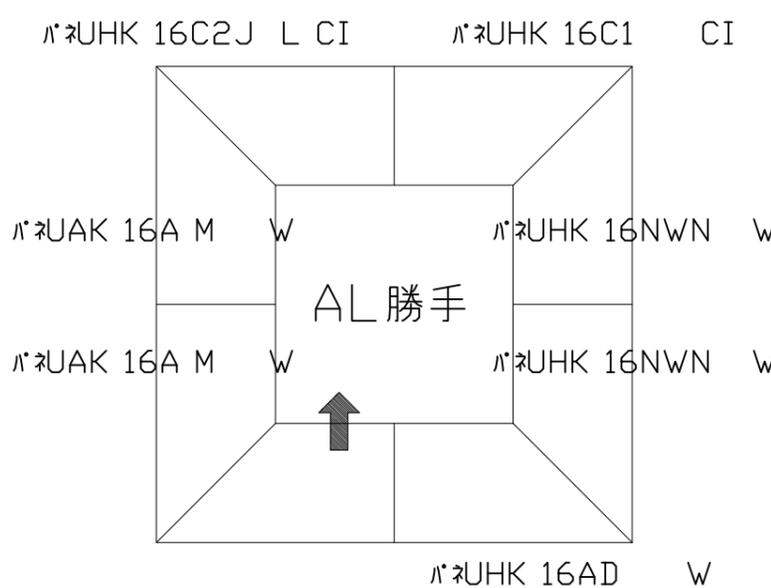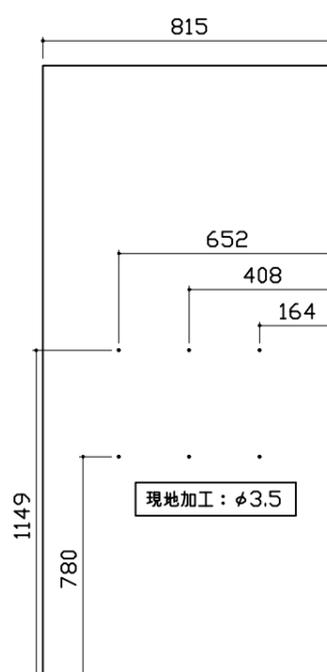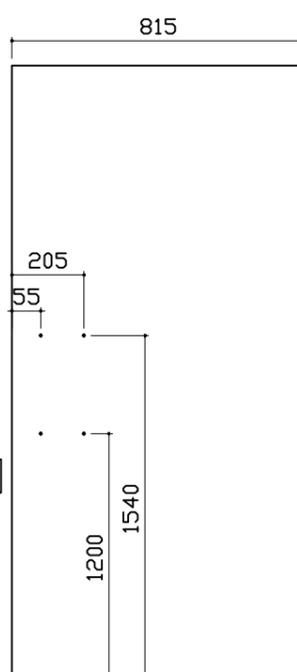パネル割図	ミラー	収納棚
<p>パネル割図</p> 	<p>ミラー</p> <p>パネUHK 16C2J L CI</p> 	<p>収納棚</p> <p>パネUHK 16C2J L CI</p> 
シャワーフックスライドバー		
<p>シャワーフックスライドバー</p> <p>パネUHK 16C2J L CI</p> 
