システムバス 御見積書

御名前 横浜-小田]原SR SB9	 様			ページ 1/3
	1)KON ODU		作成日	2025年10月13日	タカラスタンダード株式会社
<u>業者</u>		様_	プラン番号	2712E-2510-0090T	◆小田原ショールーム
商品名 PREDEN	ICIA プレデンシア		現場番号	C3480453	神奈川県小田原市国府津2902
商品 御見積金額 ¥1	,361,200 (税込¥1,497, gの価格は税込価格<税率10%>を表示し				TEL 0465-20-5213 / FAX 0465-48-5121 ◆厚木営業所 TEL 046-280-6193 / FAX 046-227-5010
	頃には商品組付費と現場配送費が含まれております。 ス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。				担当営業 担当アドバイザー プラン作成者
◆ 御見積仕様 ★	r 御見積のカラー表示は参考です。最終	発注時には必ず御	確認下さい。		◆ 備考
《システムバス》					
ユニットサイズ	1616(AL勝手)				
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス				
洗い場カラー	カームダークグレー				
浴槽材質	→				
浴槽カラー	プレシャスホワイト				
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽				
カウンター材質					
カウンター/下カバーカラ					
浴槽前カウンターカラー	ホワイト				
エプロン材質/カラー	ステンレス / ホワイト				
浴室パネル材質	高品位ホーロー				
パネルカラー(正面)	ジオマーブルモスグレー				
パネルカラー(周辺)	ホワイト				
ガス種 / 周波数	未定 / 50Hz				
◆ 御確認事項	717/2 / 00112				
▼ 脚唯祕尹垻					

現場番号 C3480453 プラン番号 2712E-2510-0090T 作成日 2025/10/13

御見積明細 システムバス ★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO 商品名	仕様	数量	単価	金額
1 プレデンシア 1616サイズ		1	1,227,000	1,227,000
2 架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3 ドア	折戸<800幅>(ホワイト)/樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4 ドア	上部換気口	1		
5 ドア位置変更	A勝手・移動なし・1面デザイン/周辺レギュラークラス・800幅ドア	1		
6 洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームダークグレー)	1		
7 排水ロカバー	ステンレス	1		
8 浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(プレシャスホワイト)	1		
9 浴槽追焚き穴	あり	1		
10 エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ホワイト)	1		
11 浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽	1		
12 ヘルシージェット	なし	1		
13 肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
14 うるぽか湯	なし	1		
15 浴槽ハンドグリップ	なし	1		
16 洗い場用水栓	サーモ水栓: 樹脂製ホース(メタル調) SB181-5UTH	1	-32,000	-32,000
17 洗い場用水栓	ヒロカルシャワー: SB181-5UTHB1HK	1		
18 浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
19 カウンター	カウンターなし(洗い場1水栓)	1	-37,000	-37,000
20 シャワーフックスライドバー	なし	1	-5,000	-5,000
21 浴室パネル	プレミアムクラス(一面デザイン)(Kパネル)	1	+15,000	+15,000
22 浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
23 天井	高光沢フラット天井	1		
24 換気機器	天井換気扇ホワイト	1		
25 換気機器開口	工場開口	1		
26 照明	天井付スクエア照明+ダウンライト(1灯)(白色)	1		
27 天井照明開口	工場開口	1		
28 ミラー	ミラーなし	1	-18,000	-18,000
29 風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
30 タオル掛け	タオル掛けなし	1	-4,000	-4,000
31 収納棚	収納棚なし	1	-17.000	-17,000

様

		現場番号	C3480453	プラン番号	2712E-2510-0090T	作成日	2025/10/13
御見積明細シス	ステムバス	★ 御見積のカラー	長示は参考です。最終	発注時には必ず	- げ御確認下さい。		
NO	商品名			仕様	数量	単価	金額
32 どこでもラック		シャワーフッ	ク(チャコールグレー)		1	+2,100	+2,100
33 どこでもラック		風呂フタフック	ク(ホワイト)		1	+2,100	+2,100
34 循環金具セット		PLLX			1	+13,500	+13,500
35 給水給湯管		洗い場1水栓			1		
36 トラップカバー		なし			1		
37 ブロック積用ボンド		2段用			1	+2,000	+2,000
システムバス合	·計				37		¥1,148,700

商品総合計 37 ¥1,148,700

商品組付費	数量	金額
1 本体組付費	1	204,500
商品組付費合計		¥204,500

	その他費用	数量	金額
現場配送費		1	8,000
配送費他合計			¥8,000

商品御見積金額


¥1,361,200

- ※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。
- ※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

パース

0

鳥瞰図

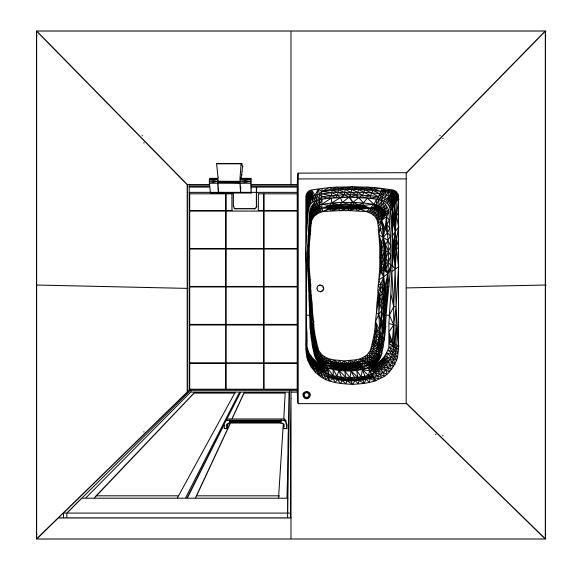


1616

高光沢フラット天井 天井換気扇


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・ 納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認 して頂きますようお願いします。


Takara standard ph p x p y y - F 株式会社

現場名称: 横浜-小田原SR SB9様邸	PREDENCIA プレデンシア	姿図
現場番号: C3480453	プラン番号: 2712E-2510-0090T	作成日: 2025年10月13日
小田原ショールーム	担当営業 :	担当アドバイザー:



■留意事項 ※印寸法は給水給湯管の 突出寸法18mmを含みます。

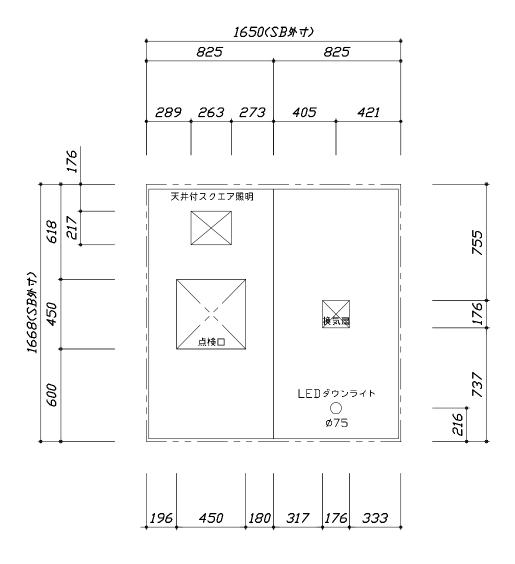



1438 <浴槽詳細図>

<天井伏図>

(%)43 1680(SB設置必要寸法) 1668(SB#+) 1600(SBM+) \bigcirc 16浴槽 25 10

875(洗場幅)

750(浴槽幅)

(額経開口寸法) 782 834 1600(SB内寸) 25 25 15 1650(SB外寸) 15 1680(SB設置必要寸法)


<平面図>


タカラスタンダード株式会社


現場名称: 横浜-小田原SR SB9様邸	PREDENCIA プレデンシア	施工図1	縮 尺: 1:25,20
現場番号: C3480453	プラン番号: 2712E-2510-0090T	作成日: 2025年10	月13日
小田原ショールーム	担当営業 :	担当アドバイザー:	

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に

- ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。
- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。 ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認お願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。



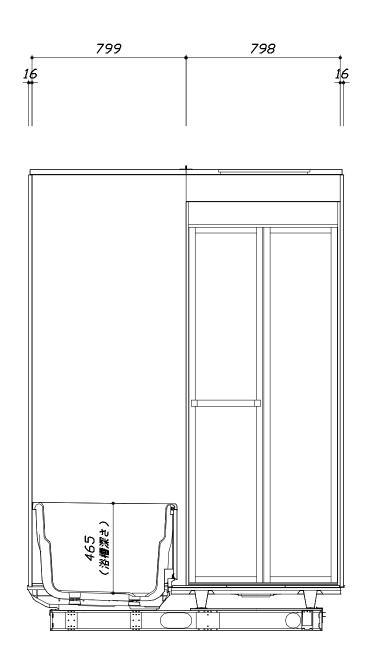

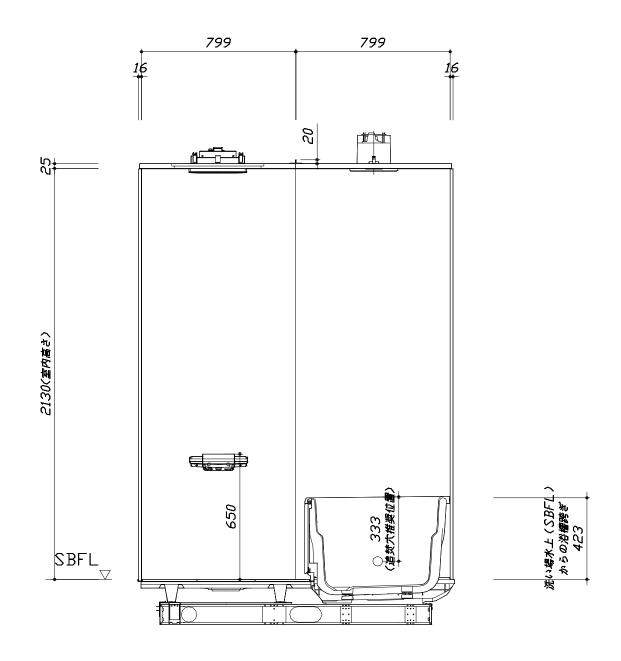

■土間コン仕上げ寸法 ドアアングル下端より 265mm下がり (クリア寸法含む)

<カウンター対面図>


<カウンター面図>


Takara standard
タカラスタンダード株式会社


現場名称: 横浜-小田原SR SB9様邸	PREDENCIA プレデンシア	施工図2	縮 尺: 1:20
現場番号: C3480453	プラン番号: 2712E-2510-0090T	作成日: 2025年10	月13日
小田原ショールーム	担当営業 :	担当アドバイザー:	

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に

- ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。
- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドファングル下端とSBFLの段差は8mmになります。 ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認お願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。 ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。



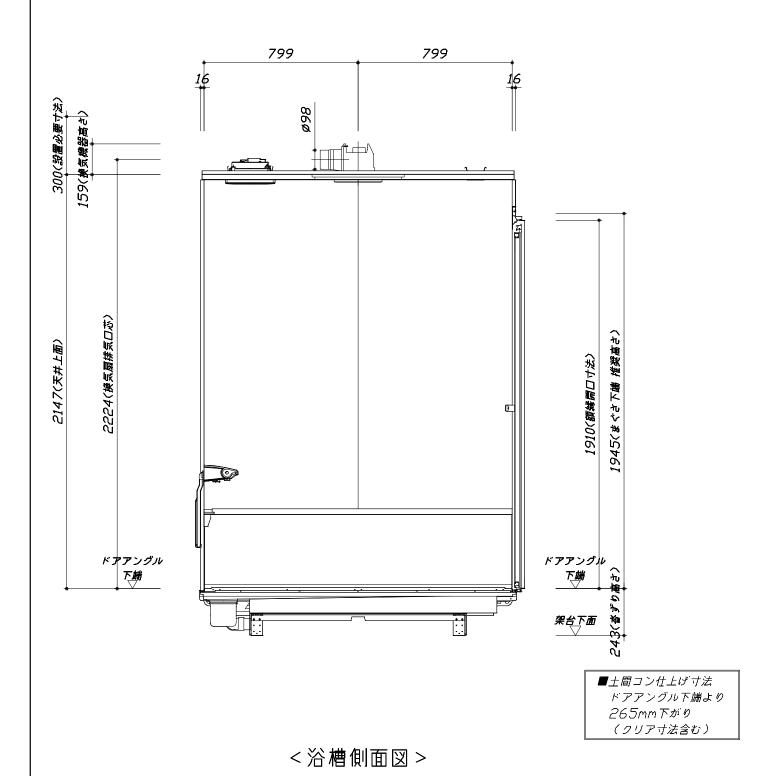

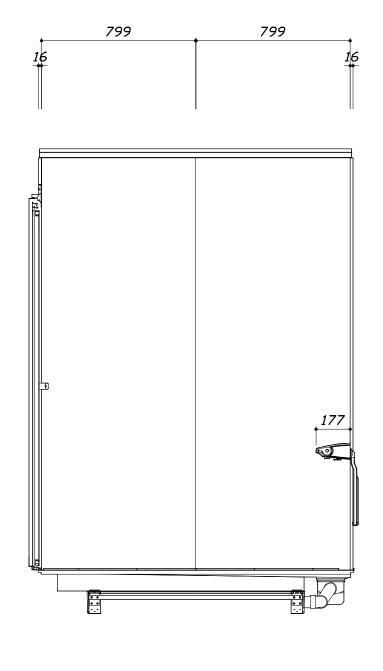

<洗場側面図>

タカラスタンダード株式会社

現場名称: 横浜-小田原SR SB9様邸	PREDENCIA プレデンシア	施工図3	縮 尺: 1:20
現場番号: C3480453	プラン番号: 2712E-2510-0090T	作成日: 2025年10	月13日
小田原ショールーム	担当営業 :	担当アドバイザー:	

本体仕様表

アクセサリー仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)		
ドア勝手	AL勝手		
架台	一体架台(戸建用): 亜鉛メッキ鋼板		
洗場パン	キープクリーンフロア:ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵		
浴槽材質	鋳物ホーロー 裏面保温材・高断熱仕様 (発泡ウレタン)		
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽 (325リットル) 追い焚き穴:あり		
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂 (FRP)		
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材 (発泡ポリエチレン)		
カウンター	_		
浴室パネル	パネル高さKタイプ:鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし		
天井	高光沢サンドイッチパネル(内部発泡樹脂)換気機器開口:あり 天井照明開口:あり		
ドア	キープ クリーント、ア:19高さ折戸(アルミ框/樹脂カ、ラス/上部換気口)		
窓 1			
窓 2	-		
窓枠1	_		
窓枠2	_		
排水トラップ	洗い場:ABS樹脂, 浴槽:ASA樹脂 封水50mm		
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50		
製品重量	410kg		

ミラー	_		
収納棚			
タオル掛け			
洗場側水栓	サーモスタット(SB181-5UTHB1HK)(樹脂ホース: メタル調)		
浴槽側水栓			
兼用水栓			
フック/スライト゛ハ゛ー			
照明	天井付スクエア照明+LEDダウンライト(LED 14.1W白色)		
換気機器	天井換気扇(100V·最大消費電力9.3W)(ダクト径φ98)ホワイト		
フロフタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン:2枚)		
給水給湯管	銅管 (10A)		
循環金具	循環金具セットPLLX:ホース先端部G1/2袋ナット仕様		
ハンドバー①			
ハンドバー②			
ハンドバー③			
ハンドバー④			
ハンドバー⑤			
ハンドバー⑥			
ハンドバー⑦			

本体カラー

浴槽	WP:プレシャスホワイト
カウンター	ー(カウンターなし)
パネル(カウンター面)	JDG:ジオマーブルモスグレー
パネル(周辺・3面)	W: ホワイト
水栓上部カウンター	
浴槽エプロン	W: ホワイト
洗場	HC: カームダークグレー
ドア / 天井	W: ホワイト / HW: ホワイト
収納棚	
タオル掛け	
ラント゛リーセット	


Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 横浜-小田原SR SB9様邸	PREDENCIA プレデンシア	仕様表
現場番号: C3480453	プラン番号: 2712E-2510-0090T	作成日: 2025年10月13日
小田原ショールーム	担当営業:	担当アドバイザー:

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事〔給排水〕、建具工事などと区別して説明しています。 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と システムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

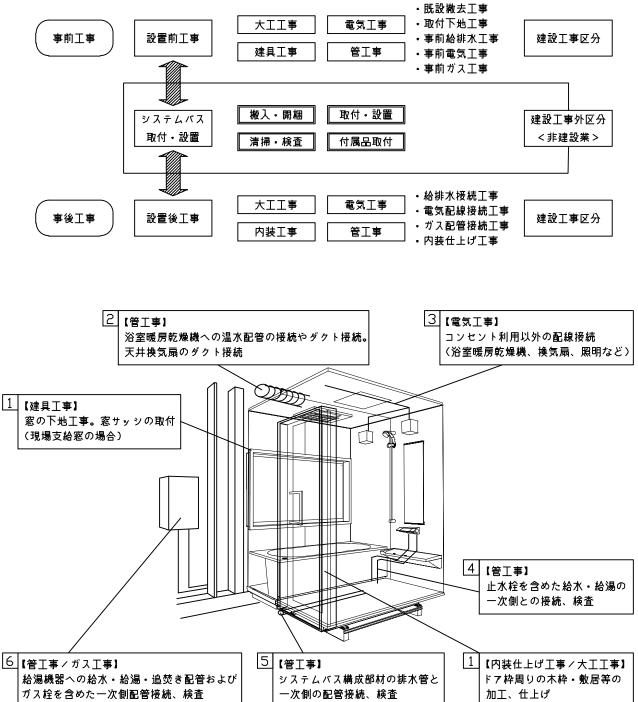

■システムバス 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

						ソ・バス工業会『工事区分ガイドライン』						
						建	設工	事		建設]	事外	
工事	区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	大工工事	とび土工工事	建具工事	管工事	電気工事	給湯機器設備	システムバス設置	作業內容
			추푸	設置基礎、設置床の工事	0	0						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			土工 建具	浴室ドア、窓サッシの下地工事	0		0					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		1		給排水配管事前工事				0				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
設置的	前工事	2	管	換気機器のダクト配管事前工事				0	0			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
		3		給湯機器専用配管事前工事				0				風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
			電気	浴室専用電気配線事前工事					0			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
				架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置								浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
				浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置								洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
				壁パネルの組立・設置								浴室パネル部材の加工と組立
				天井・浴槽の組立・設置								天井部材・浴槽部材の取付
				内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】								カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
				水栓類の組立・取付 【注記 1】								水栓類の組立、浴室部材への取付
			建設工事	浴室専用換気機器の取付 【注記 1】								浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
>, 7 =	・ムバス			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】								循環追焚き金具の取付
	付・設置		外区分	浴室内給湯機器用リモコンの取付								専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
本件权1			71 (2)	浴室照明器具の取付								浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
				その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】								電化品、オプション品の取付
				浴室ドアの組立・取付								システムバス構成部材のドアの組立・取付
				浴室窓サッシの取付 【注記 1】								システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
				浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】								システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
				シリコンの充塡								接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充塡
				試運転・完成検査 【注記 2】								完成後の試運転、性能確認検査
				建築外壁の穴あけ	0			0				建築壁の躯体加工作業
		2	管	排気ダクトの敷設工事				0				浴室換気機器のダクト敷設工事
		2	大工	浴室換気機器と排気ダクト接続工事				0				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
		3	電気	浴室換気機器の電気・アース接続工事					0			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
				ウェザーカバーの外壁取付				0	0			建築の外装仕上げ工事
設置往	後工事	4		給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				0				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
		5	管	建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				0				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
				給湯機器本体工事(試運転・確認)				0				機器の設置工事(ガス、電気工事を含む)
		1	電気	内装仕上げ工事	0		0					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
		3	他	浴室用電源配線、接続工事					0			浴室機器の事後電気工事
			,,,	浴室天井裏の電源、スイッチ工事					0			浴室全体の電気器具、配線接続工事


- ※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
- *【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


Takara standard shipara standard

現場名称: 横浜-小田原SR SB9様邸PREDENCIA プレデンシア工事区分表現場番号: C3480453プラン番号: 2712E-2510-0090T作成日: 2025年10月13日小田原ショールーム担当営業 :担当アドバイザー:

■ 排水配管工事注意事項


- ●雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を 使用してください。
- ●2重トラップにしないでください。
- ●配管途中で配管径を狭めないでください。
- ●排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- ●排水管(横引き管・エルボ)は打設する土間コンクリートの上に露出しない 高さにて配管してください。
- ●立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。
- ●貫通スリーブを使用する場合は45度エルボなどを接続し、バンドなどで 固定してください。








■ 給水給湯管工事注意事項

- ●給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- ●給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- ●給水給湯管の止水プラグ (テストプラグ) の径を27mm以下にしてください。






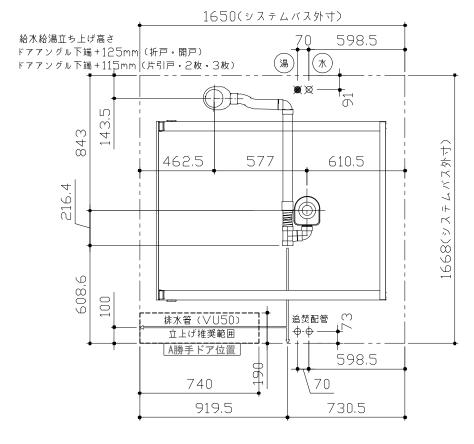

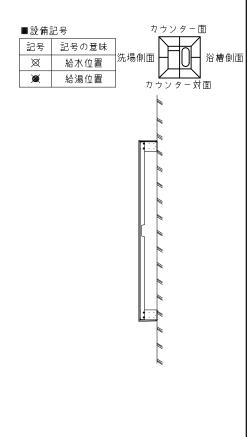



■土間コンクリート仕上げ寸法 ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

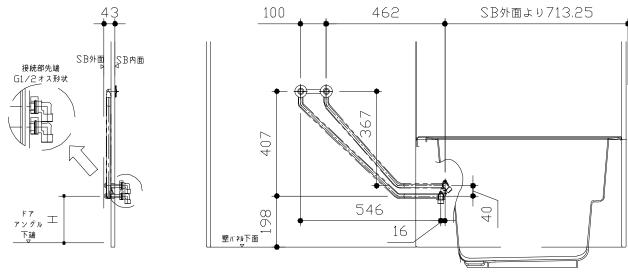

50 76 ,				A T	. 139.5
	516	372	305.5		
120.5		1409	'		120.5
I	 1650(ับ	ステムバス	外寸)	1	

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	182
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	173

〈給水給湯管取合詳細図〉


現場名称: 横浜-小田原SR SB9様邸	PREDENCIA プレデンシア	排水配管図		
現場番号: 03480453	プラン番号: 2712E-2510-0090T	作成日: 2025年10月13日		
小田原ショールーム	担当営業 :	担当アドバイザー:		


■必ずご確認ください


- (1)図面の見方
- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示:ロ=20mm角


(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意して ください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に 外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。 詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。








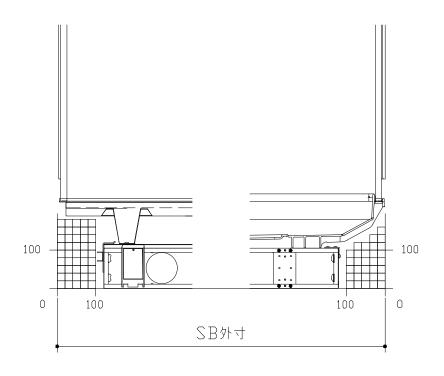

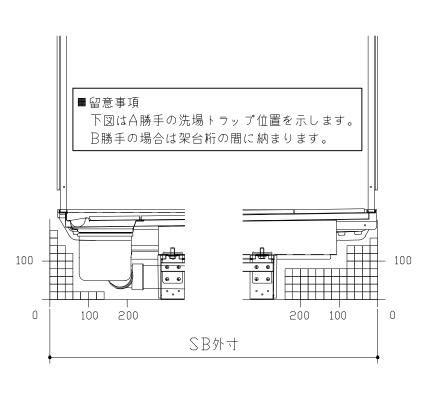

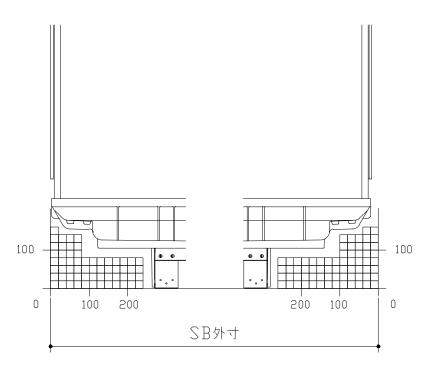

B矢視


A 矢視 D 矢視 C矢視


F矢視


E矢視

Takara standard タカラスタンダード株式会社

現場名称: 横浜-小田原SR SB9様邸PREDENCIA プレデンシア床下空間図現場番号: C3480453プラン番号: 2712E-2510-0090T作成日: 2025年10月13日小田原ショールーム担当営業 :担当アドバイザー:

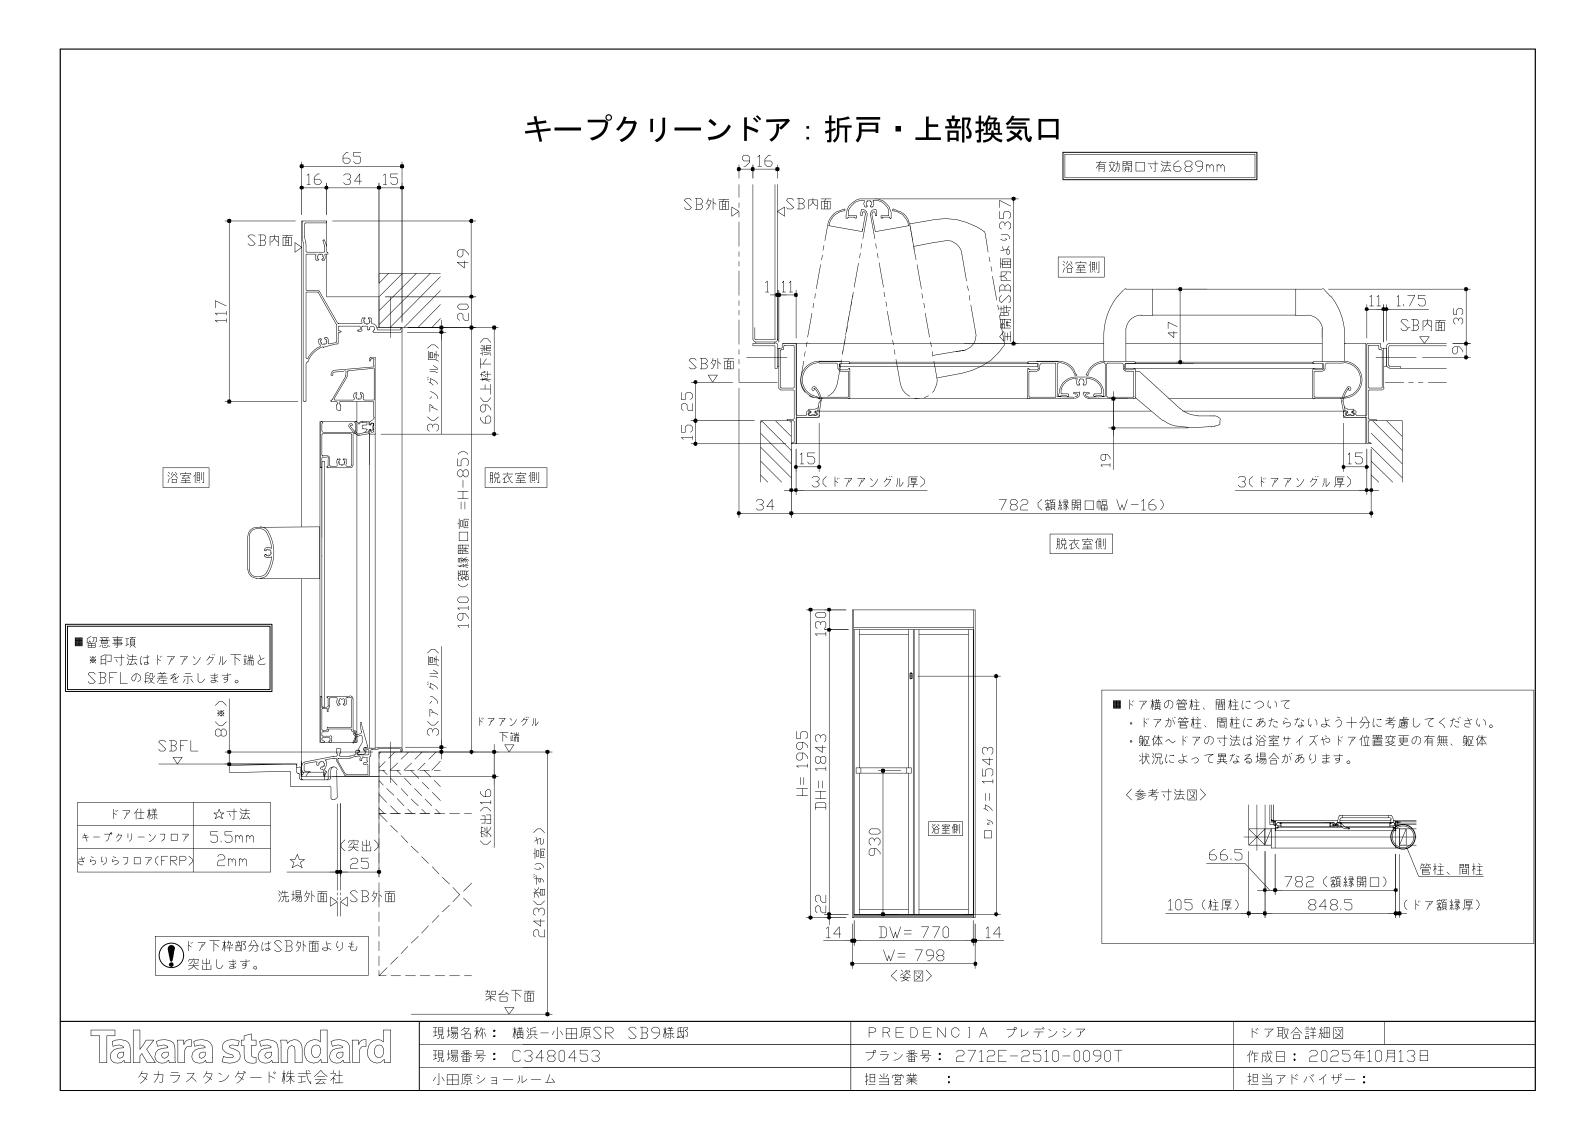

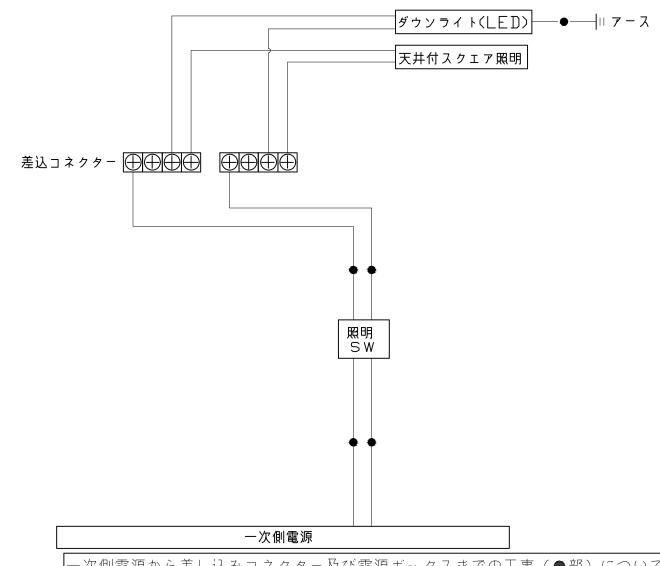



一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、 電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。

アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行ってください。 →アースが不完全な場合、感電の原因になります。

Takara standard shift standard

現場名称: 横浜-小田原SR SB9様邸	PREDENCIA プレデンシア	電気配線図
現場番号: C3480453	プラン番号: 2712E-2510-0090T	作成日: 2025年10月13日
小田原ショールーム	担当営業 :	担当アドバイザー:

