

システムバス 御見積書

御名前 福岡-大分新SR SB1 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランspa

商品
御見積金額 ¥731,300 (税込 ¥804,430)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ¥180,500 (税込 ¥198,550)

《参考》別途 現場配送費 ¥8,000 (税込 ¥8,800)

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ S1216 (AR勝手)
洗い場仕様 キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー カームホワイト
浴槽材質 アクリル人造大理石
浴槽カラー シュガーライトグレー
浴槽形状 セミスクエア浴槽
カウンター材質 樹脂
カウンター/下カバーカラー ホワイト / -
浴槽前カウンターカラー -
エプロン材質/カラー ステンレス / ホワイト
浴室パネル材質 高品位ホーロー
パネルカラー(正面) ノルディックグリーン
パネルカラー(周辺) ホワイト
ガス種 / 周波数 LPG / 60Hz

◆ 御確認事項

作成日 2025年9月13日
プラン番号 2109R-2505-0521T
現場番号 C3907167

タカスタンダード株式会社
◆大分営業所
大分県大分市古国府6丁目2-9番
TEL 092-431-5864 / FAX 097-513-8531

◆大分ショールーム
TEL 097-513-8535 / FAX 097-513-8536

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
高江		宮川

◆ 備考

展示現品の為、別途部材が必要になります。

--	--

御名前 福岡-大分新SR SB1

様

現場番号	C3907167	プラン番号	2109R-2505-0521T	作成日	2025/9/13
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ S1216サイズ		1	698,000	698,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・1面デザイン/周辺レギュラークラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームホワイト)	1		
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(シュガーライトグレー)	1		
9	浴槽追焚き穴	なし	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ホワイト)	1		
11	浴槽形状	人大セミスクエア浴槽	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
17	浴槽パン	あり	1		
18	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂ホース(シルバー)KF9032ST 水栓上部カウンター(ホワイト)	1		
19	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:KF9032ST	1		
20	浴槽用水栓	壁付サーモ水栓(TO-TBV034ZTK)	1	+40,000	+40,000
21	カウンター	ワイドカウンター	1	-46,000	-46,000
22	シャワーフックスライドバー	あり	1		
23	浴室パネル	プレミアムクラス(一面デザイン)(Kパネル)	1	+15,000	+15,000
24	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
25	天井	高光沢フラット天井	1		
26	換気機器	天井換気扇ホワイト	1		
27	換気機器開口	工場開口	1		
28	照明	ダウンライト照明(3灯)(白色)	1	+3,000	+3,000
29	天井照明開口	工場開口	1		
30	ミラー	横長ミラー	1	-7,500	-7,500
31	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		

御名前 福岡-大分新SR SB1 様

現場番号	C3907167	プラン番号	2109R-2505-0521T	作成日	2025/9/13
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
33	収納棚	クリアタイプB(2段)	1	+4,000	+4,000
34	どこでもラック	タオルハンガーL(ホワイト)	1	+2,800	+2,800
35	風呂フタフック	風呂フタフック(固定式)(ホワイト)	1	+4,000	+4,000
36	給水給湯管	洗い場用水栓2水栓 浴槽側壁付	1	+12,000	+12,000
37	トラップカバー	なし	1		
38	ブロック積用ボンド	2段用	1	+2,000	+2,000
システムバス合計			38		¥731,300
商品総合計			38		¥731,300

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費 ¥180,500 (税込 ¥198,550)


《参考》別途 現場配送費

¥8,000 (税込 ¥8,800)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

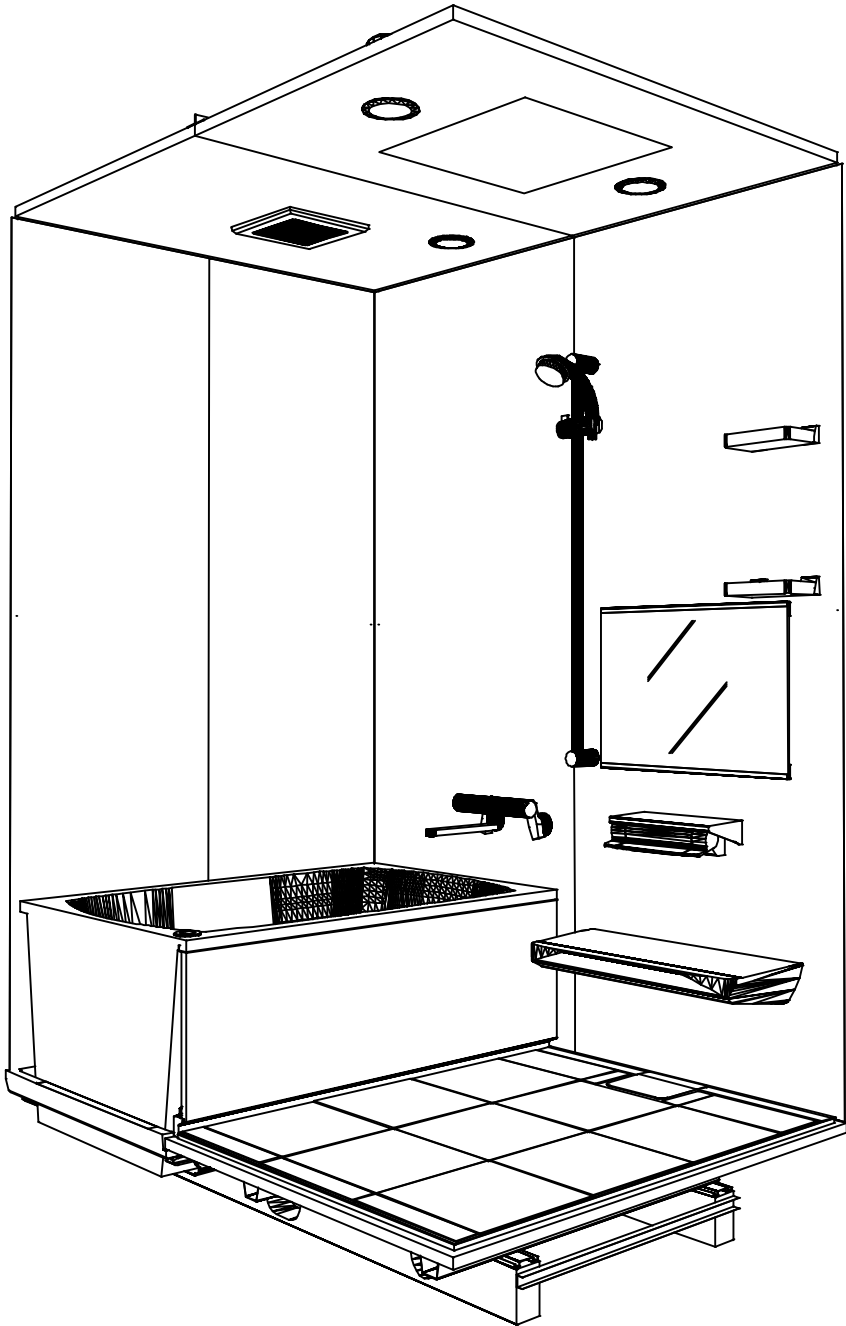

鳥瞰図

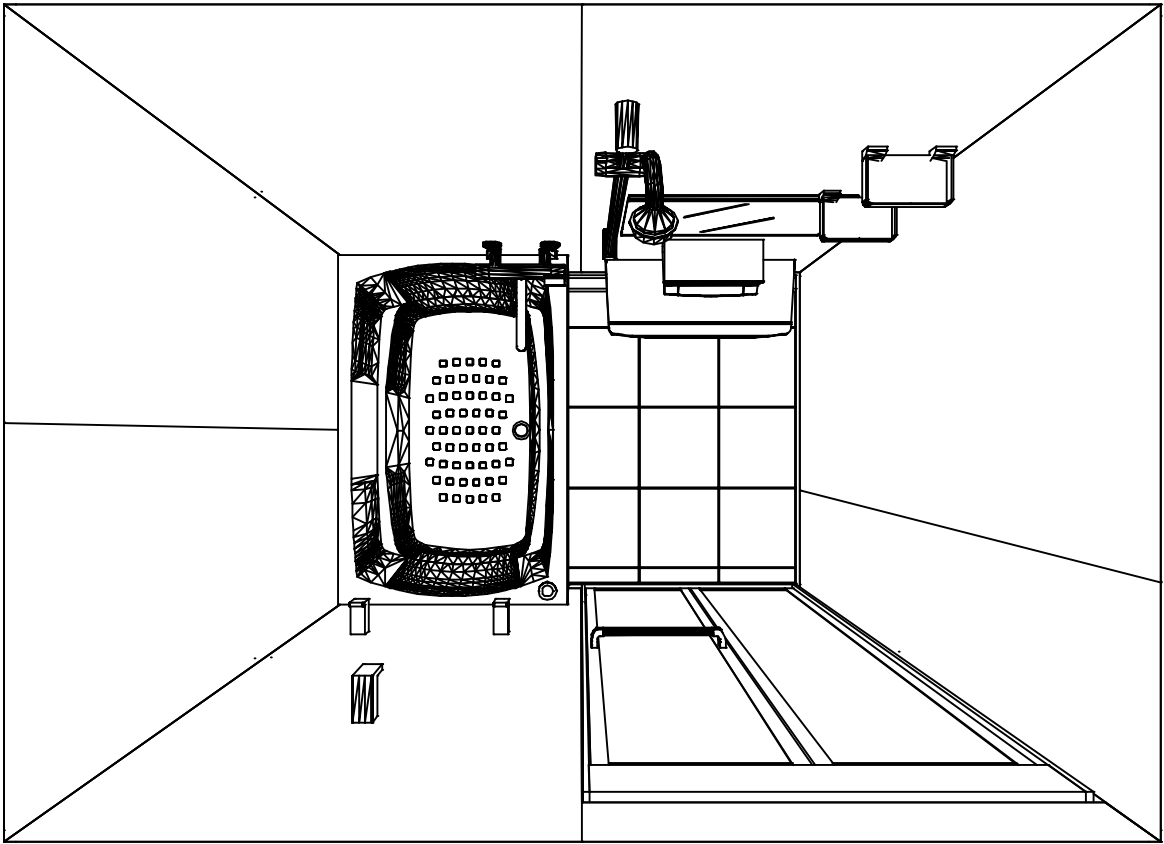

S1216

高光沢フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称：福岡-大分新SR SB1様邸	GRANSPA グランspa	姿図	
現場番号：C3907167	プラン番号：2109R-2505-0521T	作成日：2025年9月13日	
大分営業所	担当営業：高江	担当アドバイザー：	

カウンター面


浴槽側面

洗場側面


カウンター対面

■ 留意事項



* 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

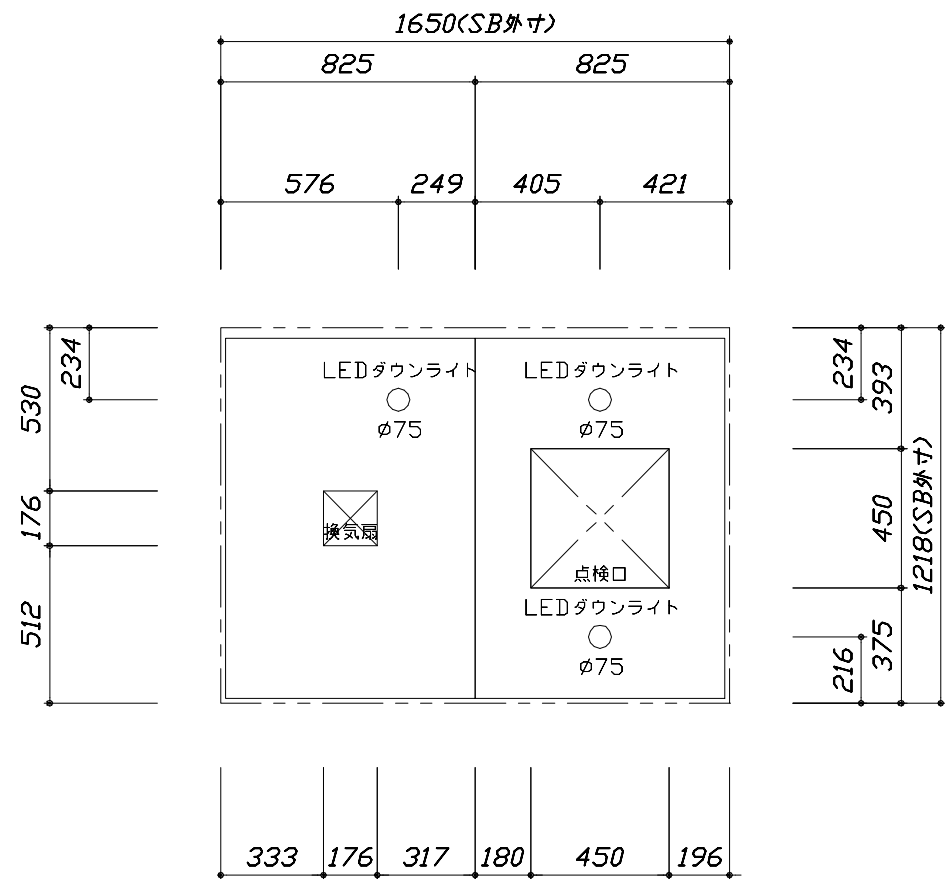

< 天井伏図 >

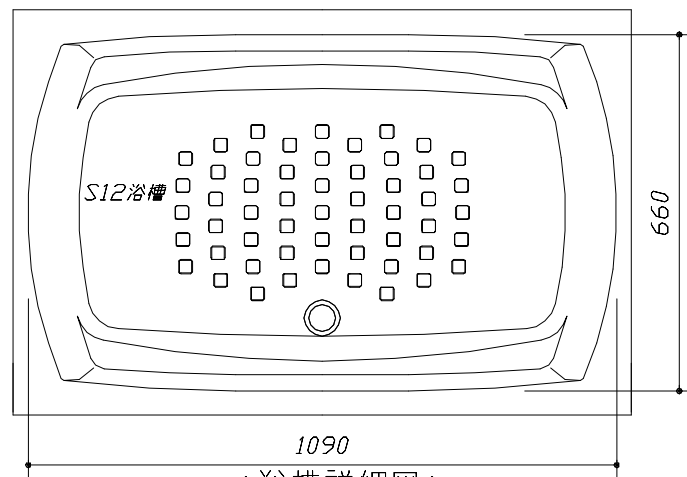



< 浴槽詳細図 >

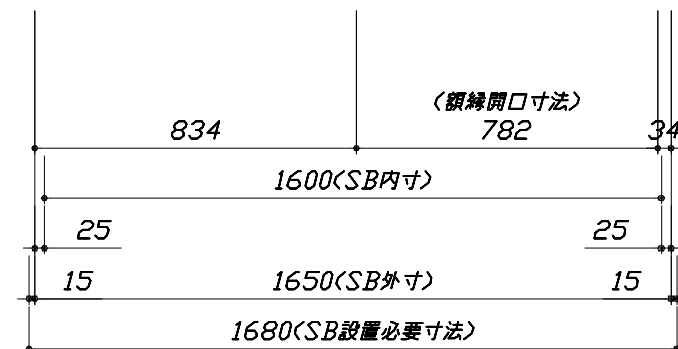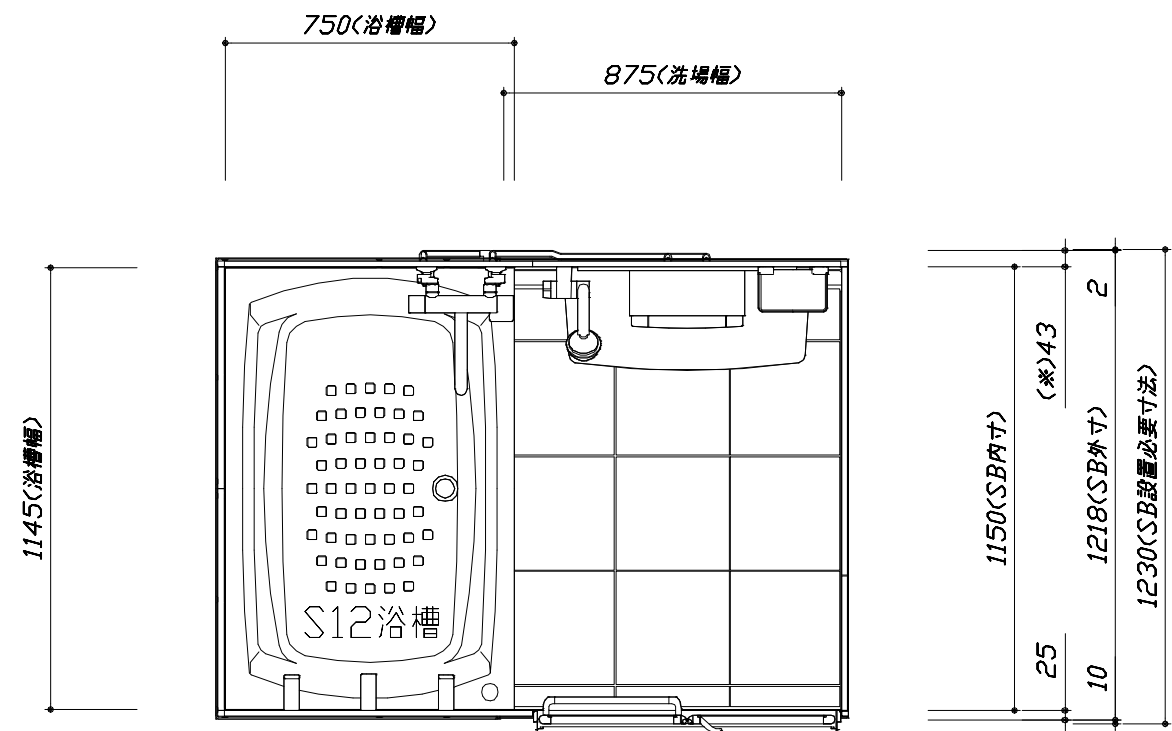

< 平面図 >

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・12方向での柱間との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との打ち合わせを十分おこなってください。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

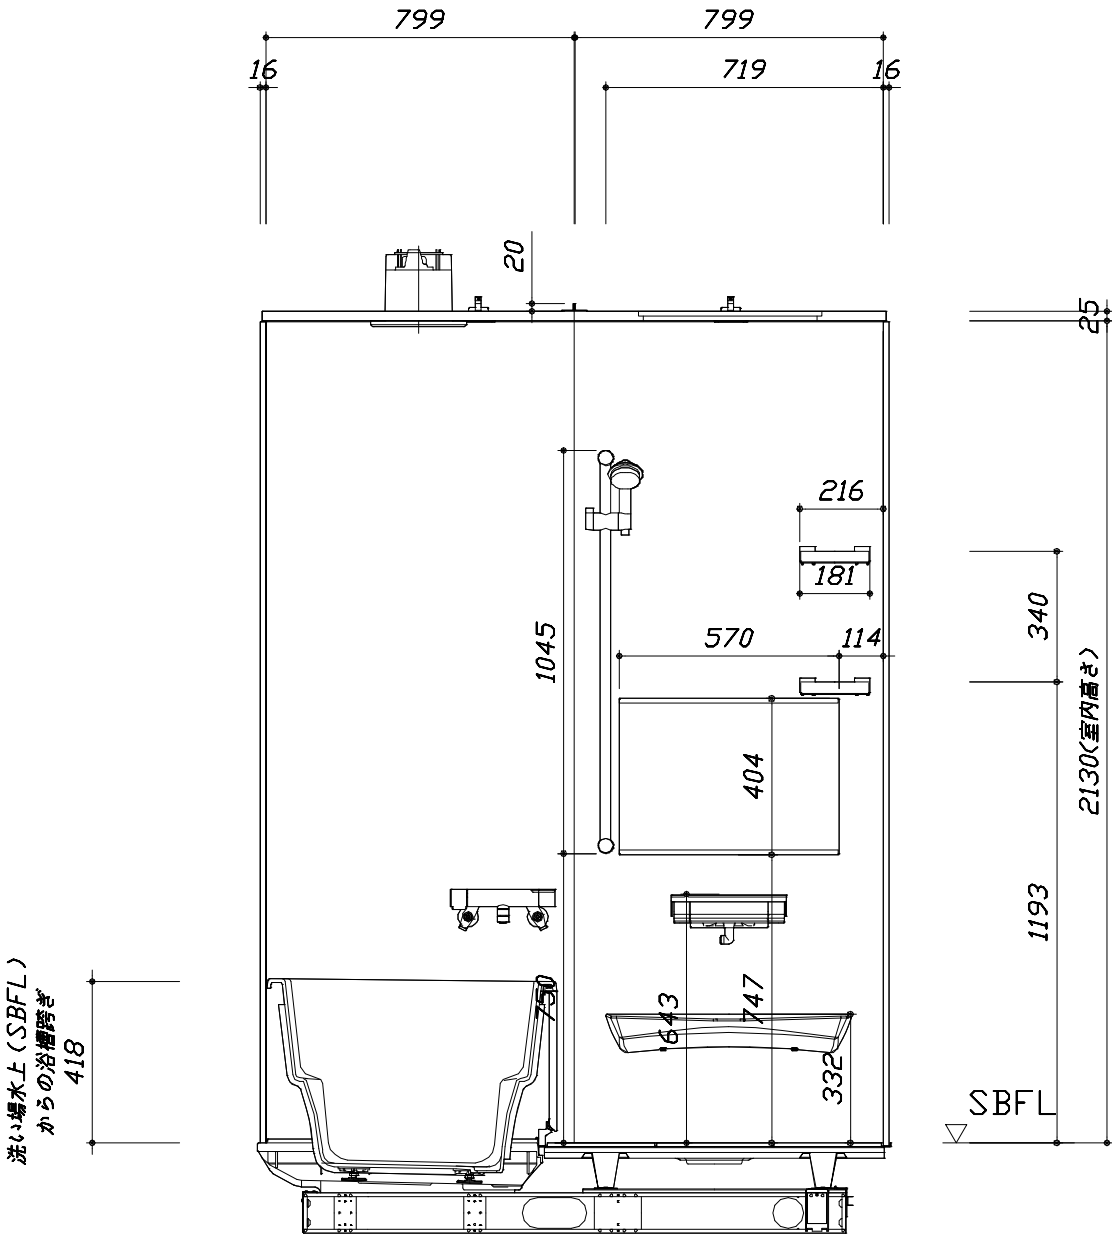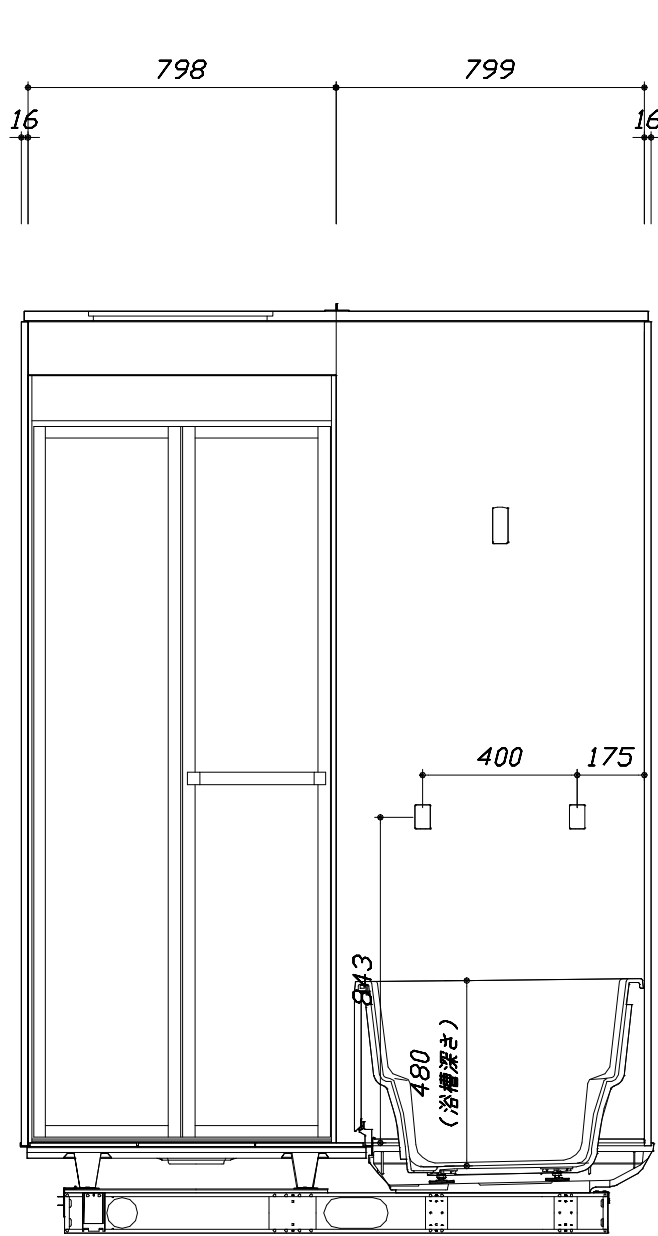



■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・12方向での柱間との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との打ち合わせを十分おこなってください。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

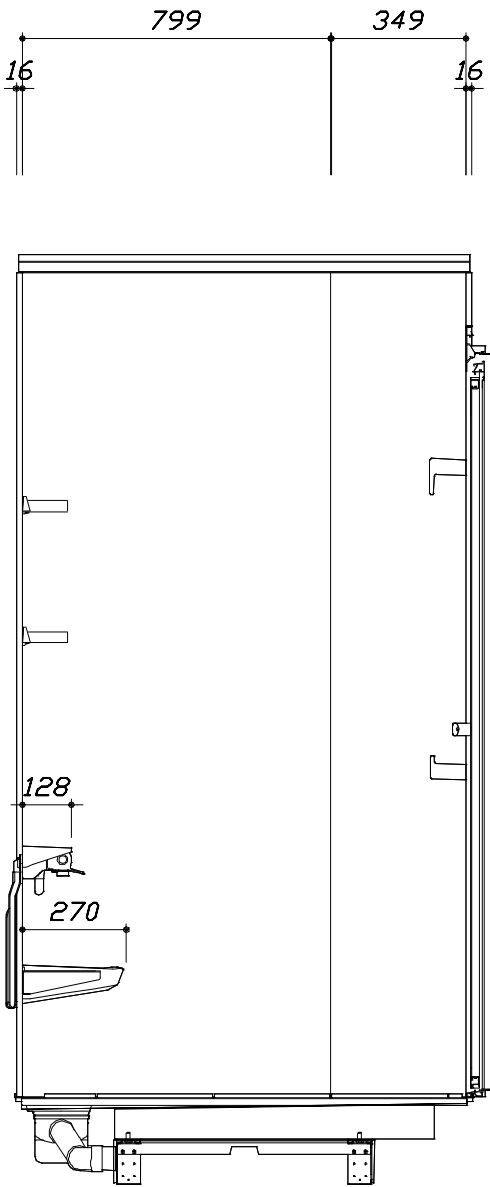

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

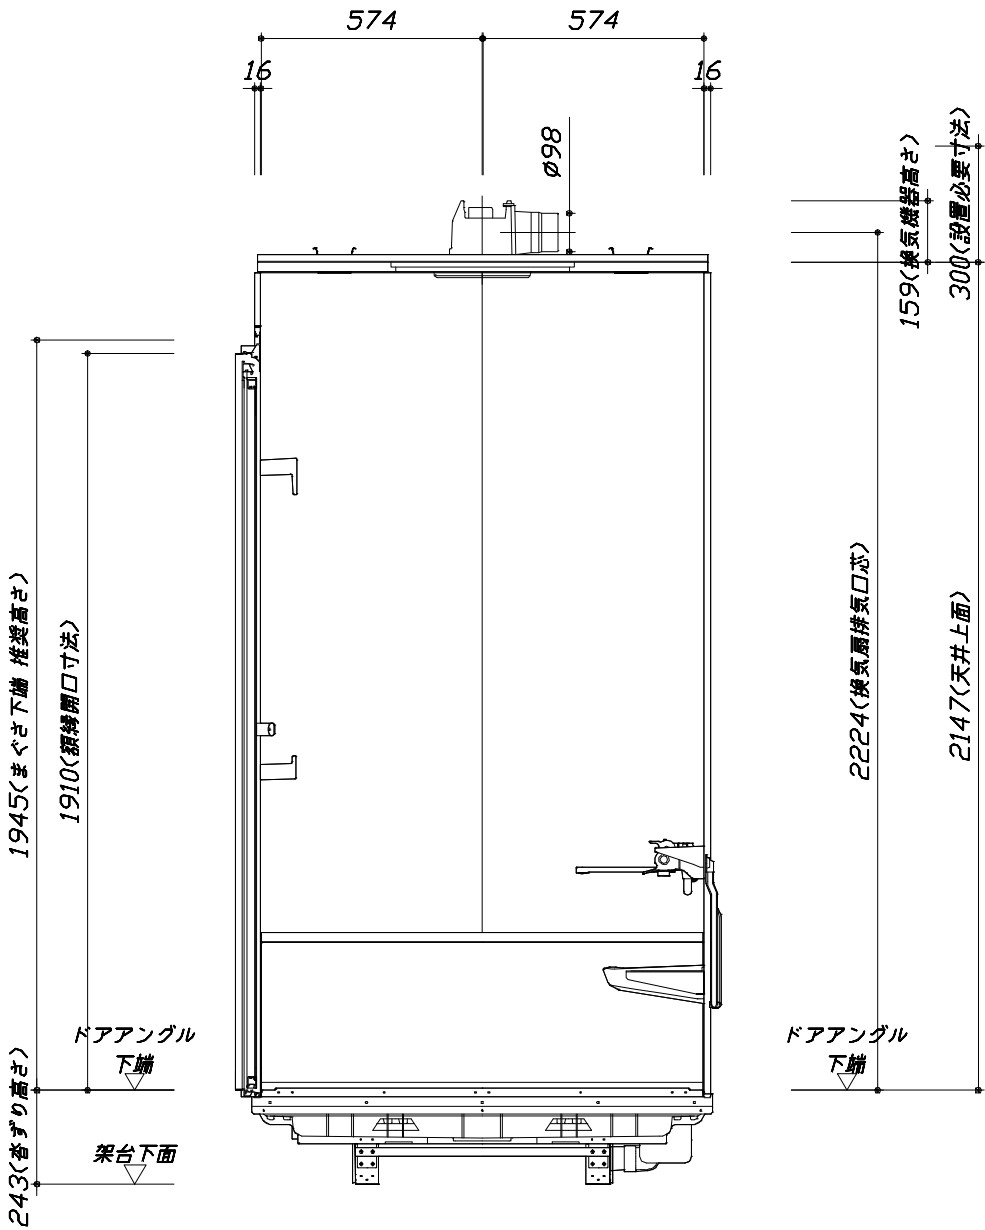

< 浴槽側面図 >

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 福岡ー大分新SR SB1様邸	GRANSPA グランspa	施工図3	縮 尺： 1:20
	現場番号： C3907167	プラン番号： 2109R-2505-0521T	作成日： 2025年9月13日	
	大分営業所	担当営業： 高江	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	S1216サイズ(室内容量3.9立方メートル)
ドア勝手	AR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	セミスクエア浴槽（S12浴槽・240リットル） 追い焚き穴:なし
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	ワイドカウンター：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし
天井	高光沢パティナール(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア:19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓1	ー
窓2	ー
窓枠1	ー
窓枠2	ー
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂, 浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	235kg

アクセサリ仕様表

ミラー	横長ミラー
収納棚	クリアタイプB：AS樹脂製（2段）
タオル掛け	ー
洗場側水栓	サーモスタット(KF9032ST)（樹脂ホース:シルバー）
浴槽側水栓	サーモスタット(TO-TBV034ZTK)
兼用水栓	ー
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（スライドバー-TN-1020）
照明	LEDダウンライト（LED 9.3W白色）（3灯）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W)（ダクト径φ98）ホワイト
フロフタ	組合せ式(アルミ複合板：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	ー
ハンドバー①	ー
ハンドバー②	ー
ハンドバー③	ー
ハンドバー④	ー
ハンドバー⑤	ー
ハンドバー⑥	ー
ハンドバー⑦	ー

本体カラー

浴槽	GN：シュガーライトグレー
カウンター	W：ホワイト
パネル(カウンター面)	JYH：ノルディックグリーン
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カウンター	W：ホワイト
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	HW：カームホワイト
ドア / 天井	W：ホワイト / HW：ホワイト
収納棚	クリアタイプB
タオル掛け	ー
ランドリーセット	ー

Takara standard タカラストانダード株式会社	現場名称： 福岡ー大分新SR SB1様邸	GRANSPA グランspa	仕様表	
	現場番号： C3907167	プラン番号： 2109R-2505-0521T	作成日： 2025年9月13日	
	大分営業所	担当営業：高江	担当アドバイザー：	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事	
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
			浴室用電源配線、接続工事					○		浴室機器の事後電気工事	
浴室天井裏の電源、スイッチ工事							○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		



※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する

※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。
- 貫通スリーブを使用する場合は45度エルボなどを接続し、バンドなどで固定してください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

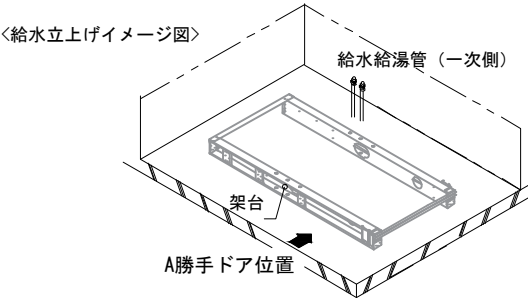

■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。




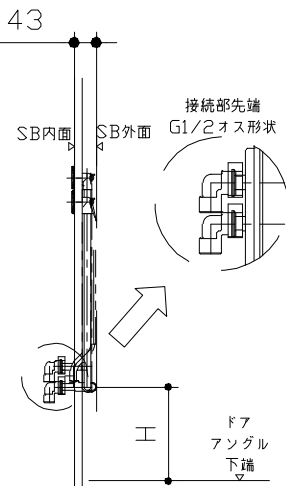
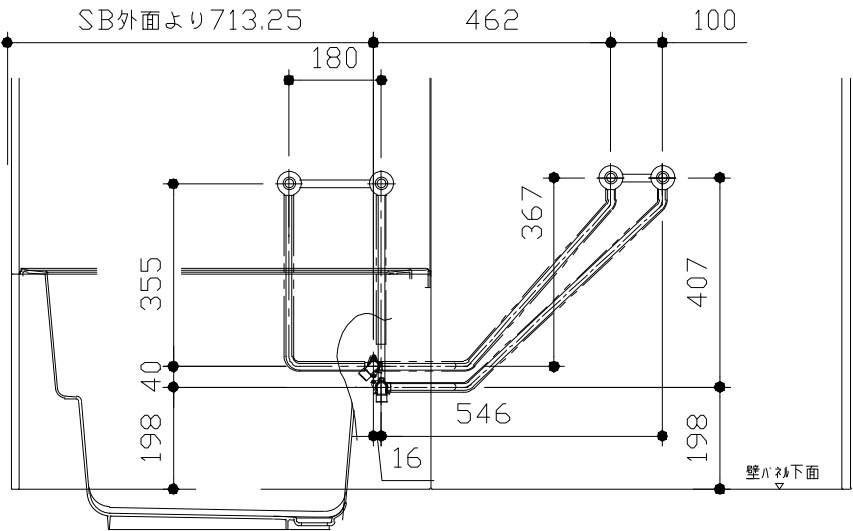


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	182
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	173

＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置

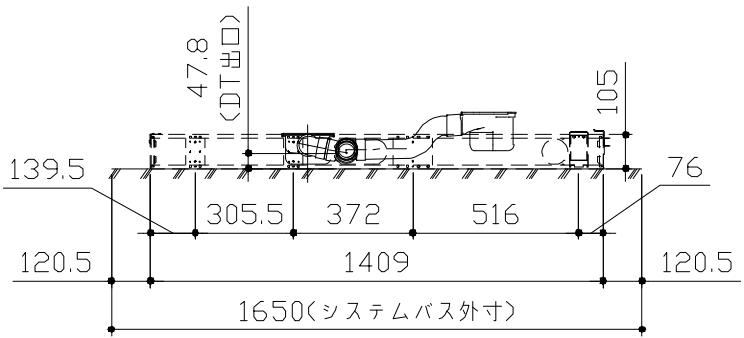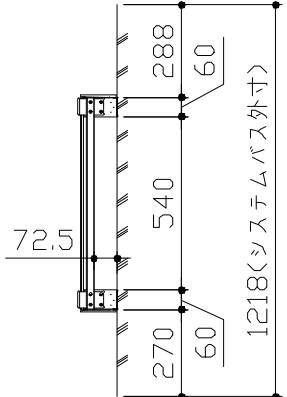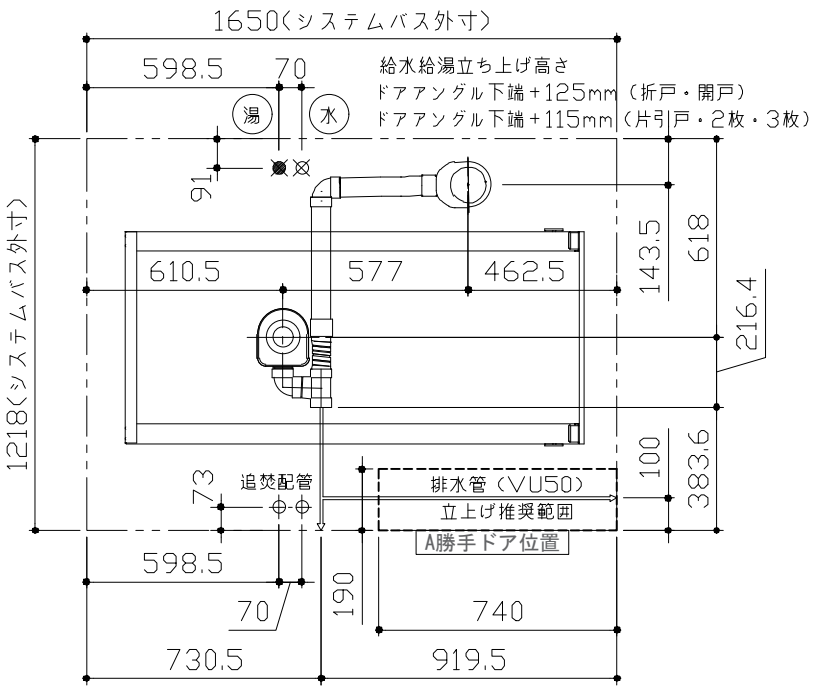

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞


■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

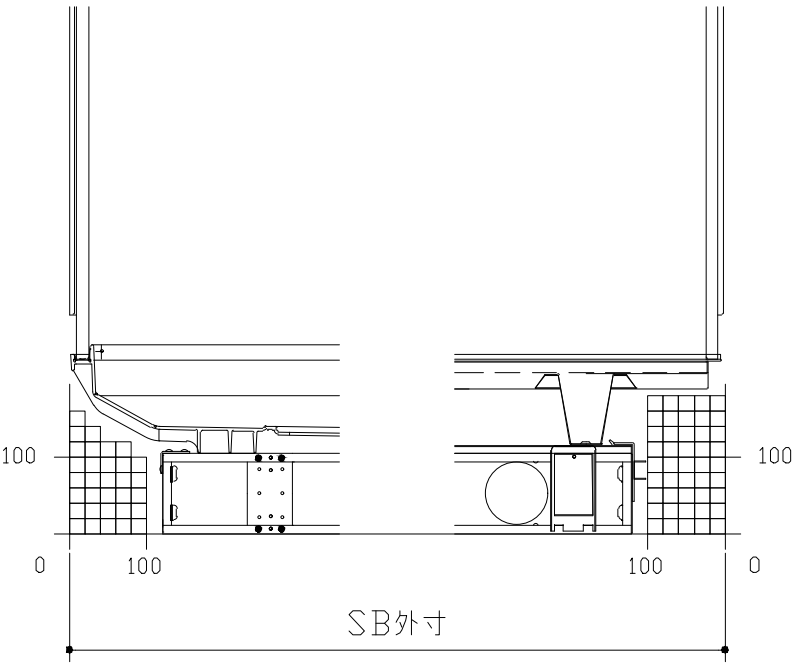


A矢視

B矢視

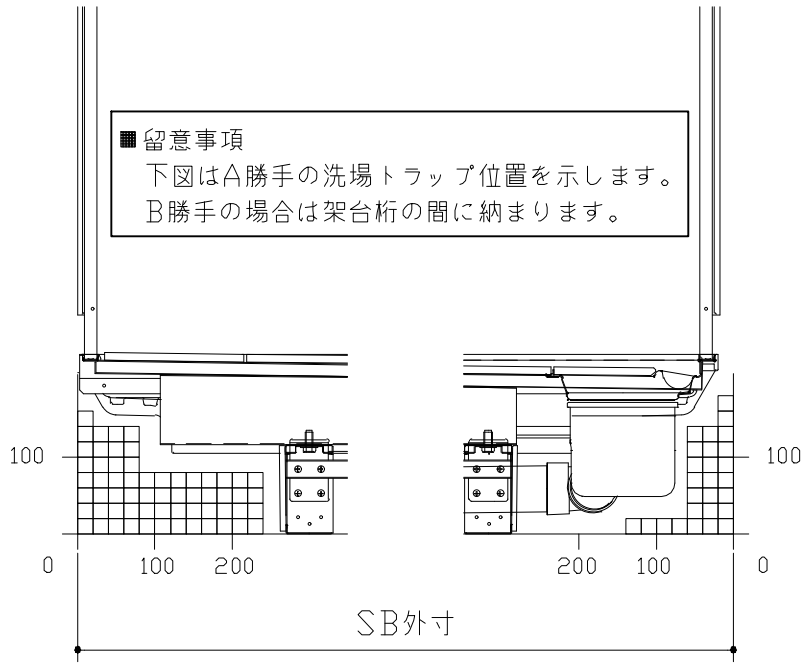

C矢視




D矢視

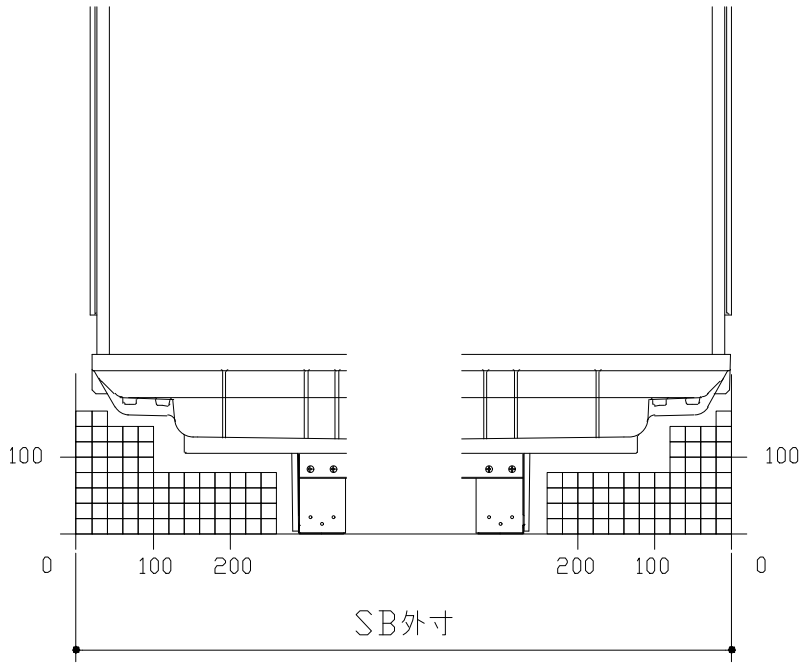

E矢視


F矢視

キープクリーンドア：折戸・上部換気口

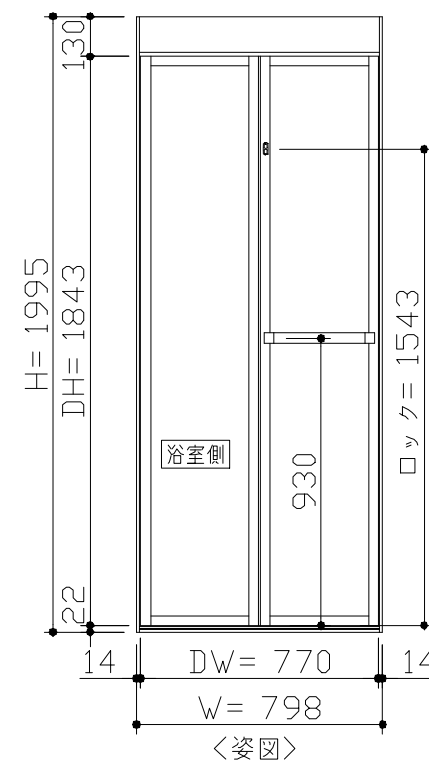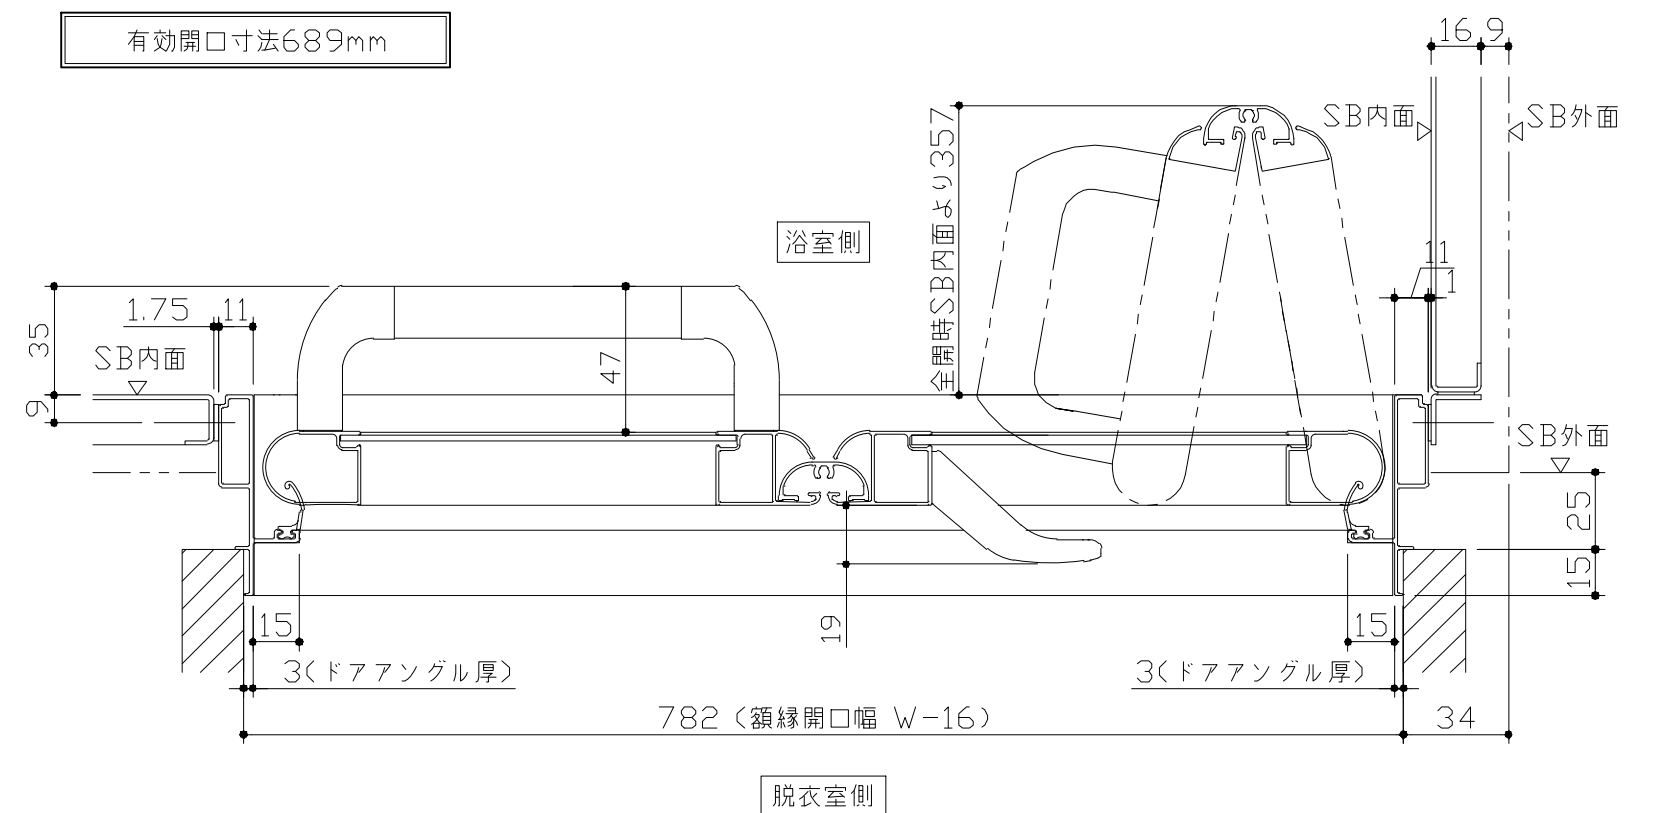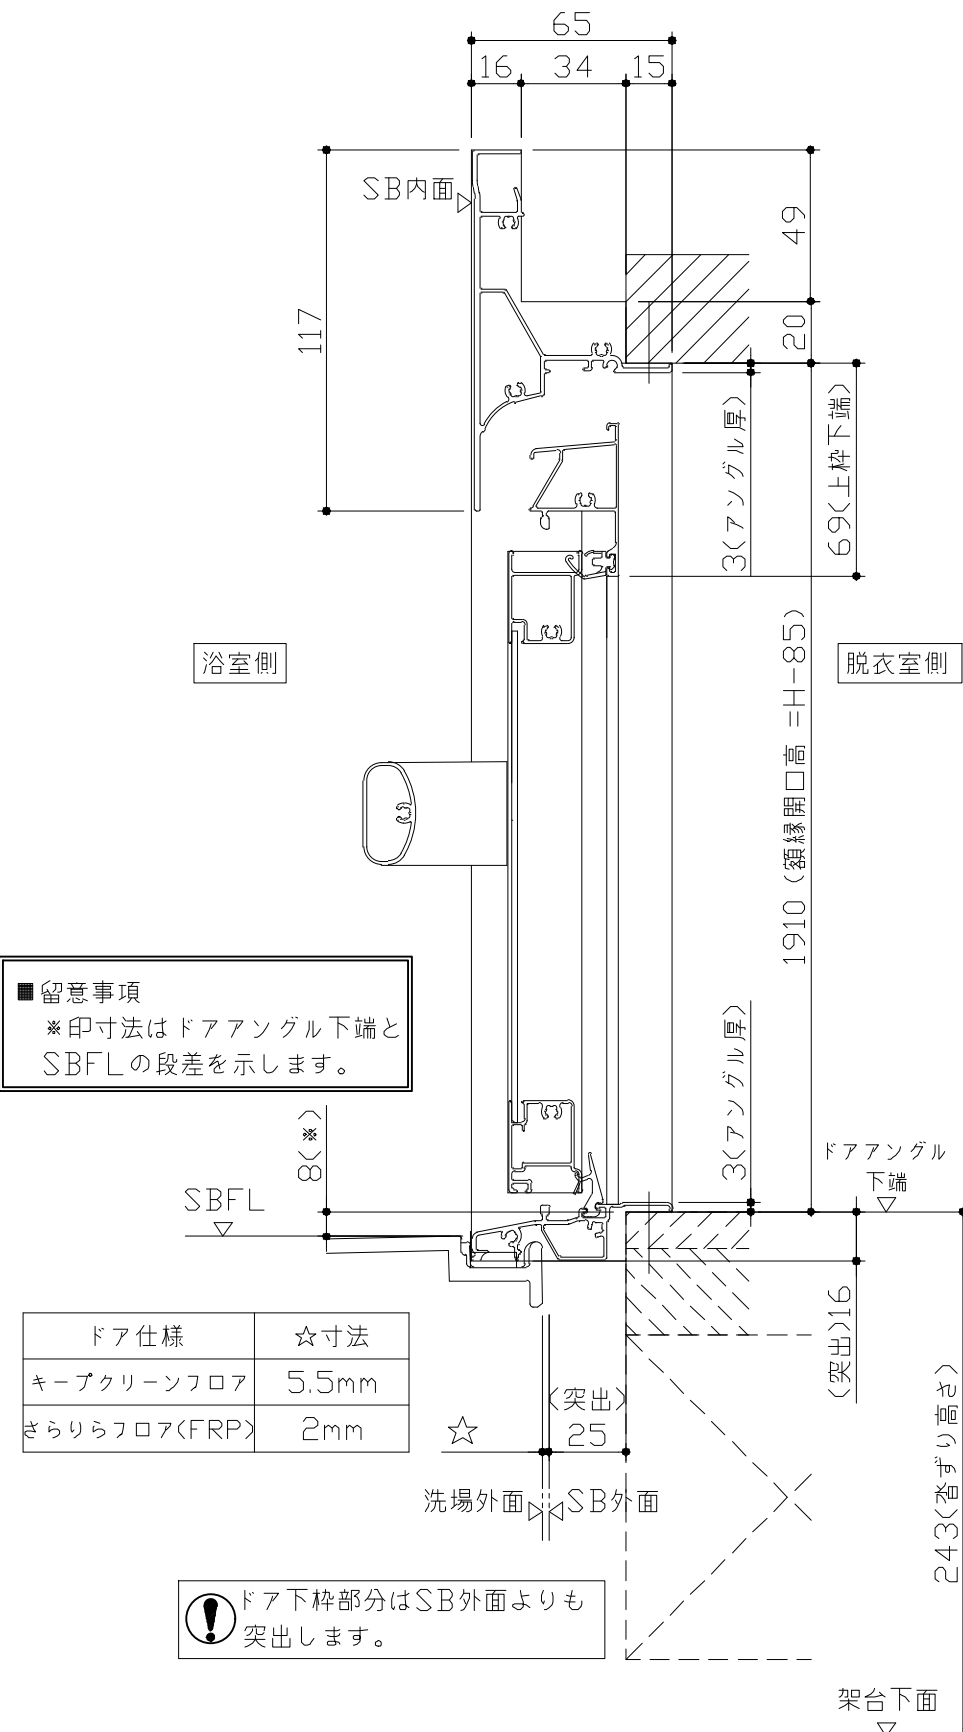

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉

















一次側電源から差し込みコネクタ及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

浴槽	洗い場用水栓	浴槽用水栓
<		

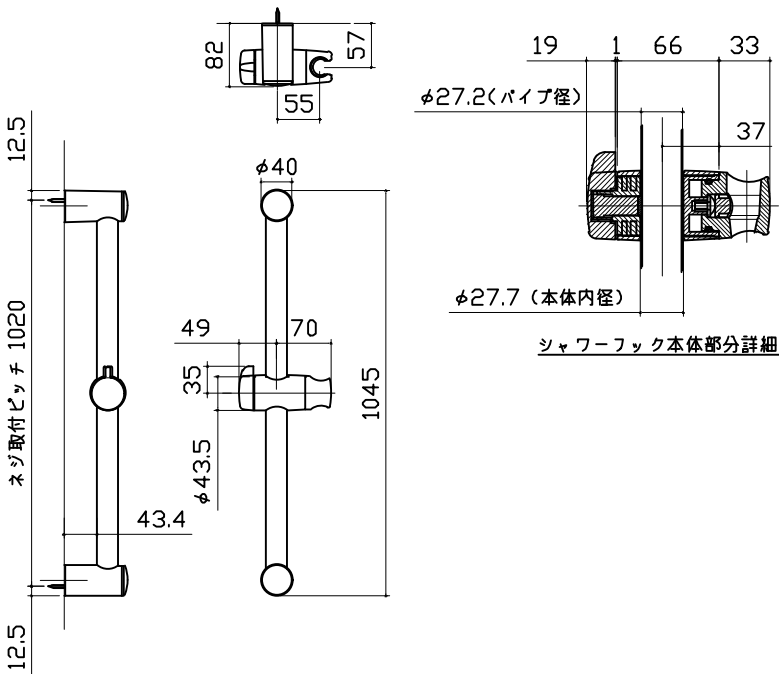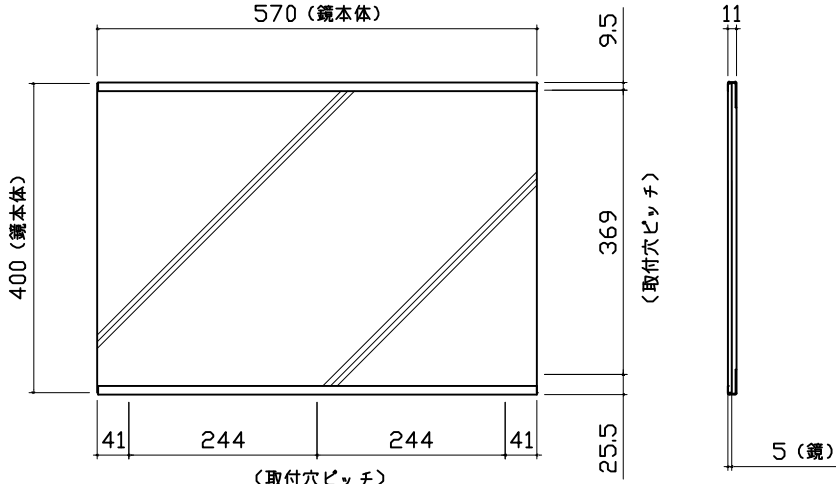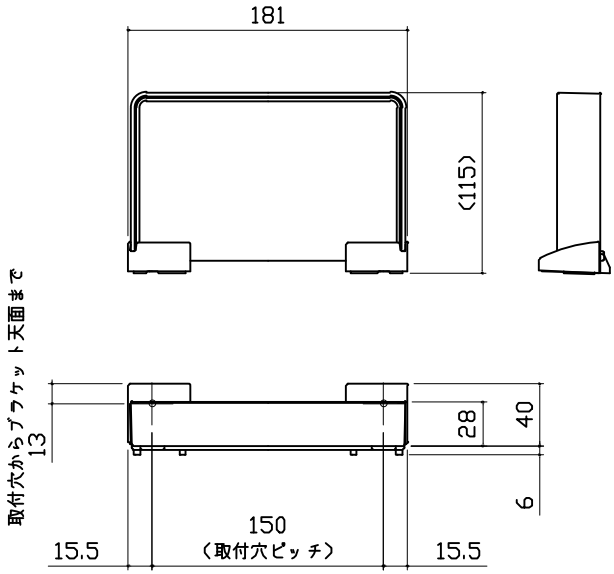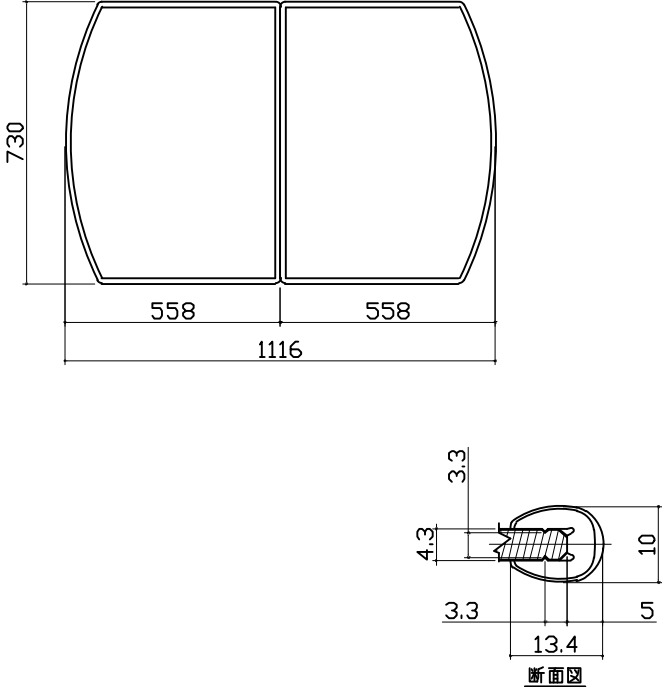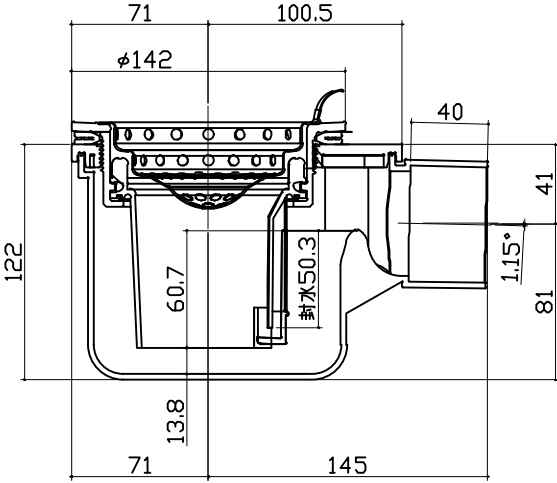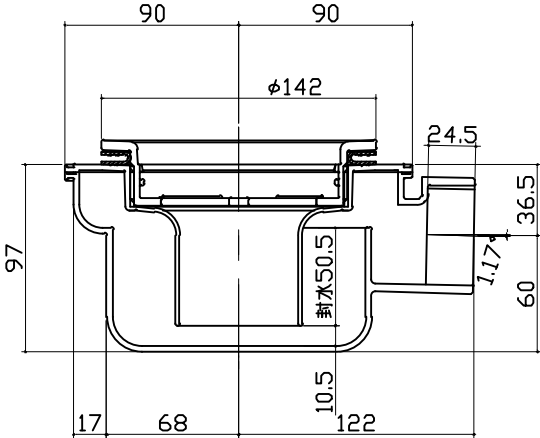シャフーフックスライダー	ミラー	収納棚		
 シャフーフック本体部分詳細	枠：SUS304 t0.8 ミラー：表面防曇コートあり（横長クリアミラー） 表面防曇コートなし（横長ミラー） 	本体：AS 		
風呂蓋 707MVA-S12W	洗い場側排水トラップ	浴槽側排水トラップ		
 断面図				
Takara standard タカスタンダード株式会社	現場名称：福岡-大分新SR SB1様邸	GRANSPA グランspa	部材詳細図	2/2
	現場番号：C3907167	プラン番号：2109R-2505-0521T	作成日：2025年9月13日	
	大分営業所	担当営業：高江	担当アドバイザー：	

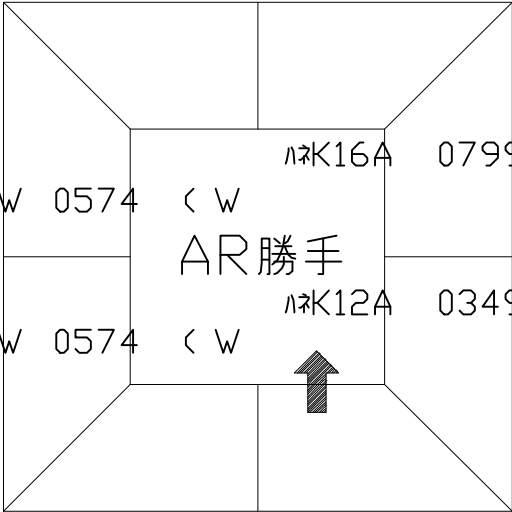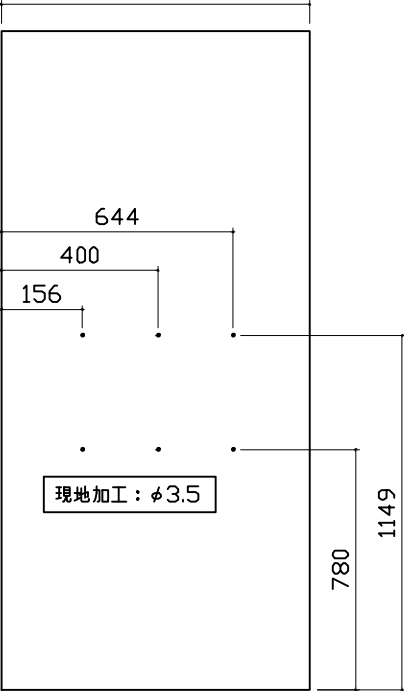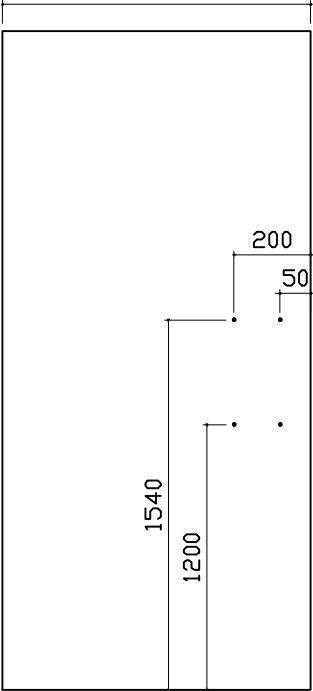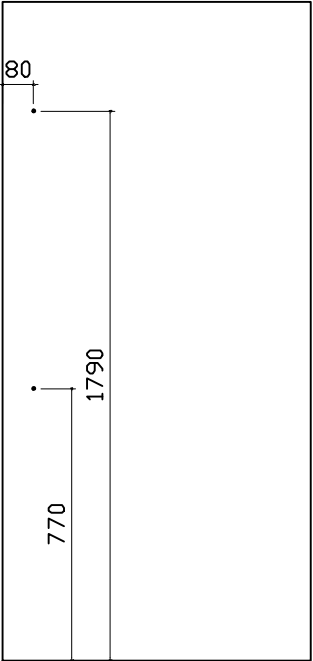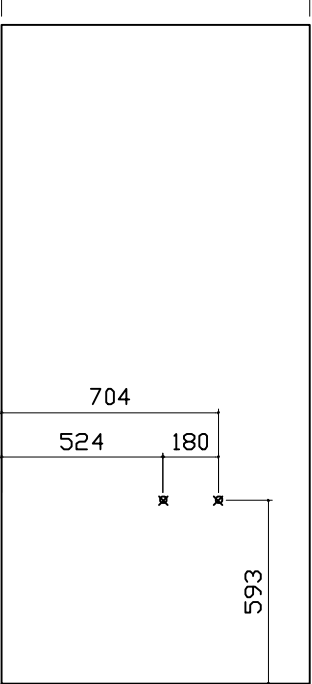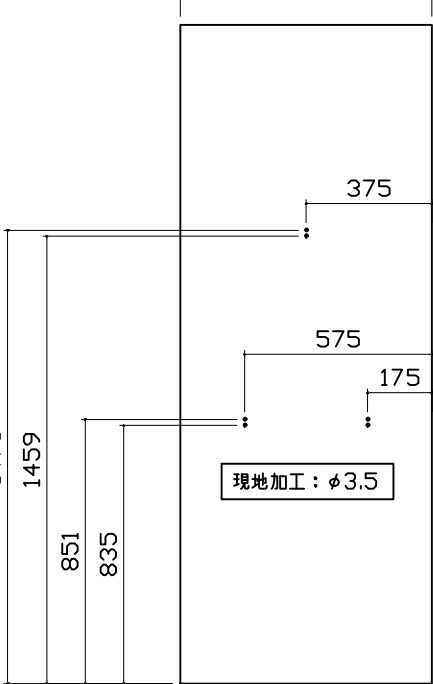パネル割図		ミラー		収納棚	
ハネK16C2Z 0799 R<JYH ハネK16C1G 0799 L<JYH ハネK12NW 0574 < W ハネK12NW 0574 < W ハネK16A 0799 < W ハネK12A 0349 < W ハネK16AD 0799 < W AR勝手 		ハネK16C2Z 0799 R<JYH 799 644 400 156 現地加工：φ3.5 780 1149 		ハネK16C2Z 0799 R<JYH 799 200 50 1540 1200 現地加工：φ3.5 	
シャワーフックスライドバー		浴槽用水栓取付穴		風呂蓋収納	
ハネK16C2Z 0799 R<JYH 799 80 1790 770 現地加工：φ3.5 		ハネK16C1G 0799 L<JYH 799 704 524 180 593 現地加工：φ33穴 		ハネK16AD 0799 < W 799 375 575 175 1475 1459 851 835 現地加工：φ3.5 ■留意事項 タオルカケ・ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。 	
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称：福岡ー大分新SR SB1様邸 現場番号：C3907167 大分営業所		GRANSPA グランspa プラン番号：2109R-2505-0521T 担当営業：高江	
				穴開け指示図 1/1 作成日：2025年9月13日 担当アドバイザー：	
