

# システムバス 御見積書

御名前 大阪-大阪SR SB-11 様

業者 様

商品名 伸びの美浴室

商品  
御見積金額 **¥465,800 (税込 ¥512,380)**

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

**(参考) 別途 商品組付費 ¥98,000 (税込 ¥107,800)**

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。  
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

作成日 2021年11月6日  
プラン番号 1801A-2111-0077T  
現場番号 C2910621

タカスタンダード株式会社  
大阪支社 販売課  
大阪府東大阪市長田東2丁目4番33号  
TEL 06-6746-6815 / FAX 06-6746-6805

大阪ショールーム  
TEL 06-6746-2311 / FAX 06-6746-1246

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
1216	SB11	北野

備考

## 御見積仕様

(システムバス)

ユニットサイズ	S1216 (AL勝手)
洗い場仕様	ガラス繊維強化樹脂<FRP>
洗い場カラー	グレーベージュ
浴槽材質	FRP
浴槽カラー	ベージュ
浴槽形状	セミスクエア浴槽
カウンター材質	樹脂
カウンターカラー	ベージュ
エプロン材質/カラー	樹脂 / ベージュ
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	スケッチボーダー(アクセント)
パネルカラー(周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	13A / 60Hz

## 御確認事項

御見積りの商品は受注生産品の為、納期は約2-3週間程度いただきます。  
組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。  
現場の状況により商品取付費(搬入費)、御見積の内容(品番・数量・金額)が  
変わる場合がございます。  
この御見積書の有効期間は30日間です。

No.\*

御名前 大阪-大阪SR SB-11

様

現場番号	C2910621	プラン番号	1801A-2111-0077T	作成日	2021/11/6
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	伸びの美浴室Pタイプ S1216サイズ		1	398,000	398,000
2	架台	低床タイプ ボルト脚架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)/樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
6	洗い場	FRP洗い場(グレーベージュ)	1		
7	浴槽	FRP(ベージュ)	1		
8	浴槽追焚き穴	あり	1		
9	エプロン	保温材なし(ベージュ)	1		
10	浴槽形状	セミスクエア浴槽	1		
11	循環金具水受けトレイセット	なし	1		
12	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
13	浴槽パン	あり	1		
14	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂ホース(シルバー)KF3000TTKS	1		
15	洗い場用水栓	エコシャワー(節水+手元止水):KF3000TTKSCAB	1	+6,500	+6,500
16	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
17	カウンター	コンパクトカウンター	1	-10,000	-10,000
18	シャワーフック/スライドバー	シャワーフック	1		
19	浴室パネル	ハイクラス(アクセントデザイン)(Fパネル)	1		
20	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴あり	1		
21	天井	フラット天井	1		
22	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V規格)	1	+41,000	+41,000
23	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
24	換気機器開口	工場開口	1		
25	照明	天井付ミニ照明<電球色>	1		
26	天井照明開口	工場開口	1		
27	ミラー	ロングミラー	1	+9,500	+9,500
28	風呂フタ	シャッター式風呂フタ	1	+3,000	+3,000
29	タオル掛け	スクエアタイプ	1	+1,500	+1,500
30	収納棚	スクエアタイプ(3段)<ベージュ>	1	+1,700	+1,700
31	どこでもラック	シャワーフック(ホワイト)	1	+2,100	+2,100

御名前 大阪-大阪SR SB-11

様

現場番号	C2910621	プラン番号	1801A-2111-0077T	作成日	2021/11/6
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500
33	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
34	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			34		¥465,800
商品総合計			34		¥465,800

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

**(参考) 別途 商品組付費**


システムバス商品組付費

¥98,000 ( 税込 ¥107,800 )


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格 &lt; 税率10% &gt; を表示しています。

パース

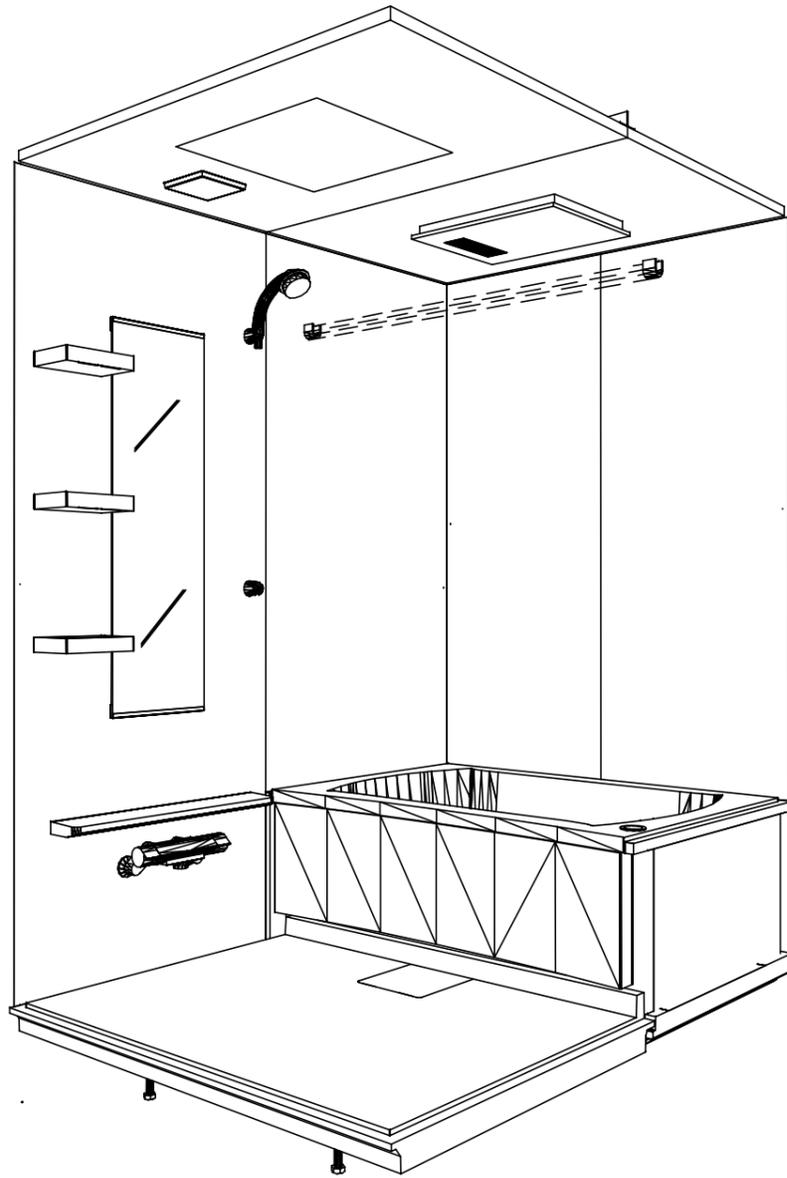

鳥瞰図

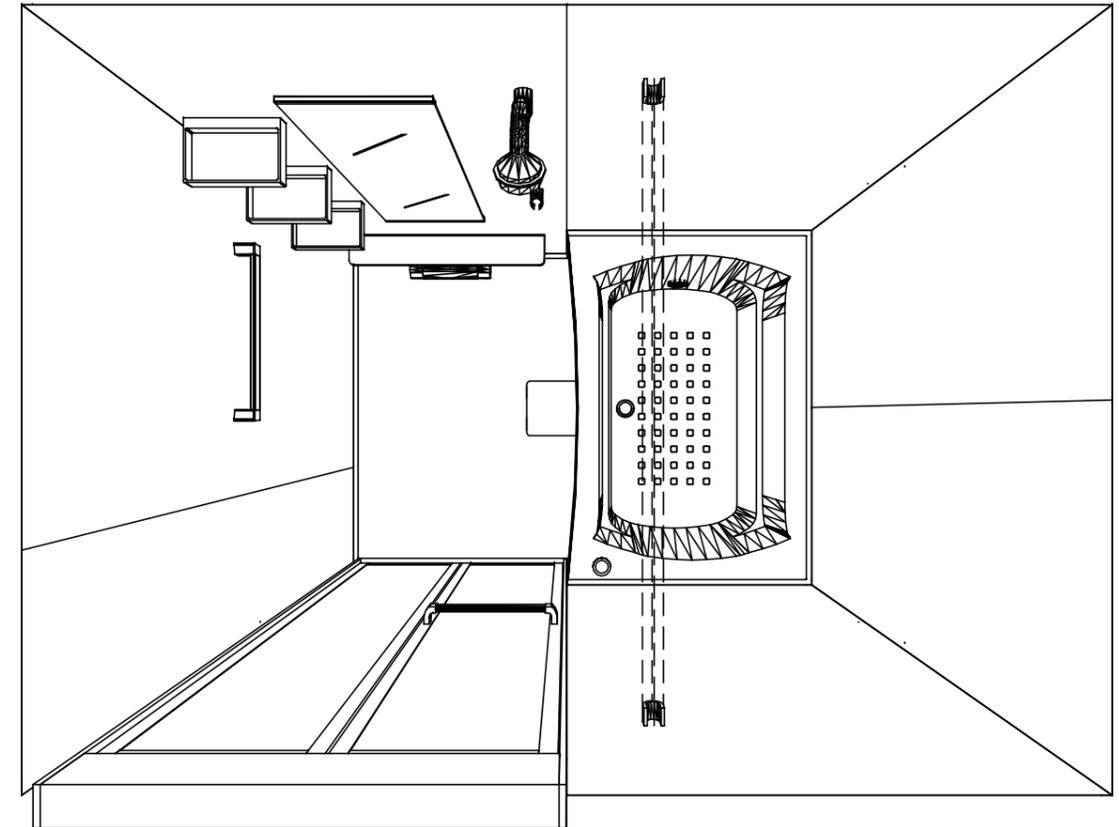

S1216

ガラス繊維強化樹脂<FRP>浴槽

フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

**Takara standard**  
タカラストانダード株式会社

現場名称： 大阪-大阪SR SB-11様邸

現場番号： C2910621

大阪支社 販売課

伸びの美浴室

プラン番号： 1801A-2111-0077T

担当営業： 1216

姿図


作成日： 2021年11月6日

担当アドバイザー： SB11


縮尺：A3サイズ等倍





■留意事項  
 ※印寸法は給水給湯管の  
 突出寸法18mmを含みます。

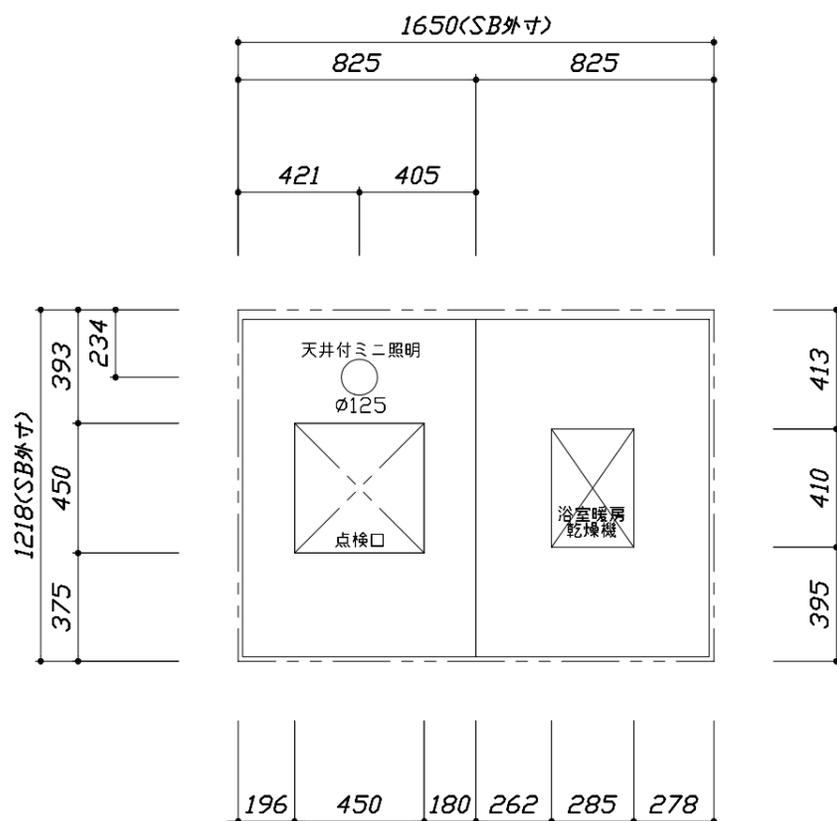

<天井伏図>

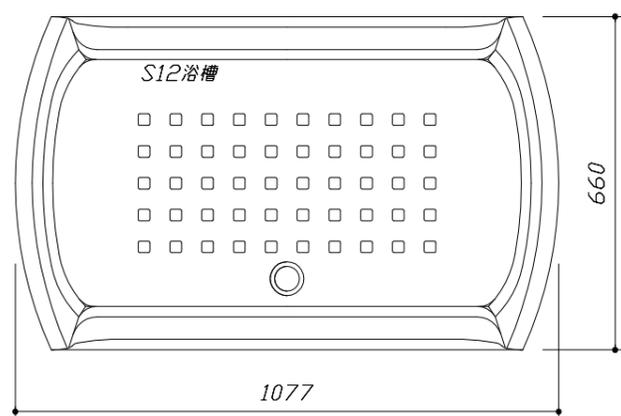

<浴槽詳細図>

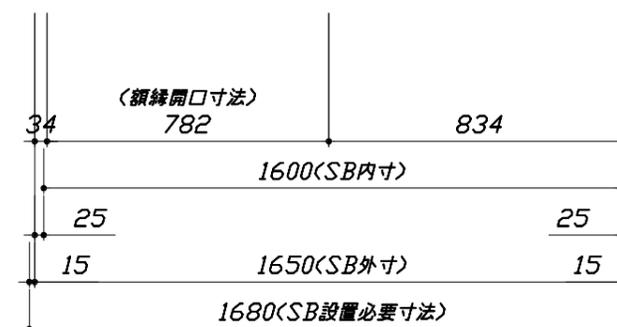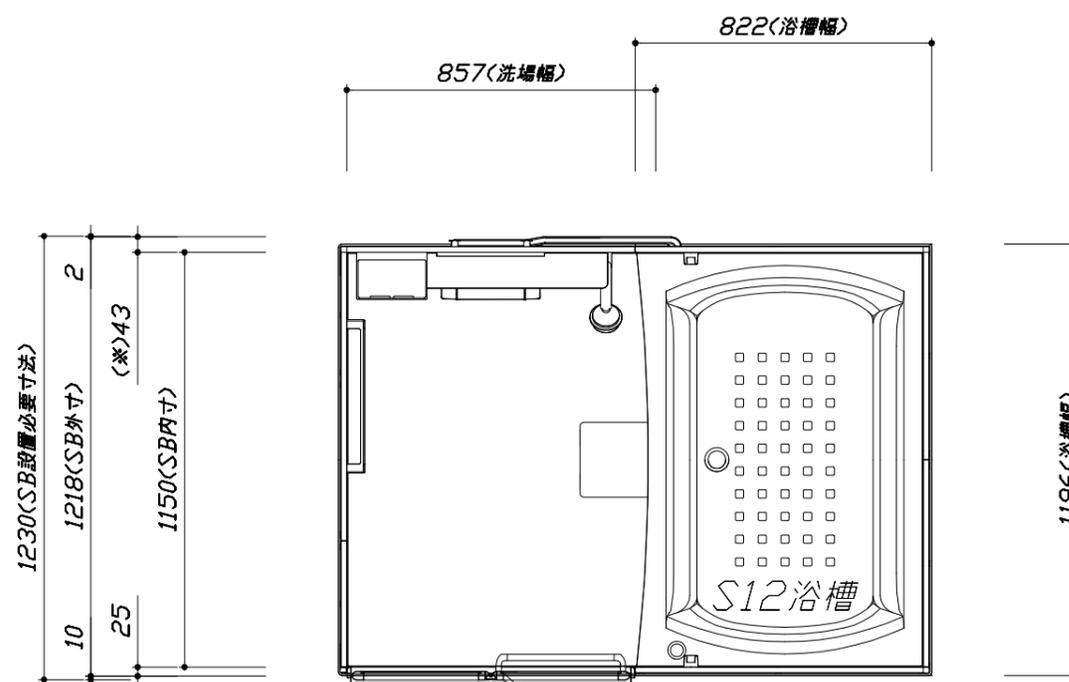

<平面図>

**Takara standard**  
 タカラスタンダード株式会社



現場名称： 大阪-大阪SR SB-11様邸  
 現場番号： C2910621  
 大阪支社 販売課

伸びの美浴室  
 プラン番号： 1801A-2111-0077T  
 担当営業： 1216

施工図1  
 縮尺： 1:25,20  
 作成日： 2021年11月6日  
 担当アドバイザー： SB11


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・12方向での柱間との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との打ち合わせを十分おこなってください。
- ・外寸は突出部を含みます。

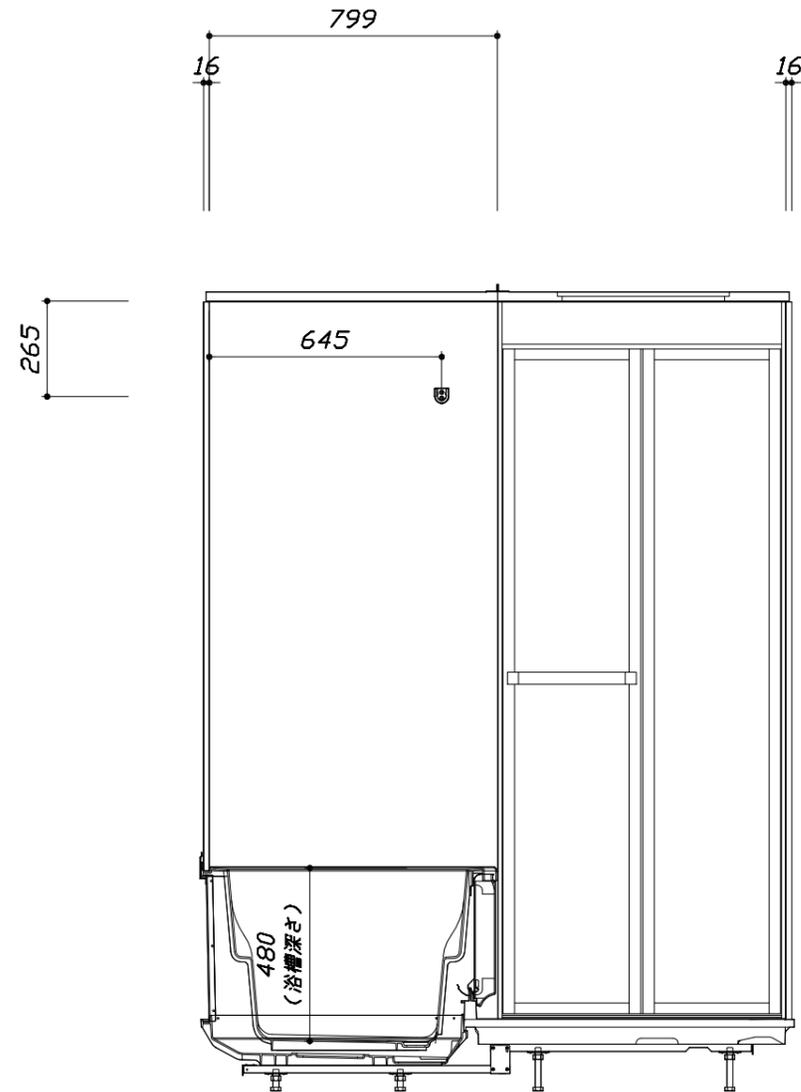

<カウンター対面図>



■ボルト脚架台高さ寸法  
 各ずり高さに対して  
 -9~+11mm調整可能

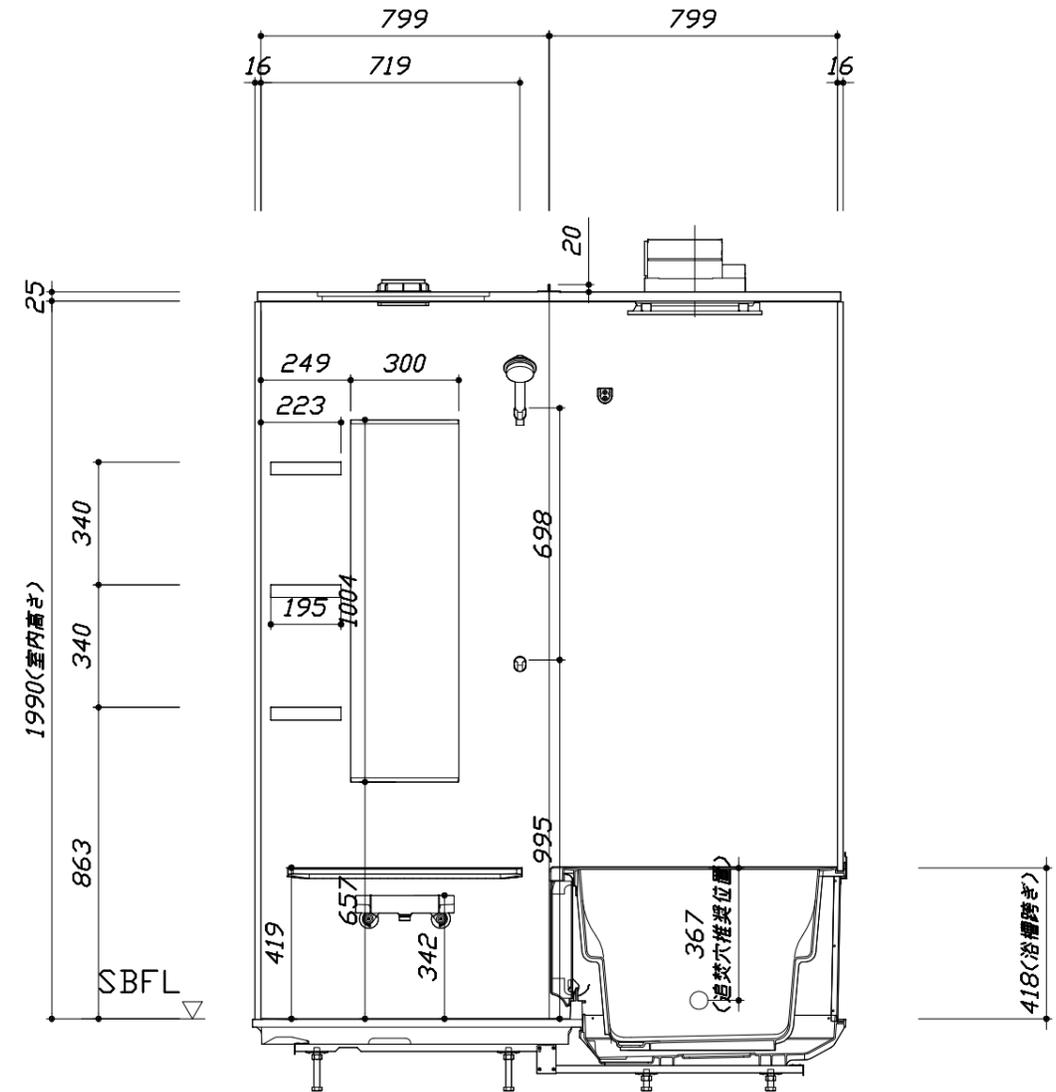

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・12方向での柱間との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との打ち合わせを十分おこなってください。
- ・外寸は突出部を含みます。

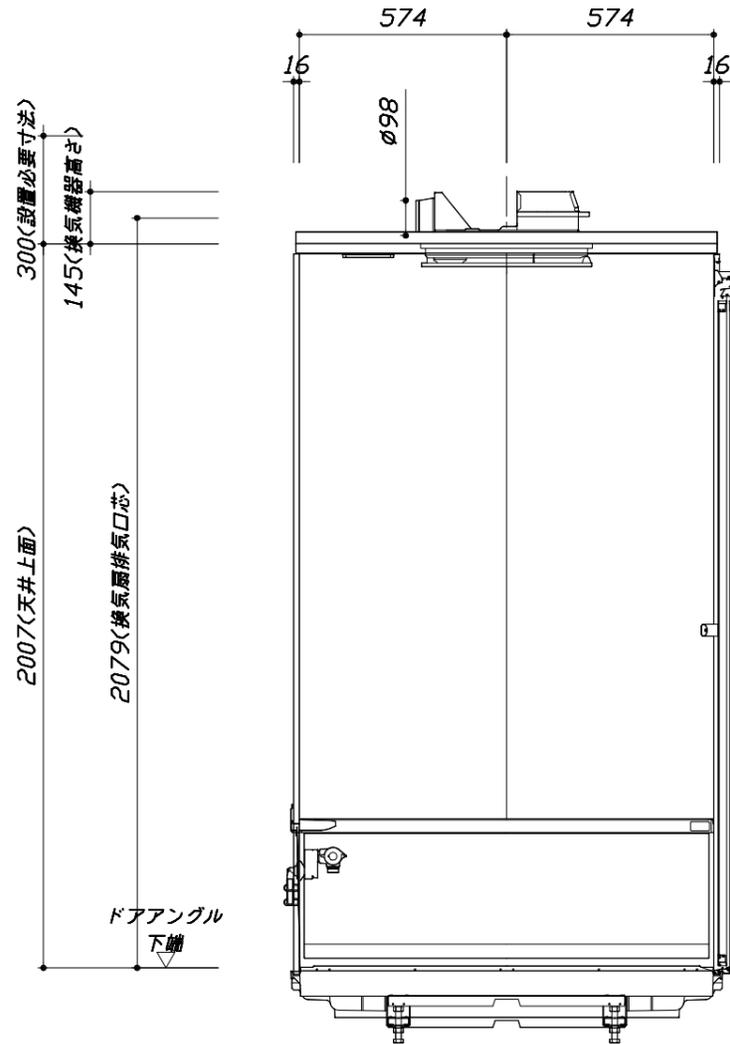

■ボルト脚架台高さ寸法  
香すり高さに対して  
-9~+11mm調整可能

< 浴槽側面図 >

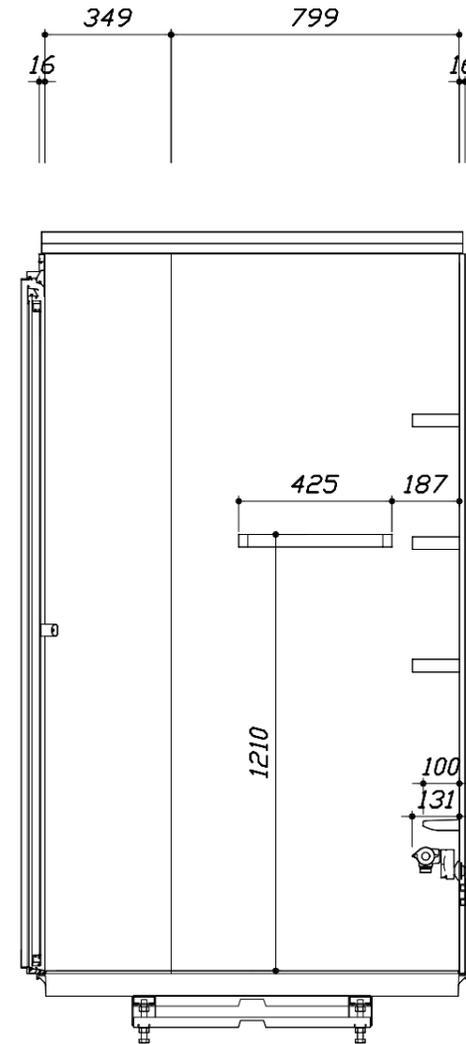

< 洗場側面図 >

本体仕様表

浴室サイズ	S1216サイズ(室内容量3.7立方メートル)
ドア勝手	AL勝手
架台	ボルト脚架台(低床タイプ)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	ガラス繊維強化樹脂 (FRP)
浴槽材質	ガラス繊維強化樹脂 (FRP) 裏面保温材 (発泡ウレタン)
浴槽形状	セミスクエア浴槽 (S12浴槽・250リットル) 追い焚き穴:あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂 (FRP)
浴槽エプロン	ABS樹脂
カウンター	コンパクトカウンター：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さFタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:あり
天井	化粧パネリッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリアドア:19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓1	—
窓2	—
窓枠1	—
窓枠2	—
排水トラップ	ASA樹脂・封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VP50
製品重量	215kg

アクセサリ仕様表


ミラー	ロングミラー
収納棚	スクエアタイプ：ABS樹脂製 (3段)
タオル掛け	スクエアタイプ(ホワイト)：ABS樹脂製
洗場側水栓	サーモスタット(KF3000TTKSCAB) (樹脂ホース:シルバー)
浴槽側水栓	—
兼用水栓	—
スライドバー	—
照明	天井付ミニ照明 (LED 6.9W電球色)
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V・最大消費電力1250W) (ダクト外径φ98) (常時換気対応品)
フロフタ	シャッター式フロフタ (PP)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	—
ハンドバー②	—
ハンドバー③	—
ハンドバー④	—
ハンドバー⑤	—
ハンドバー⑥	—
ハンドバー⑦	—

本体カラー

浴槽	D：ベージュ
カウンター	D：ベージュ
パネル(カウンター面)	GG：スケッチボーダー (アクセント)
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カウンター	—
浴槽エプロン	D：ベージュ
洗場	D：グレーベージュ
ドア	W：ホワイト
収納棚	スクエアタイプ(D：ベージュ)
タオル掛け	スクエアタイプ(ホワイト)
ランドリーセット	ホワイト

# 基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。  
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。  
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。  
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

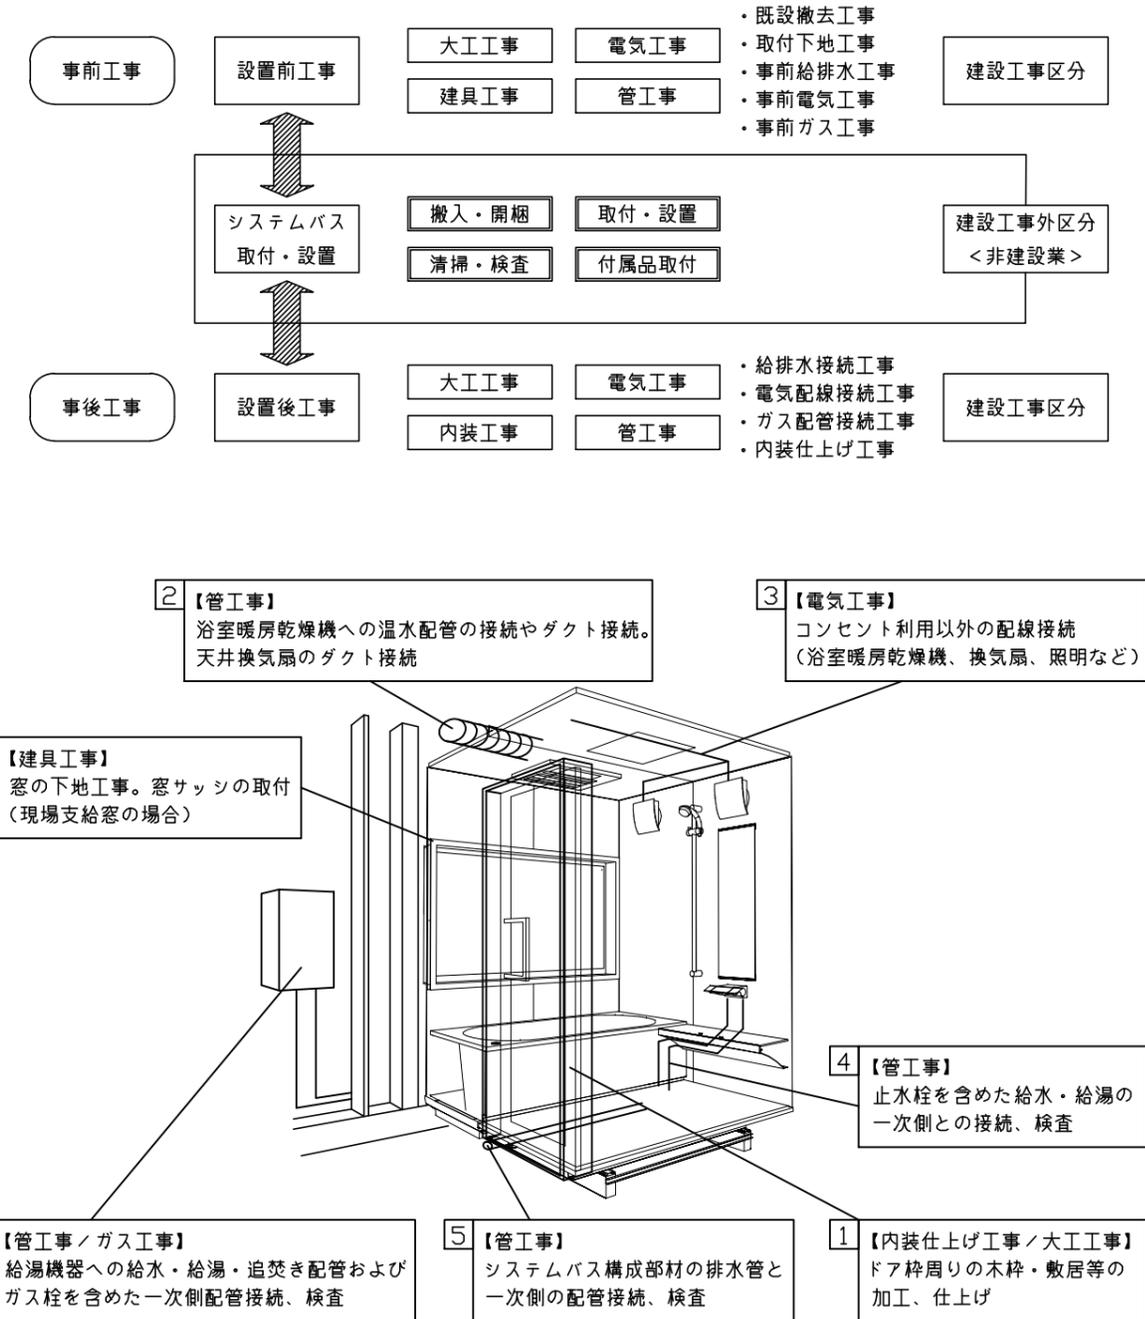

## ■システムバス 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事					建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置		
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
電気	給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事			
			浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事		
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置								□	洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置								□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置								□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置【注記 1】								□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付【注記 1】								□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付【注記 1】								□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付【注記 1】							□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付							□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付								□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付【注記 1】								□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付								□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付【注記 1】								□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付【注記 1】								□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填								□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
試運転・完成検査【注記 2】								□	完成後の試運転、性能確認検査			
設置後工事	1 2 3 4 5 6	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
		管	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付					○	○		建築の外装仕上げ工事	
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事					○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
電気 他	建築側排水配管との接続工事【注記 3】					○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査			
	給湯機器本体工事（試運転・確認）					○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）			
	内装仕上げ工事	○	○						床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事			
			浴室用電源配線、接続工事					○		浴室機器の事後電気工事		
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする  
 ※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する  
 ※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする



■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。






■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

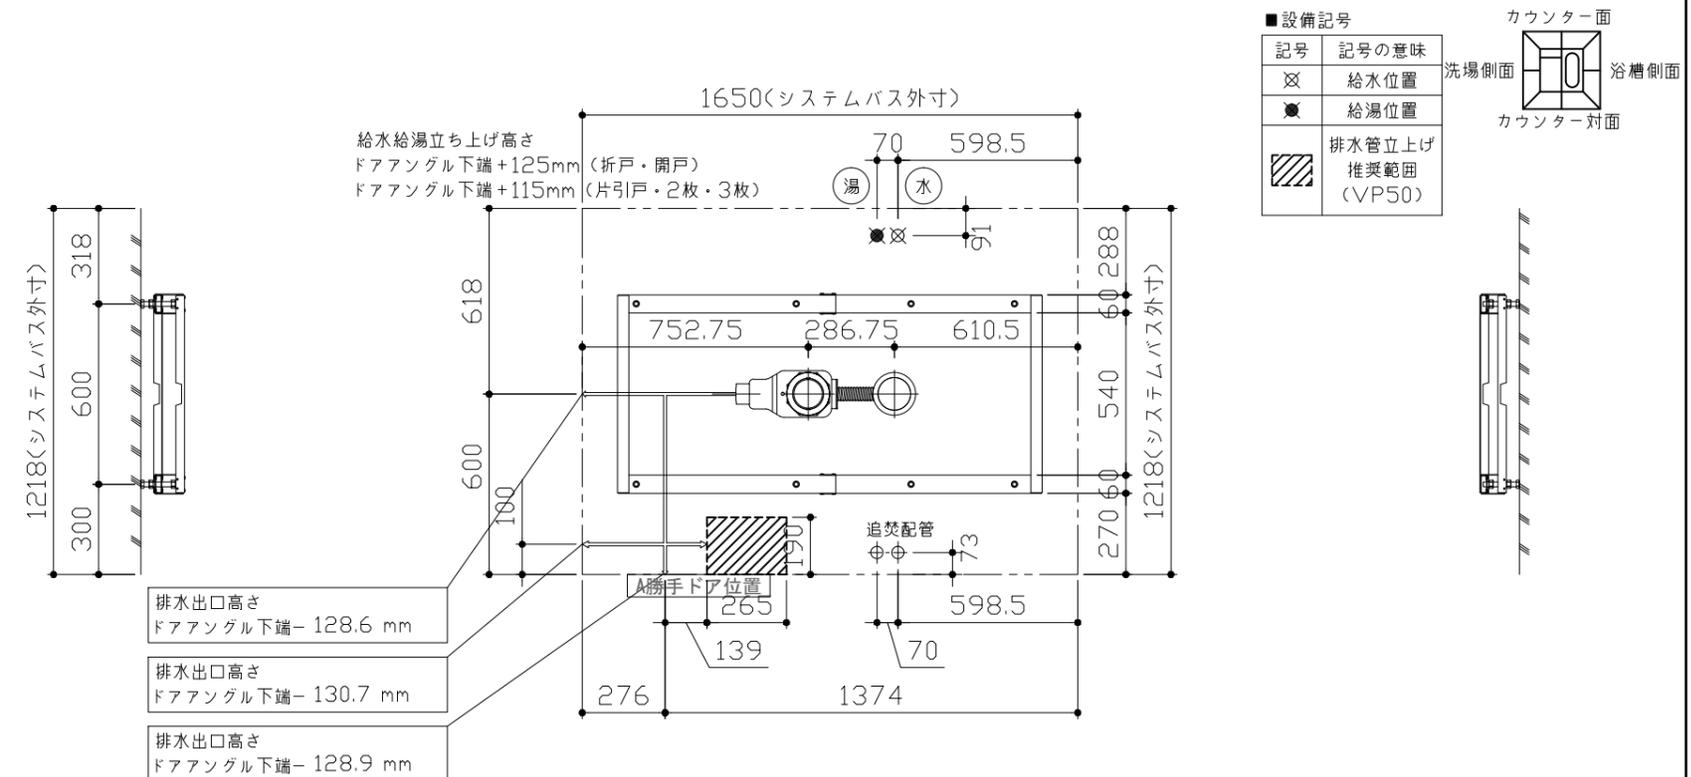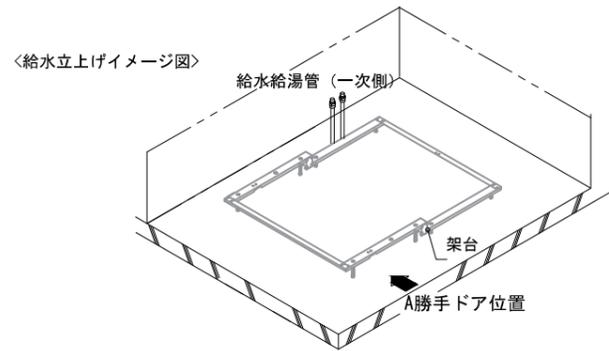

- 排水出口高さ  
ドアアングル下端- 128.6 mm
- 排水出口高さ  
ドアアングル下端- 130.7 mm
- 排水出口高さ  
ドアアングル下端- 128.9 mm

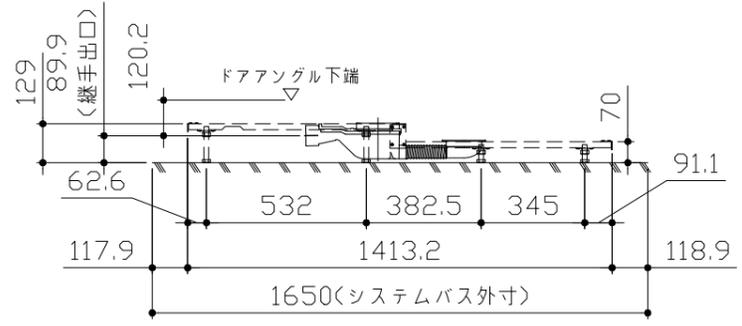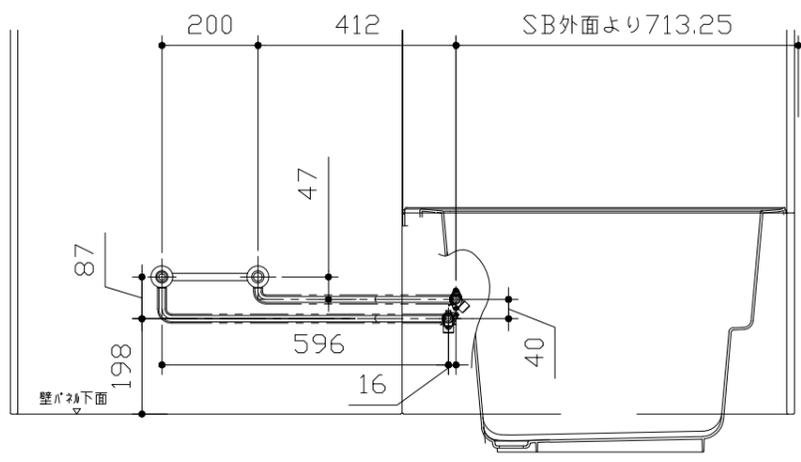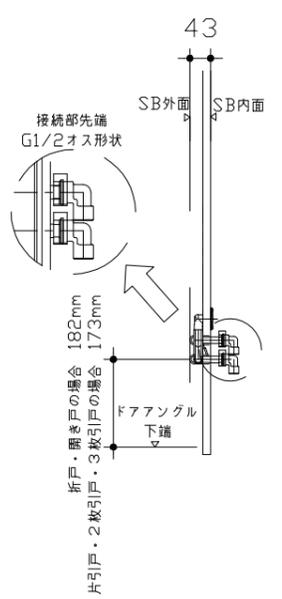

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・浴槽パンの配管導入口下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。  
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

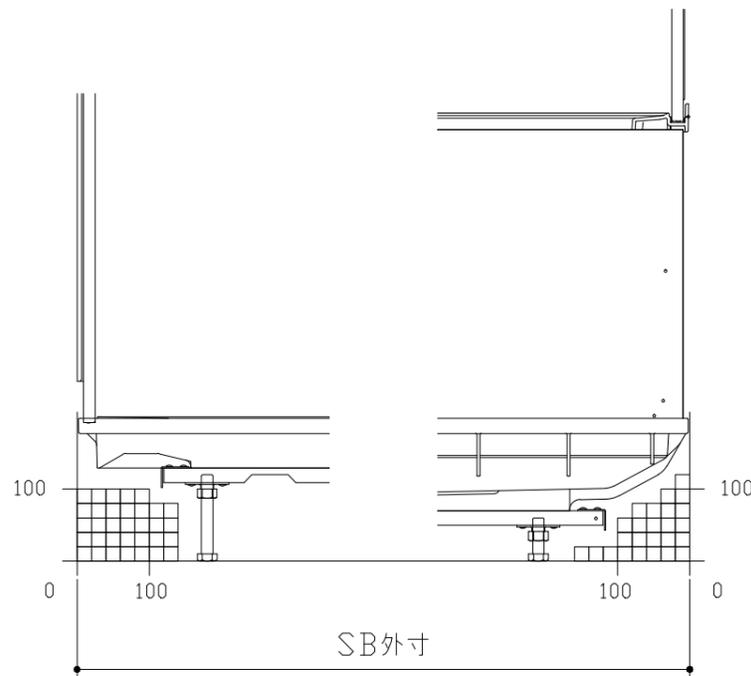


B矢視

A矢視

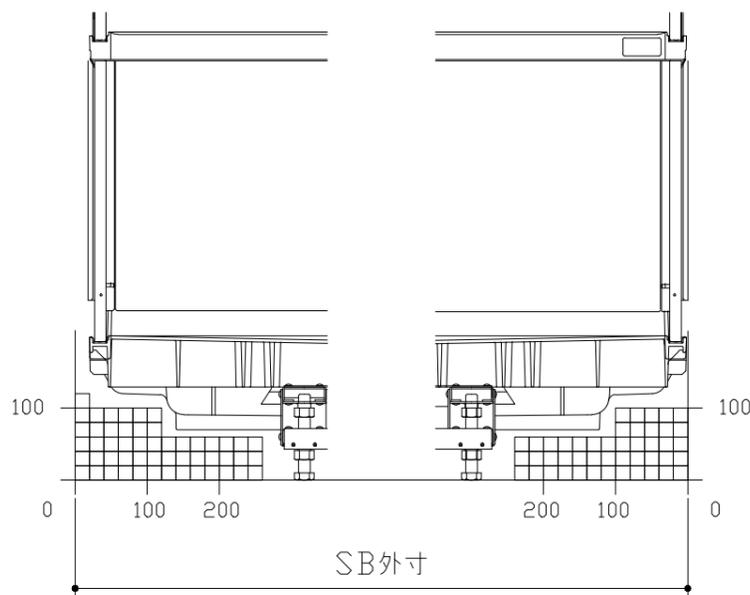

D矢視


C矢視

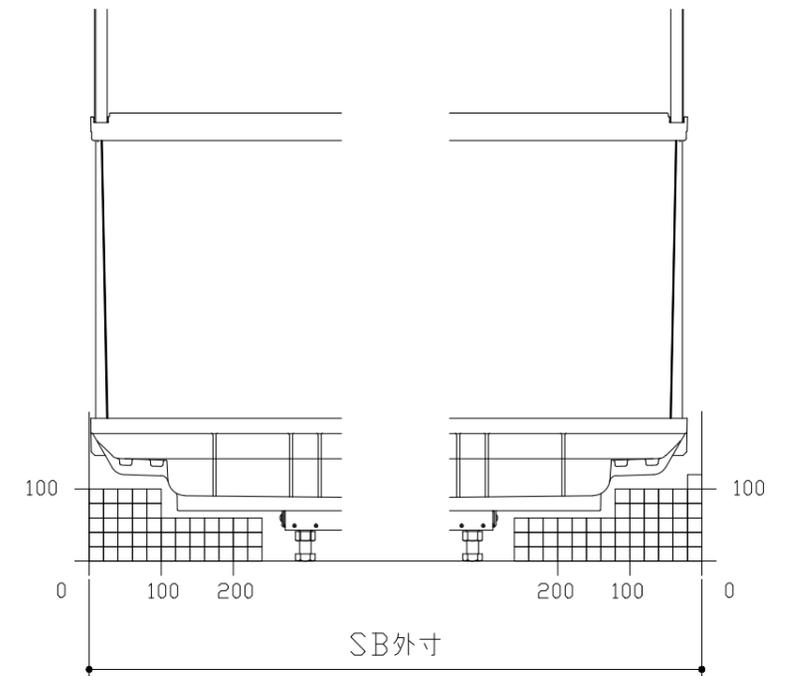

F矢視

E矢視



# キープクリンドア：折戸・上部換気口

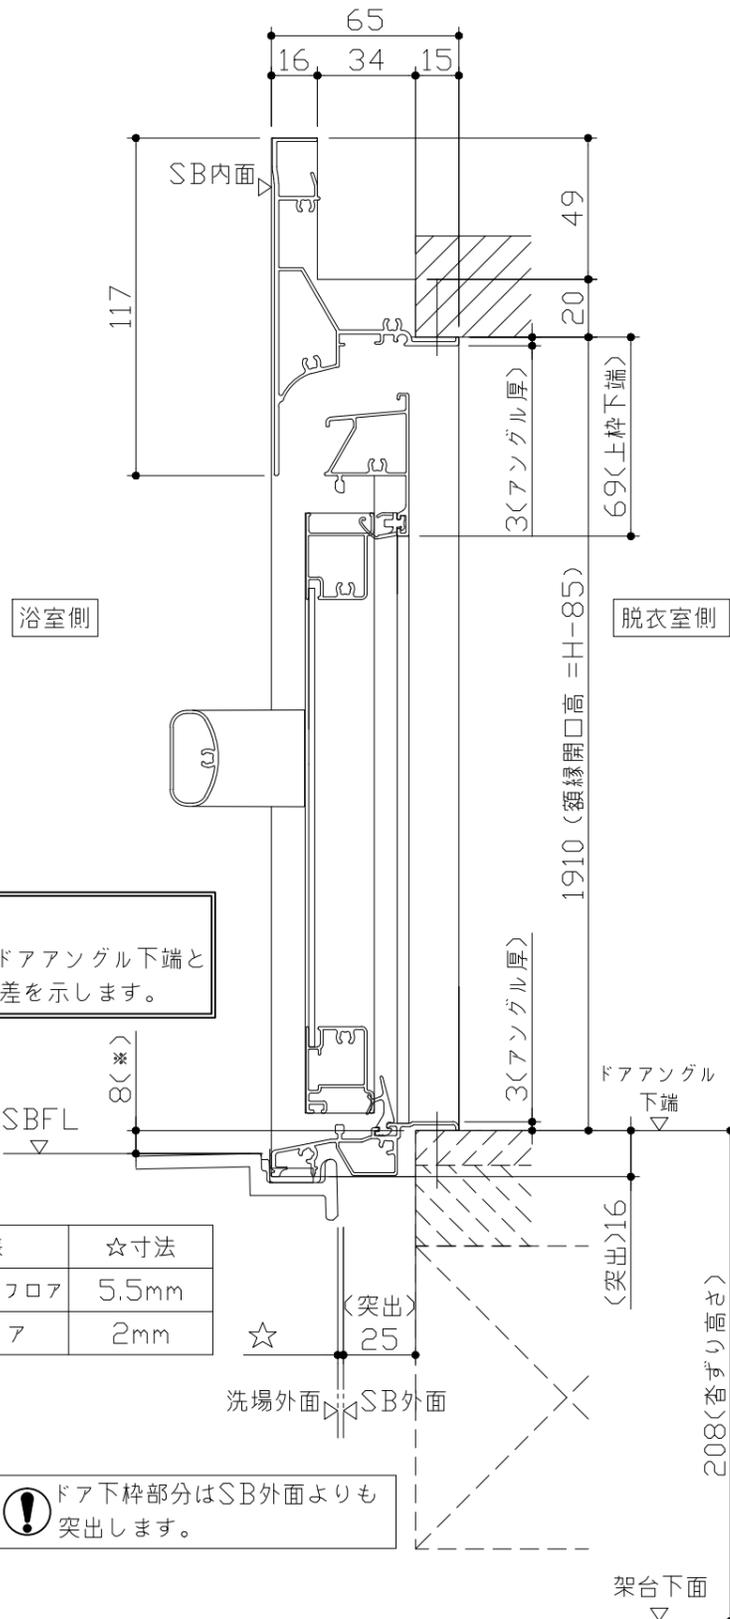

■ 留意事項  
 \* 印寸法はドアアンゲル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

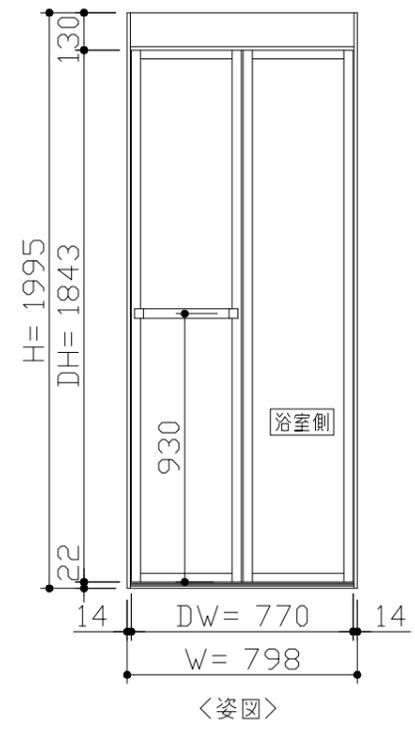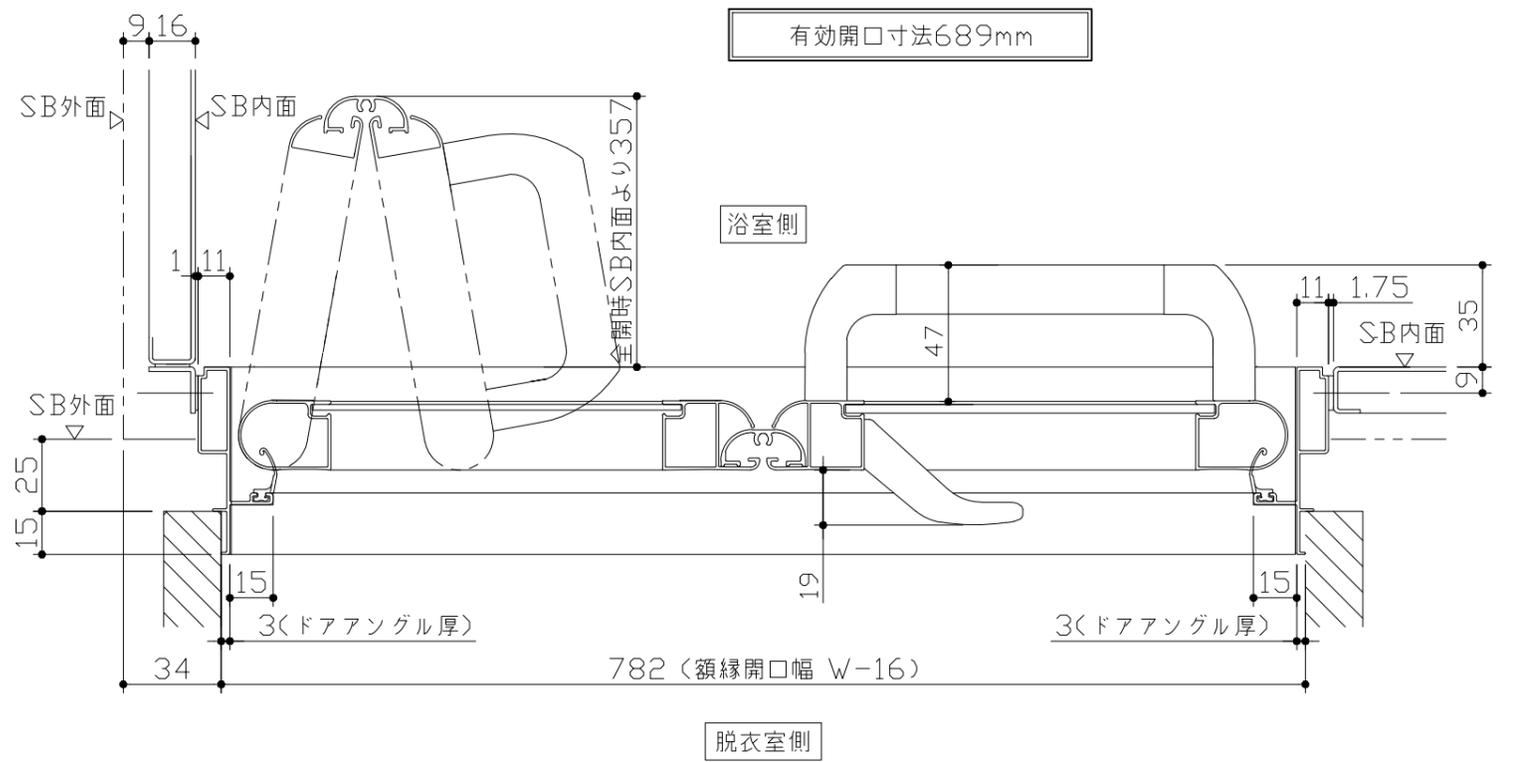

■ ドア横の管柱、間柱について

- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

<参考寸法図>

66.5


782 (額縁開口)

管柱、間柱


105 (柱厚)

848.5







(ドア額縁厚)

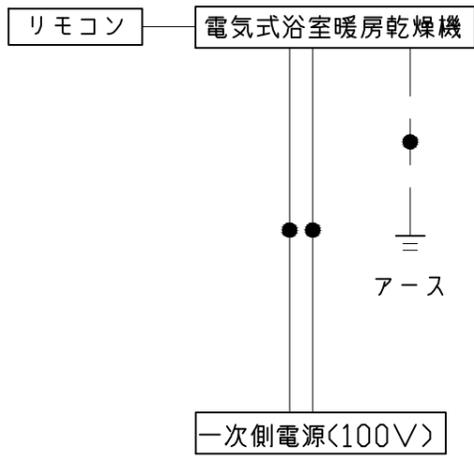

\*浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

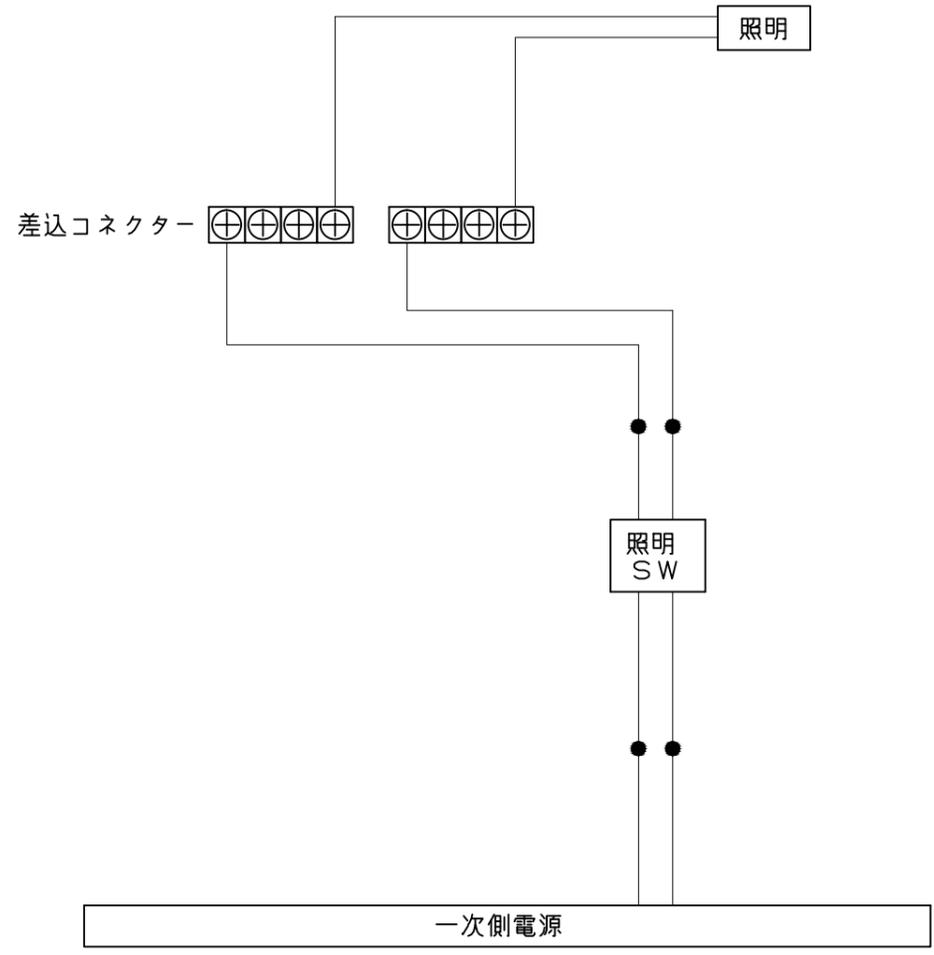


一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。

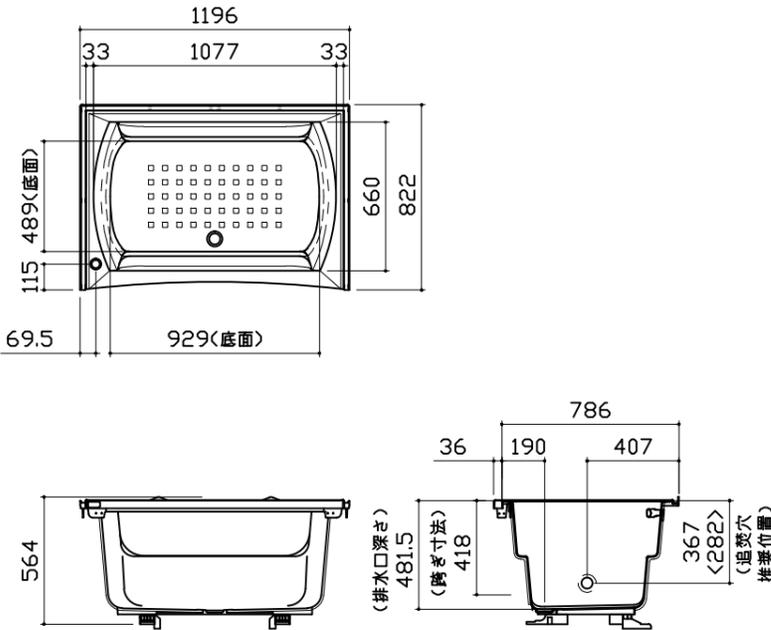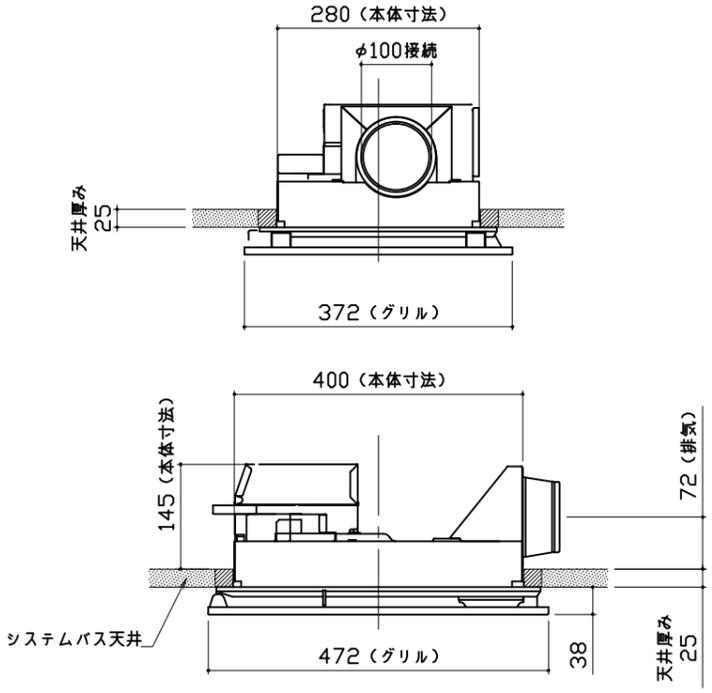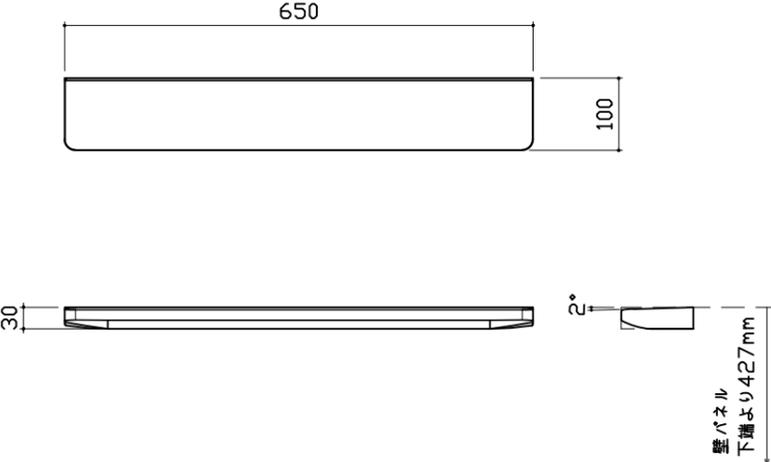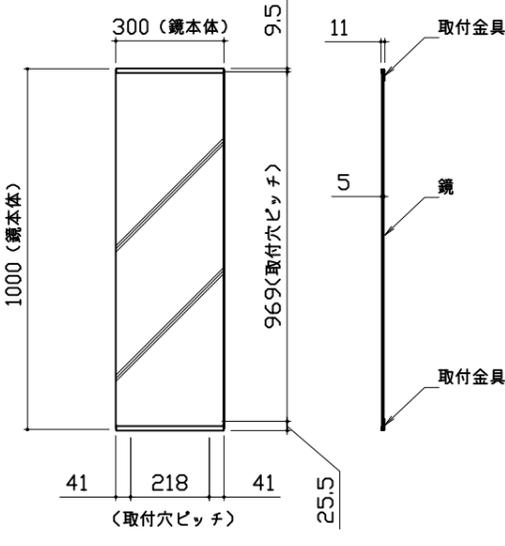浴槽	洗い場用水栓	照明
 <p>※漏水受け仕様の場合は&lt;&gt;内寸法参照のこと</p>		<p>天井付ミニ照明 LED 6.9W (1灯あたり)</p> 
換気機器	カウンター	ミラー
<p>リモコンコード長さ：5m 外形：縦120mm×横116mm</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">管工事</div> 	<p>本体：ABS</p> 	<p>枠：SUS304 t0.8 ミラー：表面防曇コートあり（ロングクリアミラー-A） 表面防曇コートなし（ロングミラー-A）</p> 


収納棚

本体：ABS

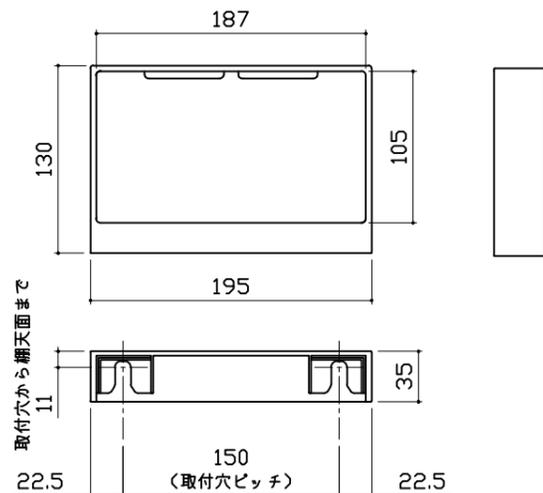


タオル掛け


本体：ABS  
キャップ：ABS

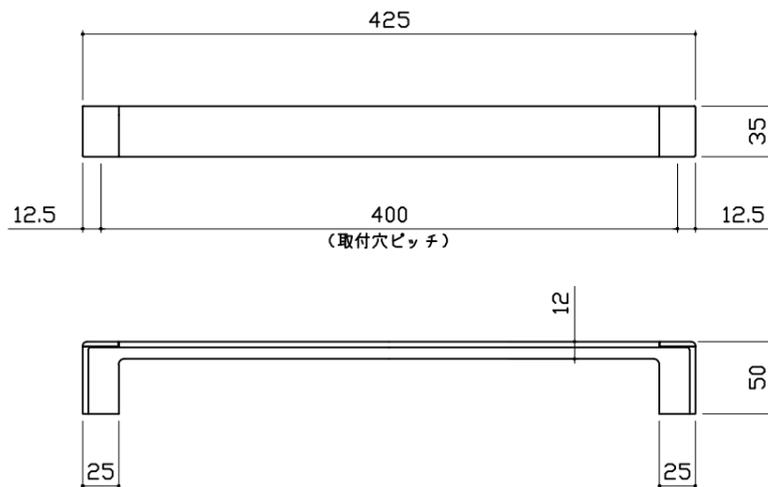


循環金具・フロアダプタ関連

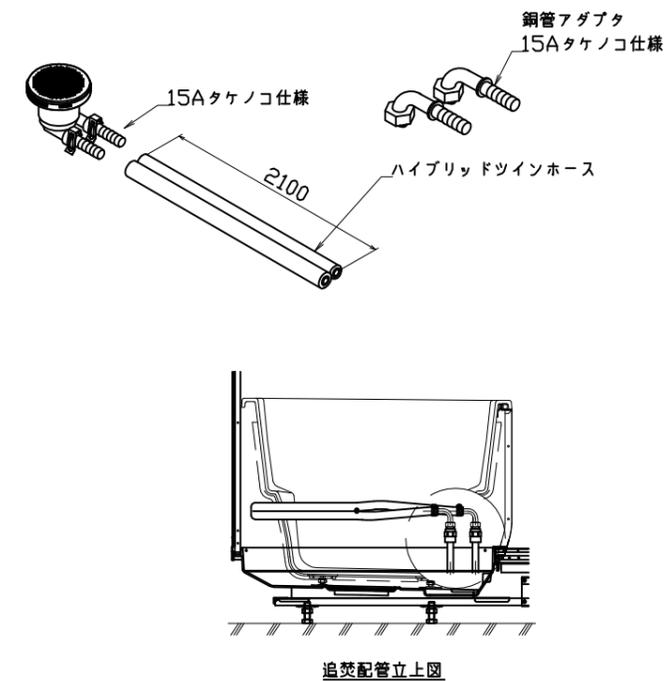


風呂蓋 707AZA-12

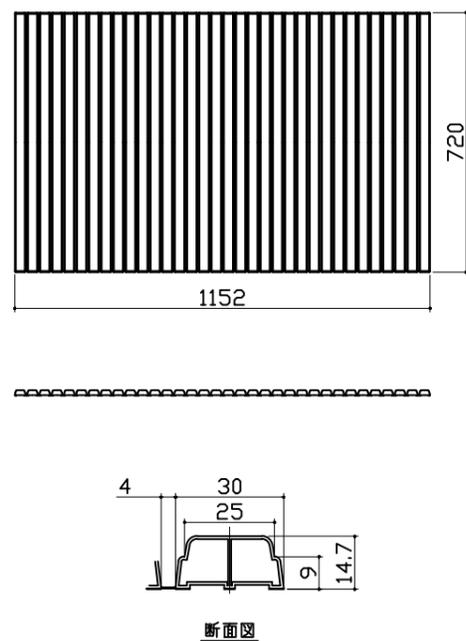

洗い場側排水トラップ

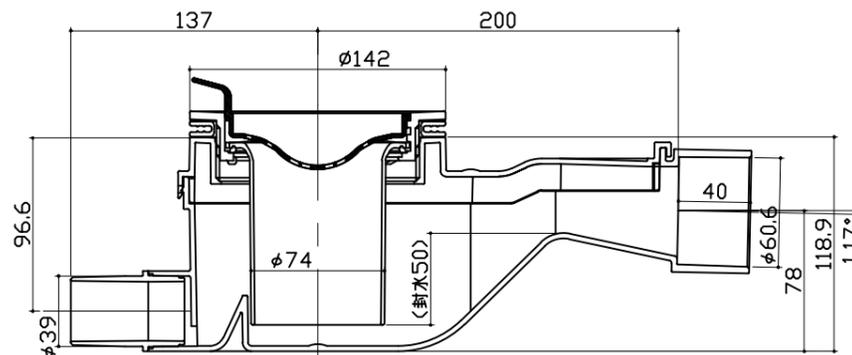

浴槽側排水トラップ



<p style="text-align: center;">パネル割図</p>	<p style="text-align: center;">ミラー</p> <p style="text-align: center;">ハF16C2C 0799 L&lt;GG</p>	<p style="text-align: center;">収納棚</p> <p style="text-align: center;">ハF16C2C 0799 L&lt;GG</p>
<p style="text-align: center;">シャワーフックスライドバー</p> <p style="text-align: center;">ハF16C2C 0799 L&lt;GG</p>	<p style="text-align: center;">ランドリーパイプ</p> <p style="text-align: center;">ハM16C1N 0799 &lt;W      ハM16C1N 0799 &lt;W</p>	
