

システムバス 御見積書

御名前 大阪-大阪SR SB-12 様

業者 様

商品名 伸びの美浴室

商品御見積金額 **¥687,700 (税込 ¥756,470)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 ¥117,000 (税込 ¥128,700)

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

御見積仕様

(システムバス)

ユニットサイズ 1317 (AR勝手)

洗い場仕様 キープクリーンフロア:プレミアムクラス

洗い場カラー グランベージュ

浴槽材質 アクリル人造大理石

浴槽カラー シュガーホワイト

浴槽形状 セミスクエア浴槽

カウンター材質 アクリル人造大理石

カウンターカラー シュガーホワイト

エプロン材質/カラー ステンレス / ホワイト

浴室パネル材質 高品位ホーロー

パネルカラー(正面) アジロホワイト

パネルカラー(周辺) アジロホワイト

ガス種 / 周波数 未定 / 60Hz

御確認事項

組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

現場の状況により商品取付費(搬入費)、御見積の内容(品番・数量・金額)が変わる場合がございます。

作成日 2021年11月6日
プラン番号 1801A-2111-0134T
現場番号 C2916550

タカスタンダード株式会社
大阪支社 販売課
大阪府東大阪市長田東2丁目4番33号
TEL 06-6746-6815 / FAX 06-6746-6805

大阪ショールーム
TEL 06-6746-2311 / FAX 06-6746-1246

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
1317	SB12	片岡

備考

No.*

御名前 大阪-大阪SR SB-12

様

現場番号	C2916550	プラン番号	1801A-2111-0134T	作成日	2021/11/6
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	伸びの美浴室ベーシックJタイプ 1317サイズ		1	544,000	544,000
2	架台	低床タイプ ボルト脚架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)/樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・全面デザインハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キーブクリーンフロア(プレミアムクラス・グランページュ)	1	+20,000	+20,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	キーブクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(シュガーホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ホワイト)	1		
11	浴槽形状	セミスクエア浴槽	1		
12	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
13	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB181-5UTH	1		
14	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:SB181-5UTHB1N	1		
15	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
16	カウンター	人大スクエアカウンター	1	+30,000	+30,000
17	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックなし	1	-700	-700
18	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	1	+14,000	+14,000
19	浴室パネル	ハイクラス(全面デザインハイクラス)(Fパネル)	1	+40,000	+40,000
20	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
21	天井	高光沢フラット天井	1		
22	換気機器	天井換気扇	1		
23	換気機器開口	工場開口	1		
24	照明	ダウンライト照明(3灯)(電球色)	1	-8,000	-8,000
25	天井照明開口	工場開口	1		
26	ミラー	ロングクリアミラー	1	+16,000	+16,000
27	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
28	タオル掛け	タオル掛けなし	1		
29	ハンドバー	ステン I型600タイプ	1	+8,000	+8,000
30	収納棚	クリアタイプB(3段)	1	+5,000	+5,000
31	どこでもラック	小物置きM(ホワイト)	1	+1,900	+1,900

御名前 大阪-大阪SR SB-12

様

現場番号	C2916550	プラン番号	1801A-2111-0134T	作成日	2021/11/6
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500
33	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
34	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			34		¥687,700
商品総合計			34		¥687,700

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥117,000 (税込 ¥128,700)


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。

パース

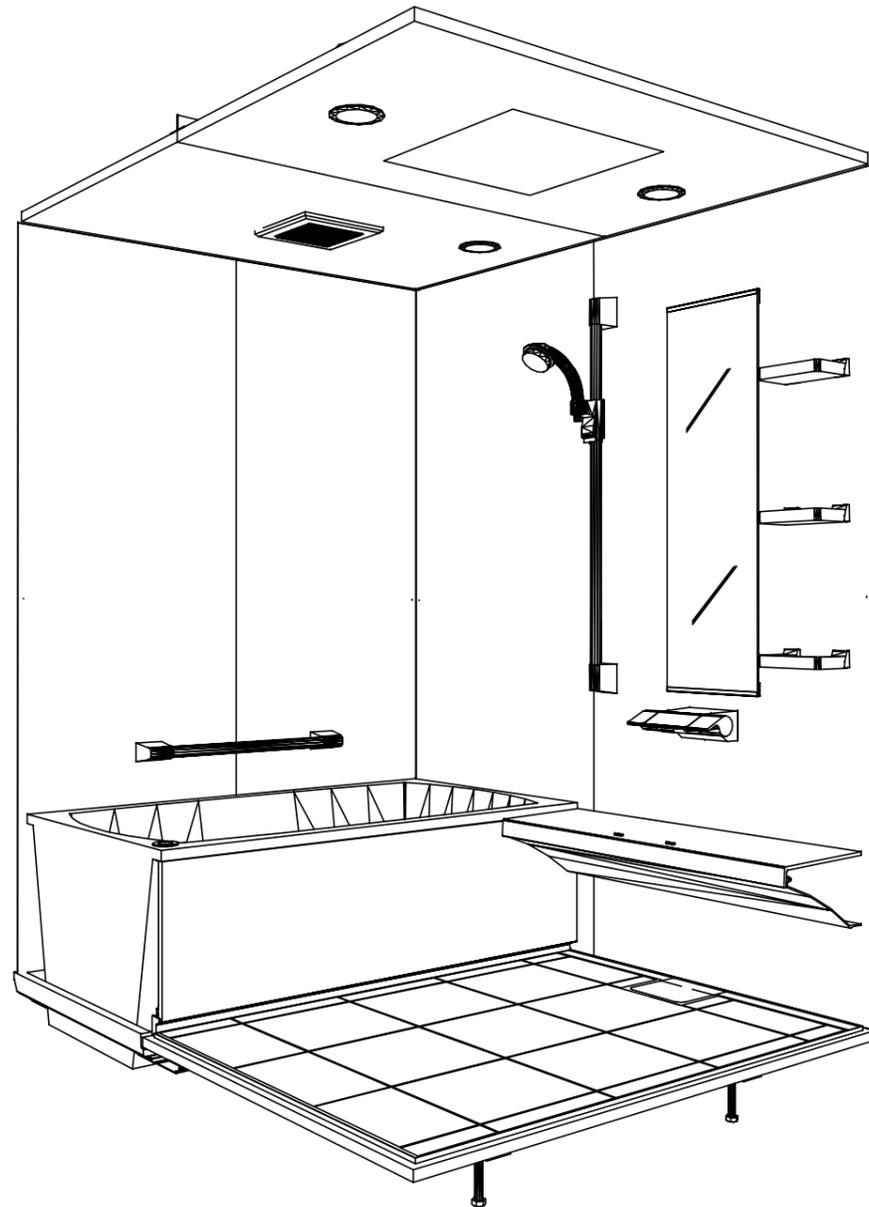

鳥瞰図

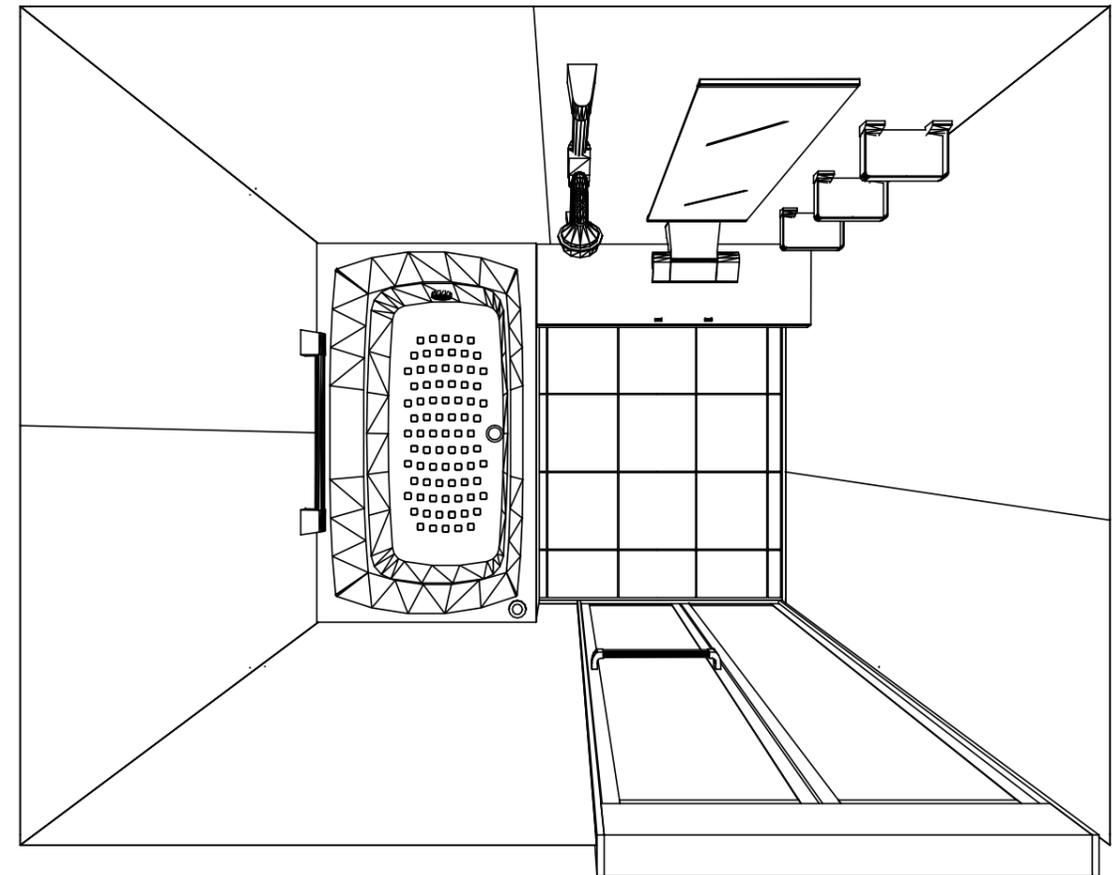

1317

キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>
高光沢フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。


Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 大阪-大阪SR SB-12様邸
現場番号： C2916550
大阪支社 販売課


伸びの美浴室
プラン番号： 1801A-2111-0134T
担当営業： 1317

姿図
作成日： 2021年11月6日
担当アドバイザー： SB12


縮尺：A3サイズ等倍





■留意事項
 ※印寸法は給水給湯管の
 突出寸法18mmを含みます。

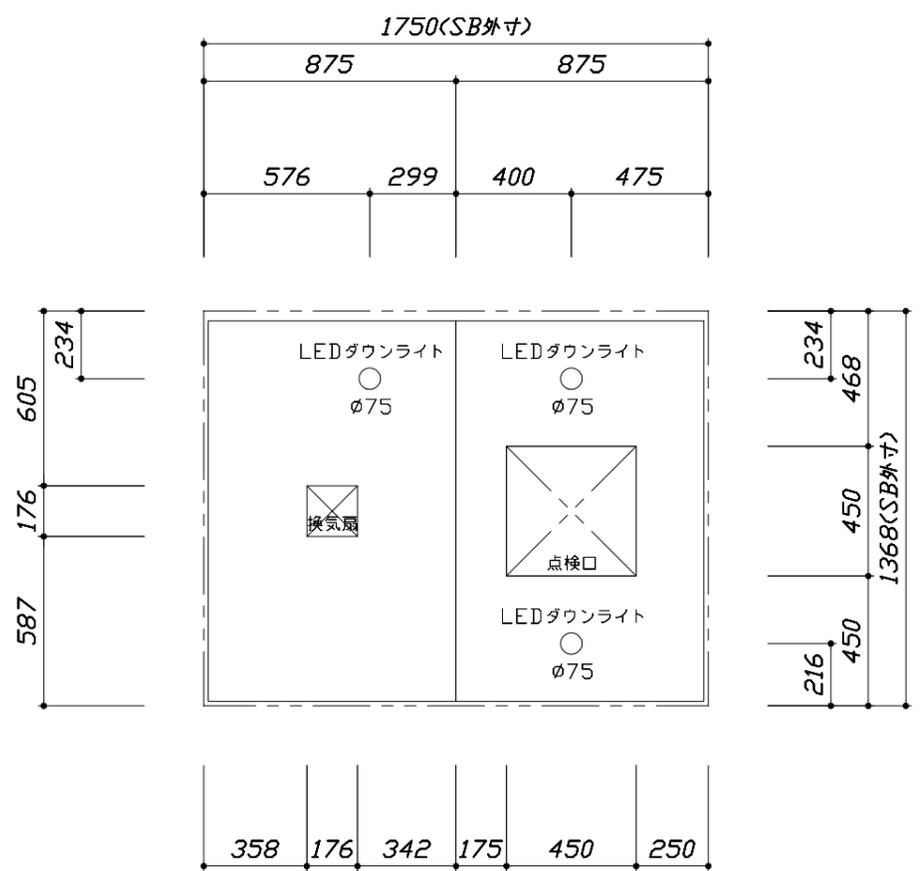

<天井伏図>

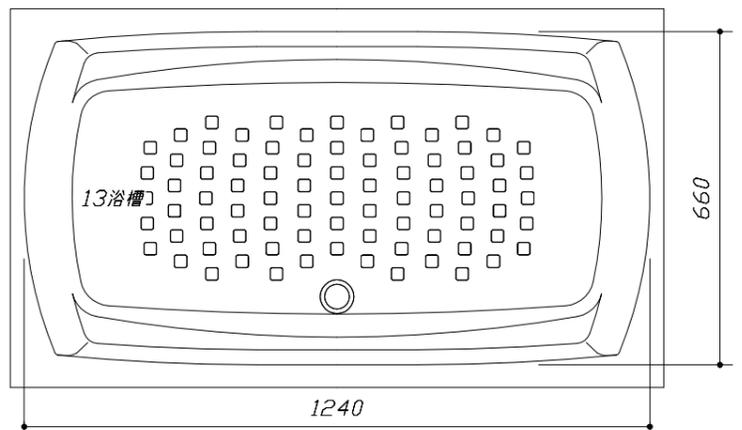

<浴槽詳細図>

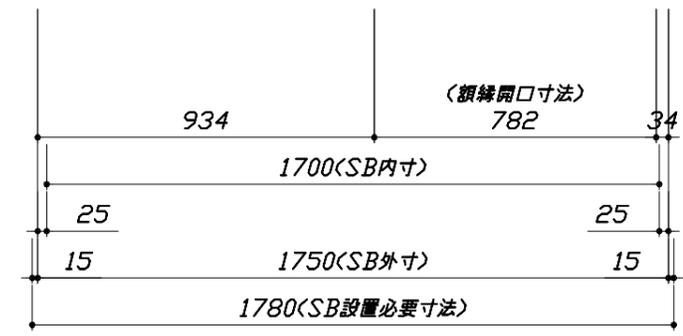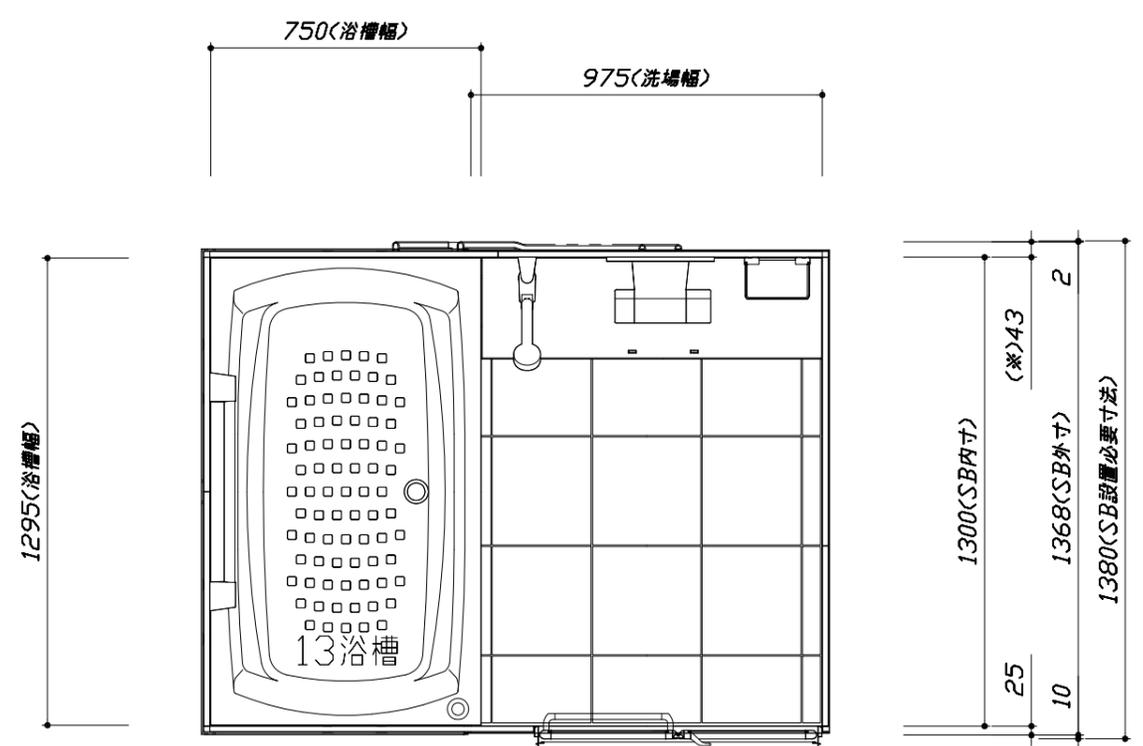

<平面図>

Takara standard
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 大阪-大阪SR SB-12様邸
 現場番号： C2916550
 大阪支社 販売課



伸びの美浴室
 プラン番号： 1801A-2111-0134T
 担当営業： 1317

施工図1
 縮尺： 1:25,20
 作成日： 2021年11月6日
 担当アドバイザー： SB12


縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

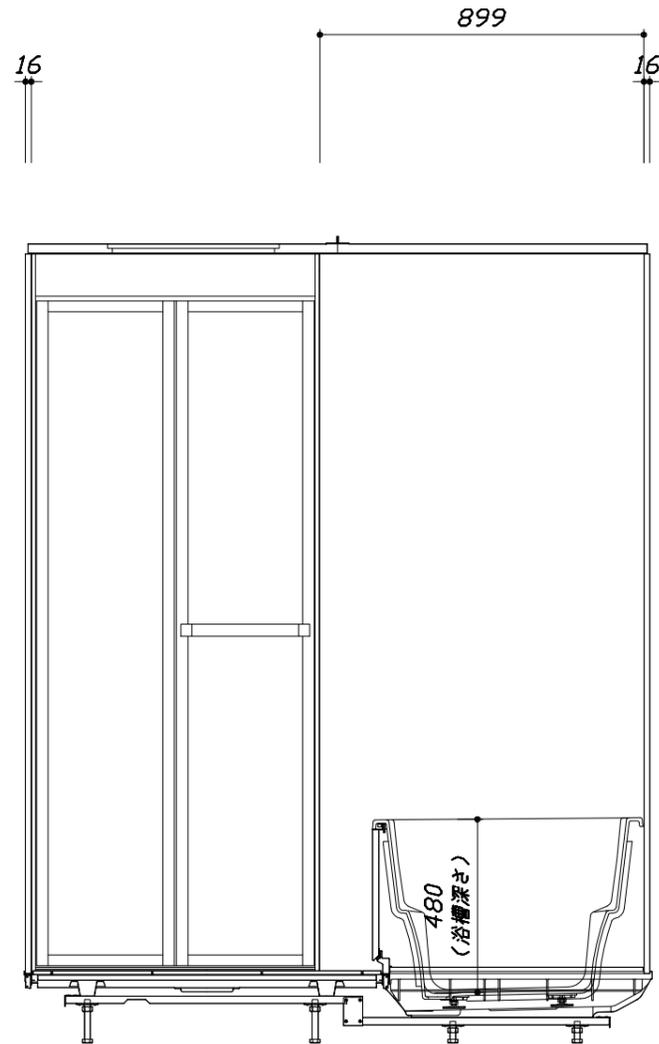

<カウンター対面図>

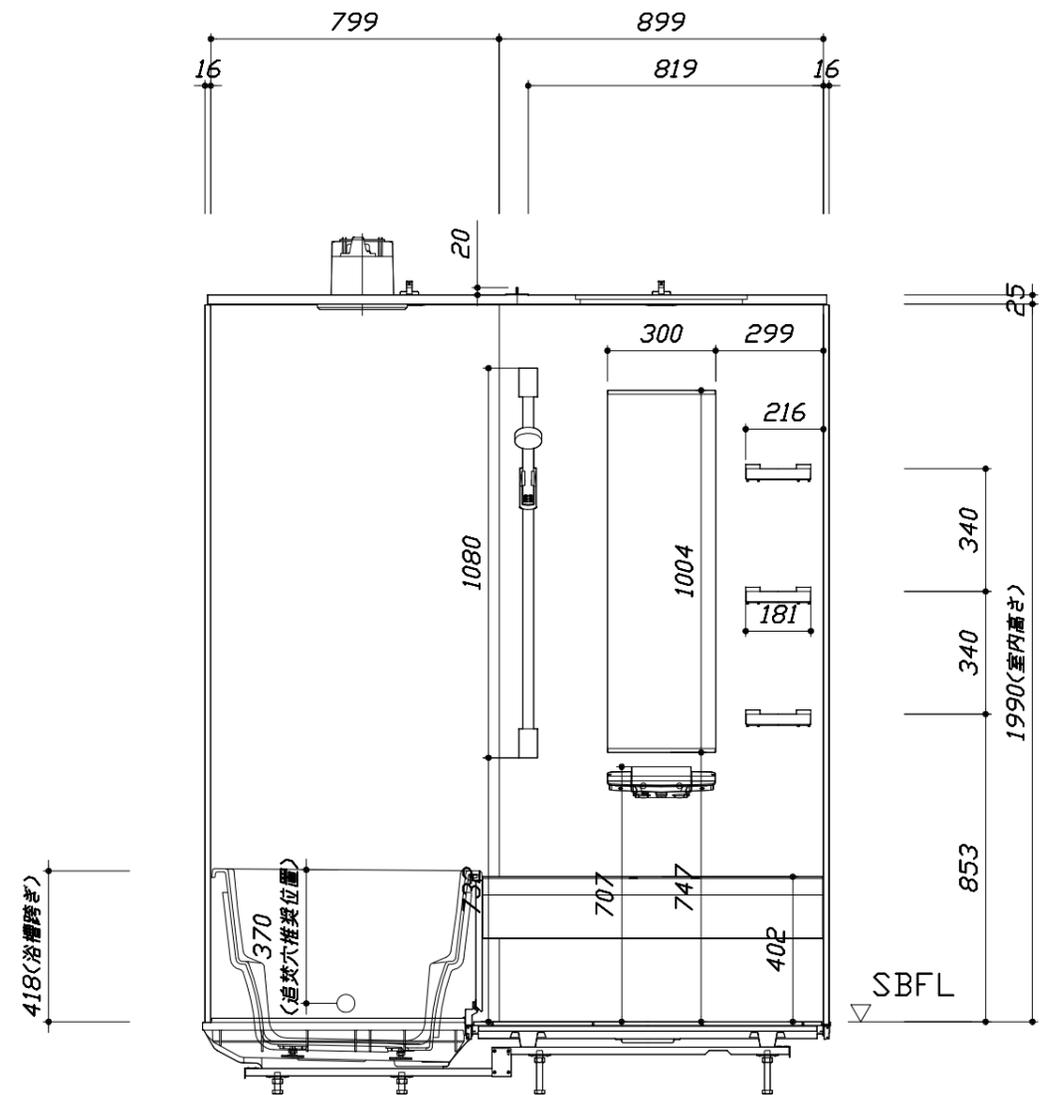

<カウンター面図>

■ボルト脚架台高さ寸法
 各ずり高さに対して
 -9~+11mm調整可能

Takara standard
 タカラストANDARD株式会社

現場名称： 大阪-大阪SR SB-12様邸
 現場番号： C2916550
 大阪支社 販売課


伸びの美浴室
 プラン番号： 1801A-2111-0134T
 担当営業： 1317

施工図2
 縮尺： 1:20
 作成日： 2021年11月6日
 担当アドバイザー： SB12


縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

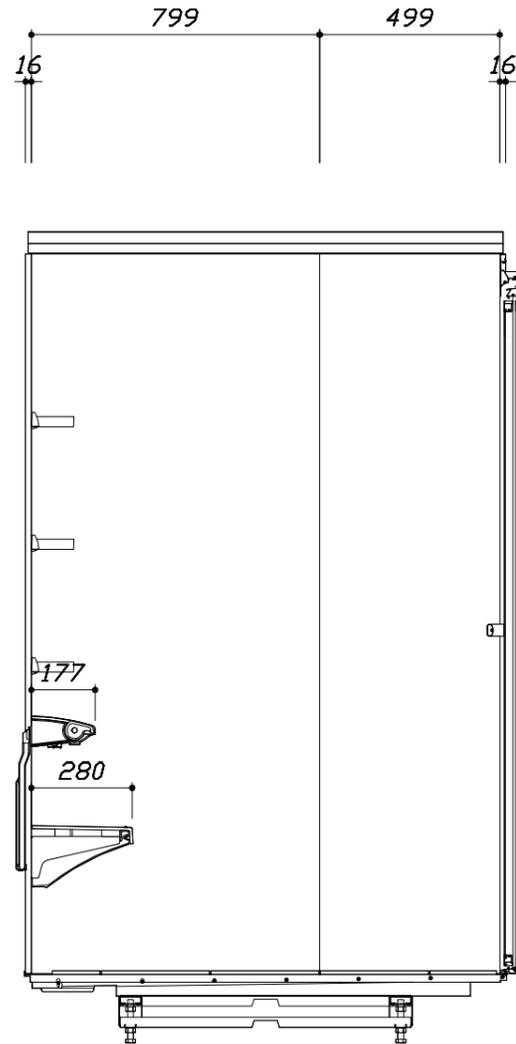

< 洗場側面図 >

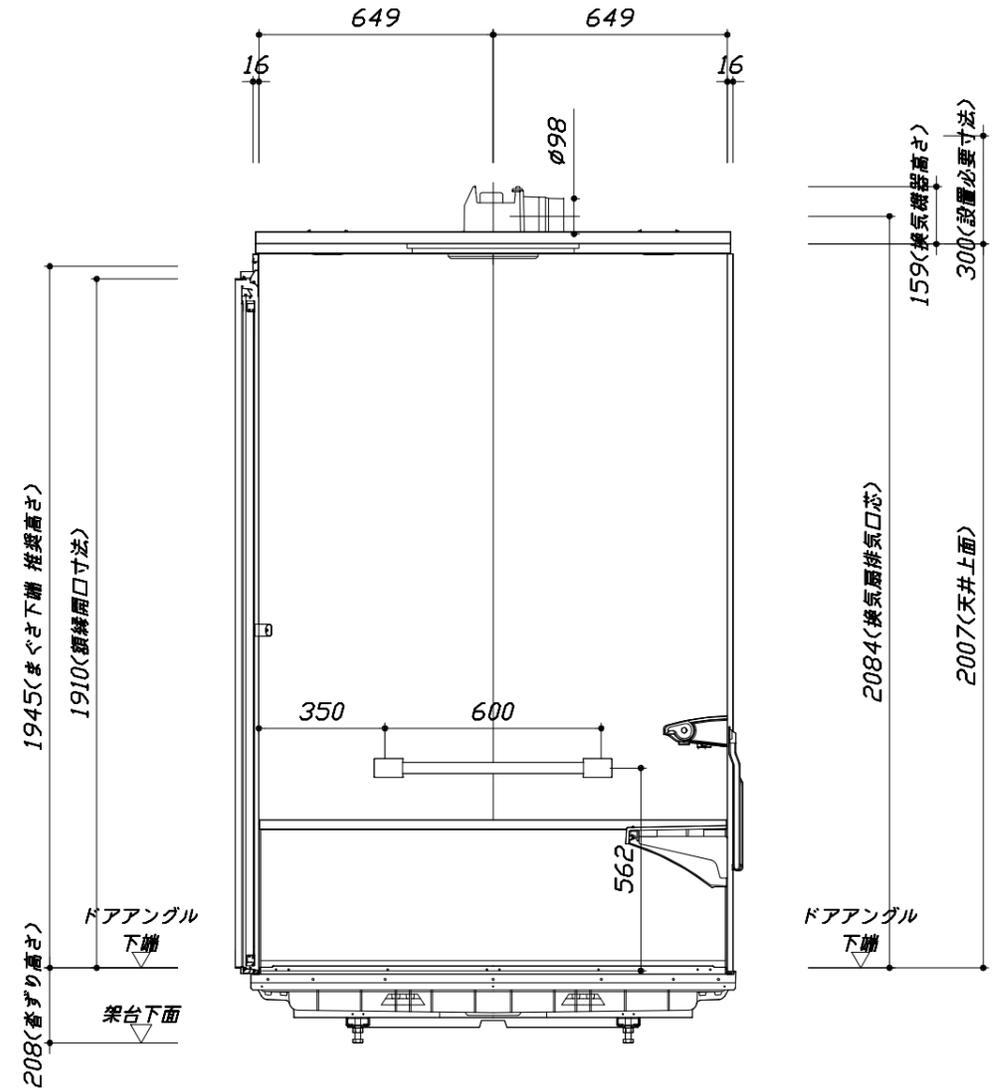

< 浴槽側面図 >

■ボルト脚架台高さ寸法
 沓ずり高さに対して
 -9~+11mm調整可能

本体仕様表

浴室サイズ	1317サイズ(室内容量4.4立方メートル)
ドア勝手	AR勝手
架台	ボルト脚架台(低床タイプ)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>裏面保温材・高断熱仕様(発泡ウレタン)
浴槽形状	セミスクエア浴槽(13浴槽・280リットル)追い焚き穴：あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂(FRP)
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング)裏面保温材(発泡ポリエチレン)
カウンター	スクエアカウンター：アクリル人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さFタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	高光沢パッドイッチャル(内部発泡樹脂)換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓1	—
窓2	—
窓枠1	—
窓枠2	—
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂、浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VP50
製品重量	245kg

アクセサリ仕様表


ミラー	ロングクリアミラー くもり止め加工
収納棚	クリアタイプB：AS樹脂製(3段)
タオル掛け	—
洗場側水栓	サーモスタット(SB181-5UTHB1N)(樹脂ホース：メタル調)
浴槽側水栓	—
兼用水栓	—
スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ) (スライドバー-T1020S MH)
照明	LEDダウンライト(LED 12.3W電球色)(3灯)
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W)(ダクト径φ98)
フロタ	組合せ式(アルミ複合板：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	—
ハンドバー②	—
ハンドバー③	—
ハンドバー④	ステンレスタイプ I型600タイプ
ハンドバー⑤	—
ハンドバー⑥	—
ハンドバー⑦	—

本体カラー

浴槽	W：シュガーホワイト
カウンター	W：シュガーホワイト
パネル(カウンター面)	JAW：アジロホワイト
パネル(周辺・3面)	JAW：アジロホワイト
水栓上部カウンター	—
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	PD：グランベージュ
ドア	W：ホワイト
収納棚	クリアタイプB
タオル掛け	—
ランドリーセット	—

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

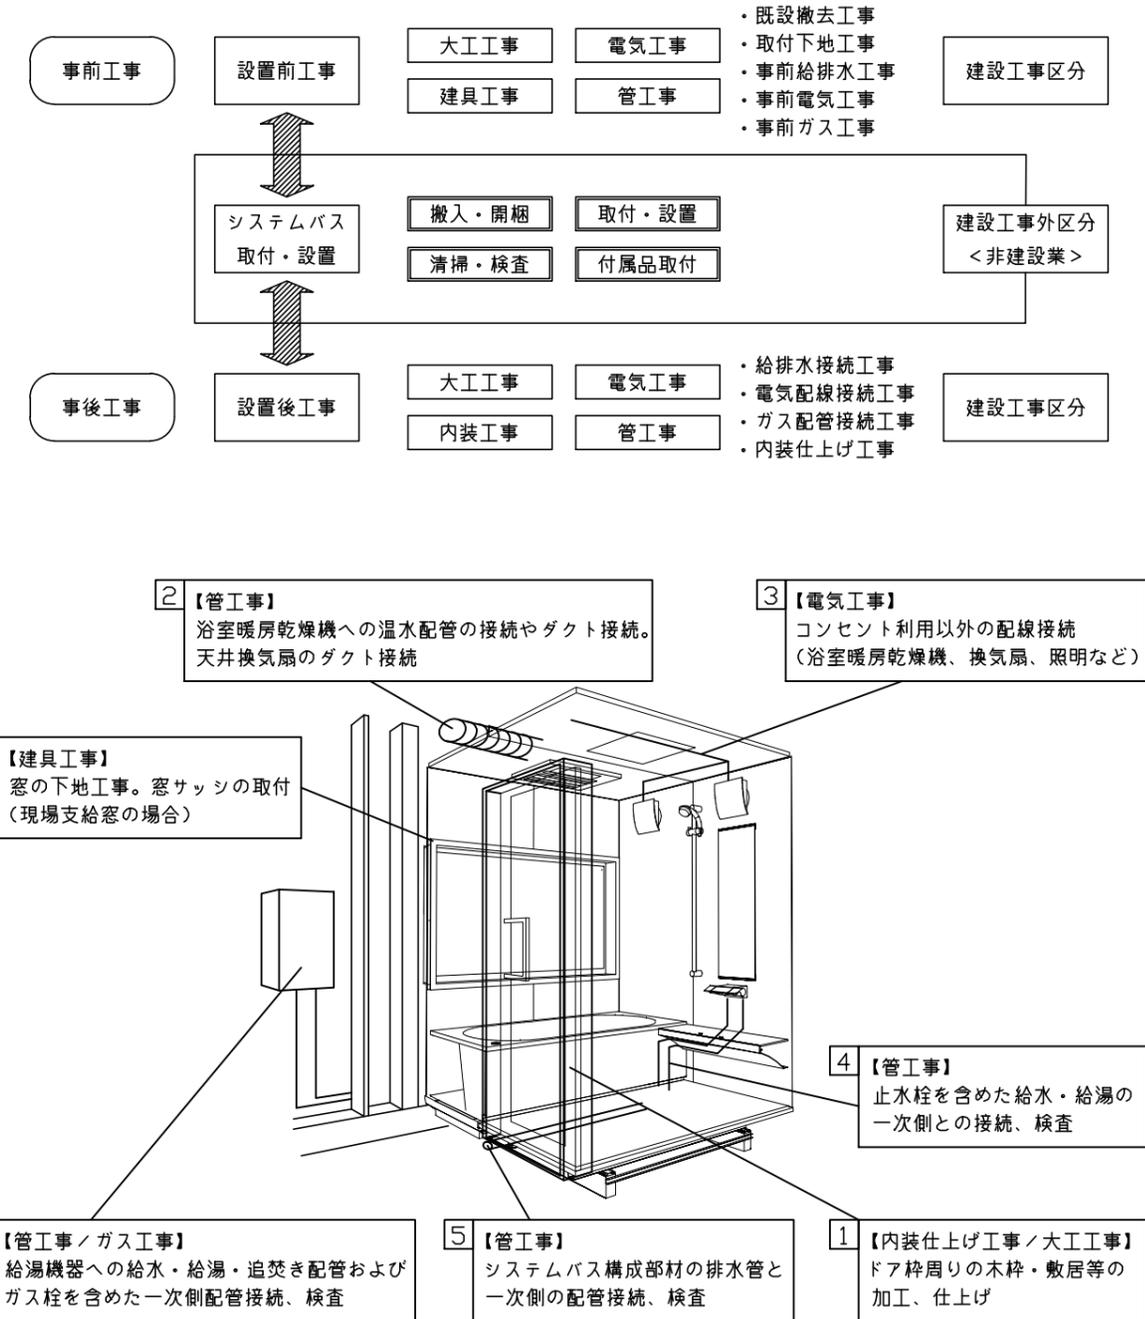

■システムバス 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置	
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
電気	給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事		
			浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□		浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置						□		洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置						□		浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置						□		天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置【注記 1】						□		カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付【注記 1】						□		水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付【注記 1】						□		浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
試運転・完成検査【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査			
設置後工事	1 2 3 4 5 6	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
		管	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付					○	○	建築の外装仕上げ工事	
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事					○		給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
電気 他	建築側排水配管との接続工事【注記 3】					○		浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査			
	給湯機器本体工事（試運転・確認）					○	□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）			
	内装仕上げ工事	○	○					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事			
			浴室用電源配線、接続工事				○		浴室機器の事後電気工事		
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事				○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
 ※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
 ※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。








■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

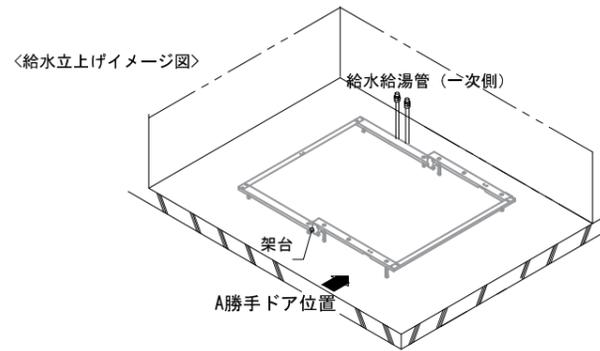

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置
■	排水管立上げ推奨範囲（VP50）

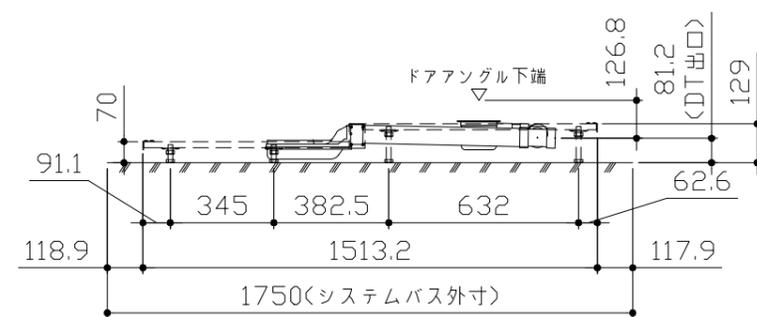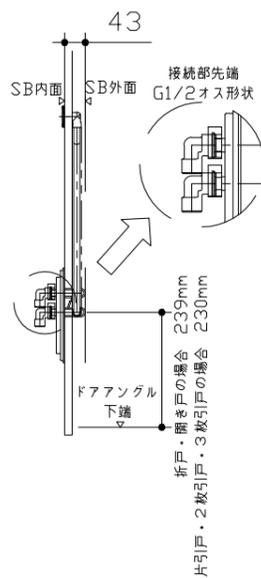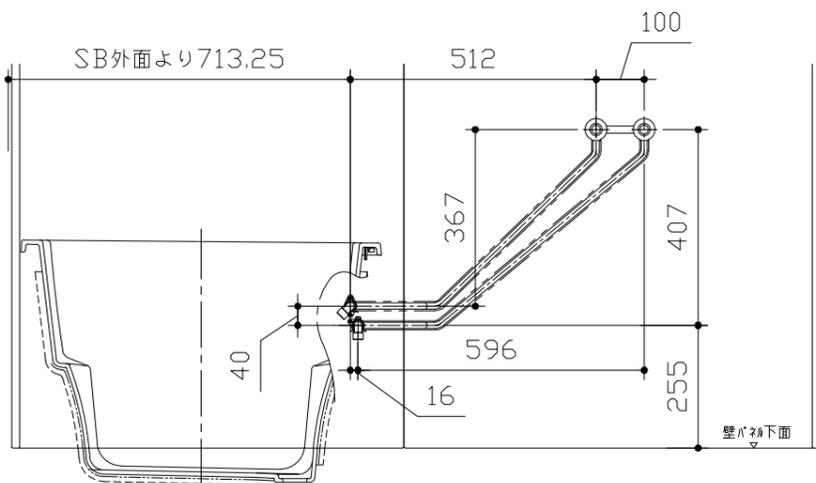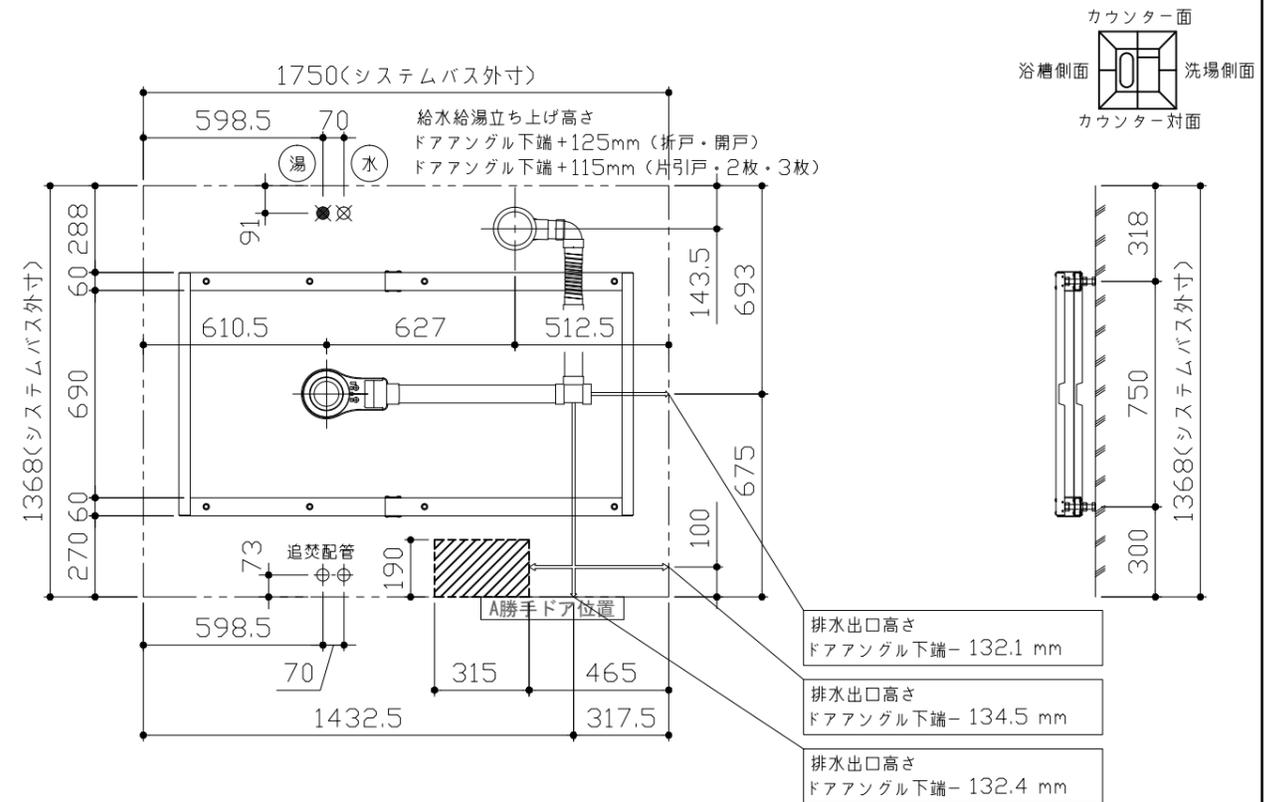

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

＜給水給湯管取合詳細図＞





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・浴槽パンの配管導入口下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

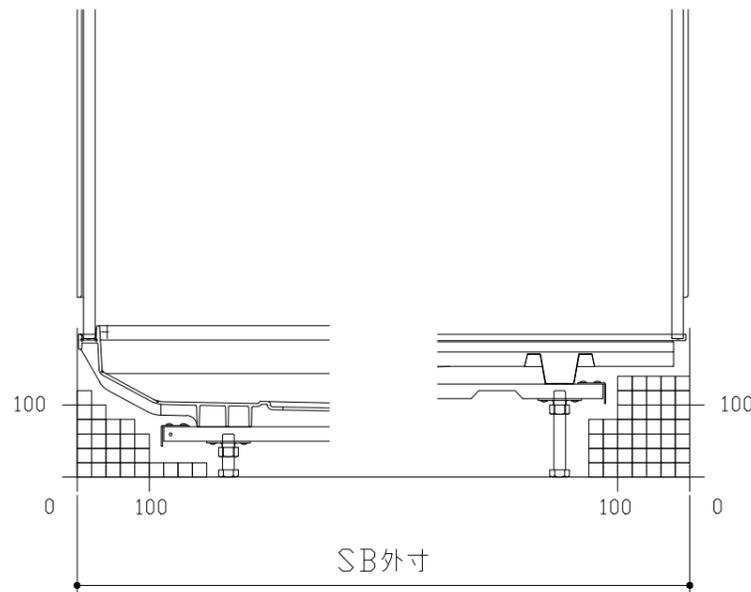


A矢視

B矢視

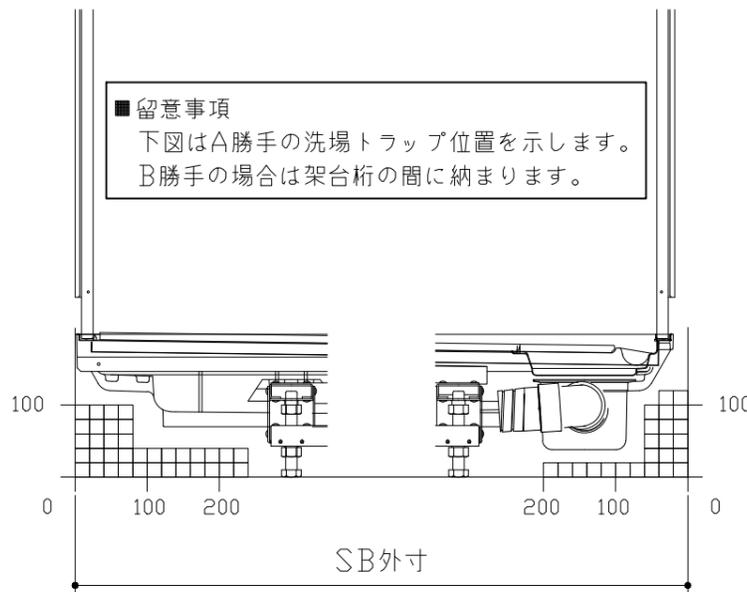


C矢視

D矢視

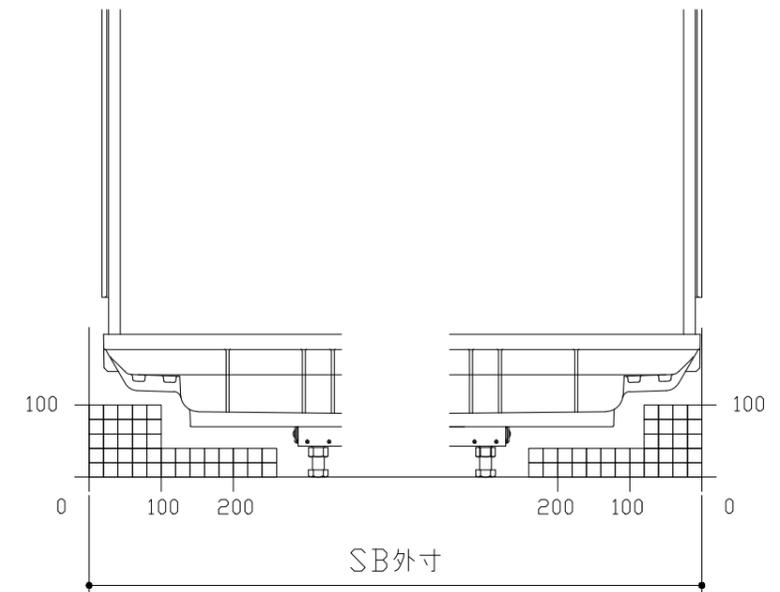


E矢視

F矢視

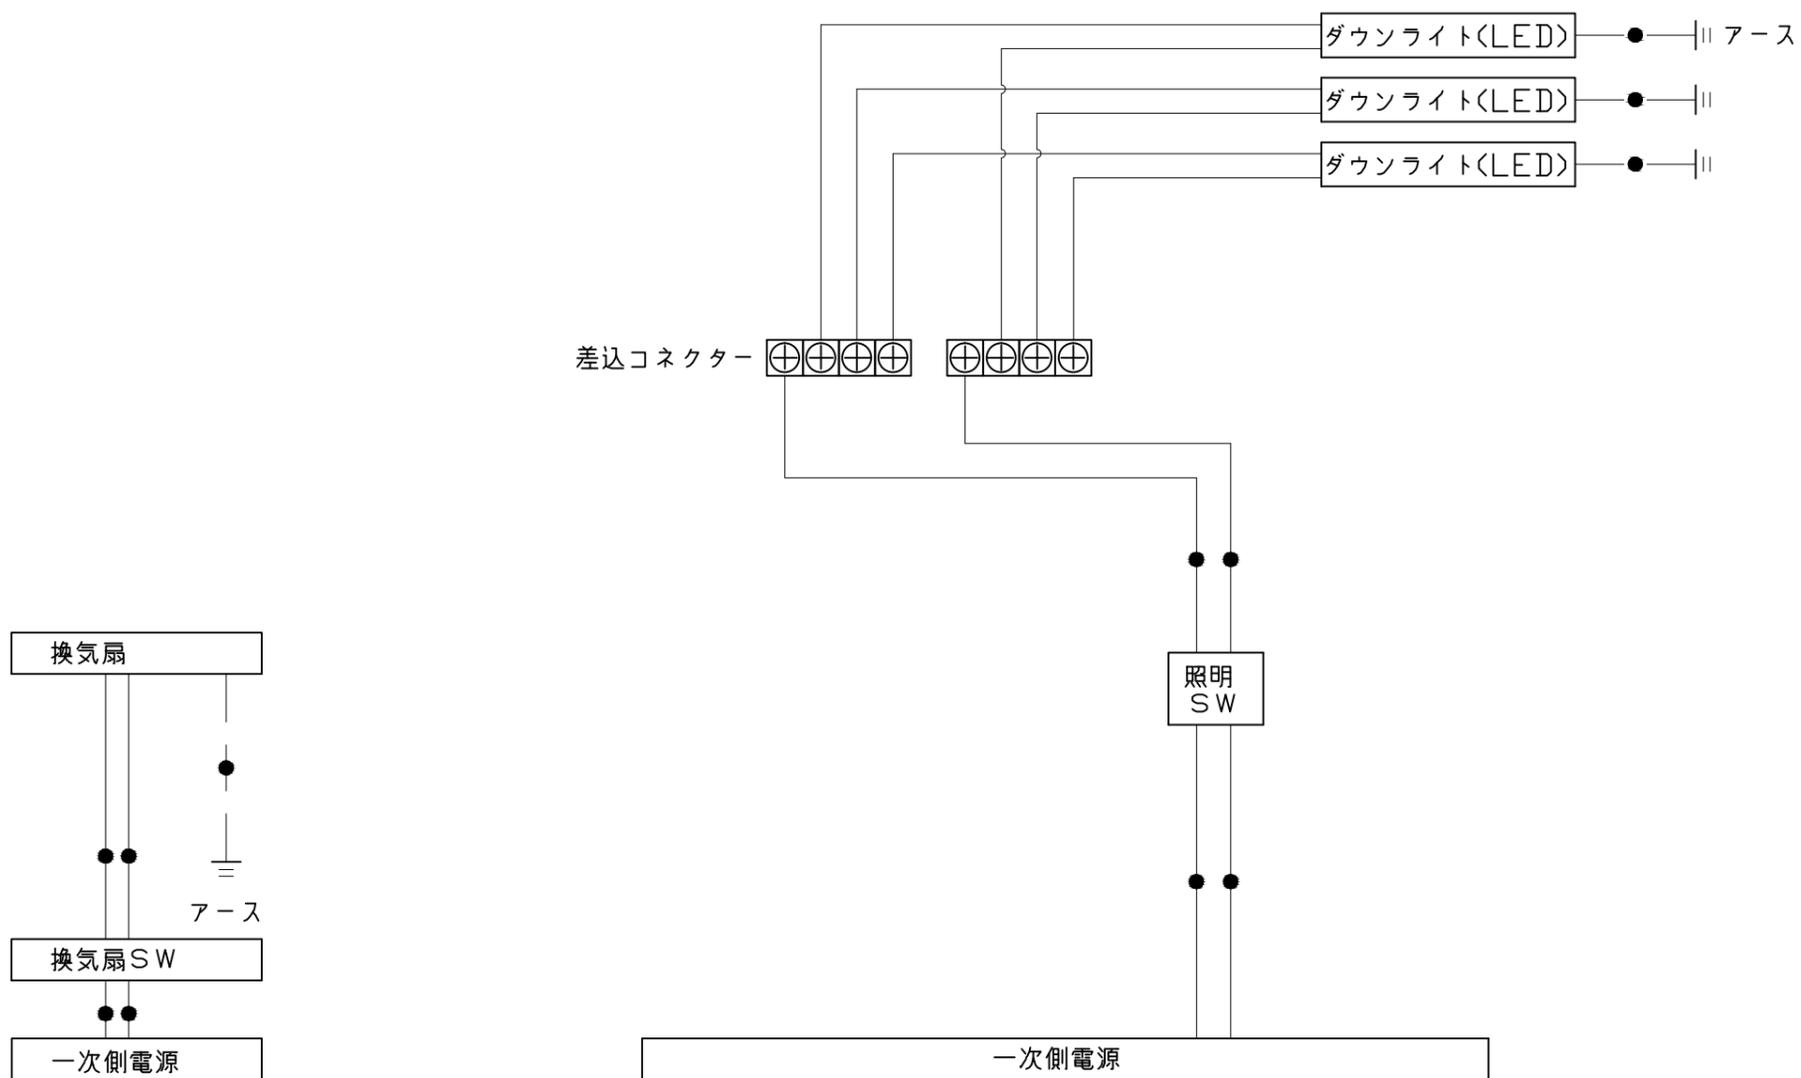

一次側電源から差し込みコネクタ及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。


浴槽

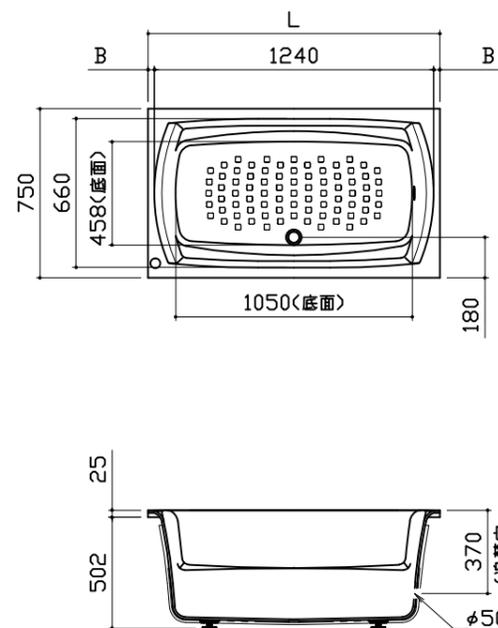

規格	浴槽奥行寸法	
	L	B
SB 1368	1295	27.5
1393	1320	40
1418	1345	52.5
1443	1370	65




洗い場用水栓

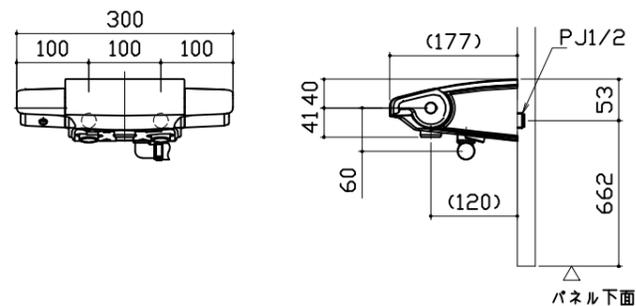


照明

ダウンライト
LED 4.1W (1灯あたり)

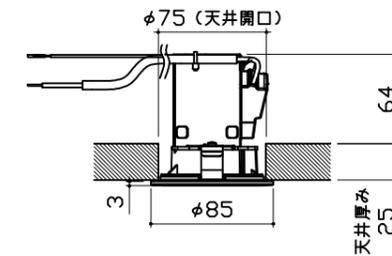


換気機器

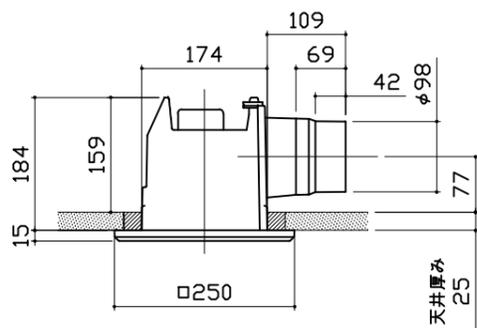


管工事

シャワーフックスライドバー

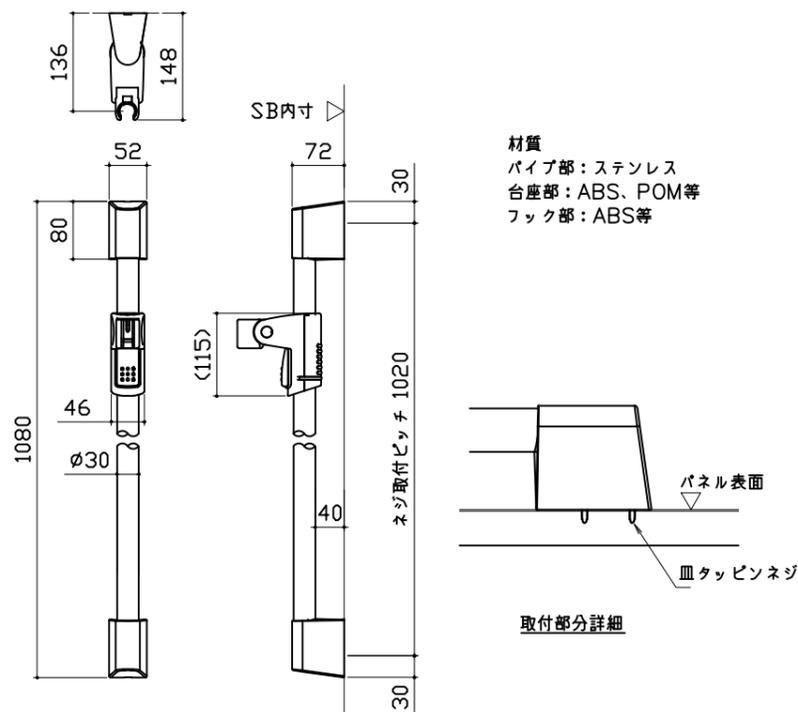


ミラー

枠: SUS304 t0.8
ミラー: 表面防曇コートあり (ロングクリアミラー-A)
表面防曇コートなし (ロングミラー-A)

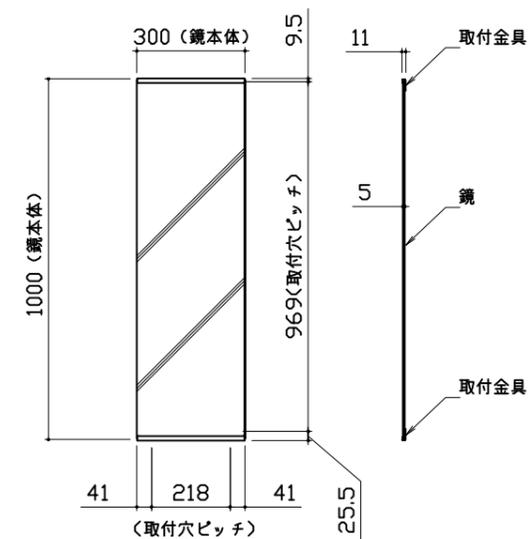


収納棚


本体：AS

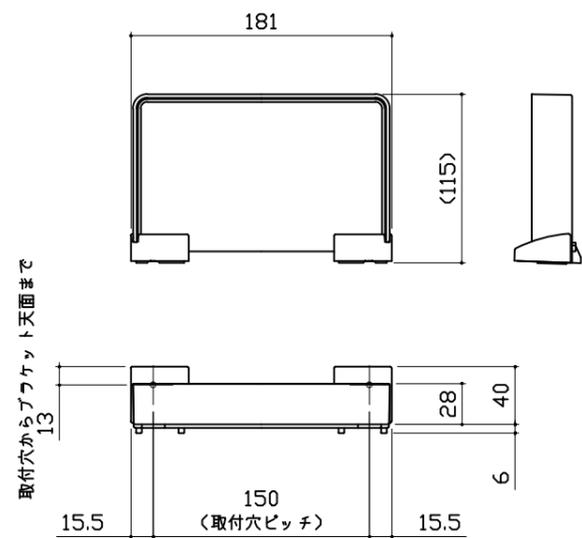



ハンドバー支持部取合詳細図

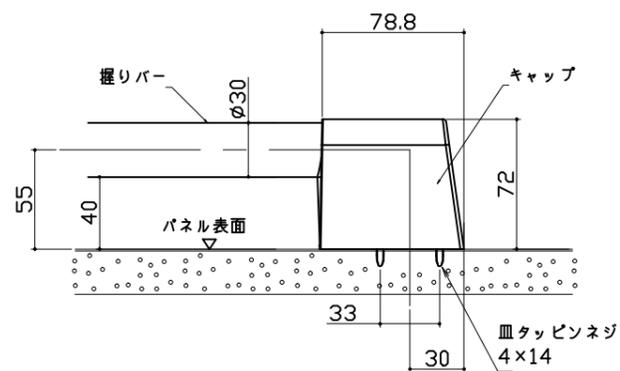


循環金具・フロアダプタ関連

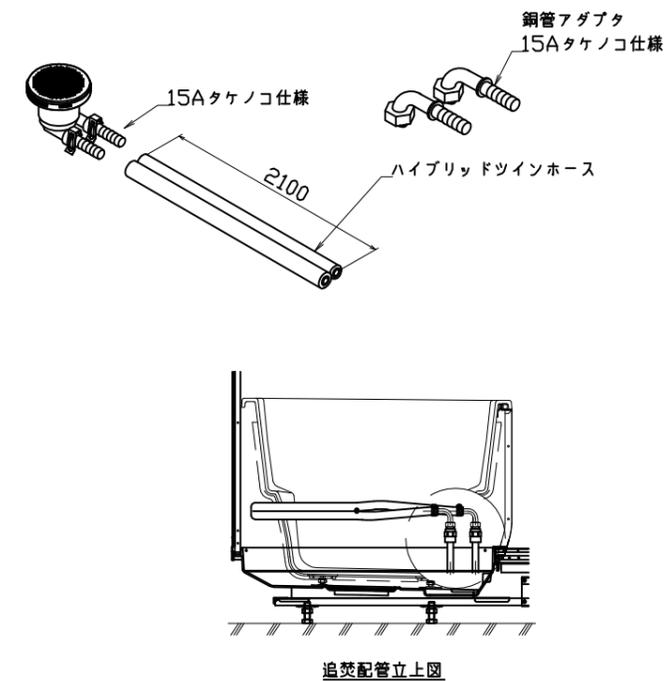


風呂蓋 フォアMVA-13W

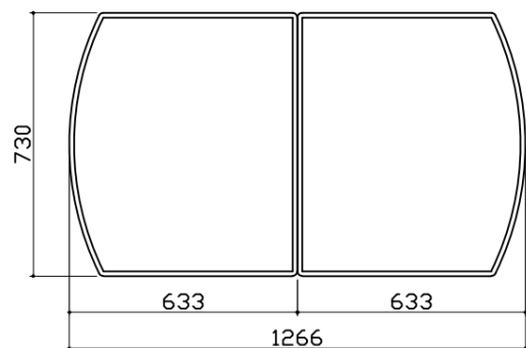

洗い場側排水トラップ

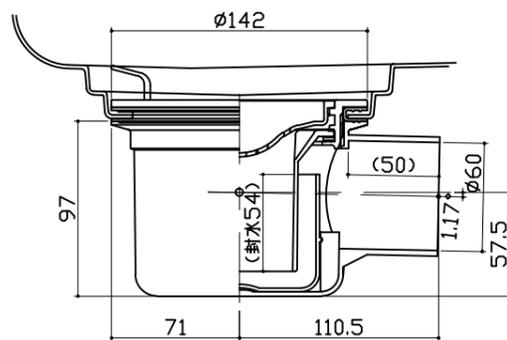

浴槽側排水トラップ

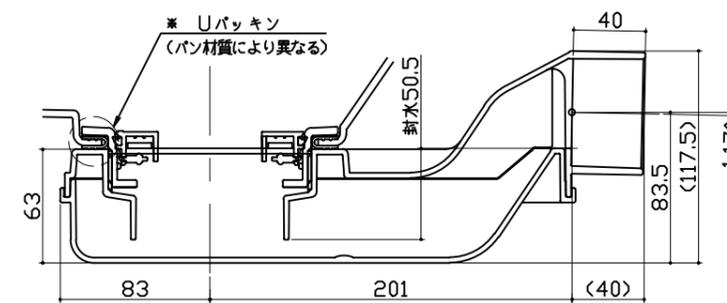

パネル割図	ミラー	収納棚
<p style="text-align: center;">パネル割図</p> <p style="text-align: center;">ハネF17C2J 0899 R<JAW</p> <p>ハネF16C1N 0799 L<JAW</p> <p style="text-align: center;">ハネF17AD 0899 <JAW</p>	<p style="text-align: center;">ミラー</p> <p style="text-align: center;">ハネF17C2J 0899 R<JAW</p> <p style="text-align: center;">現地加工: φ3.5</p>	<p style="text-align: center;">収納棚</p> <p style="text-align: center;">ハネF17C2J 0899 R<JAW</p> <p style="text-align: center;">現地加工: φ3.5</p>
<p style="text-align: center;">シャワーフックスライドバー</p>		
<p style="text-align: center;">シャワーフックスライドバー</p> <p style="text-align: center;">ハネF17C2J 0899 R<JAW</p> <p style="text-align: center;">現地加工: φ3.5</p>		
