

# システムバス 御見積書

御名前 大阪-大阪SR SB-7 様

業者 様

商品名 PREDENCIA プレデンシア

商品 御見積金額 **¥1,892,700 (税込 ¥2,081,970)**

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

**(参考) 別途 商品組付費 ¥201,000 (税込 ¥221,100)**

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。  
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

作成日 2021年11月6日  
プラン番号 1801A-2111-0150T  
現場番号 C2916507

タカスタンダード株式会社  
大阪支社 販売課  
大阪府東大阪市長田東2丁目4番33号  
TEL 06-6746-6815 / FAX 06-6746-6805

大阪ショールーム  
TEL 06-6746-2311 / FAX 06-6746-1246

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
1620	SB7	北野

備考

## 御見積仕様

(システムバス)

ユニットサイズ	1620(AL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	グラングレー
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	プレシャスホワイト
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)
浴槽・風呂フタ	高断熱仕様
カウンター材質	クォーツストーン
カウンターカラー	サンディヘイズ
エプロン材質/カラー	ステンレス / ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ジオマーブルモスグレー
パネルカラー(周辺)	ジオマーブルモスグレー
ガス種 / 周波数	未定 / 60Hz

## 御確認事項

組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。  
現場の状況により商品取付費(搬入費)、御見積の内容(品番・数量・金額)が変わる場合がございます。

No.\*

御名前 大阪-大阪SR SB-7

様

現場番号	C2916507	プラン番号	1801A-2111-0150T	作成日	2021/11/6
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1620サイズ		1	1,117,000	1,117,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	片引戸<800幅>(グレー)/樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1	+56,500	+56,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・全面デザインプレミアムクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・グラングレー)	1	+20,000	+20,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(プレシャスホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ホワイト)	1		
11	浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)	1	+50,000	+50,000
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1		
14	ガス温水式床暖房	なし	1		
15	洗い場用水栓	単独型プッシュ式水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB280 水栓カウンター(チャコールグレー)	1	+96,000	+96,000
16	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド(節水+手元止水)	1		
17	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
18	カウンター	クォーツストーンカウンター	1	+138,000	+138,000
19	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	1	+5,200	+5,200
20	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザインプレミアム)(Kパネル)	1	+85,000	+85,000
21	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
22	引き違い窓	1109S(ペアガラス窓)<中抜き>(シャンパングレー)	1	+31,500	+31,500
23	窓枠フリー	窓枠フリー(樹脂タイプ)L1512 G<グレー色>	1	+19,000	+19,000
24	天井	高光沢フラット天井	1		
25	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V規格)	1	+41,000	+41,000
26	換気機器	ランドリーパイプメタルタイプ(1本)	1	+1,500	+1,500
27	換気機器開口	現場開口	1		
28	照明	ストレートライン照明(調光機能付)	1	+64,000	+64,000
29	天井照明開口	工場開口	1		
30	ミラー	横長クリアミラー	1	-1,500	-1,500
31	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		

御名前 大阪-大阪SR SB-7 様

現場番号	C2916507	プラン番号	1801A-2111-0150T	作成日	2021/11/6
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	タオル掛け	クリアタイプ クリア	1		
33	収納棚	クリアタイプ クリア(2段)	1	-4,000	-4,000
34	浴室テレビ	16インチ(ブラック)	1	+156,000	+156,000
35	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500
36	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
37	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			37		¥1,892,700
商品総合計			37		¥1,892,700

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

**(参考) 別途 商品組付費**


システムバス商品組付費

¥201,000 ( 税込 ¥221,100 )


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格 &lt; 税率10% &gt; を表示しています。

パース

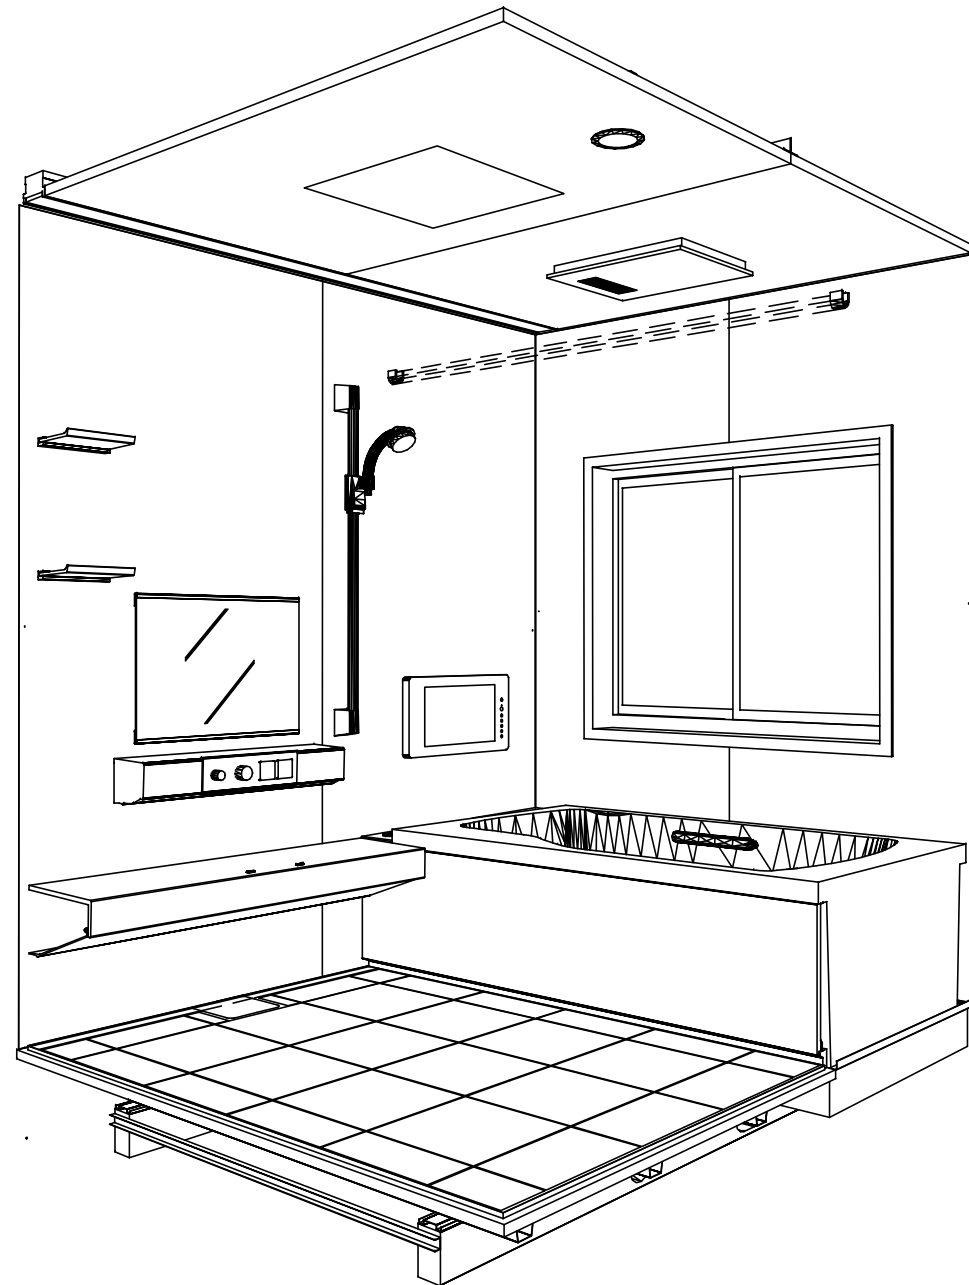

鳥瞰図

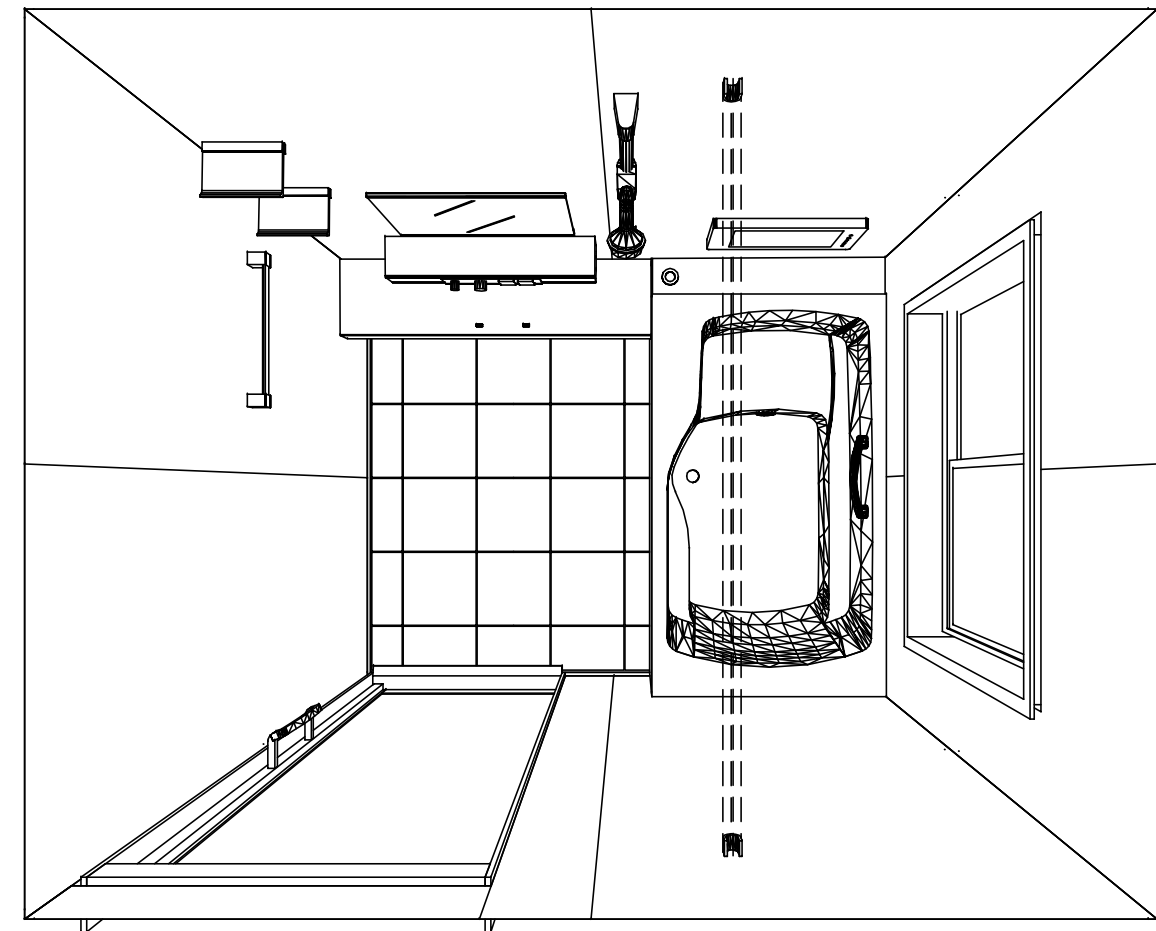

1620

鑄物ホーロー浴槽

高光沢フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

**Takara standard**  
タカラストANDARD株式会社

現場名称： 大阪-大阪SR SB-7様邸

現場番号： C2916507

大阪支社 販売課

PREDENCIA プレデンスシア

プラン番号： 1801A-2111-0150T

担当営業： 1620

姿図



作成日： 2021年11月6日

担当アドバイザー： SB7


縮尺：A3サイズ等倍



■留意事項  
 ※印寸法は給水給湯管の  
 突出寸法18mmを含みます。

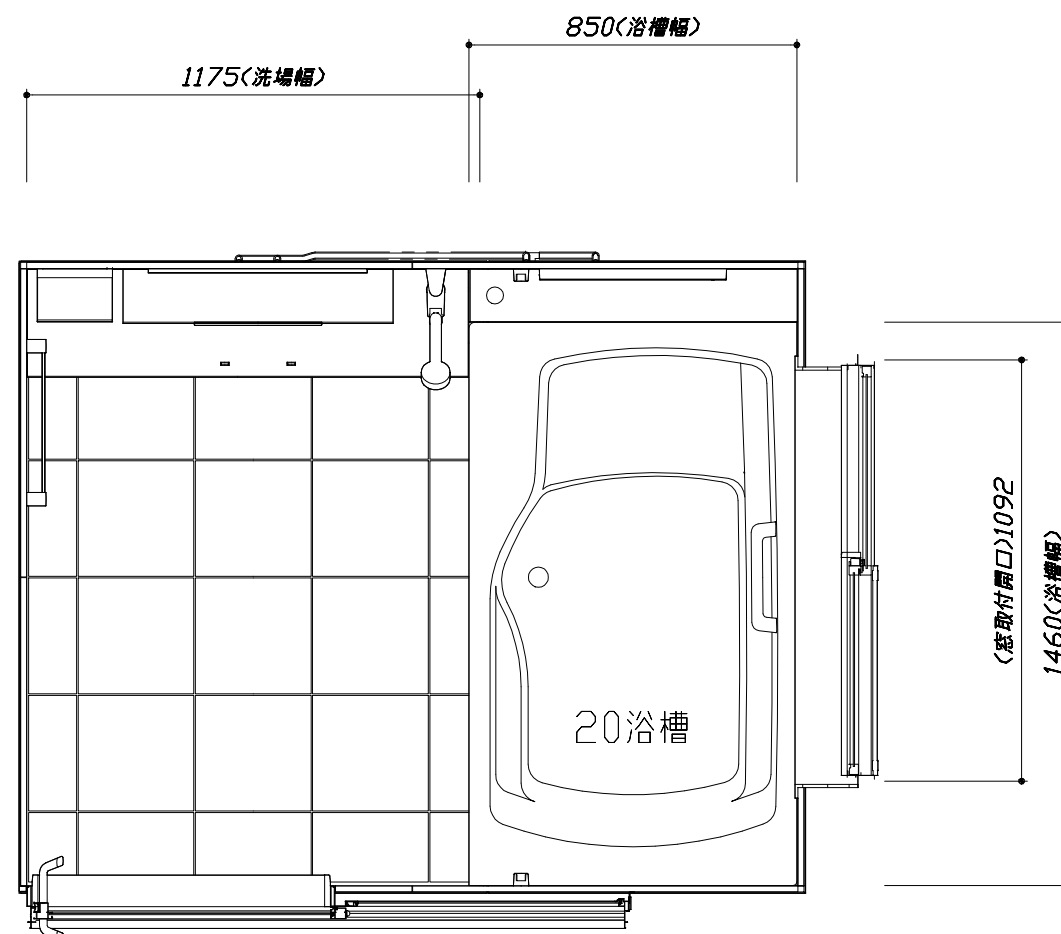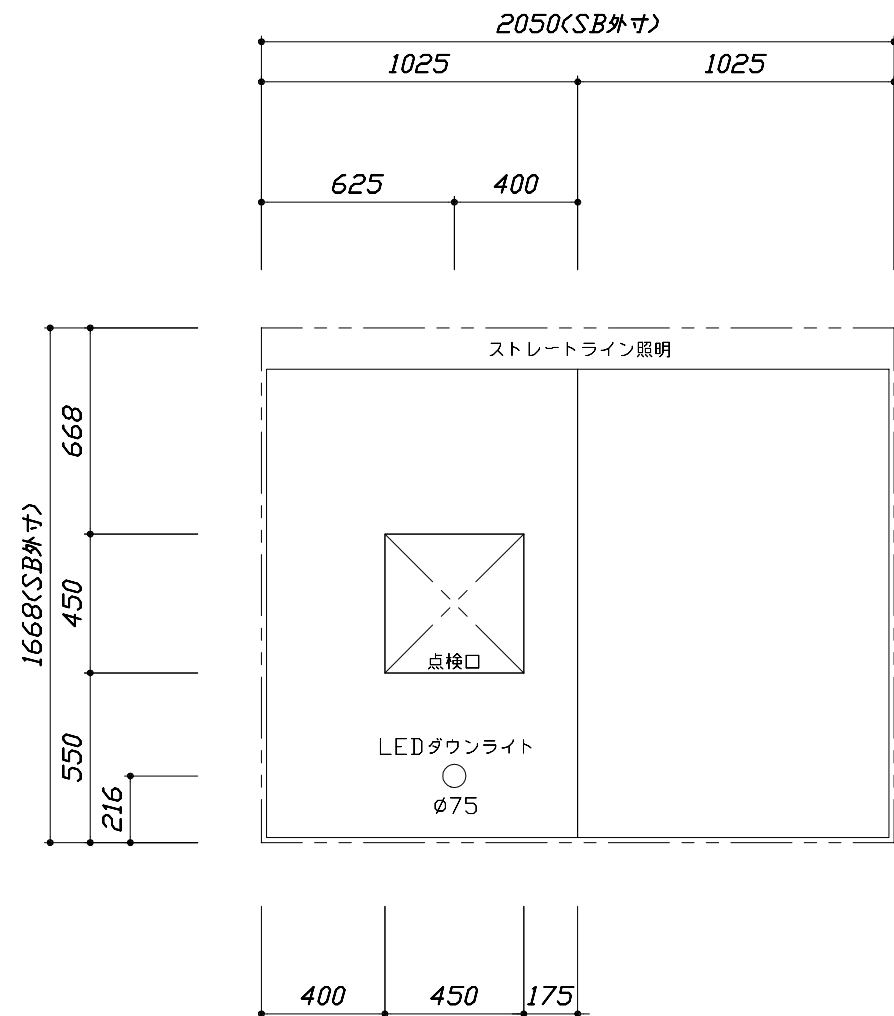

<天井伏図>

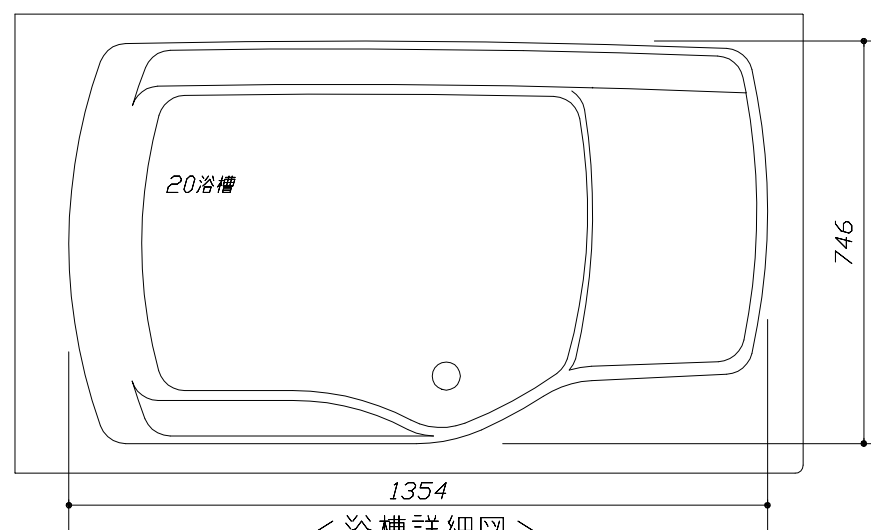

<浴槽詳細図>



<平面図>

Takara standard  
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 大阪-大阪SR SB-7様邸  
 現場番号： C2916507  
 大阪支社 販売課



PREDECIA プレデンスア  
 プラン番号： 1801A-2111-0150T  
 担当営業： 1620

施工図1 縮尺： 1:25,20  
 作成日： 2021年11月6日  
 担当アドバイザー： SB7


縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・浴槽側面の窓設置位置は参考です。ご確認をお願いします。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法をご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

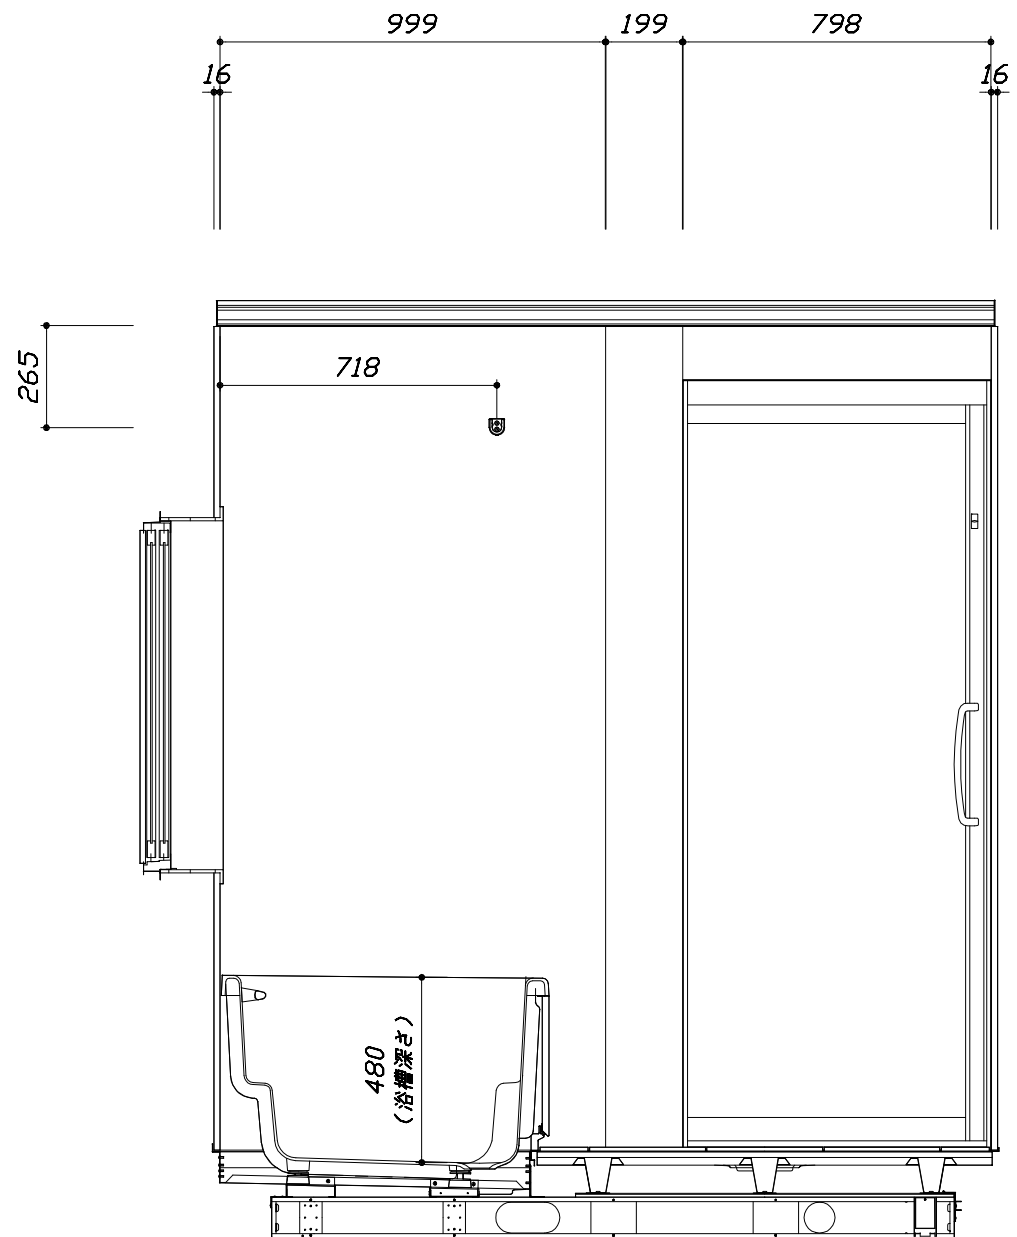

<カウンター対面図>


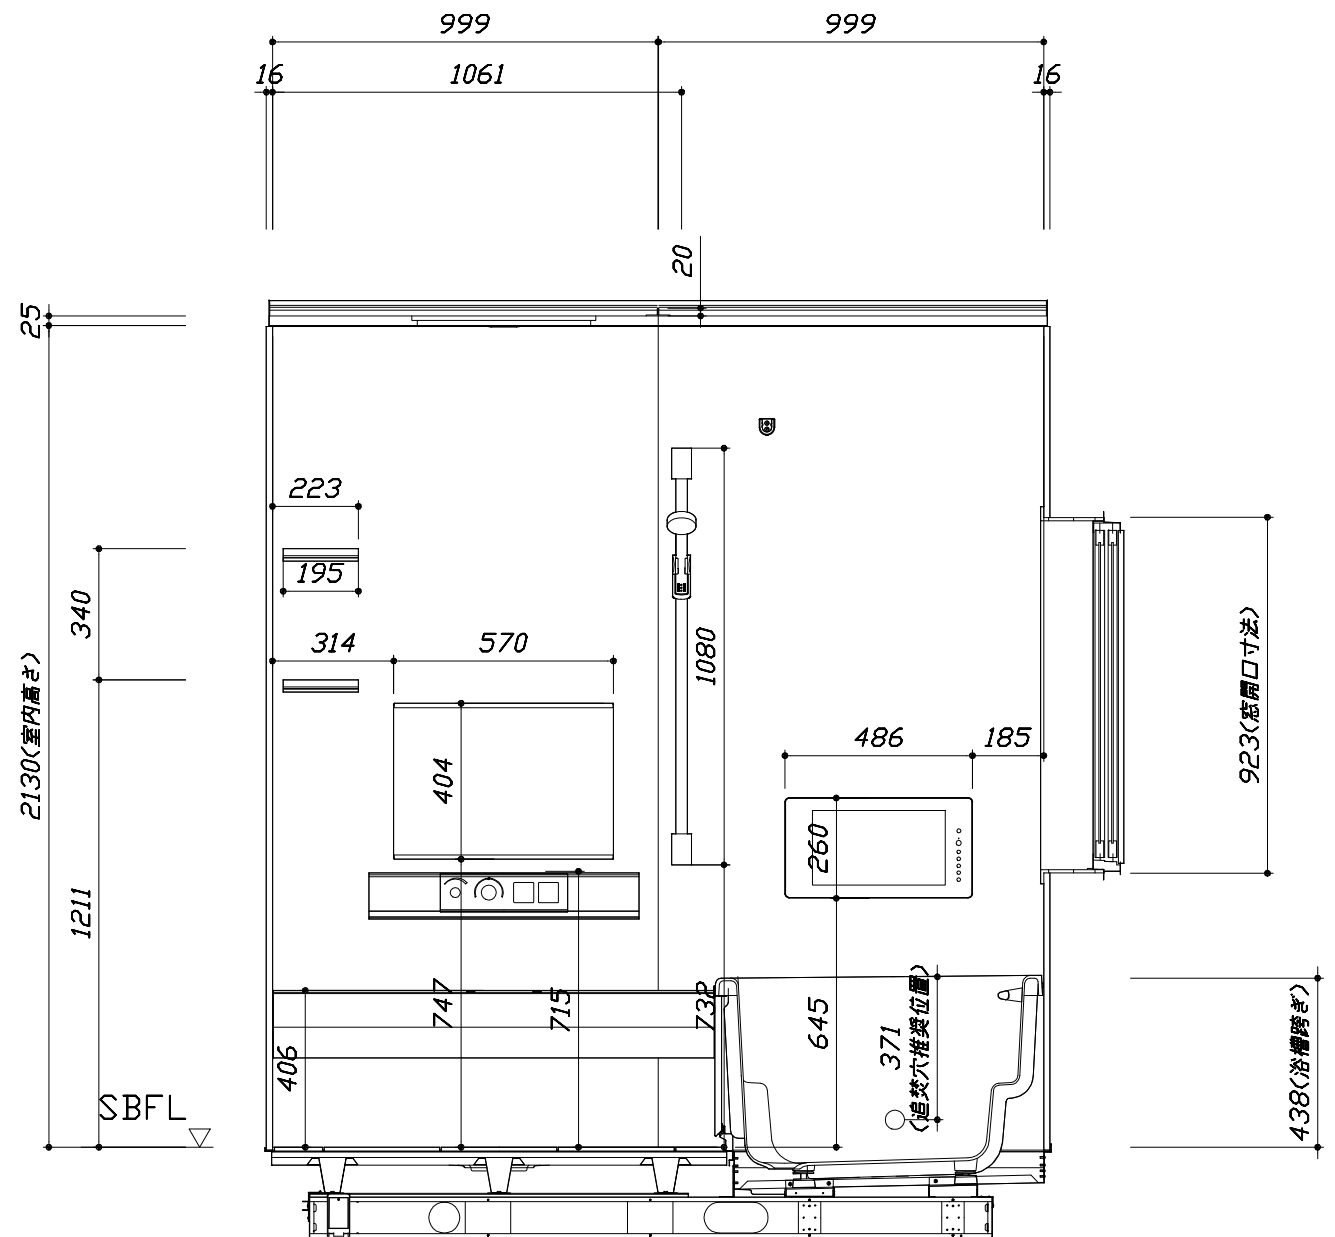


<カウンター面図>

■土間コン仕上げ寸法  
ドアアングル下端より  
265mm下がり  
(クリア寸法含む)


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・浴槽側面の窓設置位置は参考です。ご確認をお願いします。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法をご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

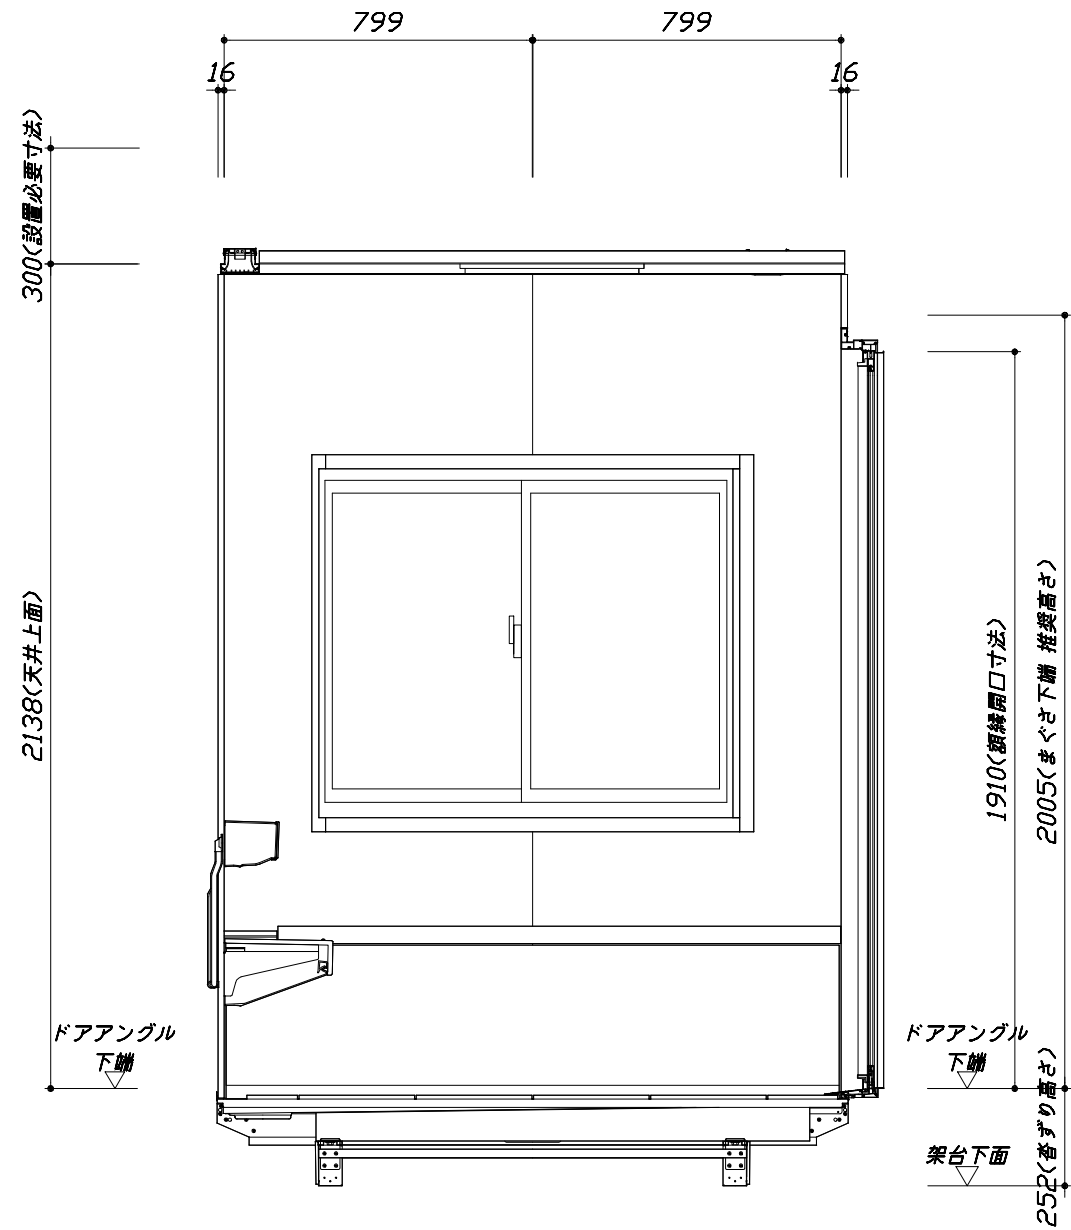

■土間コン仕上げ寸法  
 ドアアングル下端より  
 265mm下がり  
 (クリア寸法含む)

< 浴槽側面図 >

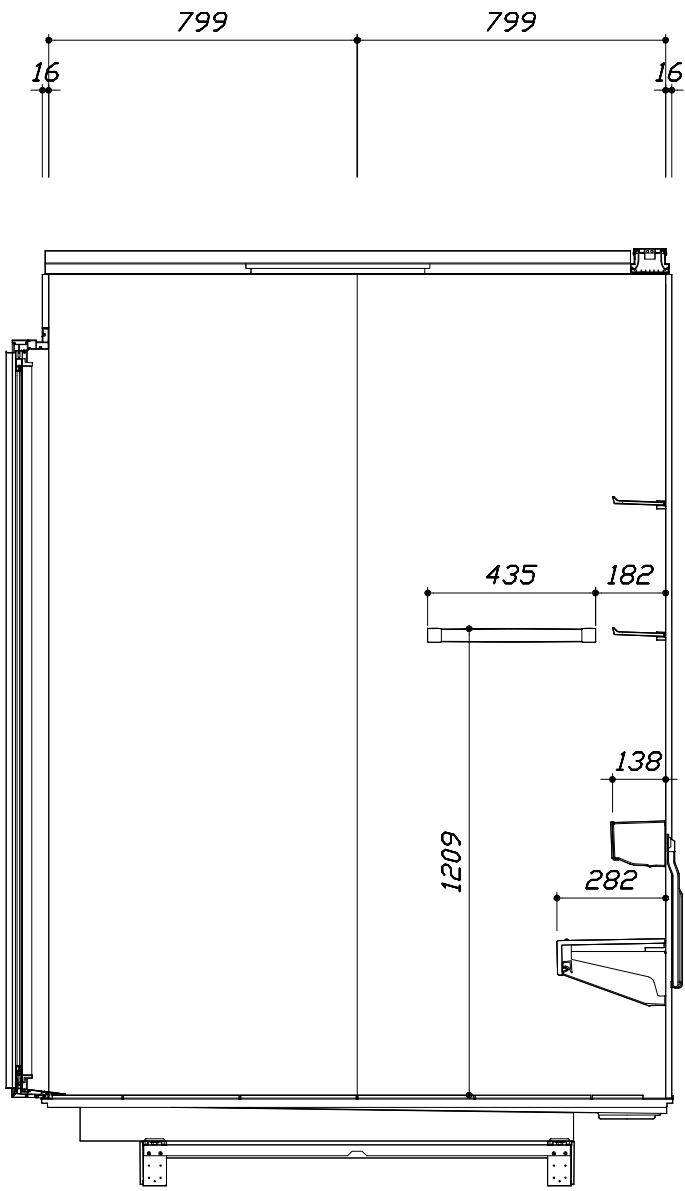

< 洗場側面図 >

本体仕様表

浴室サイズ	1620サイズ(室内容量6.8立方メートル)
ドア勝手	AL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	鋳物ホーロー 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付) グリップ付 (305リットル) 追い焚き穴：あり
浴槽パン	ステンレス
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	クォーツストーンカウンター：クォーツストーン カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	高光沢パネリッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：なし 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ片引戸(アルミ框/樹脂ガラス/ﾀﾞｲﾈﾞｰﾙ型換気口)
窓 1	引違い窓S1109(アルミ/ペアガラス) サッシ色 C：シャンパングレー
窓 2	－
窓枠 1	ABS樹脂 G：グレー
窓枠 2	－
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂、 浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	505kg

アクセサリ仕様表

ミラー	横長クリアミラー くもり止め加工
収納棚	クリアタイプ：アクリル樹脂製 (2段)
タオル掛け	クリアタイプ：アクリル樹脂製
洗場側水栓	プッシュ式・サーモスタット(SB280LABN(H)) (樹脂ホース：メタル調)
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
スライドバー	シャワーフックスライドバー (手すりタイプ) (スライドバー-T1020S MH)
照明	ストレートライン照明 (LED 23.7W調光機能付)
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V・最大消費電力1250W) (ﾀﾞｲｱﾞﾈｯﾄφ98) (常時換気対応品)
フロタ	保温風呂フタ (PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－



本体カラー

浴槽	WP：プレシャスホワイト
カウンター	K：サンディヘイズ
パネル(カウンター面)	JDG：ジオマーブルモスグレー
パネル(周辺・3面)	JDG：ジオマーブルモスグレー
水栓上部カウンター	CG：チャコールグレー
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	PG：グラングレー
ドア	G：グレー
収納棚	クリアタイプ(クリア)
タオル掛け	クリアタイプ(クリア)
ランドリーセット	M：メタル



# 基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。  
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。  
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。  
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

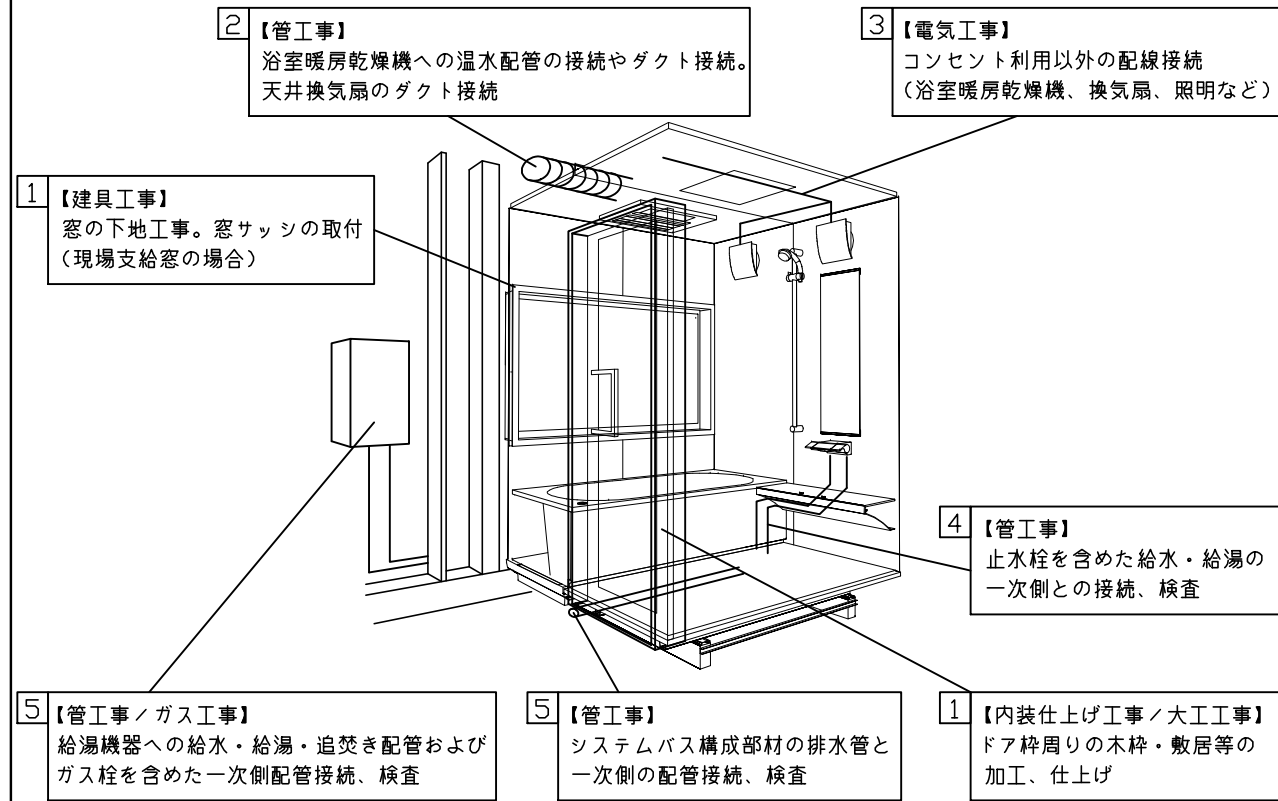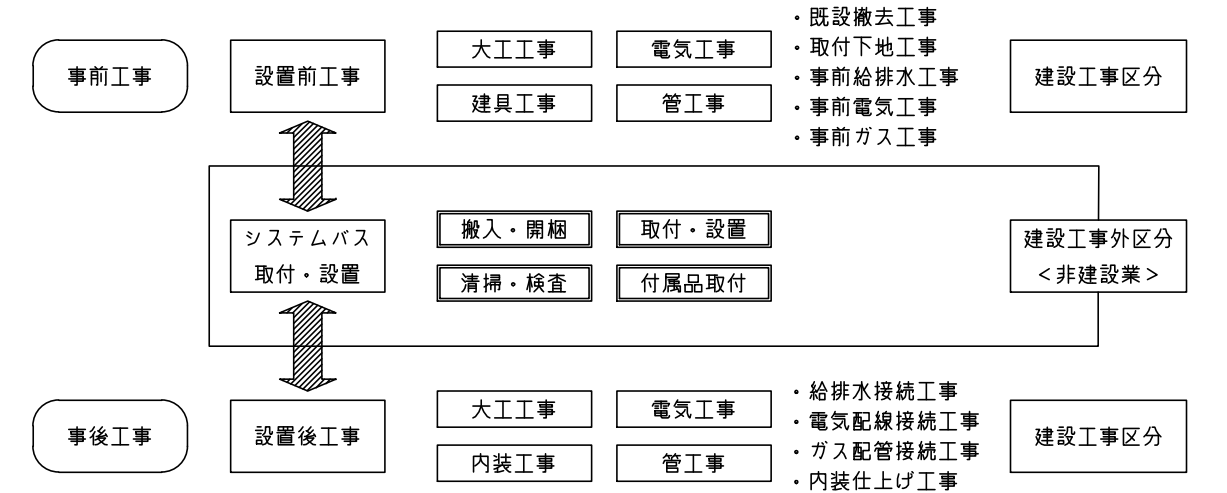

## ■システムバス 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位(図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工工事	とび土工事	建具工事	管工事	電気工事	給湯機器設備	システムバス設置	
設置前工事	1	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
			給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
設置前工事	2	管	換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
			給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
			浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
設置前工事	3	電気	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
			架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□		浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置						□		洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
			設置後工事	1	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○	
排気ダクトの敷設工事								○			浴室換気機器のダクト敷設工事
浴室換気機器と排気ダクト接続工事								○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査
4	管	浴室換気機器の電気・アース接続工事						○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
		ウェザーカバーの外壁取付						○	○		建築の外装仕上げ工事
		給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事							○		給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
5	管	建築側排水配管との接続工事【注記 3】					○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
		給湯機器本体工事（試運転・確認）					○	□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
		内装仕上げ工事	○	○						床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
1	3	電気 他	浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事						○		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする  
 ※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する  
 ※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。




■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。


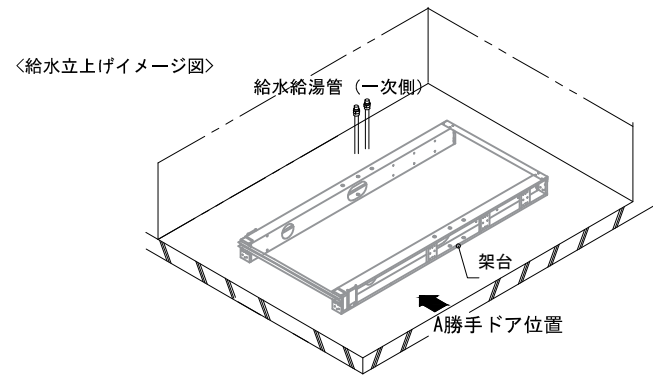


■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアングル下端より265mm下がり打設してください。

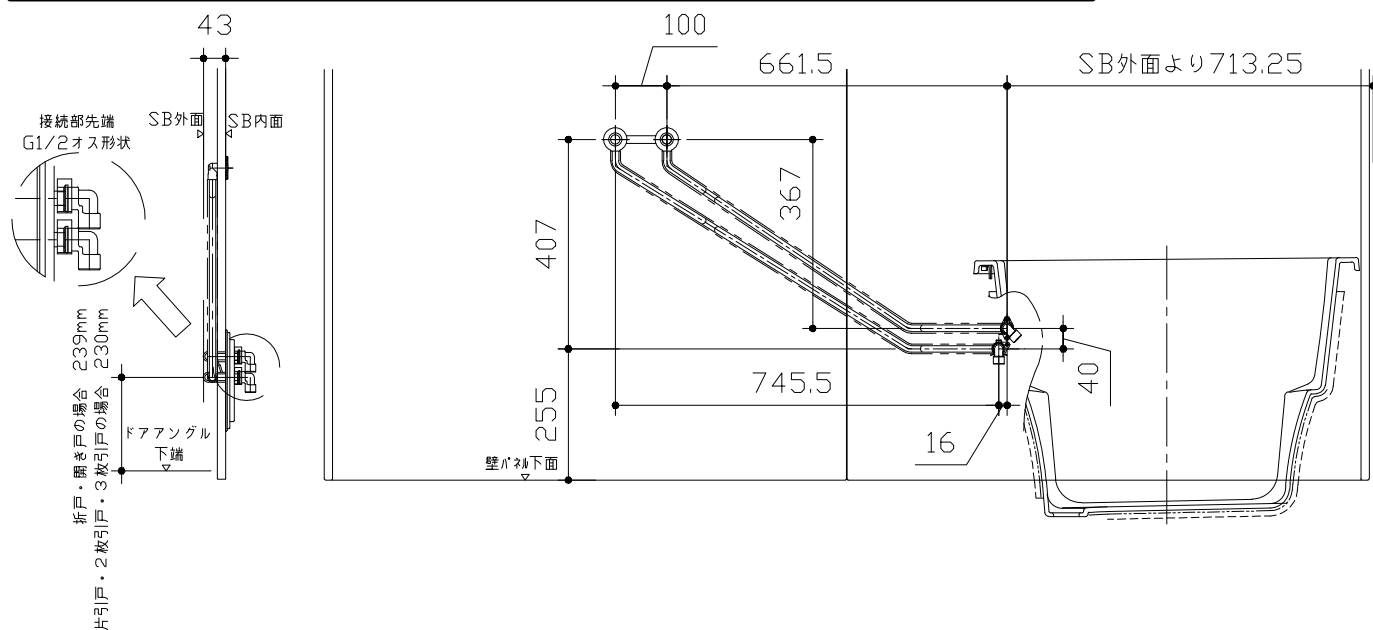


〈給水給湯管取合詳細図〉

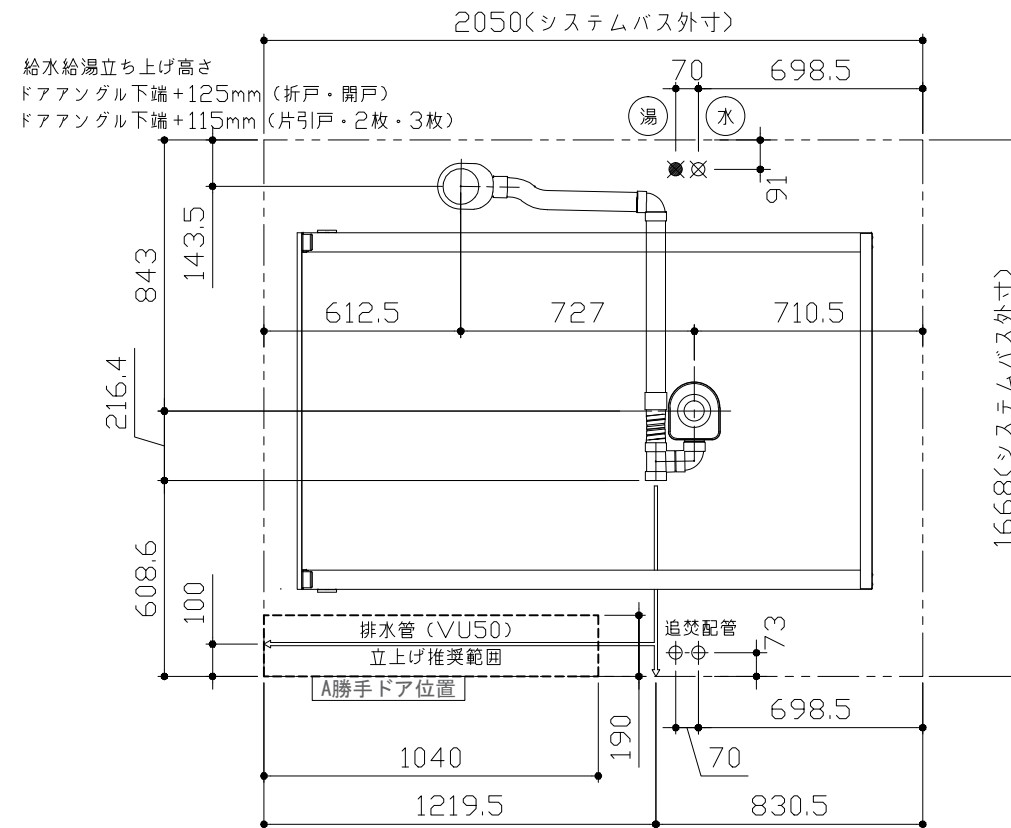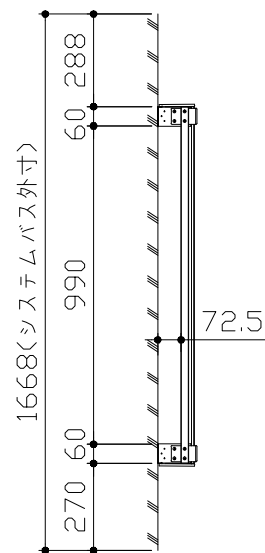

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置



〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。  
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

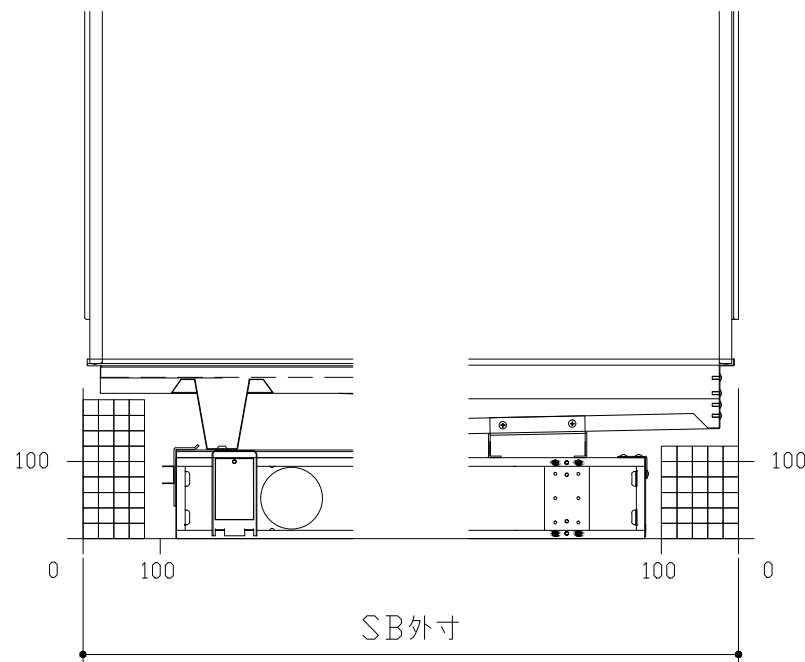


B矢視

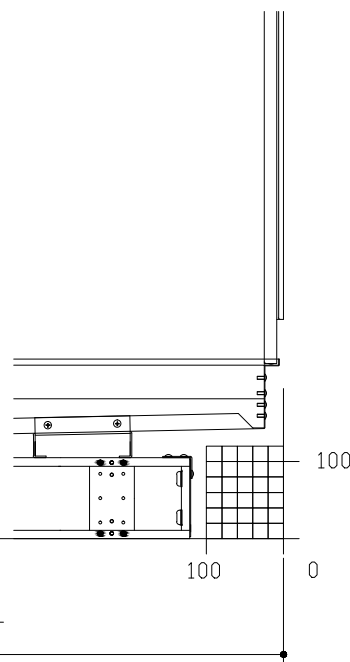


A矢視

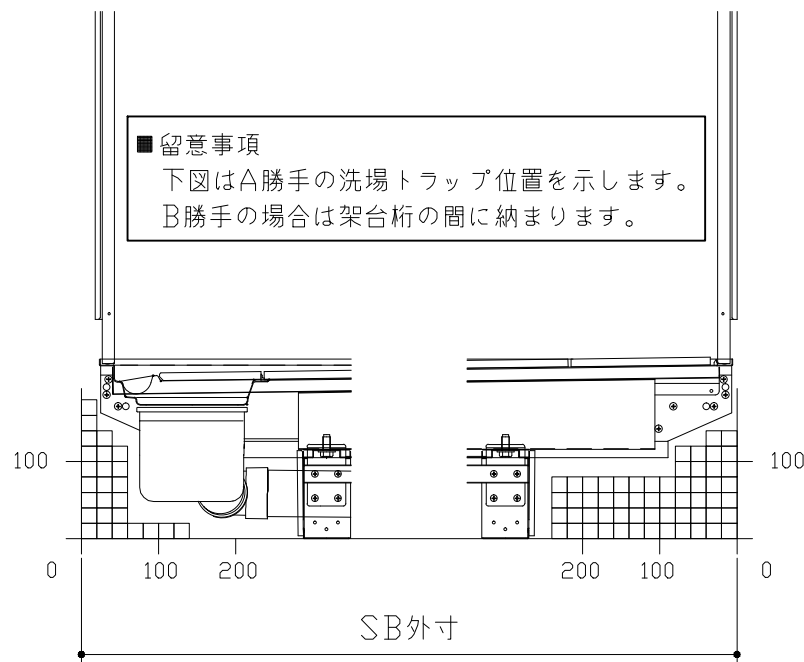


D矢視

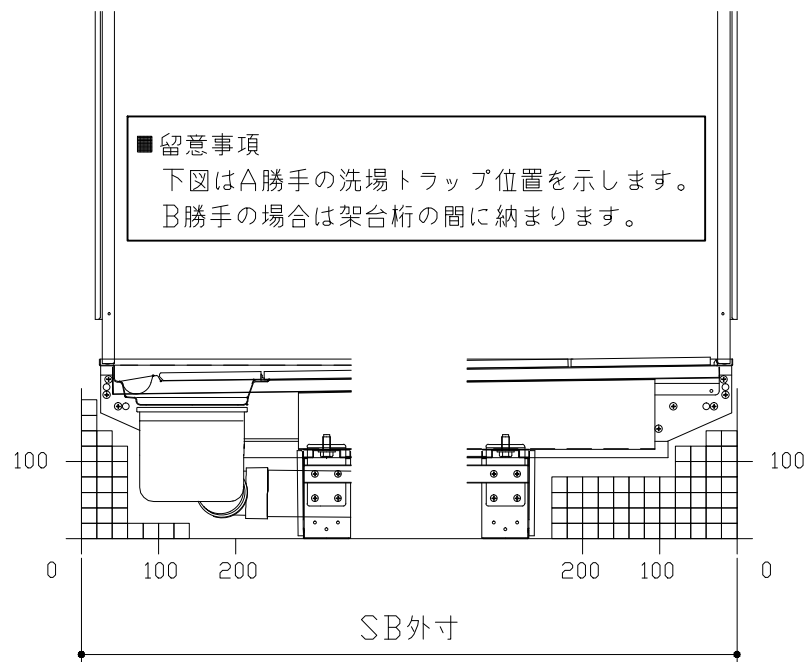

C矢視


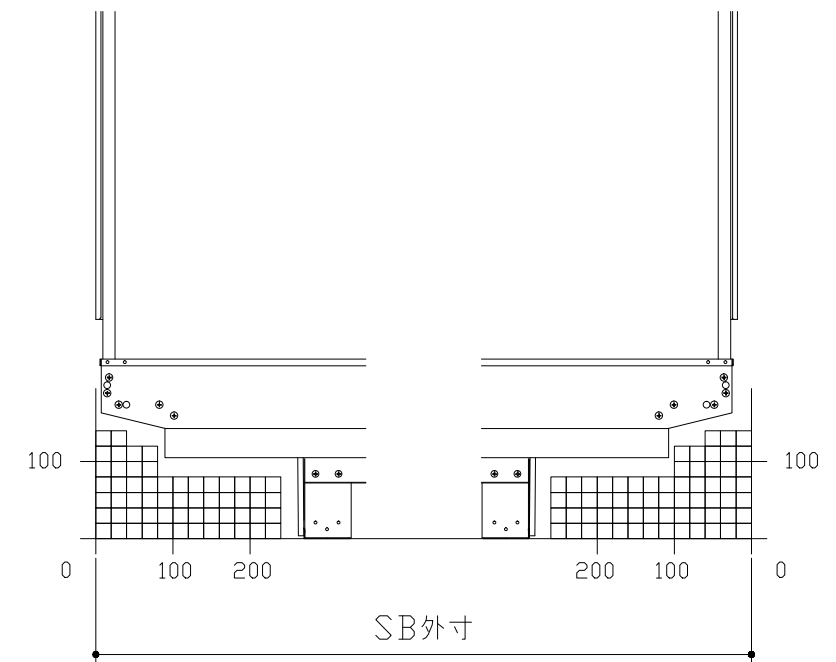


F矢視

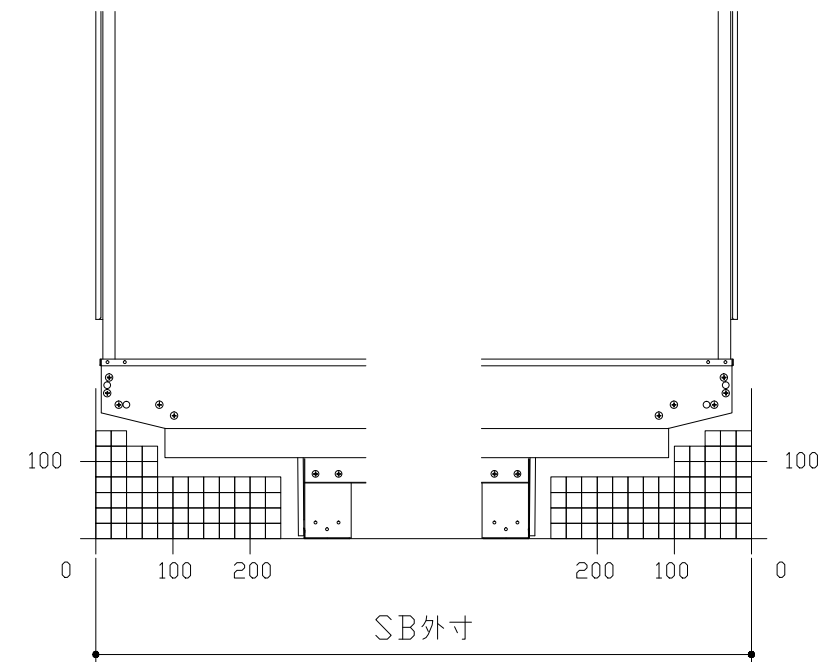

E矢視

# キープクリーンドア：片引戸・タテ型換気口

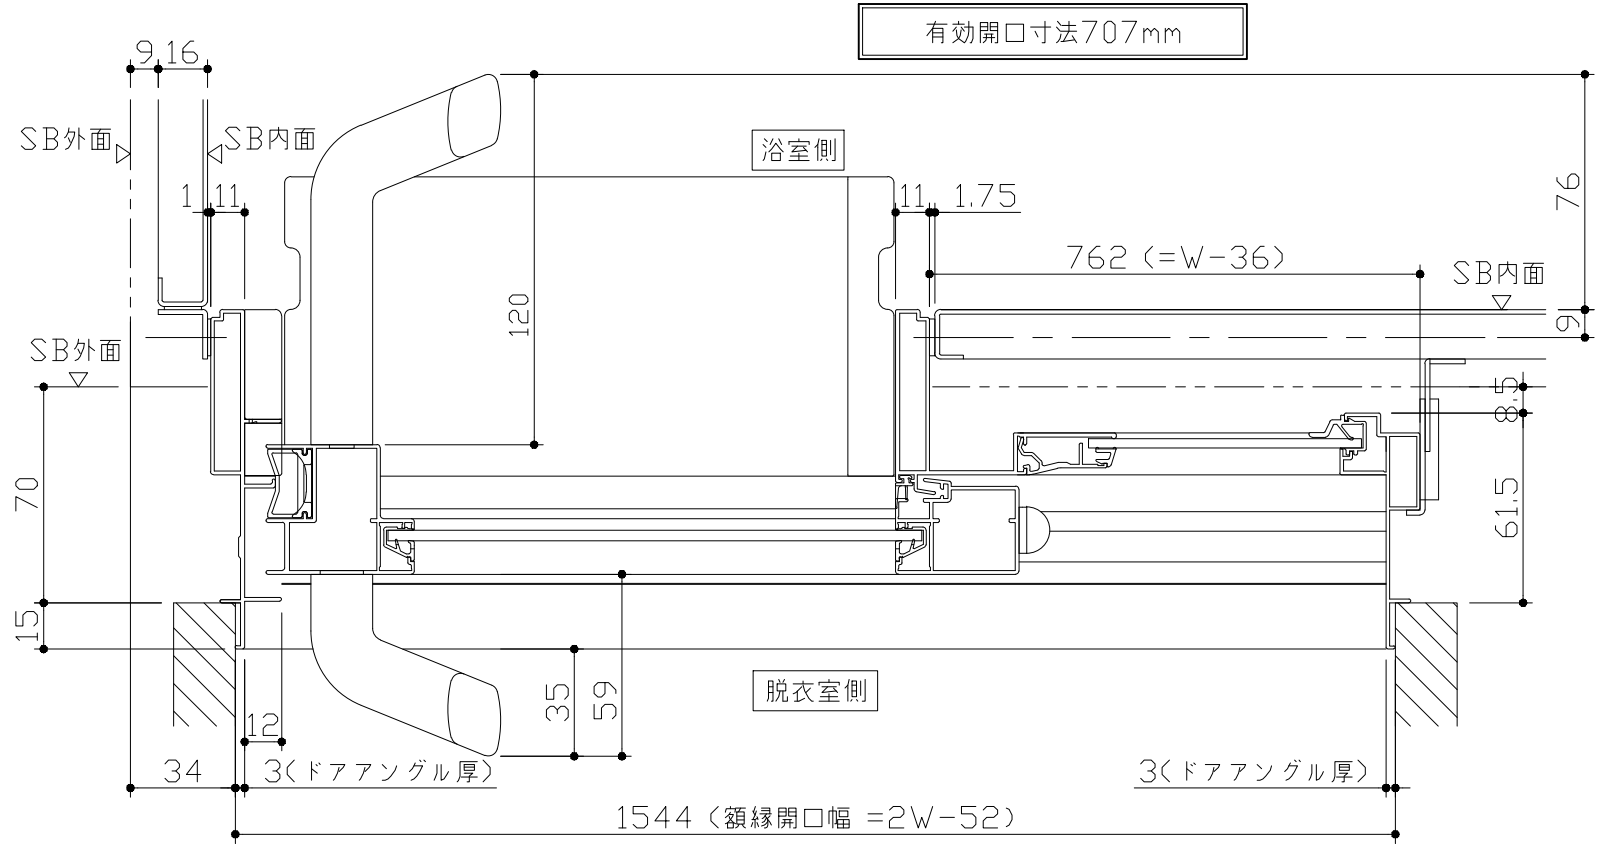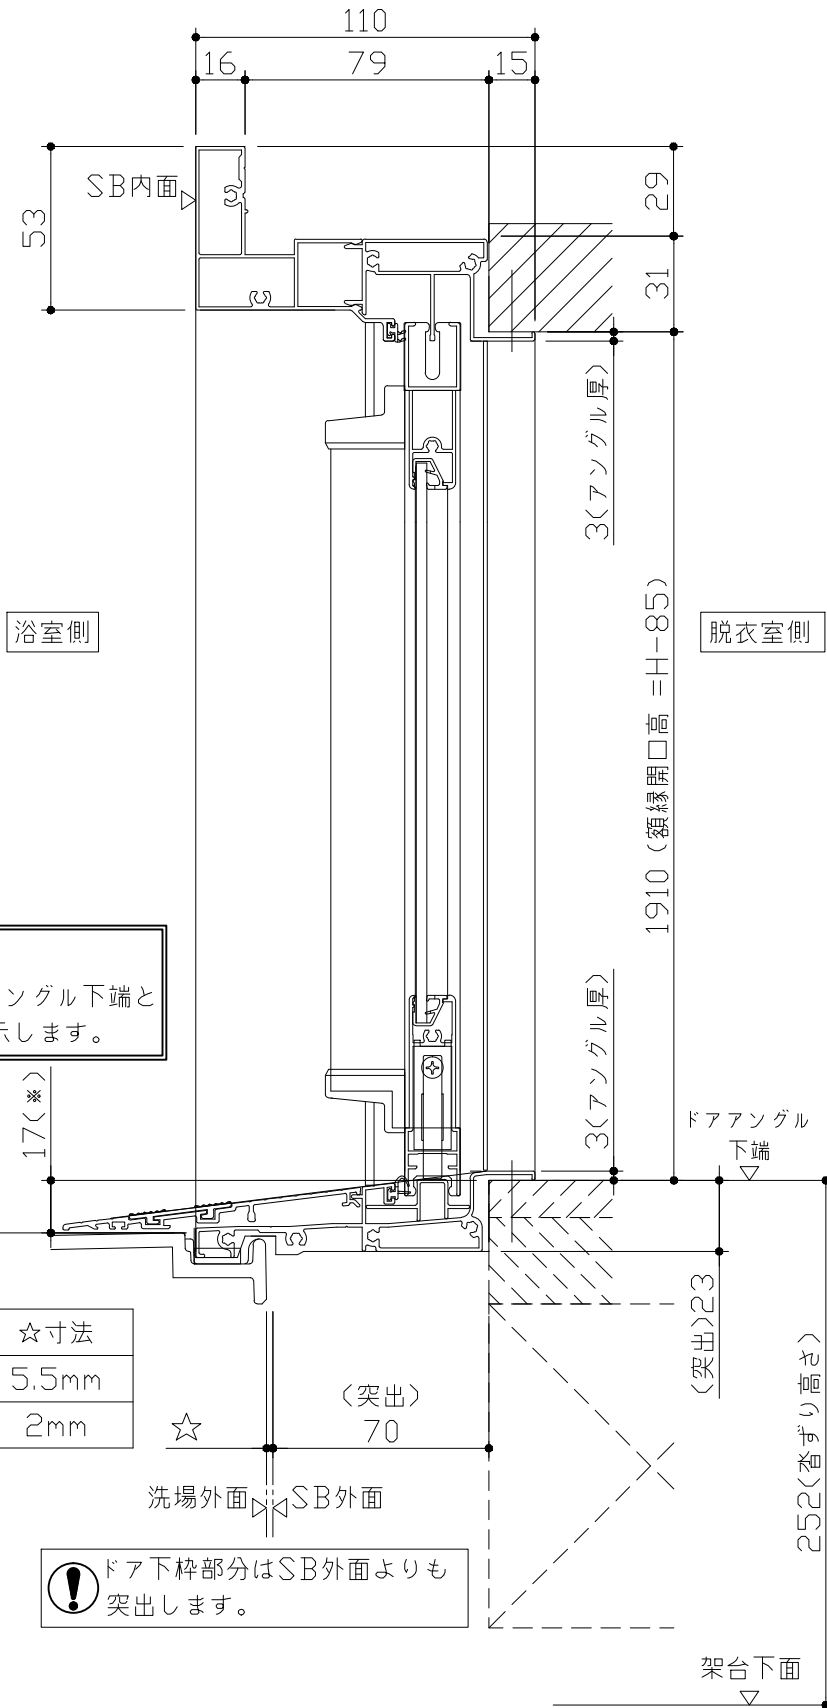


有効開口寸法707mm


■ 留意事項  
 \* 印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンプフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

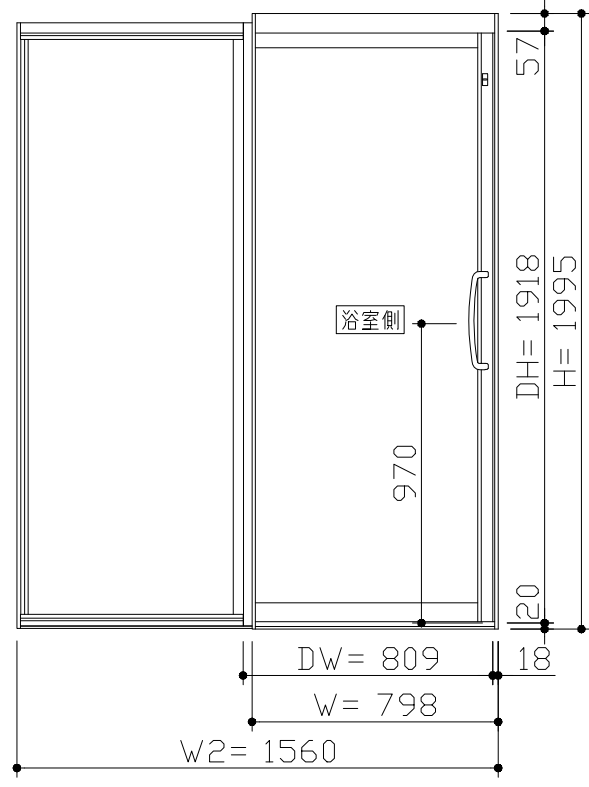

■ ドア横の管柱、間柱について  
 ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。  
 ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

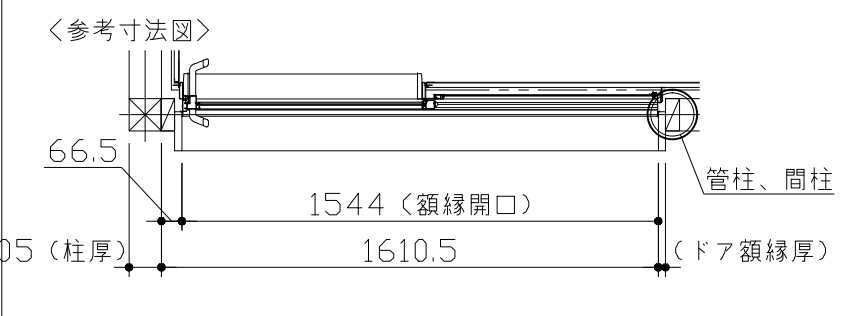


**Takara standard**  
 タカラストANDARD株式会社


現場名称： 大阪-大阪SR SB-7様邸  
 現場番号： C2916507  
 大阪支社 販売課

PREDECENCIA プレデンスシア  
 プラン番号： 1801A-2111-0150T  
 担当営業： 1620

ドア取合詳細図  
 作成日： 2021年11月6日  
 担当アドバイザー： SB7

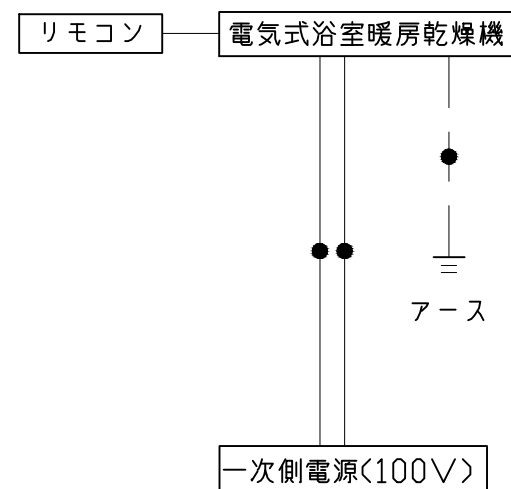


\*浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

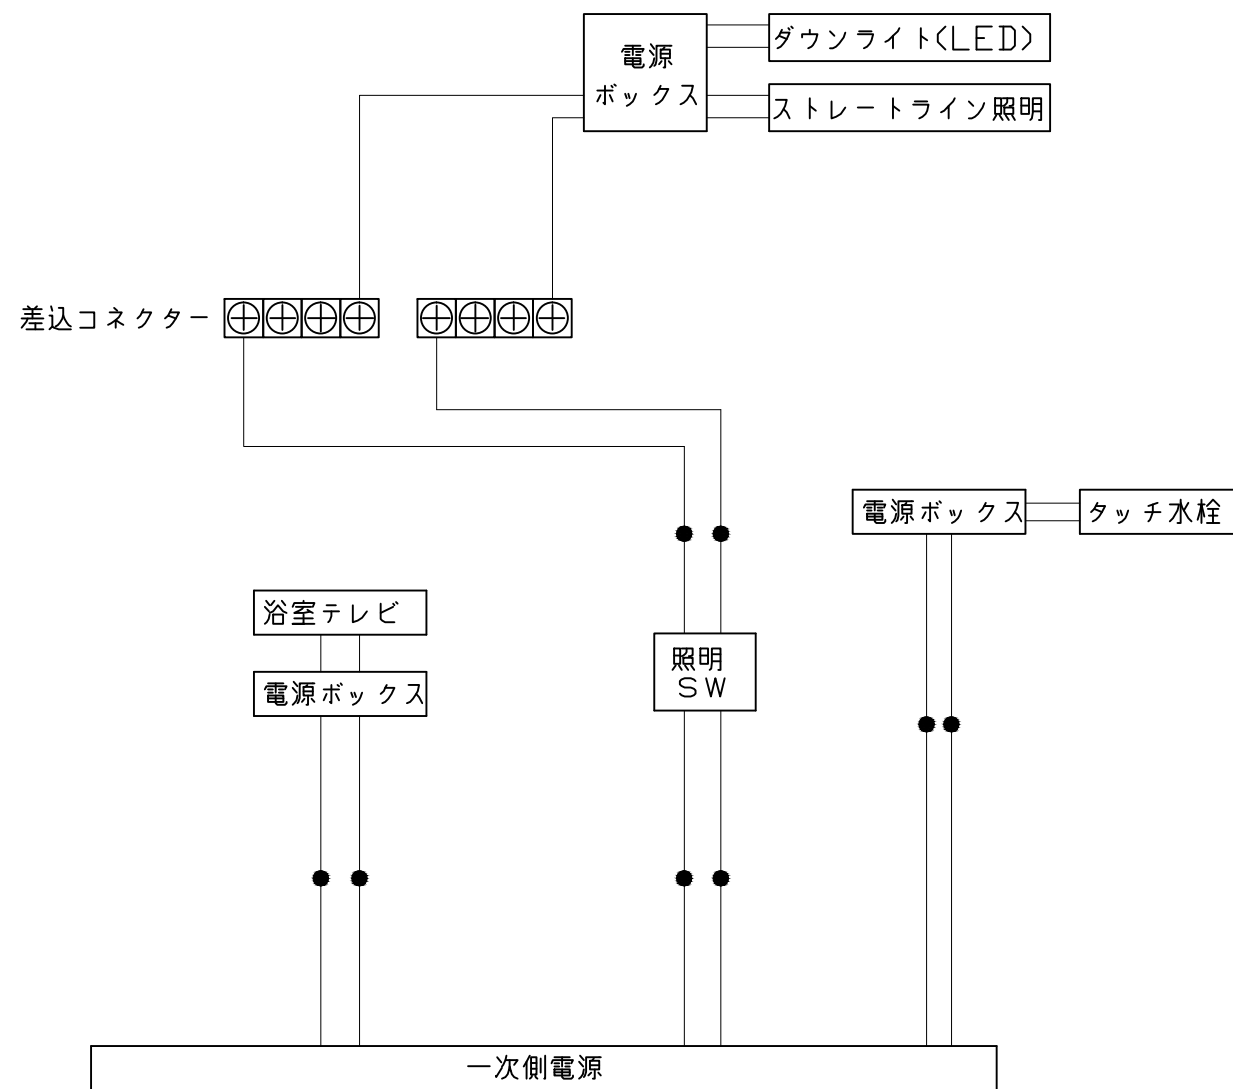


一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。

浴槽

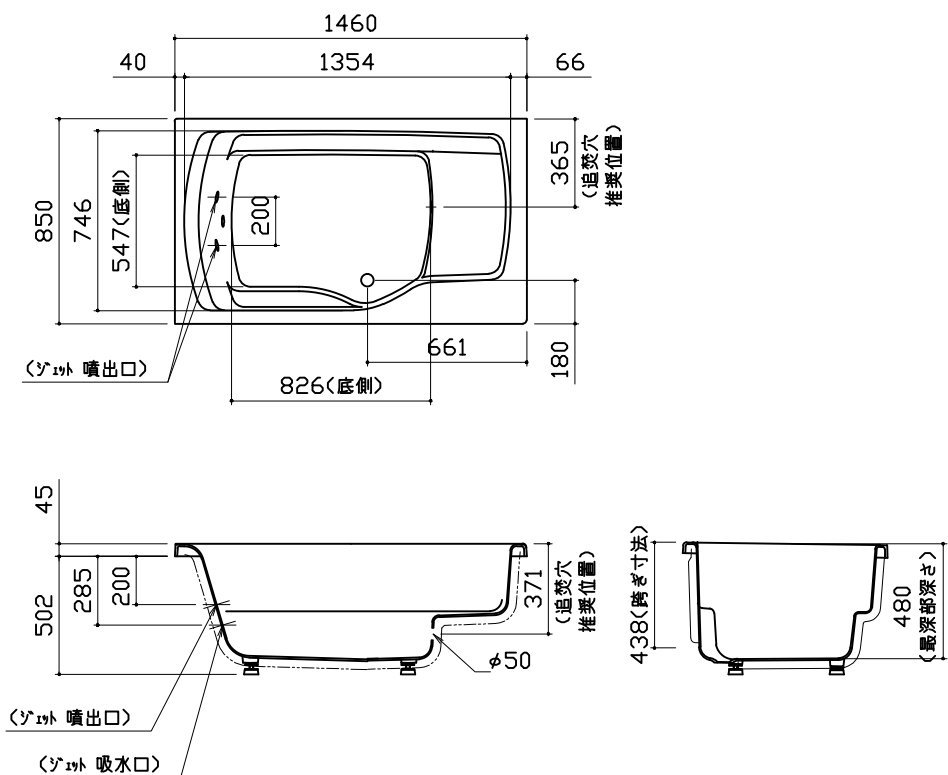


洗い場用水栓

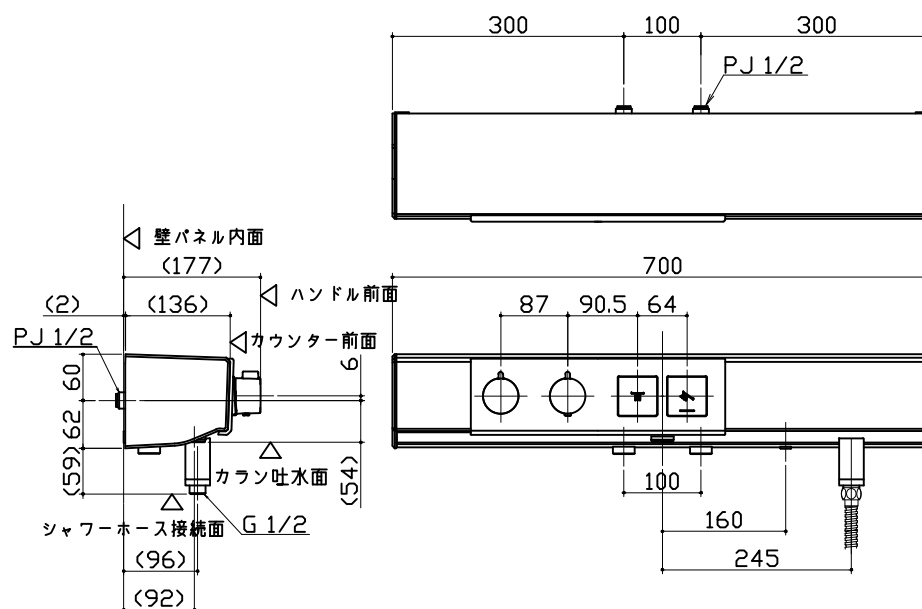

照明


ストレートライン照明  
LED 23.7W (ダウンライト1灯含む)

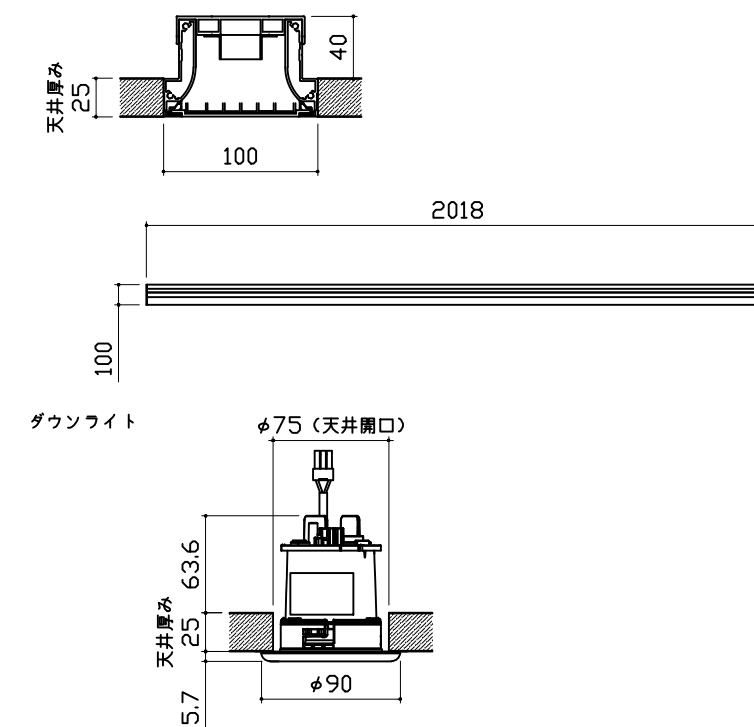


換気機器

リモコンコード長さ: 5m  
外形: 縦120mm×横116mm

管工事

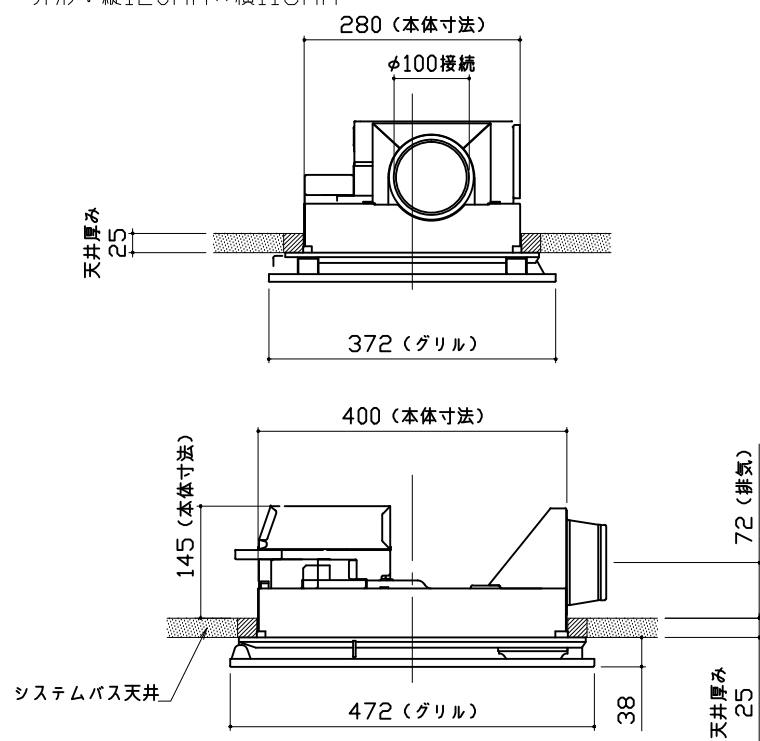


シャワーフックスライドバー

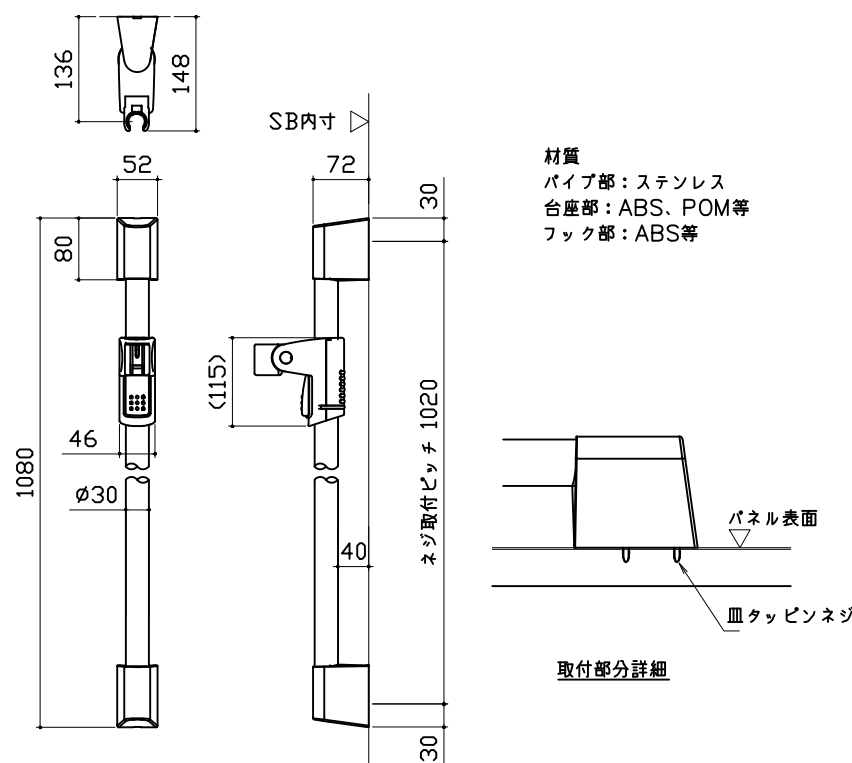


ミラー

枠: SUS304 t0.8  
ミラー: 表面防曇コートあり (横長クリアミラー)  
表面防曇コートなし (横長ミラー)

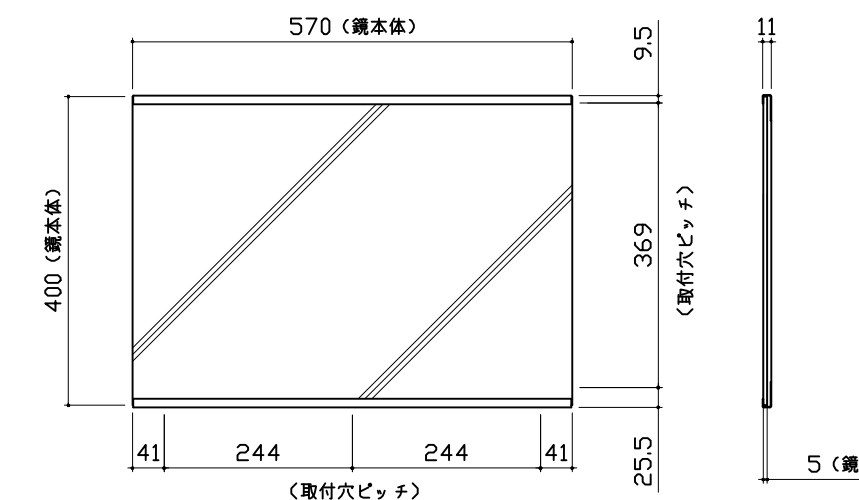


収納棚

本体：PMMA

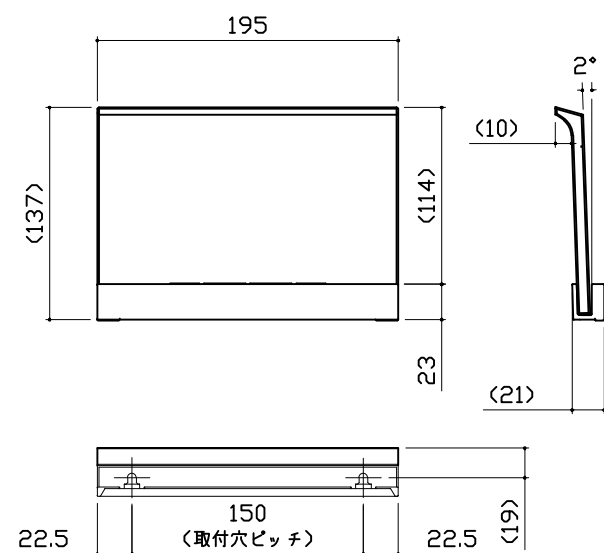


タオル掛け

本体：PMMA  
ブラケット：ABS (クロムメッキ仕上げ)

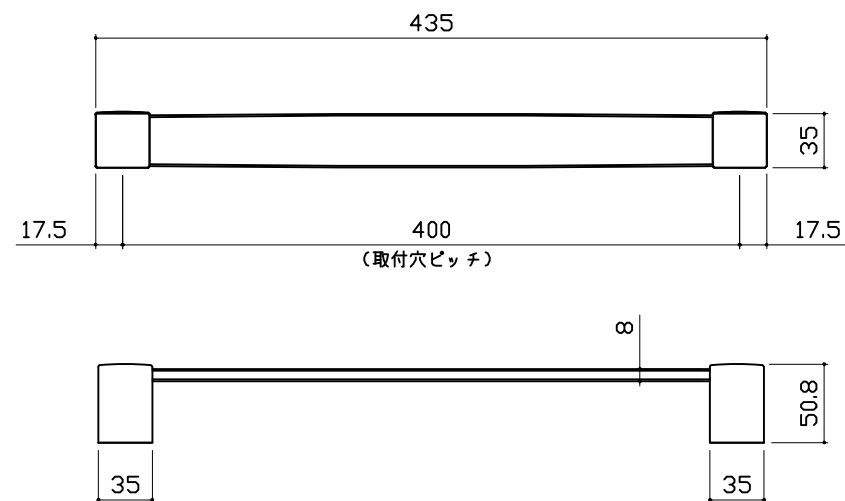


窓枠フリー


\*[ ]寸法はそれ以下に現地加工することができます。  
\*末尾 E：フクビ化学工業製 NW/NG/NB：キョーセイ製  
材質：窓枠本体/カバー AESコートABS ...L1512(E/NG/NB)  
AASコートABS ...L1512(NW)  
コーナーピース部 ABS ...E/NW/NG/NB共通

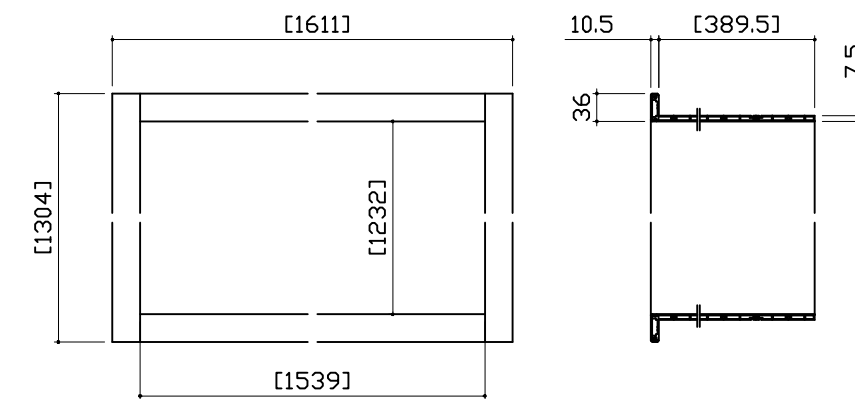


循環金具・フロアダプタ関連

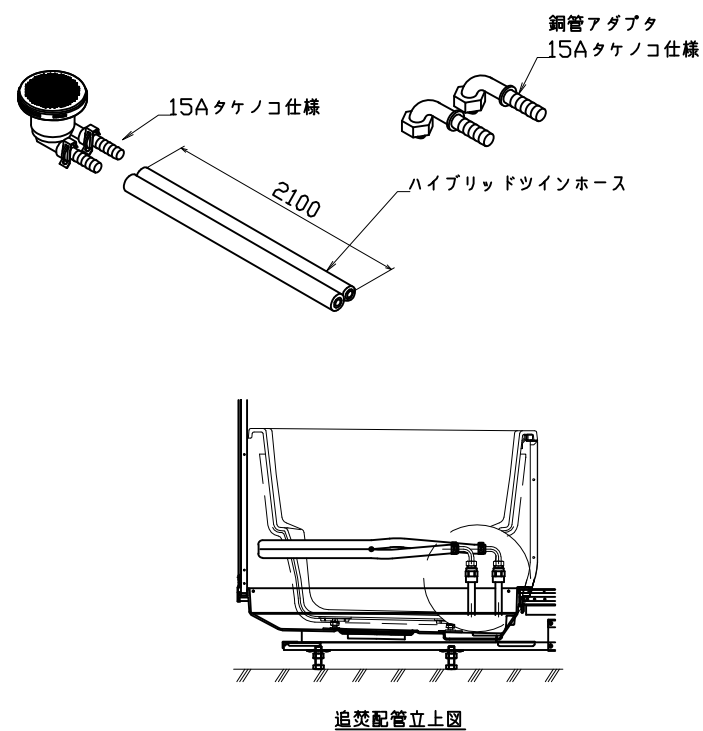


風呂蓋 7079MDH-20WSK

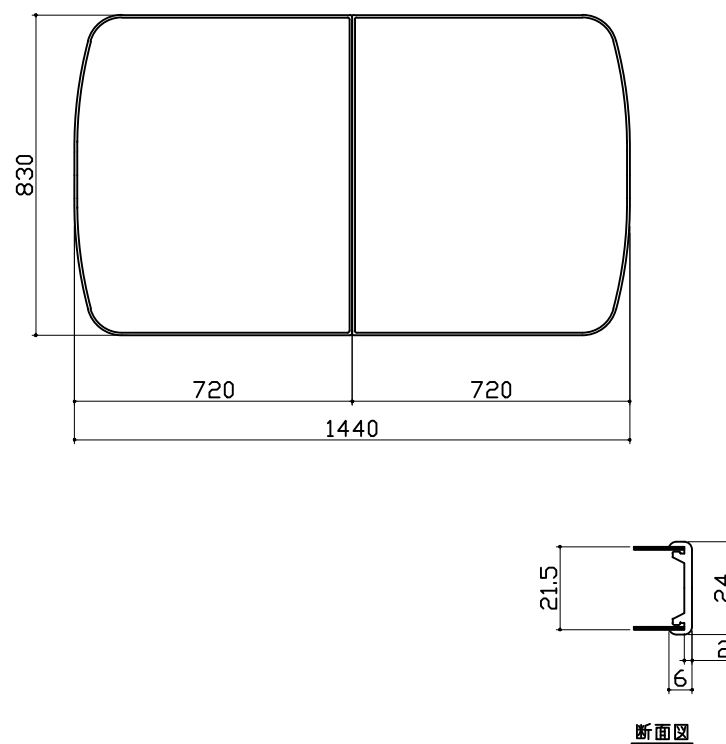

洗い場側排水トラップ

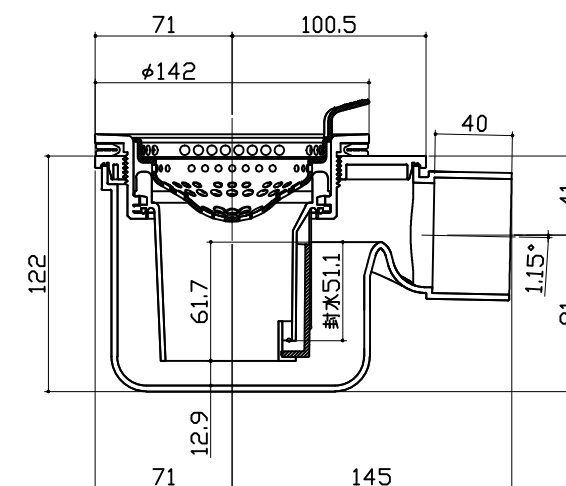


浴槽側排水トラップ

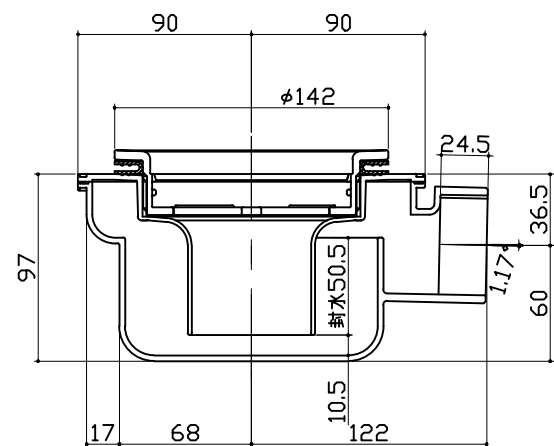

浴室テレビ①


浴室テレビ本体

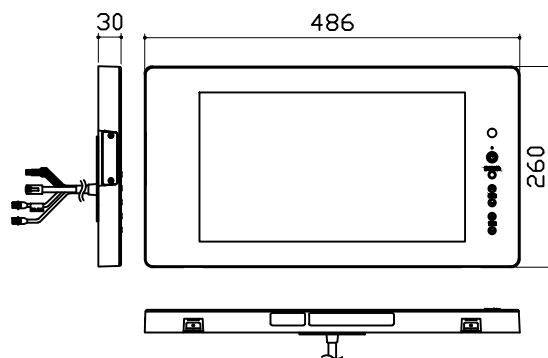

電気工事

TV本体仕様	
名称	浴室テレビユニット
型式	白色: MW16D-3(T) 黒色: MW16D-3B(T)
外形寸法(mm)	幅486×高さ260×奥行30
質量	3.2kg
周囲温度	0~50℃
表示部	画面サイズ 15.6インチ
バックライト	
スピーカー	3W+3W
映像解像度	WXGA:1366×768
消費電力	24W

電源チューナーボックス



電源チューナーボックス仕様	
名称	電源チューナーボックス
外形寸法(mm)	幅230×高さ104×奥行47.3
質量	0.95kg
定格入力	AC100V
アンテナ部	F型接続
周囲温度	0~40℃

※三谷商事製

浴室テレビ②

【工事範囲】

当社工事範囲

1. 浴室テレビ本体、電源ボックスの取付
2. モニター中継ケーブルの天井裏への配線
3. 浴室テレビ本体及び電源ボックスとモニター中継ケーブルの接続



電気工事業者様 工事範囲

1. 電源ボックスへ一次側100Vの接続
2. アンテナ線の配線及び接続作業
3. プレーカーと漏電遮断機の設置


■留意事項

- (1) レコーダー、プレーヤー等の外部機器は接続できません。
- (2) 付属のモニター中継ケーブルは4mになります。  
4mで長さが足りない場合には別売品のモニター延長ケーブル(4m)で最長8mまで延長可能です。

電気工事

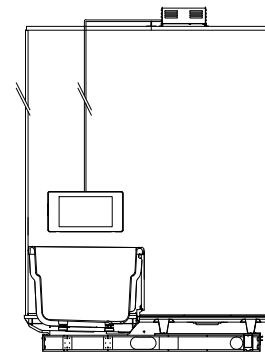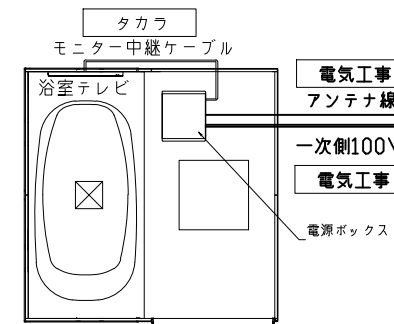





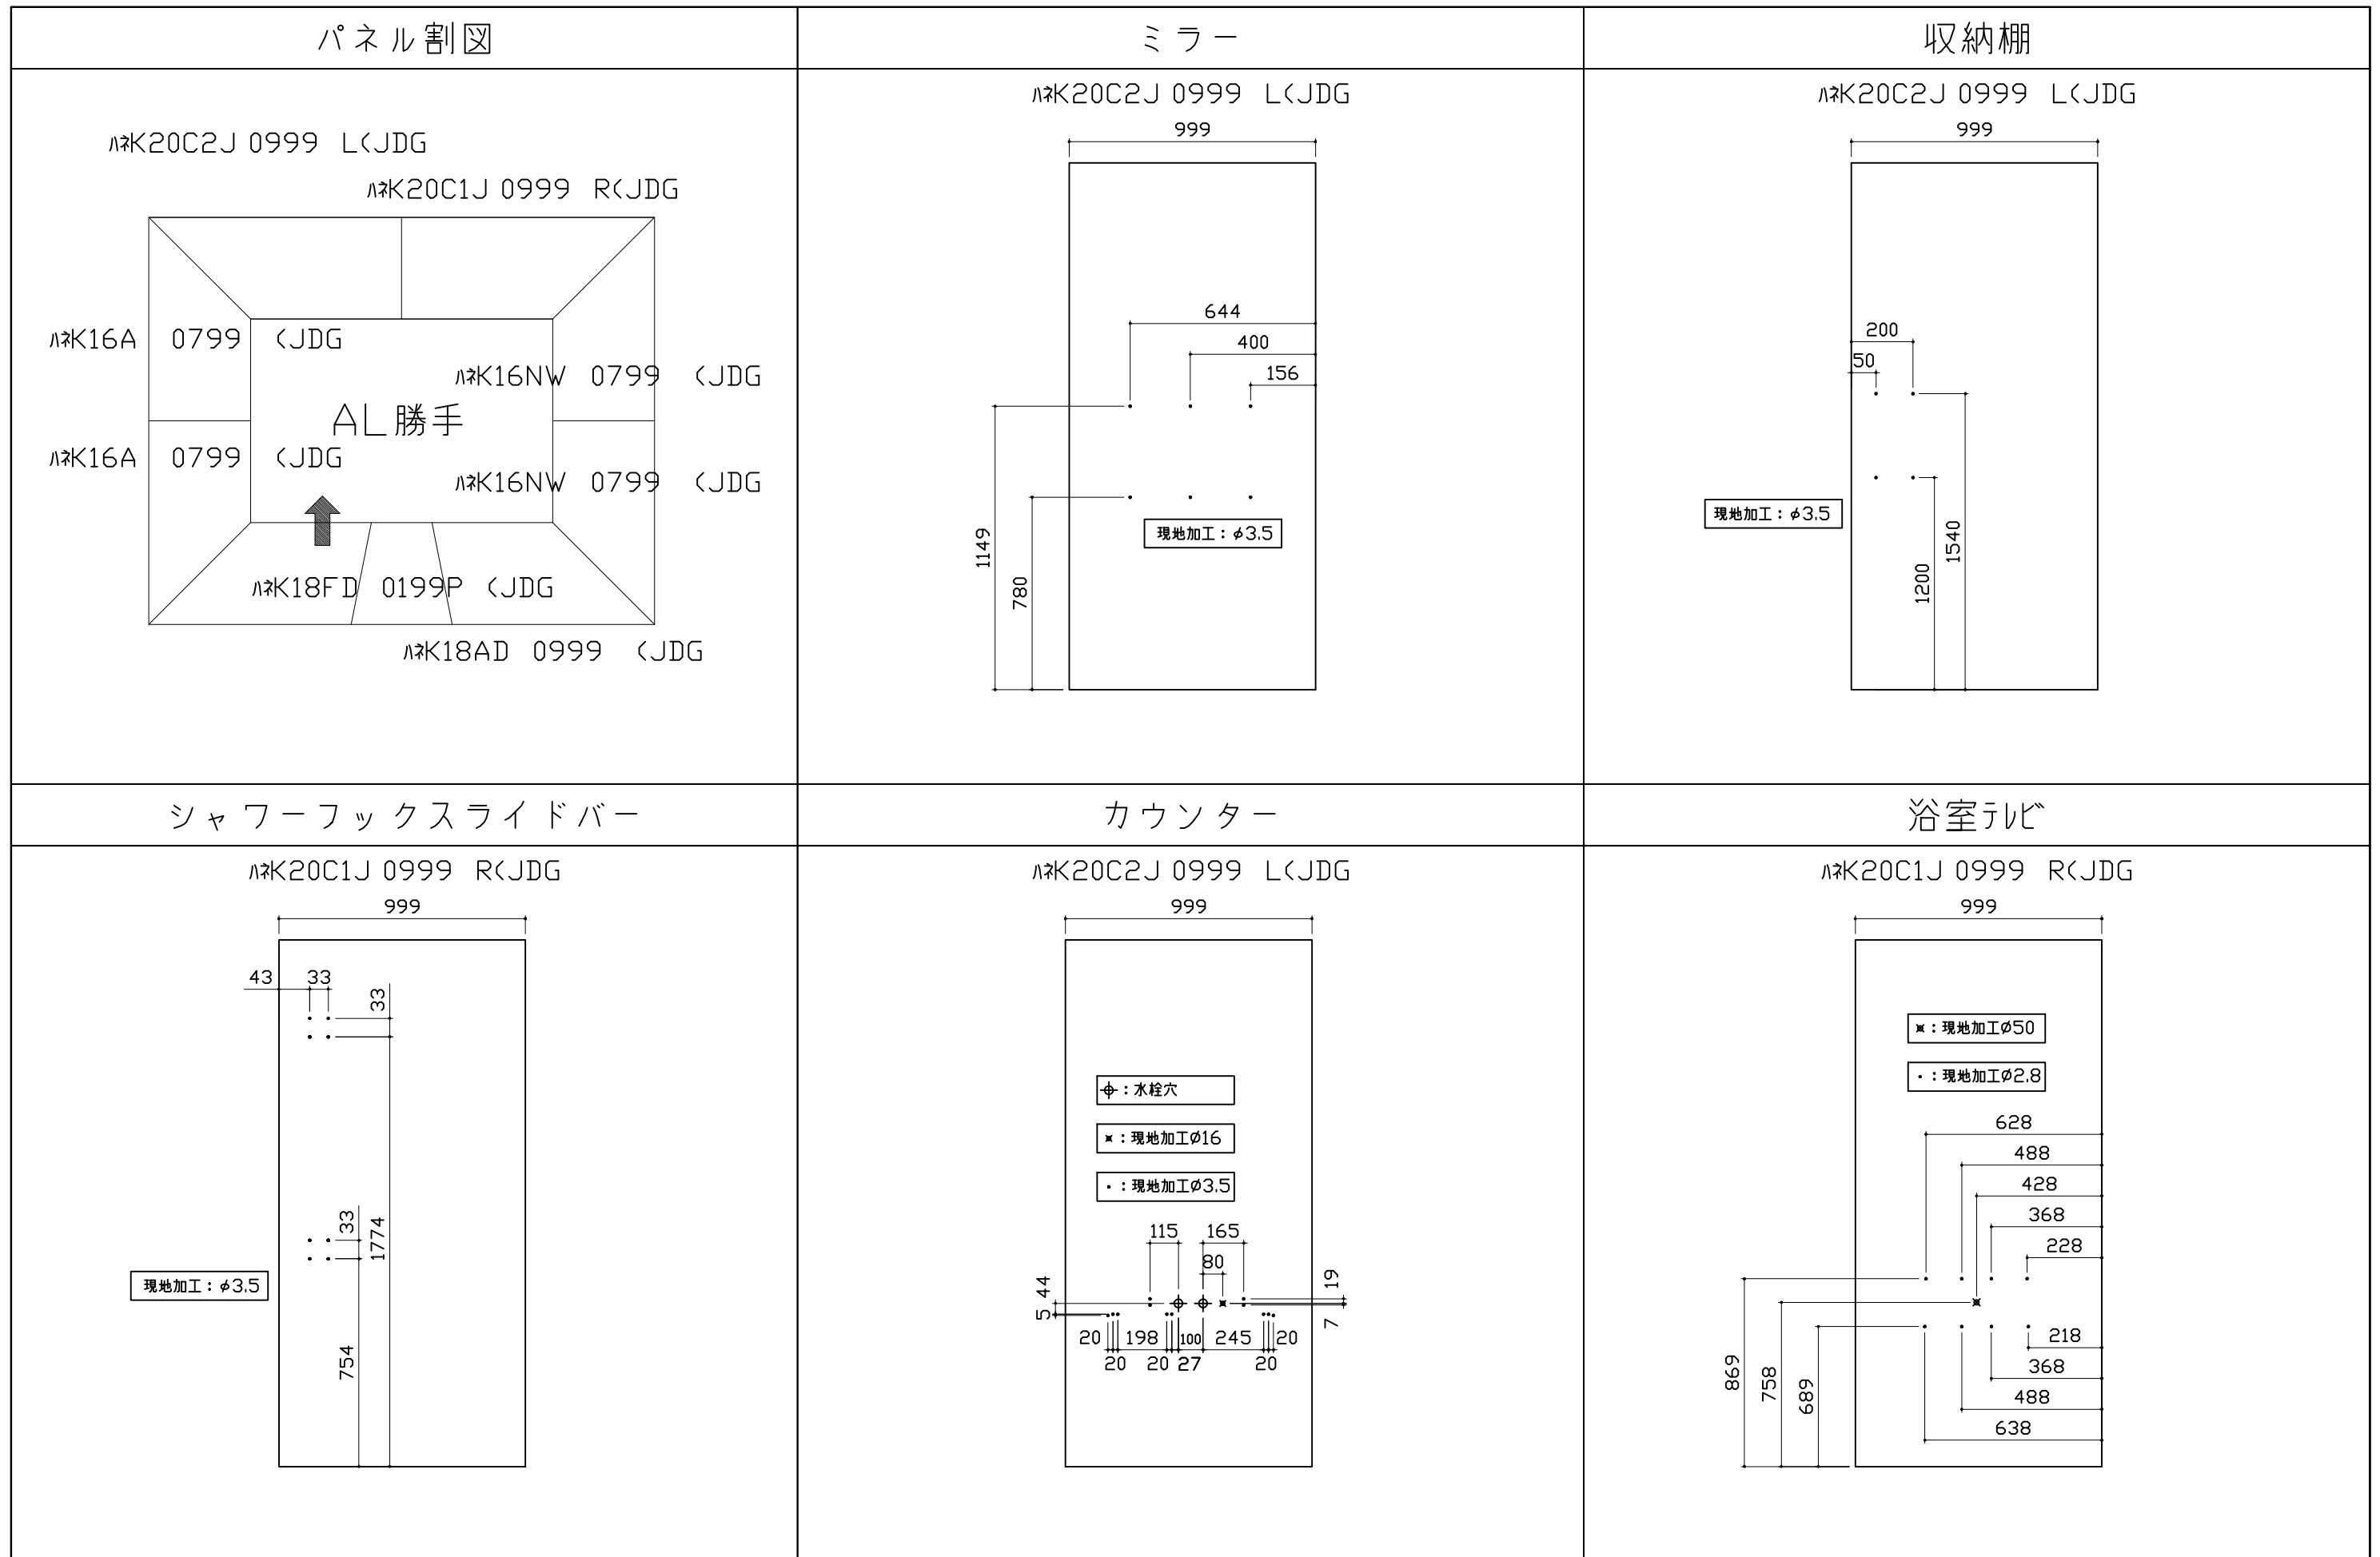

ランドリーパイプ


ハネK18AD 0999 <JDG

ハネK20C1J 0999 R<JDG

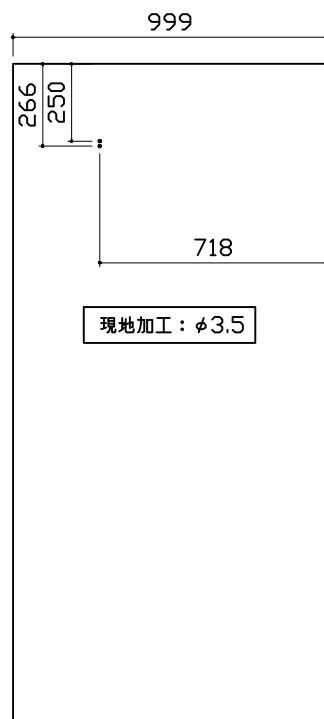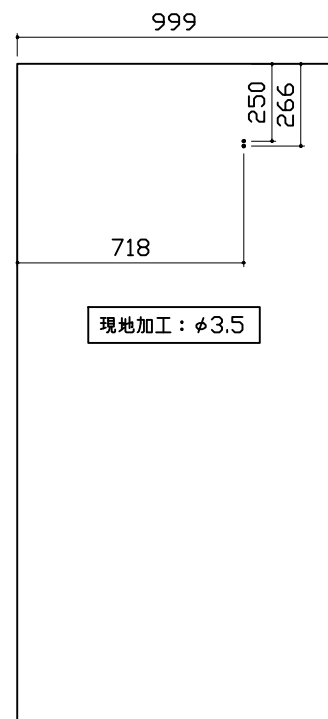

タオル掛け

ハネK16A 0799 <JDG

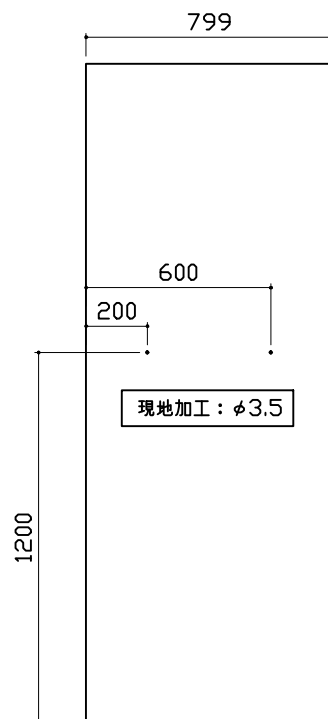

■留意事項  
ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。
