

システムバス 御見積書

御名前 ★大阪-大阪SR SB14 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランspa

作成日 2025年8月26日
プラン番号 1801A-2505-0854T
現場番号 C4529628

タカラスタANDARD株式会社
◆大阪支社 販売課
大阪府東大阪市長田東2丁目4番33号
TEL 06-6746-6815 / FAX 06-6746-6805

◆大阪ショールーム
TEL 06-6746-2311 / FAX 06-6746-1246

商品
御見積金額 ￥1,021,000 (税込 ￥1,123,100)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥162,500 (税込 ￥178,750)
《参考》別途 現場配送費 ￥0 (税込 ￥0)

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様 ★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

《システムバス》

ユニットサイズ	1620(BL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームホワイト
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	クリスタルパールホワイト
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ホワイト / ホワイト
浴槽前カウンターカラー	ー
エブロン材質/カラー	ステンレス / ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ウォルナットグレイジュ
パネルカラー(周辺)	ウォルナットグレイジュ
ガス種 / 周波数	13A / 60Hz

◆ 御確認事項

上記商品ご発注の際は、右枠内にユーザー様もしくは元請業者様の捺印が必要です。
発注後の仕様・カラー変更は出来かねますのでご確認の上捺印宜しくお願い致します。
☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご発注の際には、弊社支店営業所等へお問い合わせ、またはカタログにて御確認お願い致します。
■システムバスは受注生産品の為、約3-4週間の納期をいただきます。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
SB14	ウォルナットグレイジュ	田中

◆ 備考

--	--

No.*

御名前 ★大阪-大阪SR SB14

様

現場番号

C4529628

プラン番号

1801A-2505-0854T

作成日

2025/8/26

御見積明細 システムバス

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1620サイズ		1	856,000	856,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	開き戸<800幅>(ホワイト)／強化ガラス(透明)(20サイズ)	1	+47,500	+47,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドアオプション部材	ドア外タオル掛け(開き戸専用)/ブラケット:クロムメッキ	1	+9,000	+9,000
6	ドア位置変更	B勝手・移動なし・周辺ハイクラス・800幅ドア	1		
7	洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームホワイト)	1		
8	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
9	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(クリスタルパールホワイト)	1		
10	浴槽追焚き穴	あり	1		
11	エプロン	カラスステンレス(保温材あり)(ホワイト)	1		
12	浴槽形状	人大ワイド浴槽(ベンチ付)	1		
13	ヘルシージェット	なし	1		
14	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
15	うるぽか湯	なし	1		
16	オートウォッシュ	なし	1		
17	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
18	浴槽パン	あり	1		
19	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB181-5UTH	1		
20	洗い場用水栓	ヒロカルシャワー:SB181-5UTHB1HK	1		
21	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
22	カウンター	人造大理石カウンター	1		
23	シャワーフックスライドバー	あり	1		
24	浴室パネル	ハイクラス(全面デザイン 周辺ハイクラス)(Kパネル)	1	+40,000	+40,000
25	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
26	天井	カラーフラット天井(ベージュ)	1		
27	換気機器	天井換気扇ホワイト	1		
28	換気機器開口	工場開口	1		
29	照明	ストレートライン照明(昼白色)	1	+41,000	+41,000
30	天井照明開口	工場開口	1		
31	ミラー	横長クリアミラー	1	-1,000	-1,000

御名前 **★大阪-大阪SR SB14** 様

現場番号	C4529628	プラン番号	1801A-2505-0854T	作成日	2025/8/26
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	風呂フタ	断熱風呂フタ	1	+3,000	+3,000
33	タオル掛け	クリアタイプ クリア	1	+3,000	+3,000
34	収納棚	クリアタイプB(2段)	1	+4,000	+4,000
35	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
36	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
37	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			37		¥1,021,000

商品総合計	37	¥1,021,000
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費

¥162,500 (税込 ¥178,750)


《参考》別途 現場配送費

¥0 (税込 ¥0)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

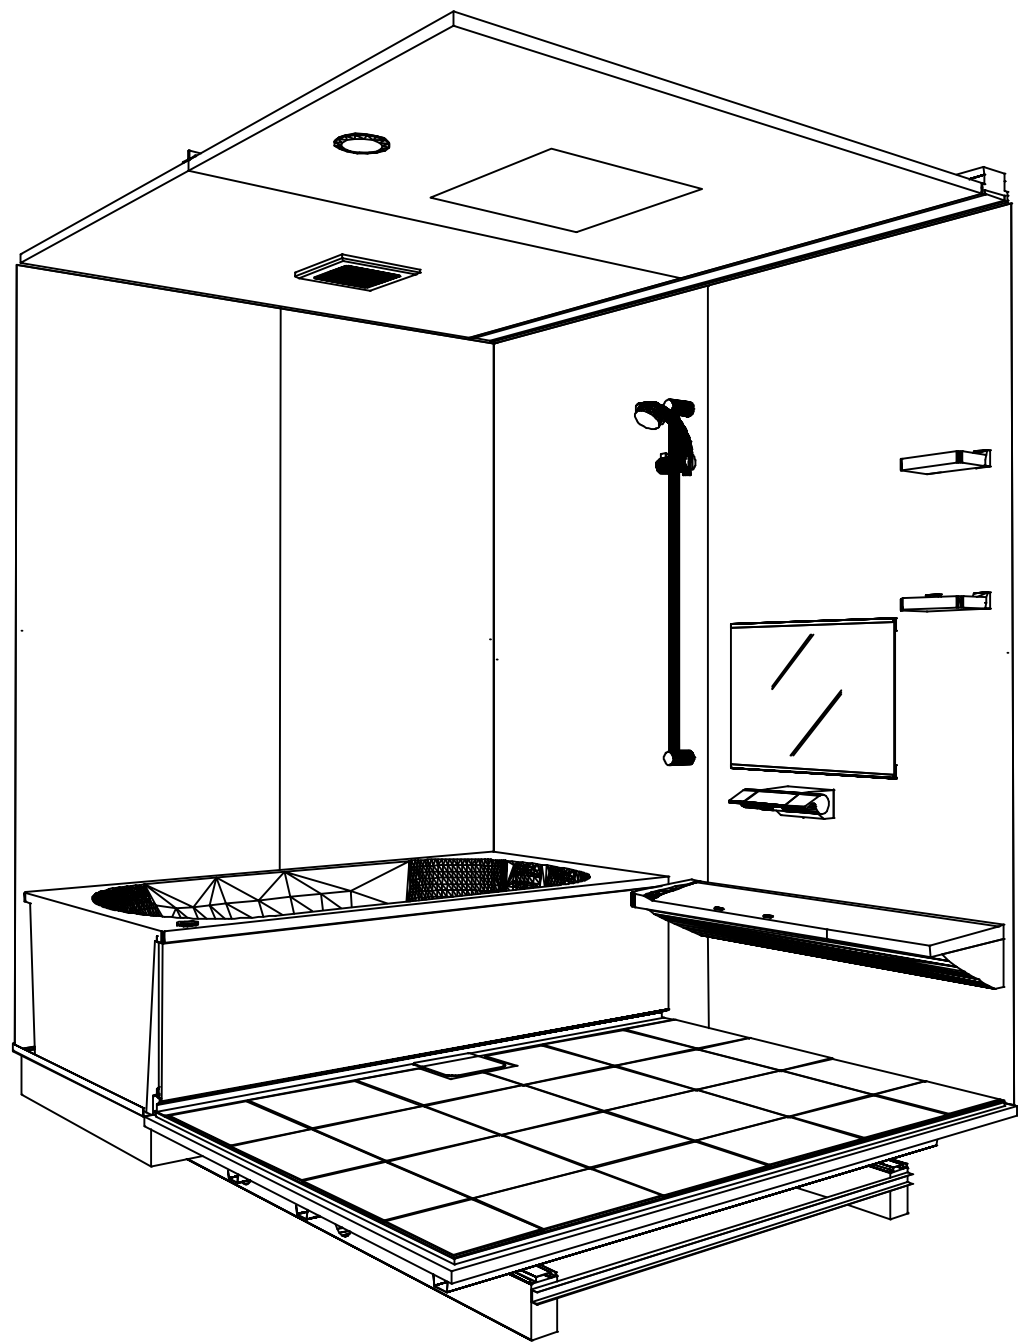

鳥瞰図

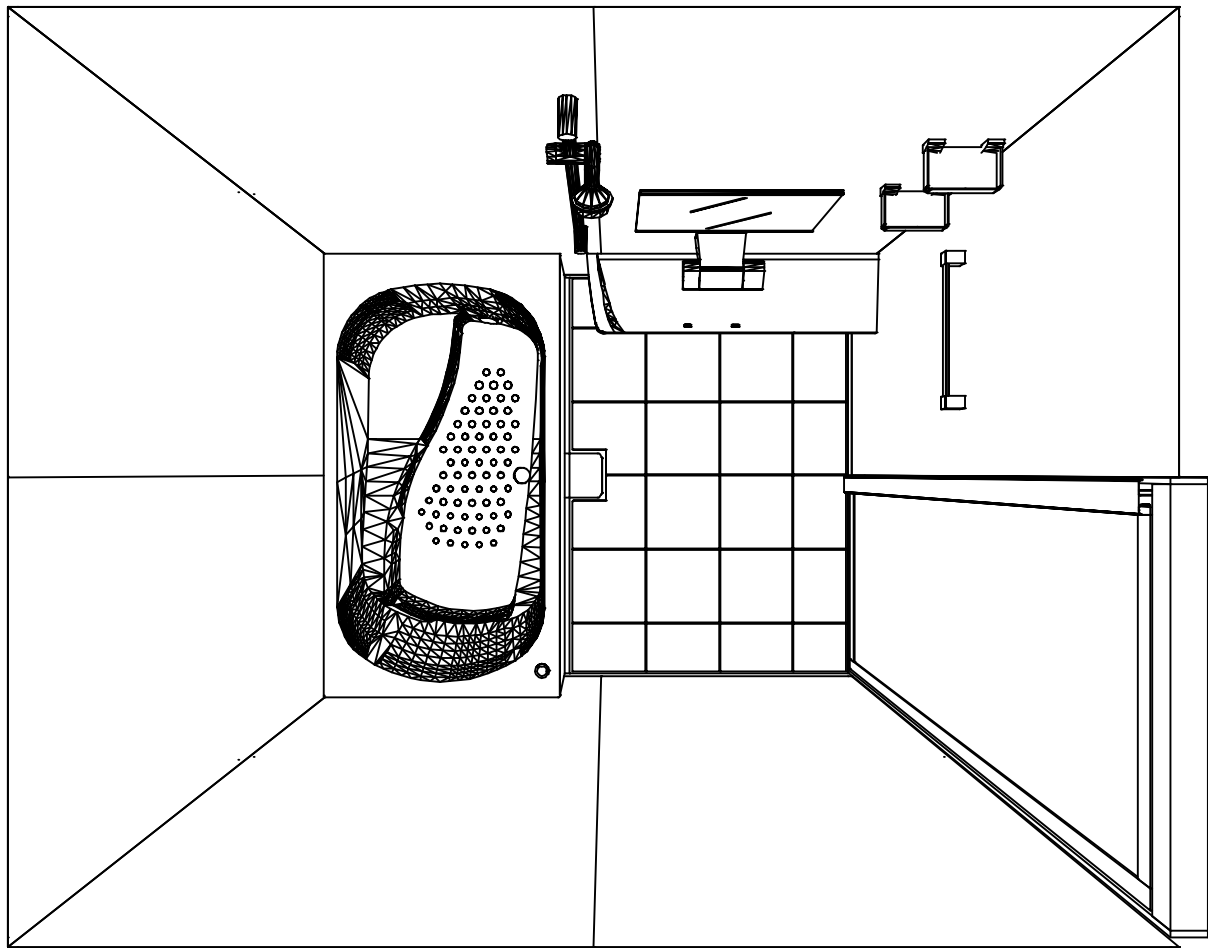

1620

フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： ★大阪ー大阪SR SB14様邸	GRANSPA グランspa	姿図	
現場番号： C4529628	プラン番号： 1801A-2505-0854T	作成日： 2025年8月26日	
大阪支社 販売課	担当営業：SB14	担当アドバイザー： ウォルナットクレージュ	

カウンター面


浴槽側面

洗場側面



カウンター対面

■ 留意事項

* 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

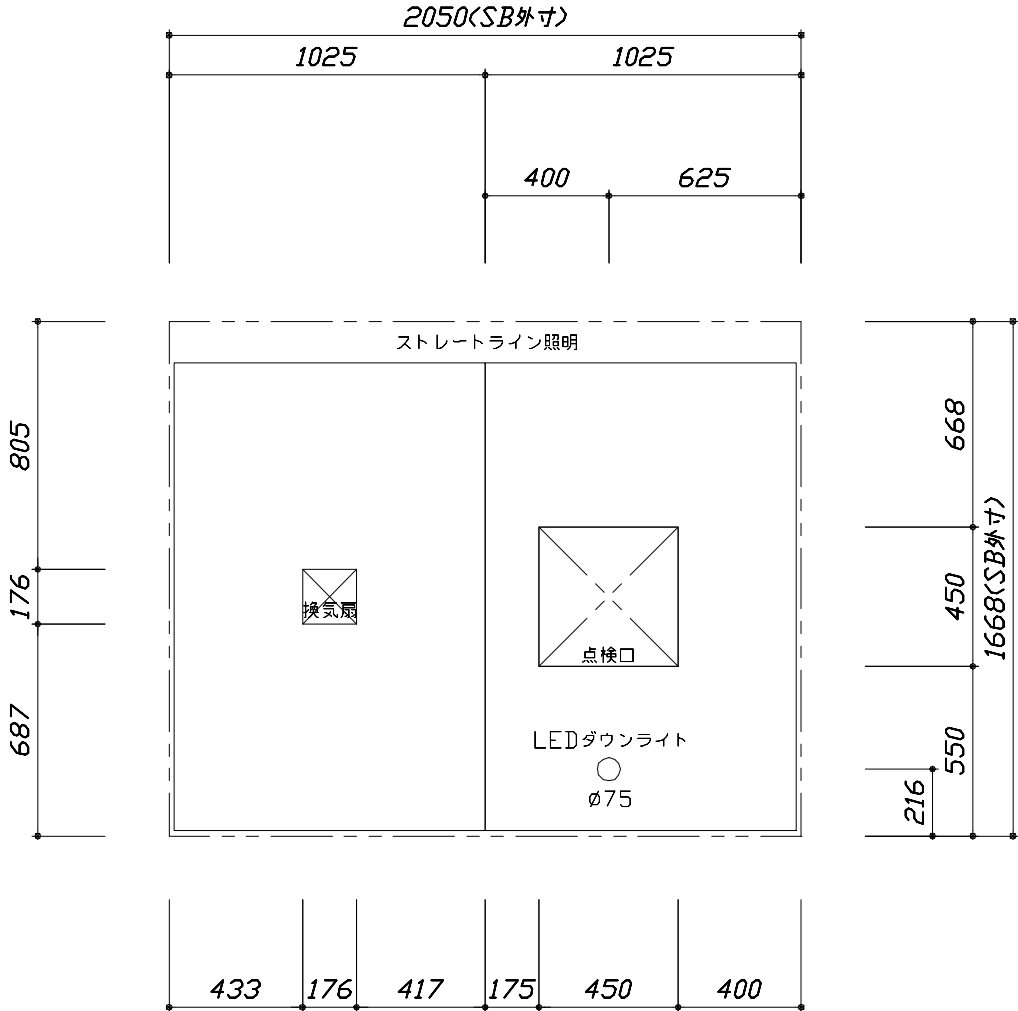


<天井伏図>

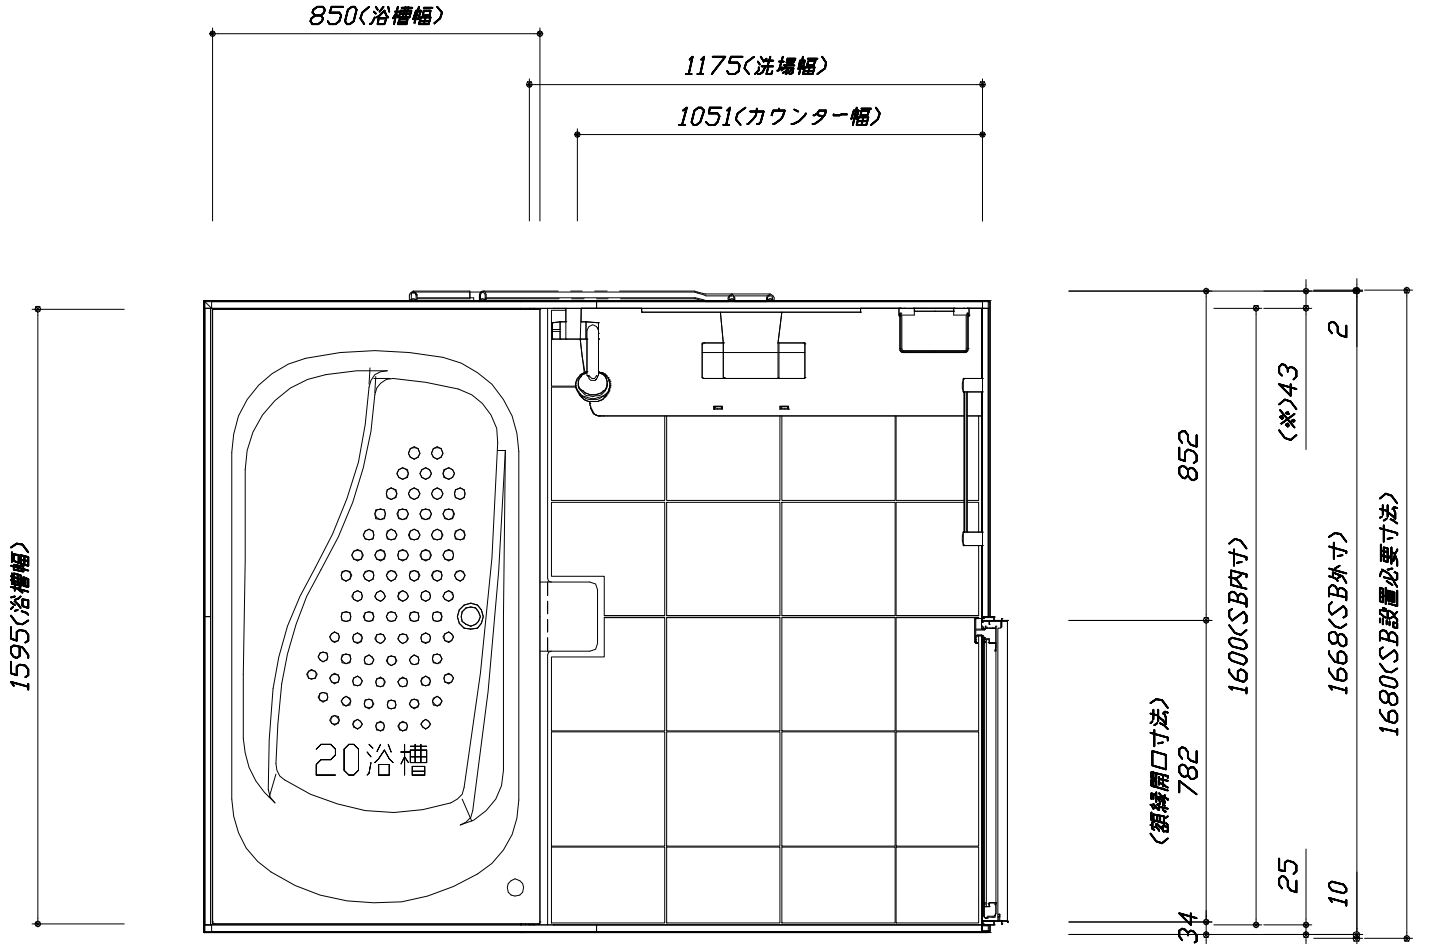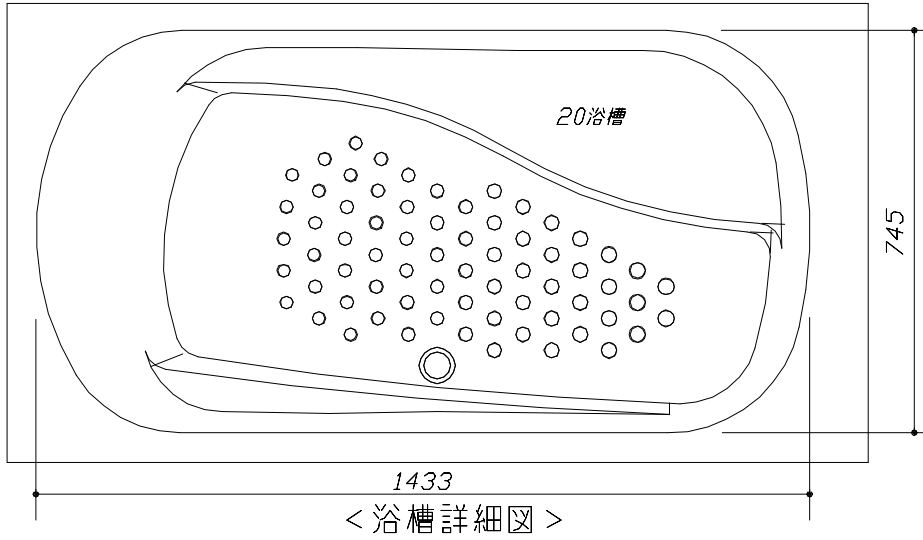

<平面図>

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。


- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

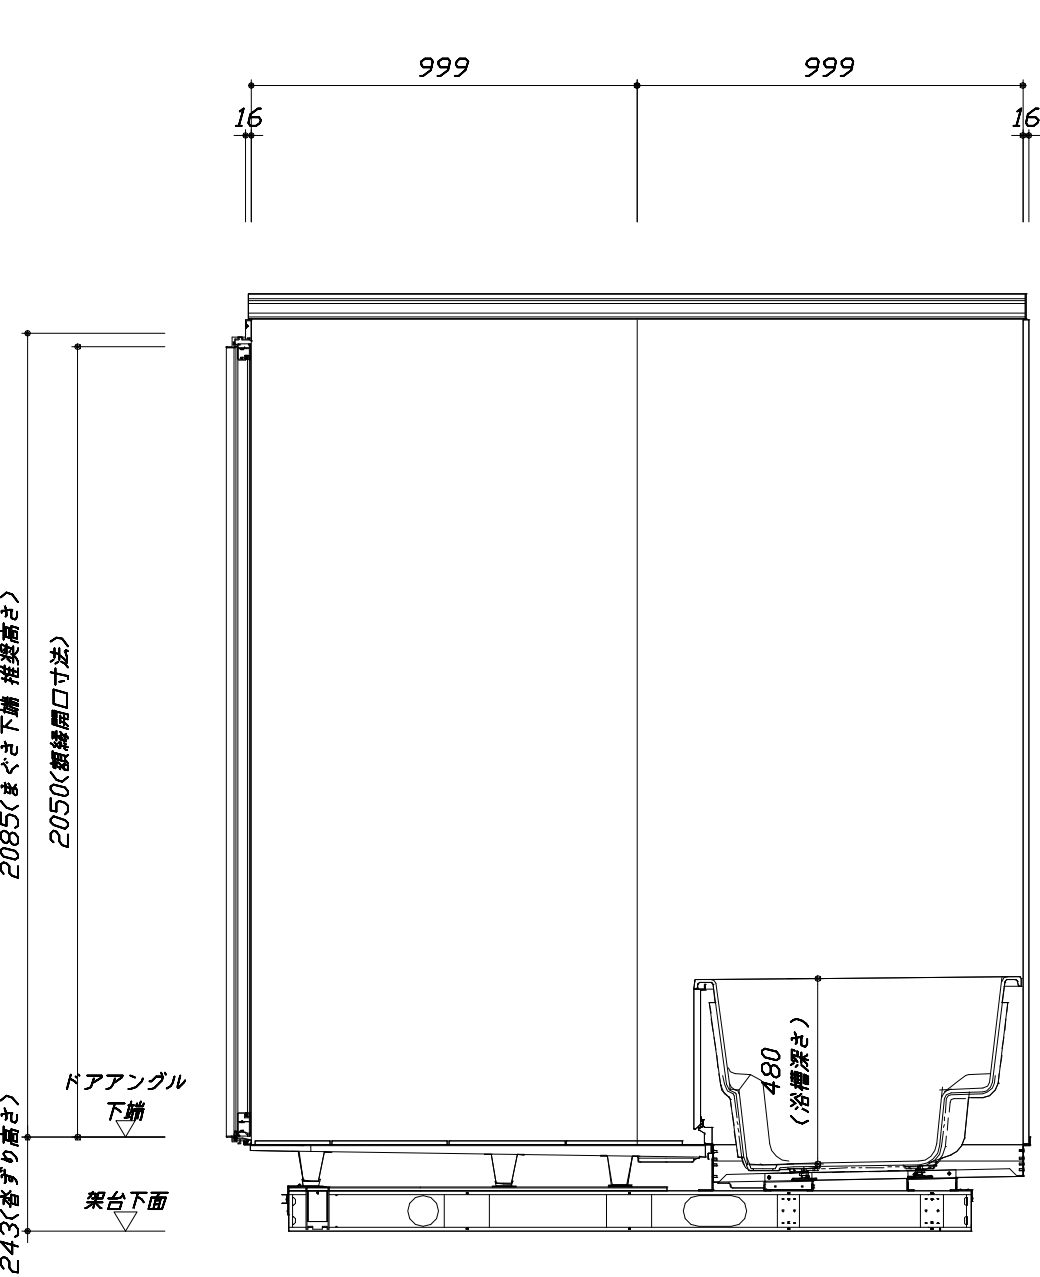

洗い場水上 (SBFL)
からの浴槽深さ
418

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

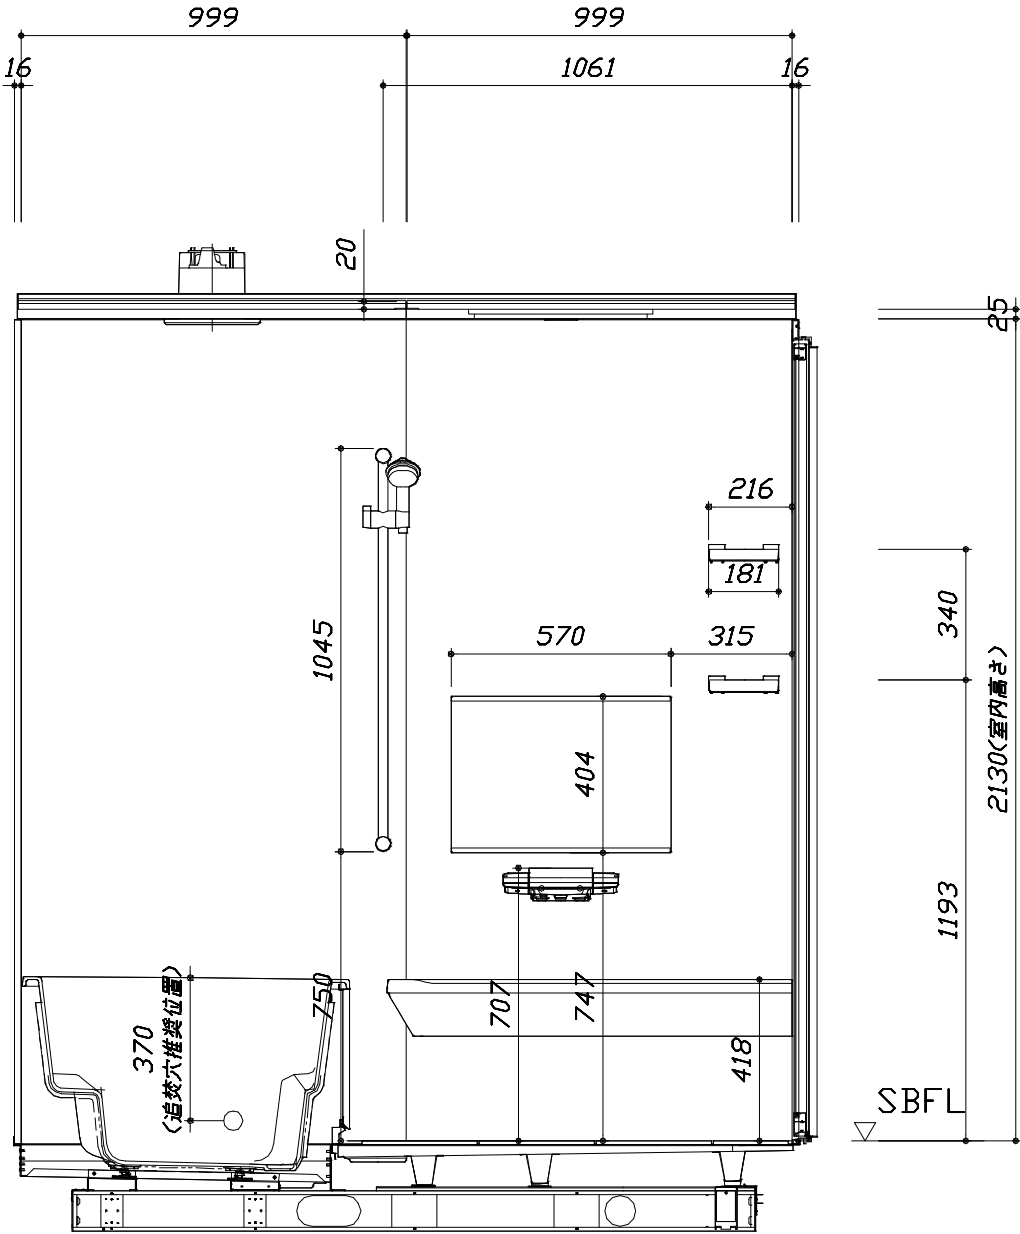

<カウンター面図>


Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： ★大阪ー大阪SR SB14様邸
現場番号： C4529628
大阪支社 販売課

GRANSPA グランspa
プラン番号： 1801A-2505-0854T
担当営業： SB14

施工図2 縮 尺： 1:20
作成日： 2025年8月26日
担当アドバイザー： ウォルナットクレージュ

縮尺：A3サイズ等倍

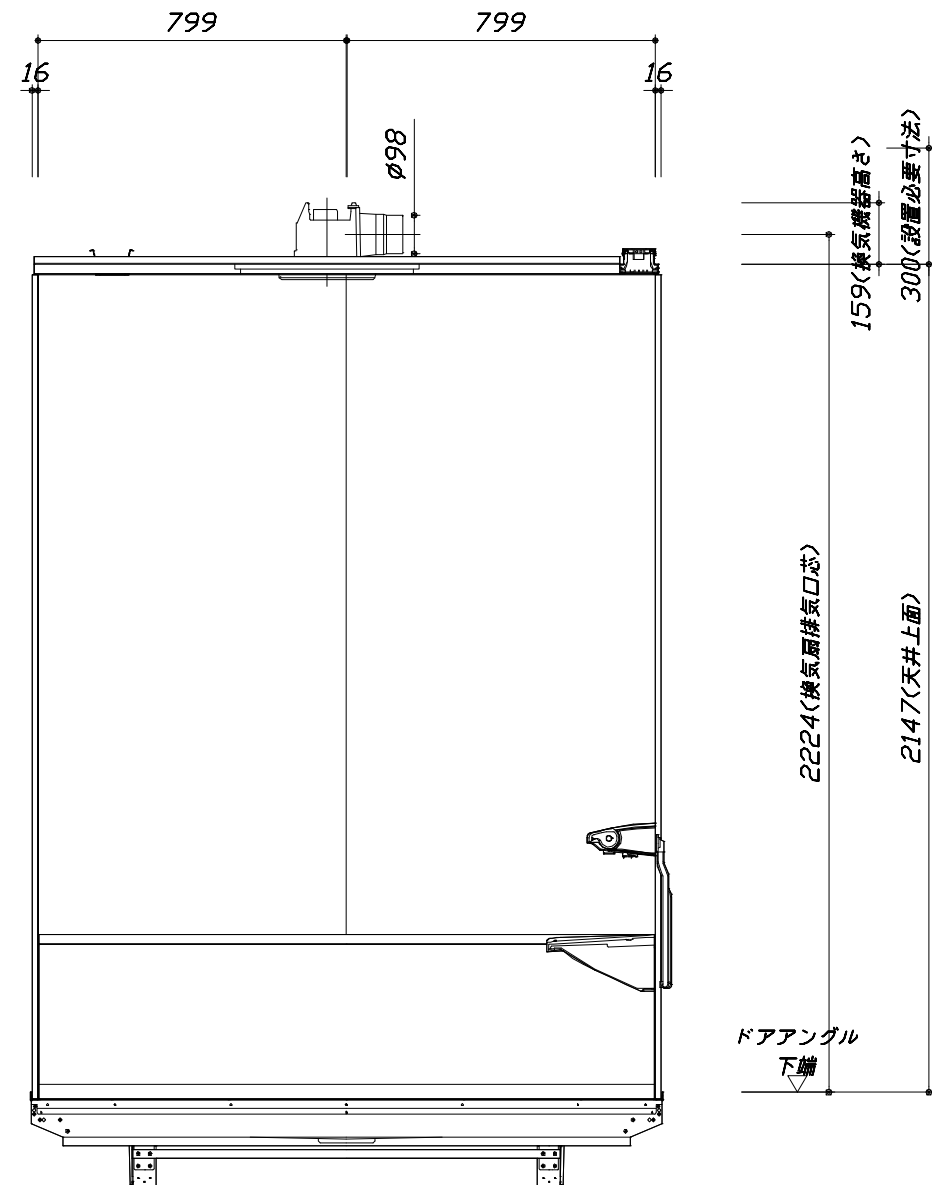

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

Takara standard

タカラスタンダード株式会社

現場名称： ★大阪-大阪SR SB14様邸	GRANSPA グランSPA	施工図3	縮 尺： 1:20
現場番号： C4529628	プラン番号： 1801A-2505-0854T	作成日： 2025年8月26日	
大阪支社 販売課	担当営業：SB14	担当アドバイザー： ウォルナットクレシゅ	

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1620サイズ(室内容量6.8立方メートル)
ドア勝手	BL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)（330リットル） 追い焚き穴:あり
浴槽パン	ステンレス
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	人造大理石カウンター：人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア:20高さ開き戸(アルミ框/飛散防止フィルム付強化ガラス/ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型換気口/ドア外装ル掛け付)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	洗い場：ＡＢＳ樹脂, 浴槽：ＡＳＡ樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	365kg

アクセサリ仕様表

ミラー	横長クリアミラー くもり止め加工
収納棚	クリアタイプB：AS樹脂製（2段）
タオル掛け	クリアタイプ：アクリル樹脂製
洗場側水栓	サーモスタット(SB181-5UTHB1HK)（樹脂ホース:ﾏﾃﾞﾙ調）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ-TN-1020）
照明	ストレーライン照明（LED 20.3W昼白色）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W) (ﾀﾞｲｬﾐｰﾀﾞ径φ98) ホワイト
フロフタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	WN：クリスタルパールホワイト
カウンター	WA：ホワイト
ﾊﾟﾆｰﾙ(ｶｳﾝﾀｰ面)	YG：ウォルナットグレイジュ
ﾊﾟﾆｰﾙ(周辺・3面)	YG：ウォルナットグレイジュ
水栓上部ｶｳﾝﾀｰ	－
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	HW：カームホワイト
ドア / 天井	W：ホワイト / D：ベージュ
収納棚	クリアタイプB
タオル掛け	クリアタイプ(クリア)
ﾗﾝﾄﾞﾘｰセット	－

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： ★大阪－大阪SR SB14様邸	GRANSPA グランspa	仕様表	
	現場番号： C4529628	プラン番号： 1801A-2505-0854T	作成日： 2025年8月26日	
	大阪支社 販売課	担当営業：SB14	担当アドバイザー： ウォルナットグレイジュ	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分			参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』								
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査			
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事	
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
	1 2 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
			浴室用電源配線、接続工事					○		浴室機器の事後電気工事	
浴室天井裏の電源、スイッチ工事							○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。
- 貫通スリーブを使用する場合は45度エルボなどを接続し、バンドなどで固定してください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

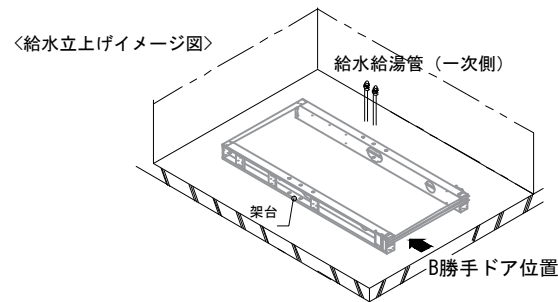

■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。



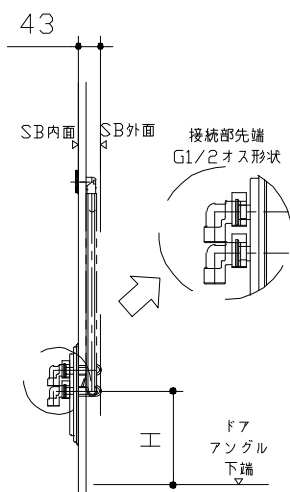
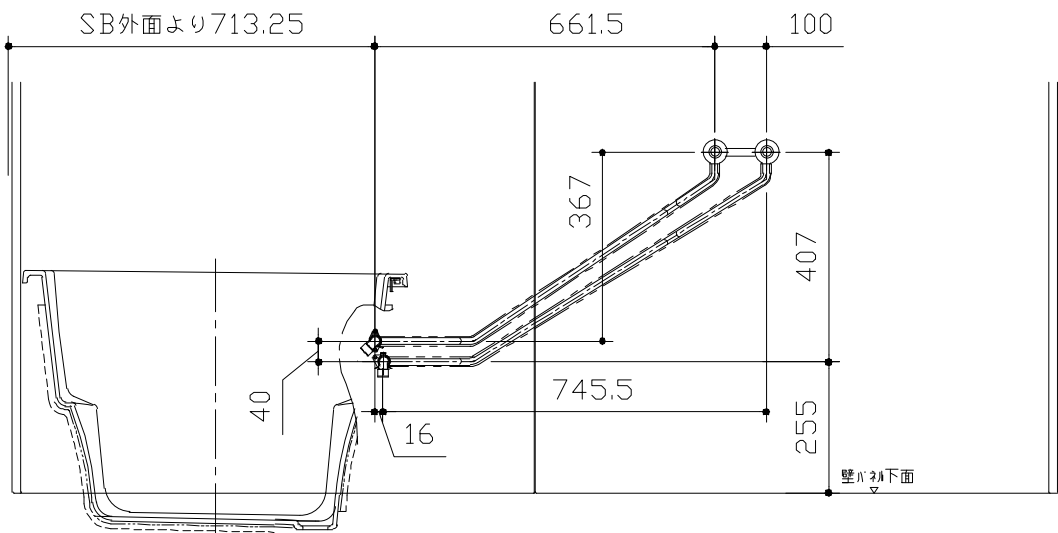


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230

＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置

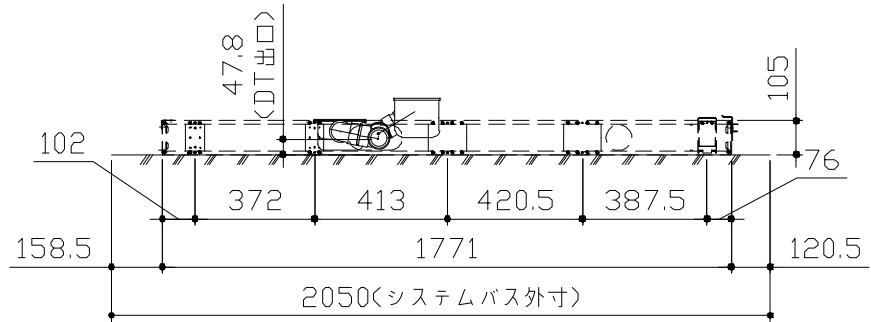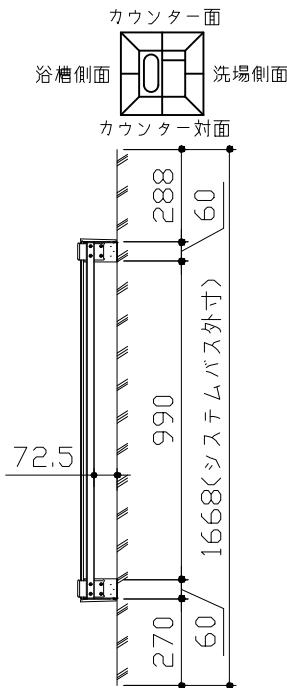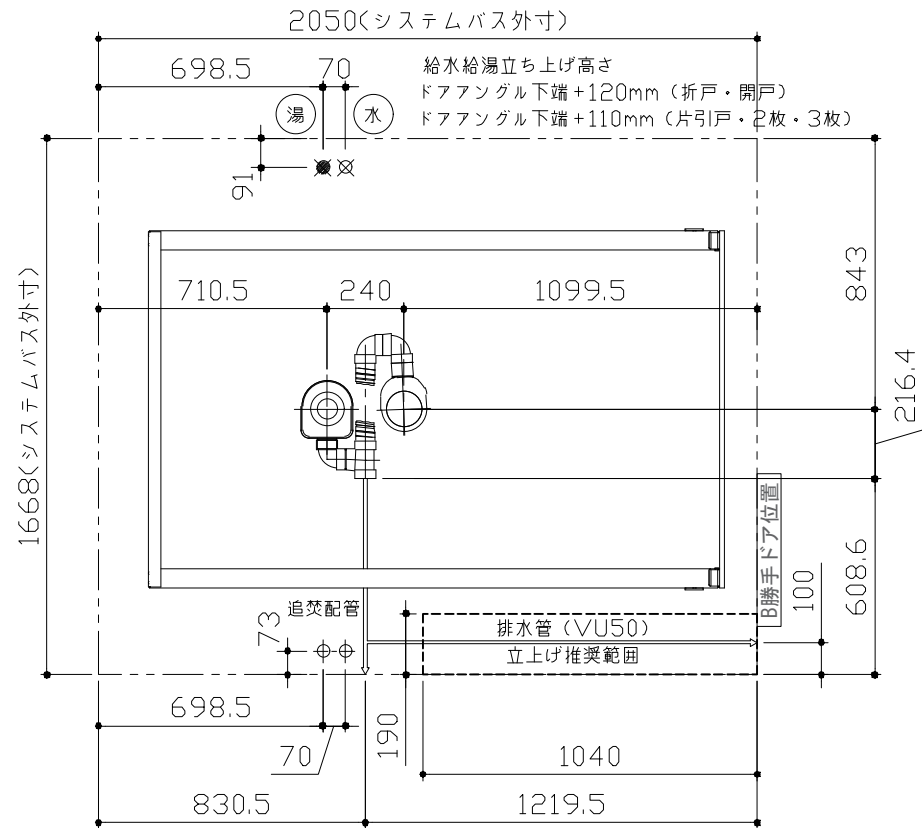

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞



■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

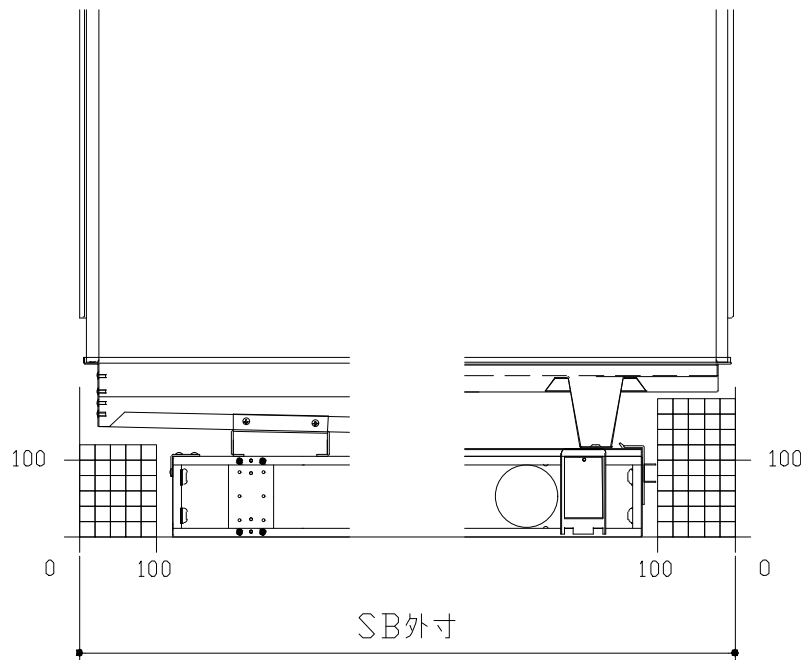


A矢視

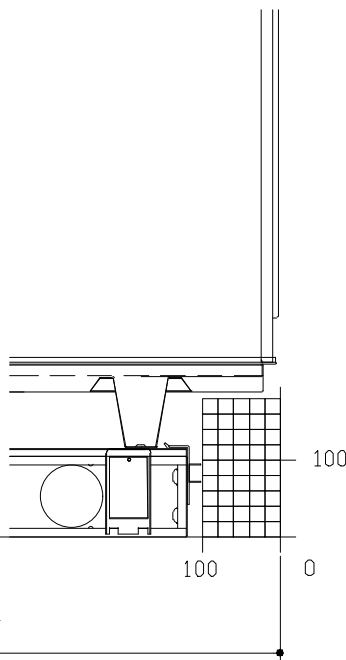


B矢視

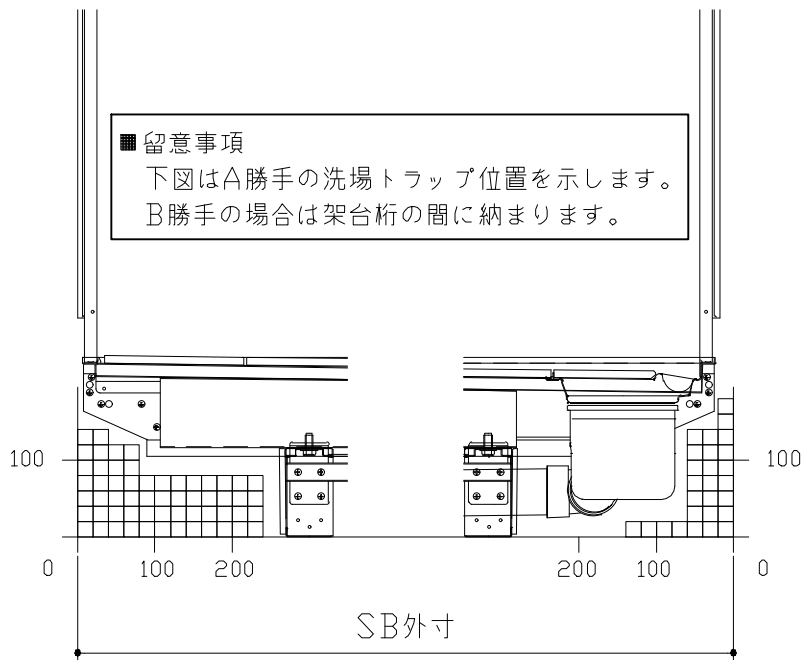


C矢視

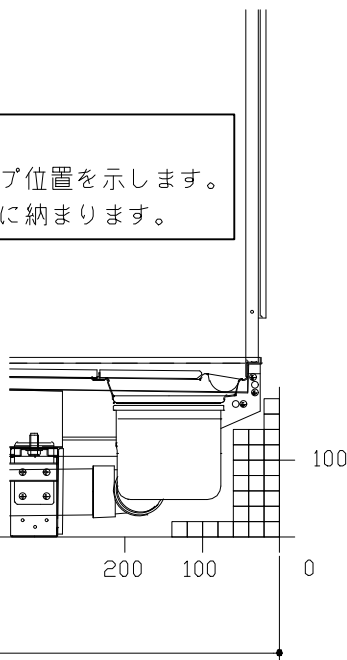

D矢視


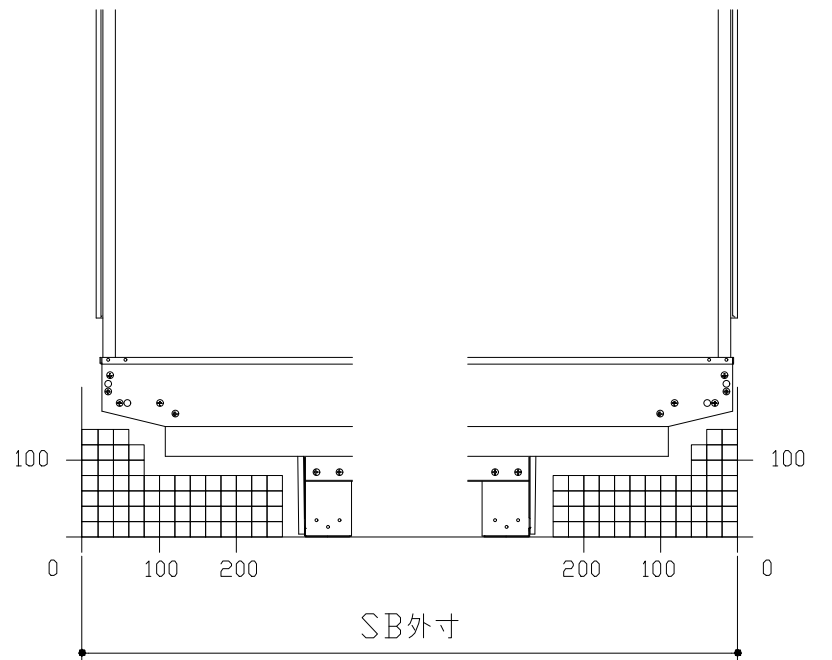


E矢視

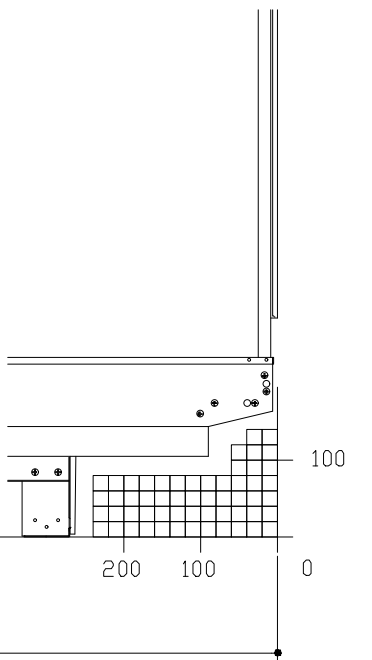


F矢視


キープクリーンドア：開き戸・タテ型換気口

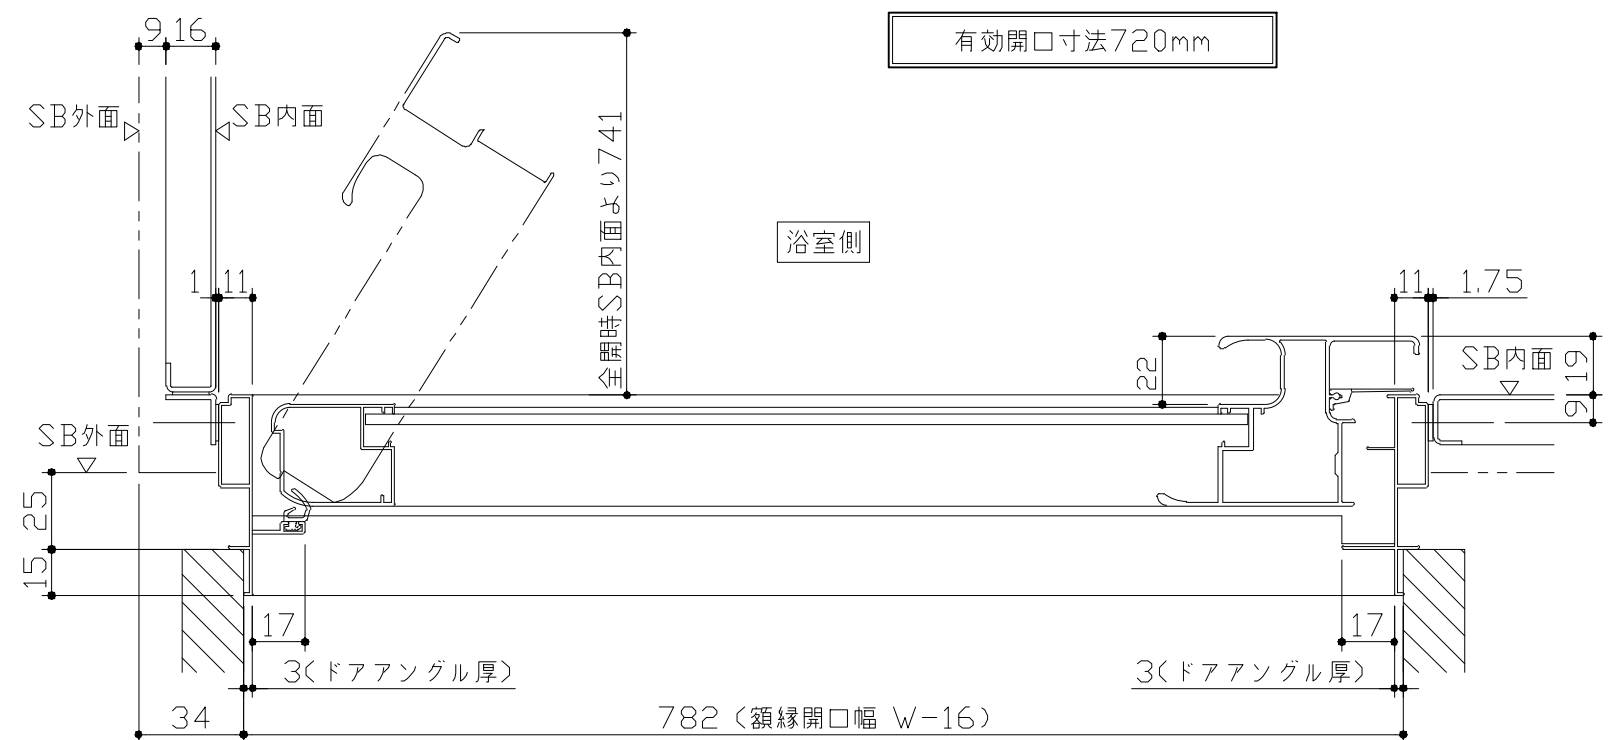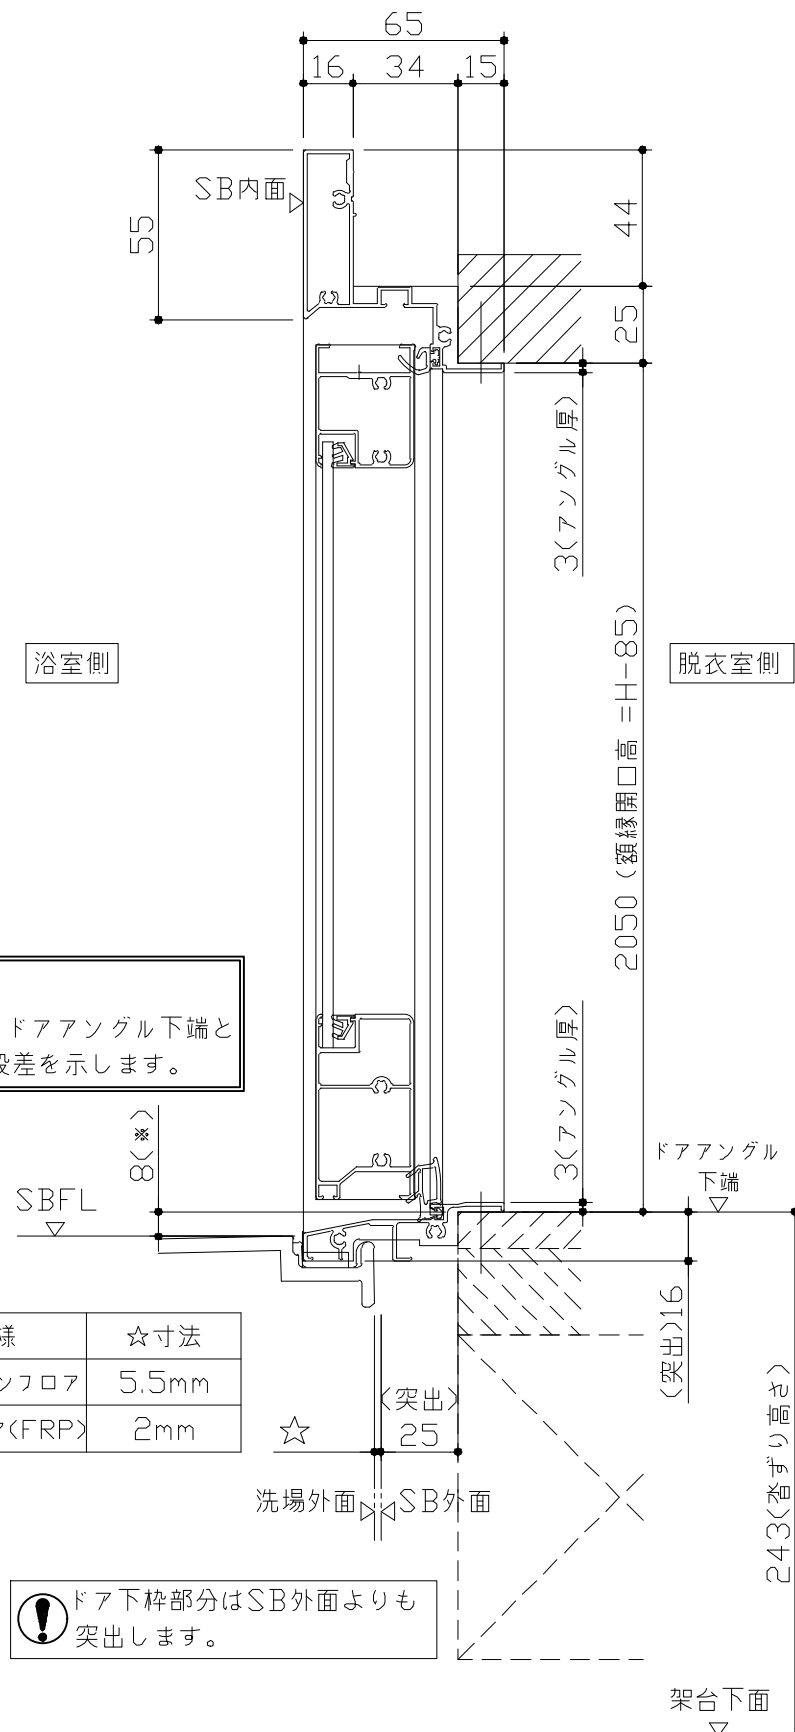

ドア開き角度65°以上でタオル掛けと
干渉の恐れがあります。

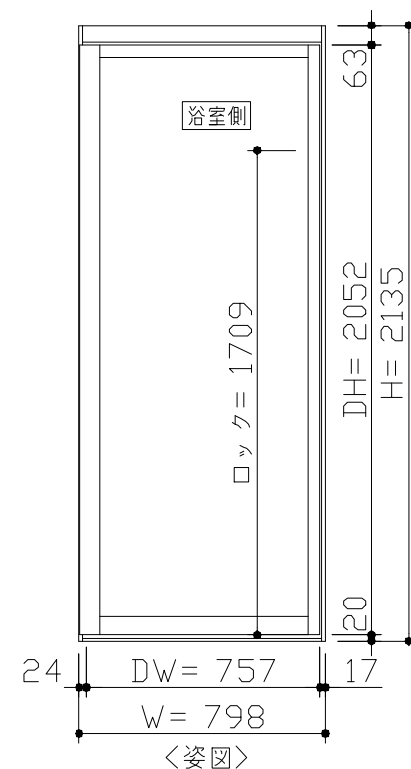



- ドアの開閉について
 ドアの開閉スペースにご注意ください。
 ユニットサイズや収納棚やカウンターなどの
 アクセサリーにより出入りに支障を感じる
 場合があります。

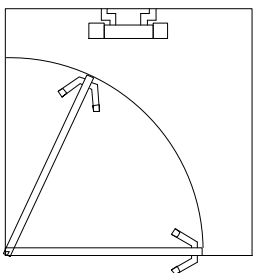

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉




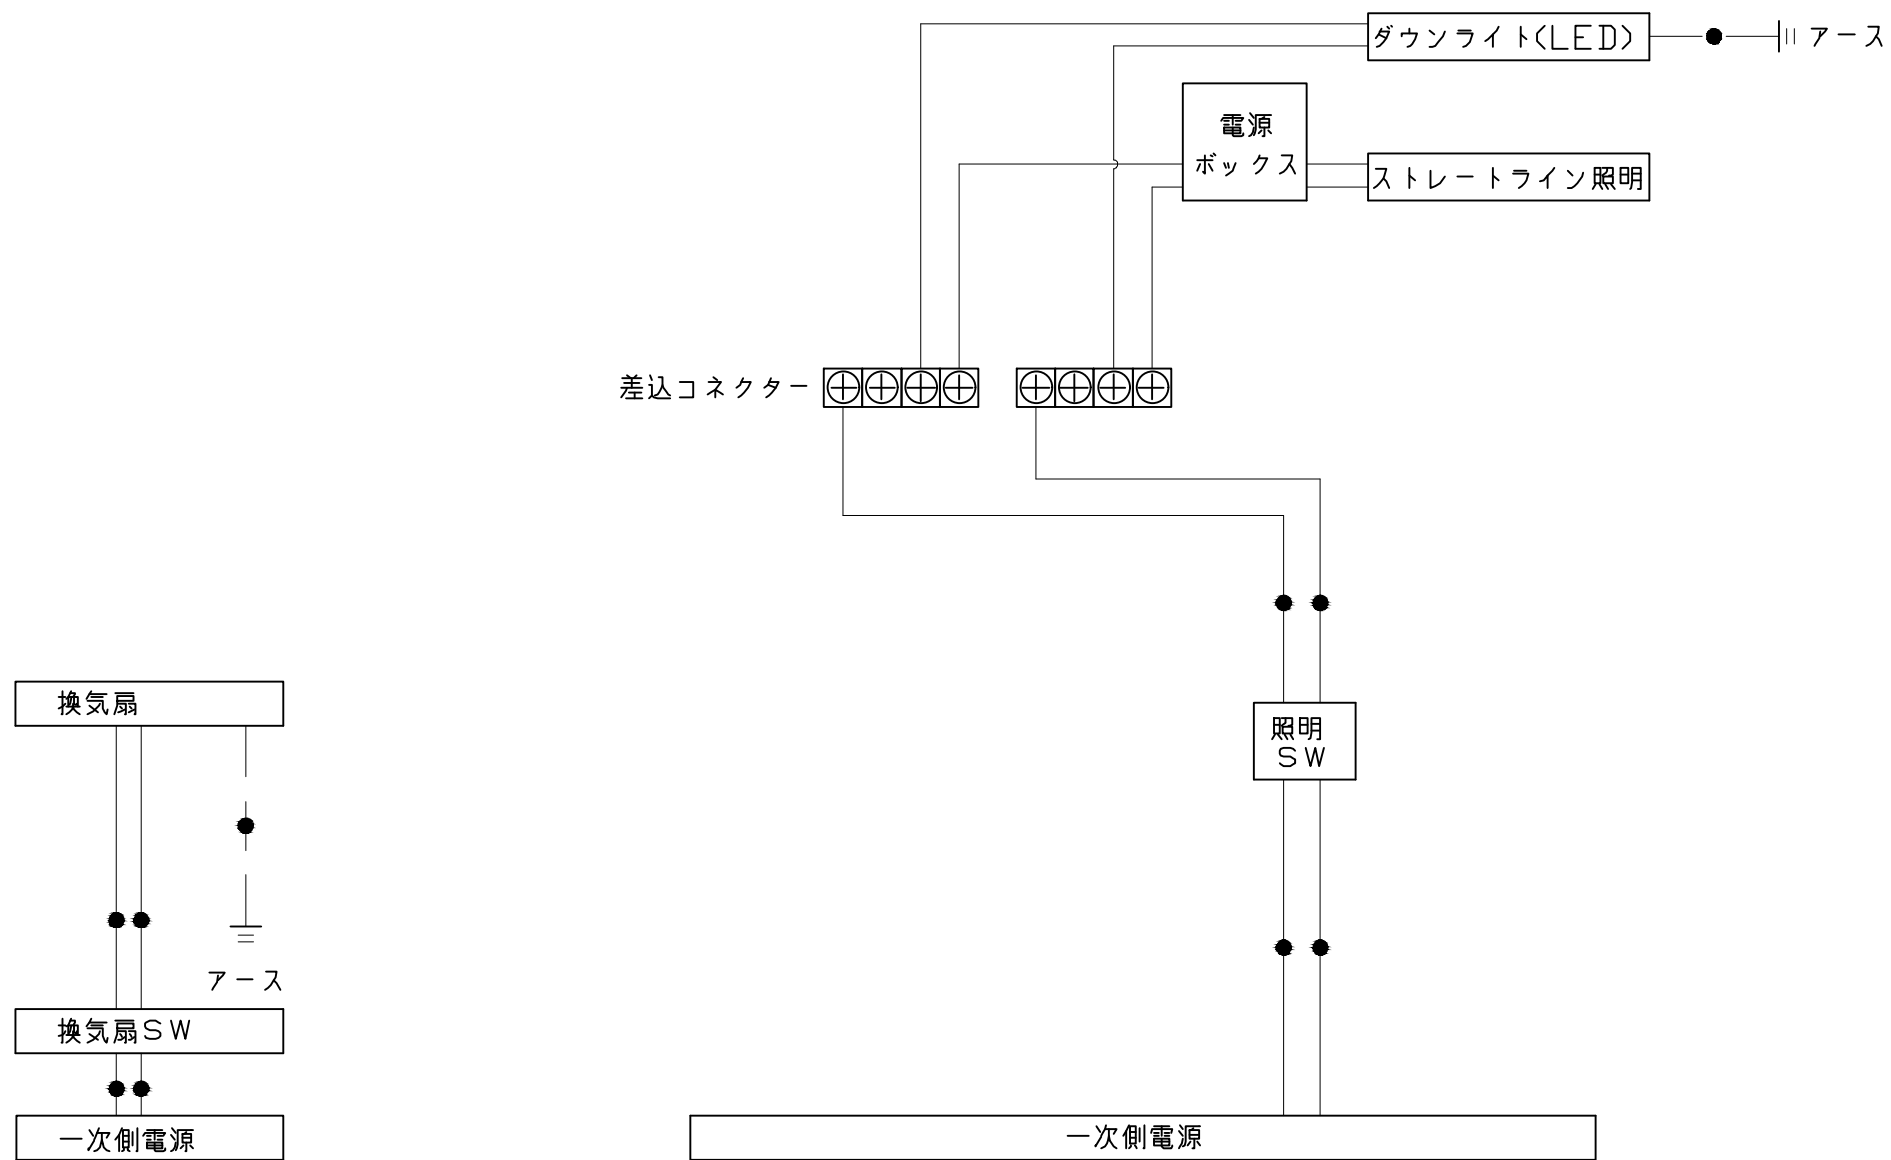

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。


アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

浴槽

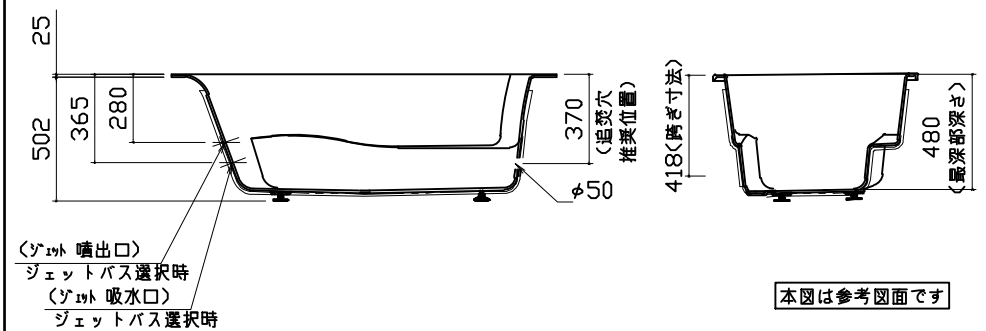

規格	SB	浴槽奥行寸法		
	奥行寸法	L	A	B
	1593	1520	32.5	54.5
	1618	1545	57.5	54.5
	1643	1570	82.5	54.5
	1668	1595	107.5	54.5
	1693	1620	120	67
	1718			
	1743			
	1768			
1793				
1818				
1843				
1868				


洗い場用水栓

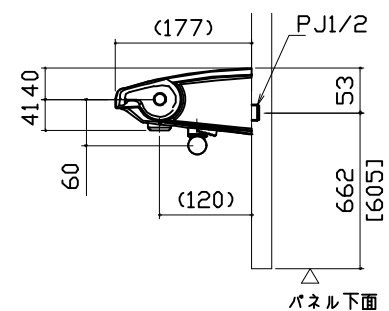[illegible]


照明

Technical drawing of the 天井下付金具 (Under-hanging bracket). The drawing shows a top view with a diameter of 75mm for the 天井開口 (Duct opening) and a bottom view with a diameter of 85mm. A vertical dimension of 3mm is indicated for the base thickness. The drawing shows a bracket with a hook and a screw for mounting.

換氣機器









シャーフックスライドバー

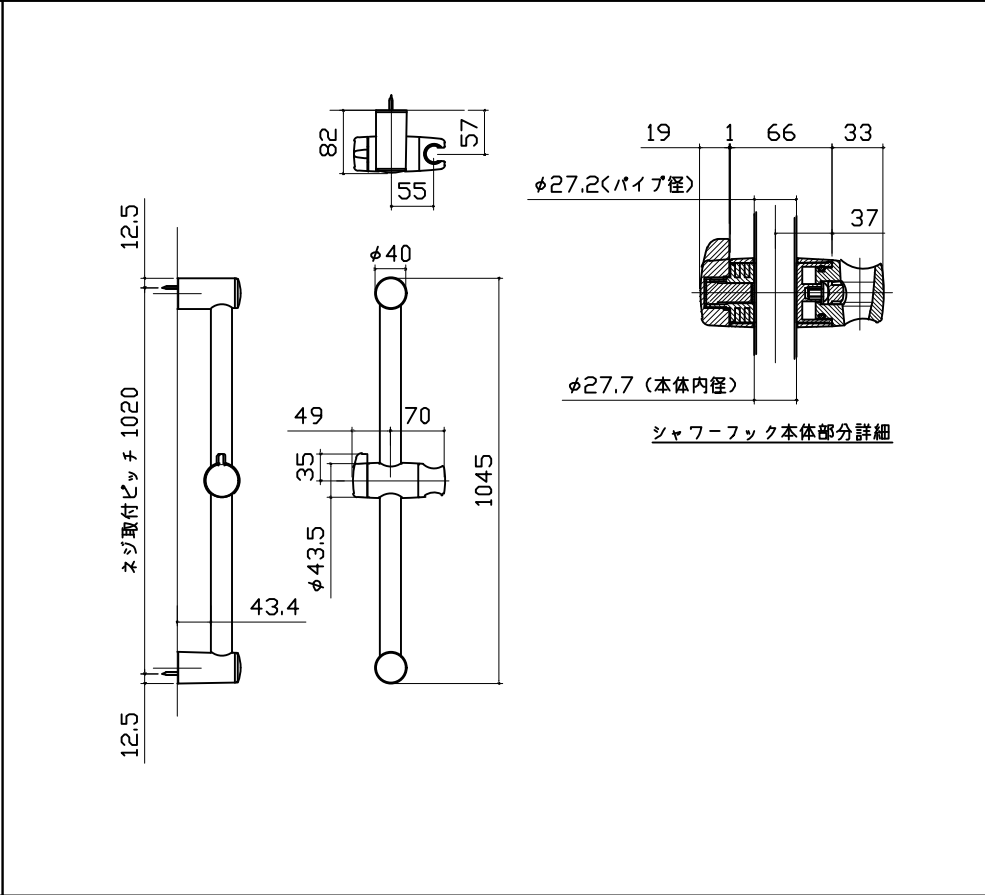


ミラー


[illegible]

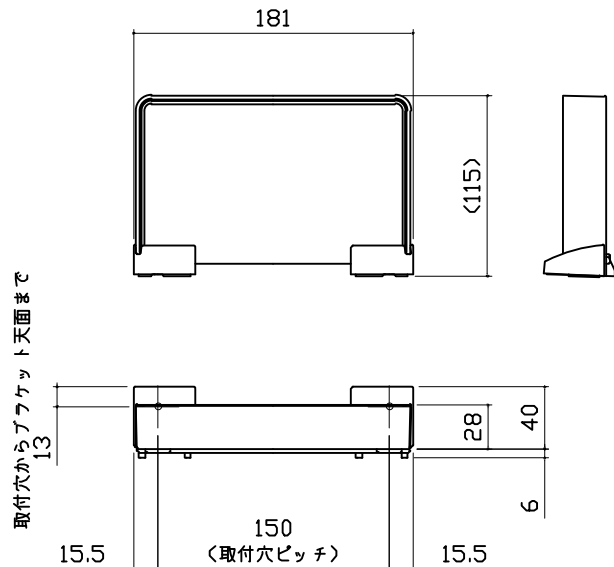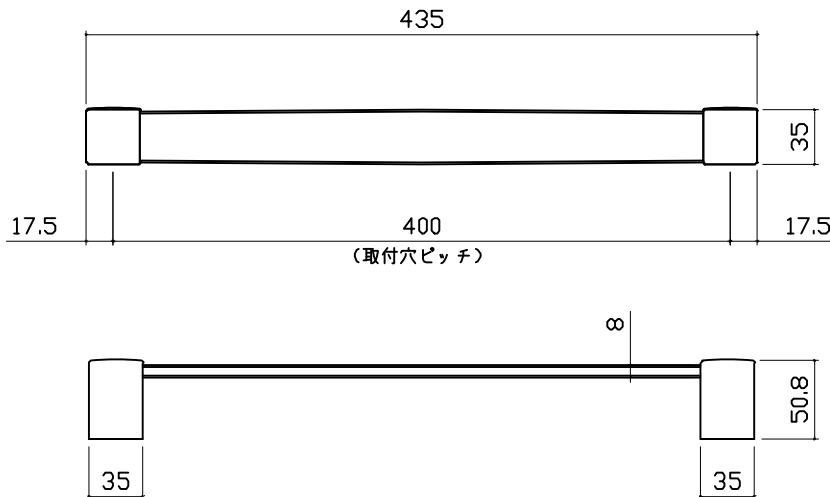
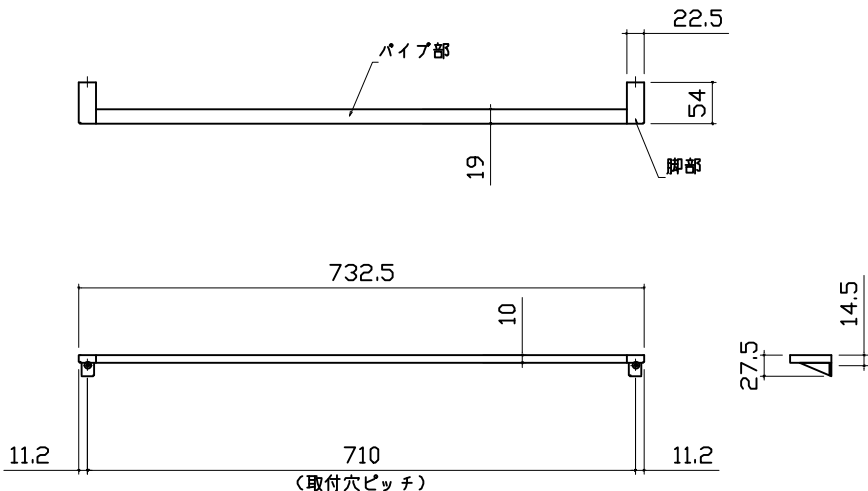
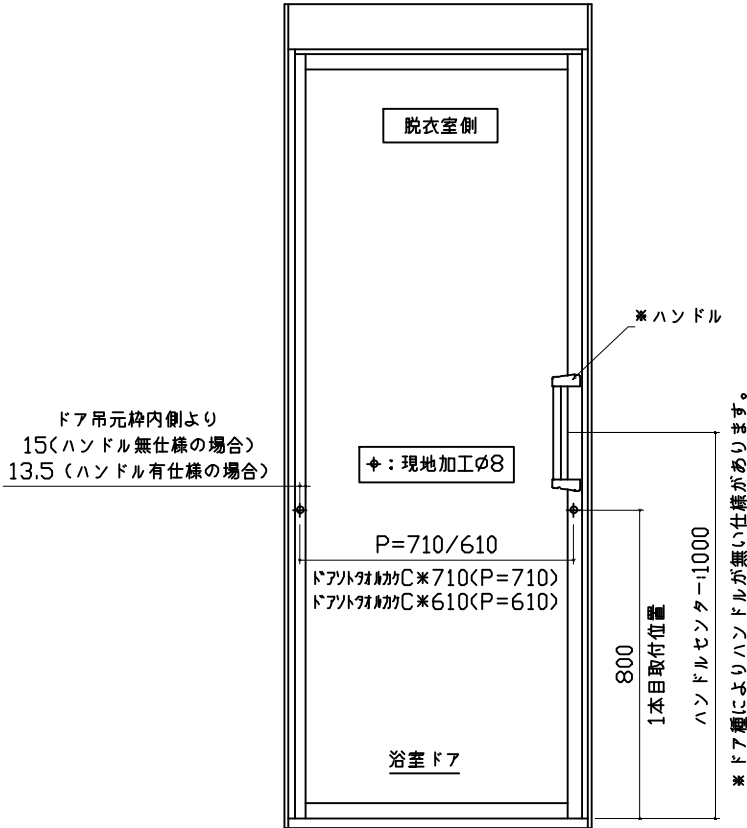
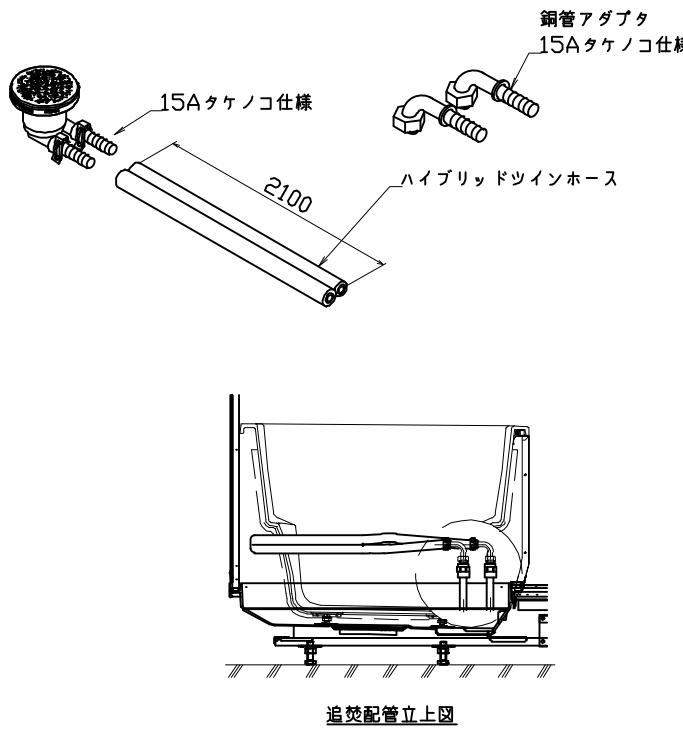
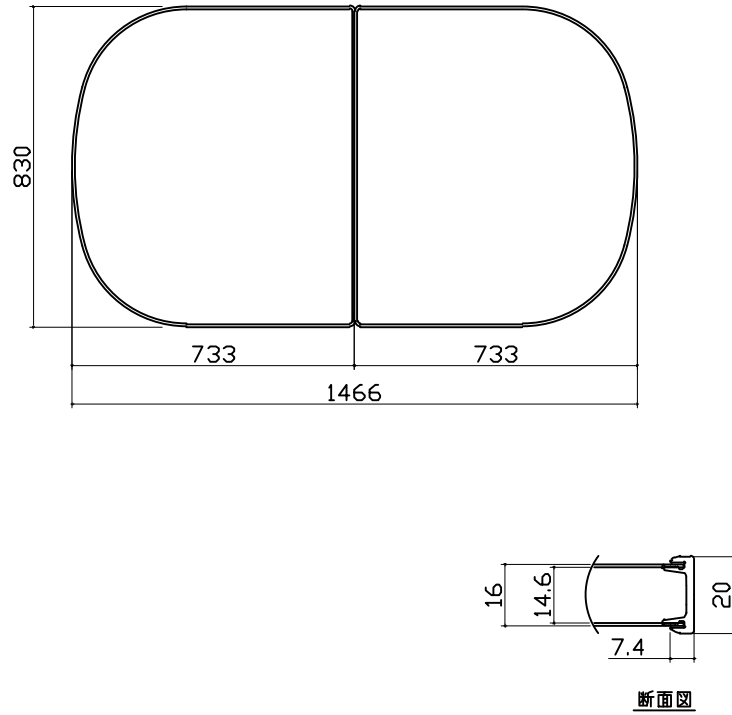
収納棚 本体：AS 		タオル掛け 本体：PMMA ブラケット：ABS（クロムメッキ仕上げ） 		ドア外タオル掛け パイプ部材質：ステンレス（ヘアライン仕上げ） 脚部材質：亜鉛ダイキャスト（クロムメッキ仕上げ） 			
ドア外タオル掛け 設置位置 		循環金具・フロアダプタ関連 		風呂蓋 7079MVAH-20WST 			
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称：★大阪ー大阪SR SB14様邸 現場番号： C4529628 大阪支社 販売課		GRANSPA グランspa プラン番号： 1801A-2505-0854T 担当営業：SB14		部材詳細図 2/3 作成日： 2025年8月26日 担当アドバイザー： ウォルナット・グレース・ジュ	

洗い場側排水トラップ

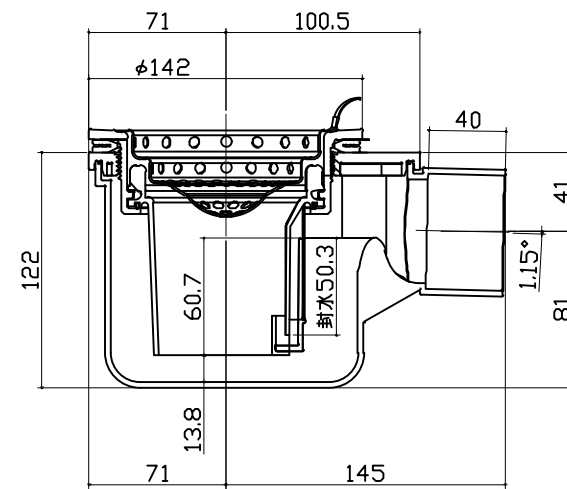

浴槽側排水トラップ

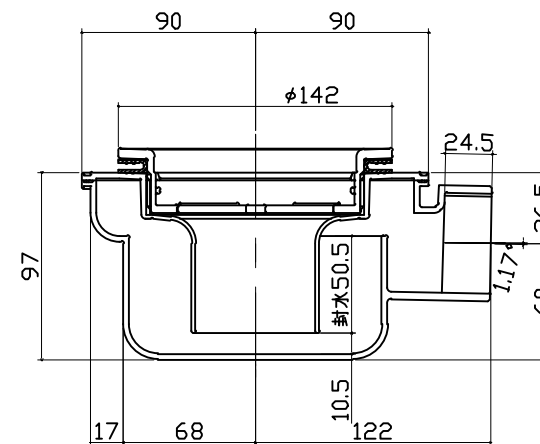

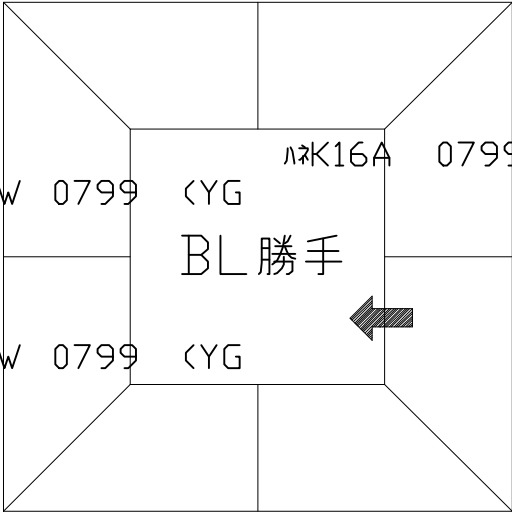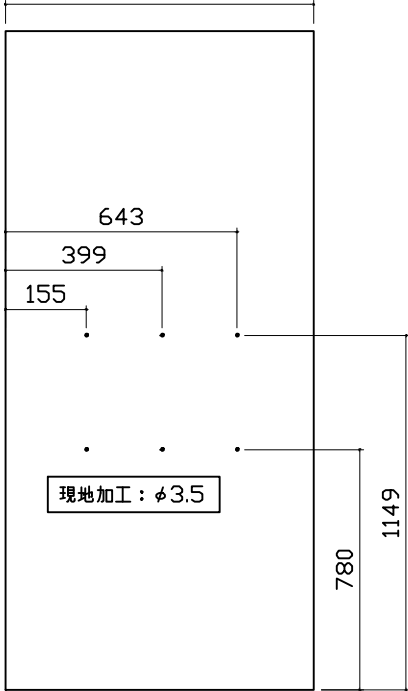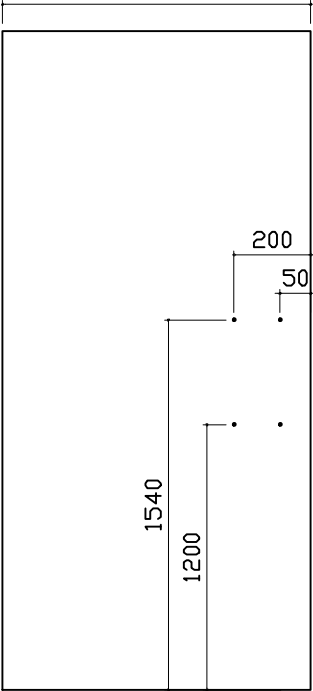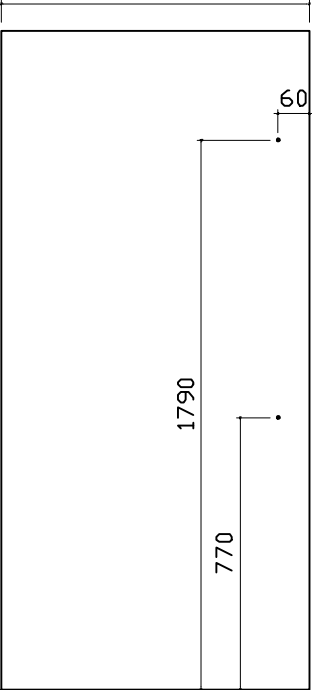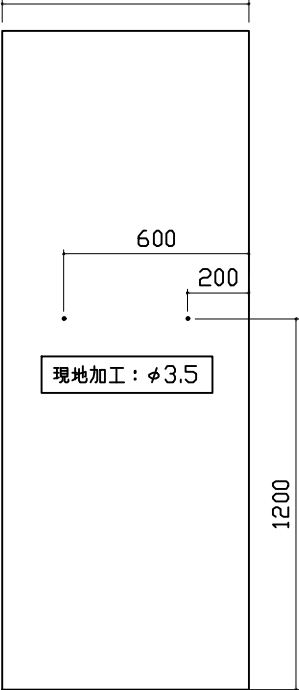パネル割図		ミラー		収納棚	
パネル割図 ハネK20C2B 0999 R<YG ハネK20C1G 0999 L<YG ハネK16NW 0799 <YG ハネK16A 0799 <YG ハネK16NW 0799 <YG ハネK18AD 0999 <YG ハネK18B 0999 <YG BL勝手 		ミラー ハネK20C2B 0999 R<YG 999 643 399 155 780 1149 現地加工：φ3.5 		収納棚 ハネK20C2B 0999 R<YG 999 200 50 1540 1200 現地加工：φ3.5 	
シャフーフックスライドバー		タオル掛け			
シャフーフックスライドバー ハネK20C1G 0999 L<YG 999 1790 770 60 現地加工：φ3.5 		タオル掛け ハネK16A 0799 <YG 799 600 200 1200 現地加工：φ3.5 			
		■留意事項 ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。			
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称：★大阪ー大阪SR SB14様邸		GRANSPA グランspa	
		現場番号：C4529628		プラン番号：1801A-2505-0854T	
		大阪支社 販売課		担当営業：SB14	
				穴開け指示図	1/1
				作成日：2025年8月26日	
				担当アドバイザー：ウォルナットクレーシゅ	
