

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 北海道 札幌SR SB1 様

業者 様

商品名 PREDECENCIA プレデンシア

作成日 2025年5月26日
プラン番号 1200A-2505-0787T
現場番号 C4626025

タカラスタンダード株式会社
◆北海道支店 販売一課
北海道札幌市白石区
TEL 011-862-6111 / FAX 011-862-6183

◆札幌ショールーム
TEL 011-862-6157 / FAX 011-862-1155

商品
御見積金額 ￥1,933,900 (税込 ￥2,127,290)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥273,000 (税込 ￥300,300)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616(BL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームグレー
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	ラスターブラック
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽
カウンター材質	クォーツストーン
カウンター/下カバーカラー	ジュエルブラック / ブラック
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ジオマーブルモスグレー
パネルカラー(周辺)	ジオマーブルモスグレー
ガス種 / 周波数	LPG / 50Hz

◆ 御確認事項

- ※売却時、循環金具は別途手配必要となります。
- ★売却時カウンター取付ネジ打替え必要。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		尾関

◆ 備考

No.*

御名前 北海道 札幌SR SB1

様

現場番号	C4626025	プラン番号	1200A-2505-0787T	作成日	2025/5/26
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1616サイズ		1	1,227,000	1,227,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	2枚引戸<1000幅>(グレー)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1	+74,000	+74,000
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	洗い場	キーブクリーンフロア(ハイクラス・カームグレー)	1		
6	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
7	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(ラスターブラック)	1		
8	浴槽追焚き穴	あり	1		
9	エプロン	カラスステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
10	浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽	1		
11	ヘルシージェット	なし	1		
12	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
13	うるぽか湯	なし	1		
14	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
15	洗い場用水栓	プッシュ式水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB280	1	+71,000	+71,000
16	洗い場用水栓	ヒロカルシャワー(手元止水):SB280LABHK	1		
17	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
18	カウンター	クォーツストーンカウンター(ラグジュアリーライトあり)	1	+89,000	+89,000
19	カウンター	クォーツストーンデュアルカウンター	1	+138,000	+138,000
20	浴槽前間接照明	ラグジュアリーライト	1	+13,500	+13,500
21	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
22	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザイン 周辺プレミアムクラス)(Kパネル)	1	+85,000	+85,000
23	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
24	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
25	換気機器	天井換気扇ブラック	1	+3,000	+3,000
26	換気機器開口	工場開口	1		
27	照明	ストレートライン照明(調光・調色機能付・ラグジュアリーミラー/ライト対応用)	1	+91,000	+91,000
28	天井照明開口	工場開口	1		
29	ミラー	ラグジュアリーミラー(全幅タイプ)	1	+117,000	+117,000
30	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
31	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-4,000	-4,000

御名前 北海道 札幌SR SB1 様

現場番号	C4626025	プラン番号	1200A-2505-0787T	作成日	2025/5/26
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	ハンドバー	メタル 1型600タイプ	1	+9,000	+9,000
33	収納棚	収納棚なし	1	-17,000	-17,000
34	どこでもラック	小物置きM(チャコールグレー)	1	+1,900	+1,900
35	吊り金具	62LL	1	+16,500	+16,500
36	循環金具	FW-LPLX	1	+5,000	+5,000
37	給水給湯管	1水栓<上配管 カウンター側接続>	1		
38	トラップカバー	洗い場側トラップカバー	1		
39	トラップカバー	浴槽側トラップカバー(浴槽パンあり)	1		
システムバス合計			39		¥1,933,900
商品総合計			39		¥1,933,900

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥273,000 (税込 ¥300,300)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

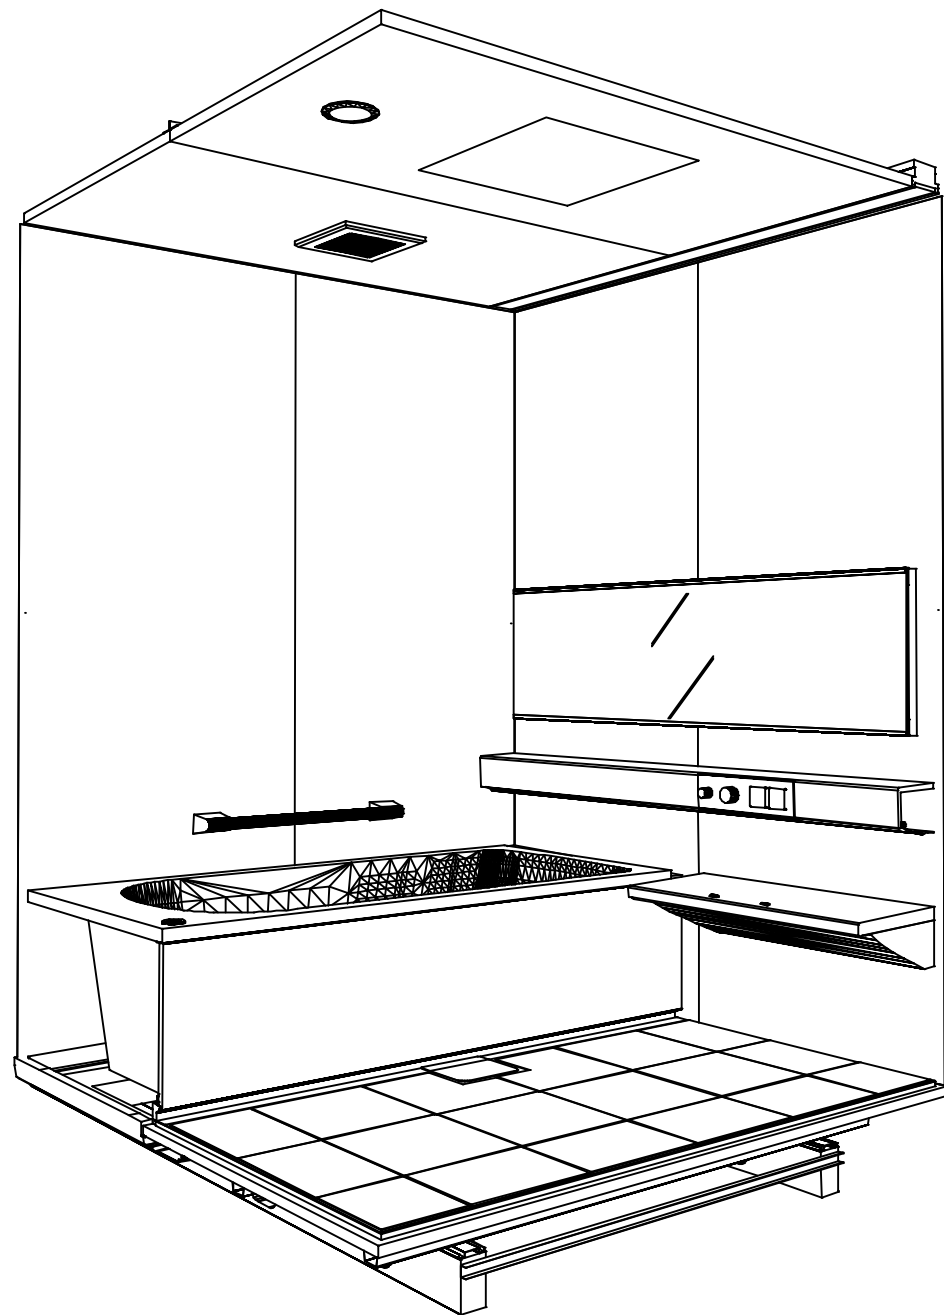

鳥瞰図

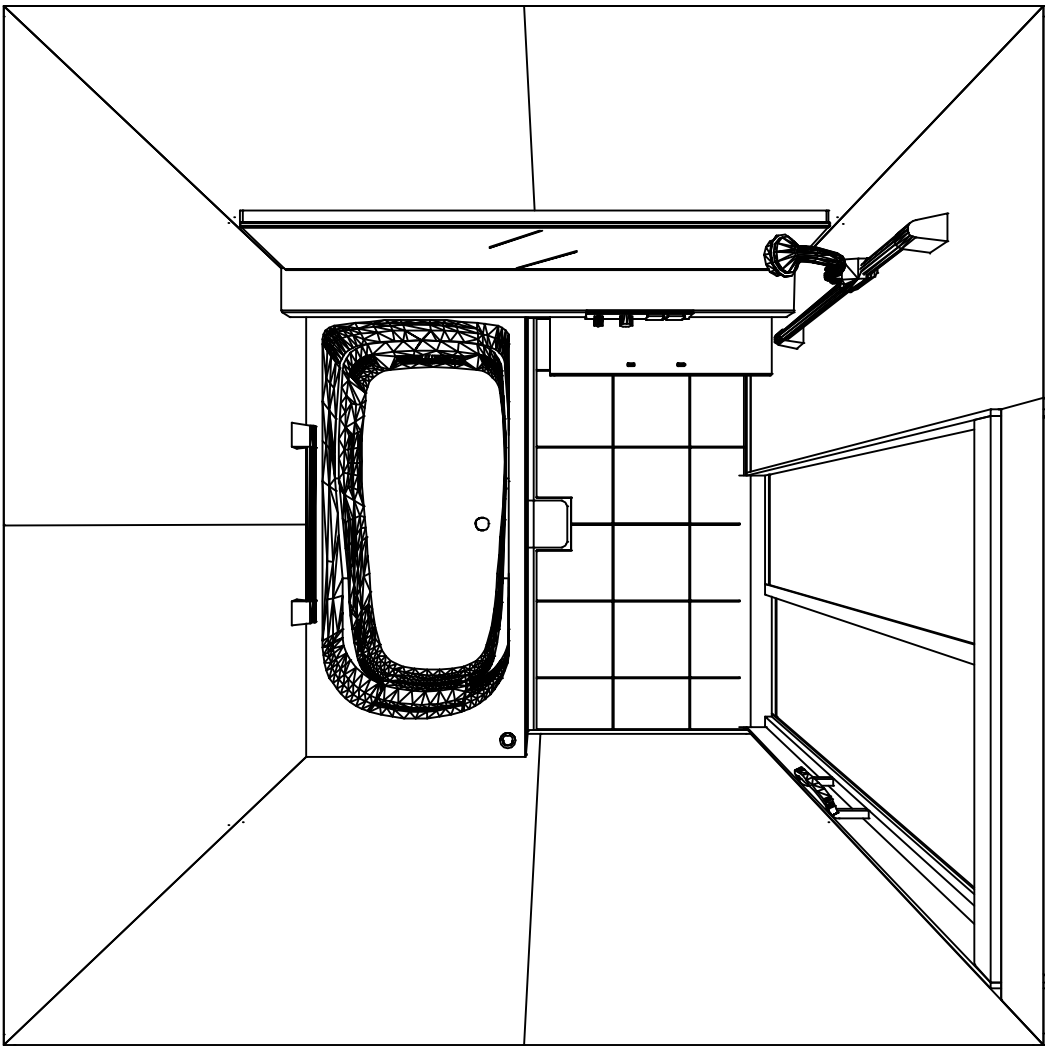

1616


フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。


現場名称： 北海道_札幌SR SB1様邸	PREDENCIA プレデンスシア	姿図	
現場番号： C4626025	プラン番号： 1200A-2505-0787T	作成日： 2025年5月26日	
北海道支店 販売一課	担当営業 ：	担当アドバイザー：	

カウンター面
浴槽側面
洗場側面
カウンター対面



■**留意事項**
※印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。

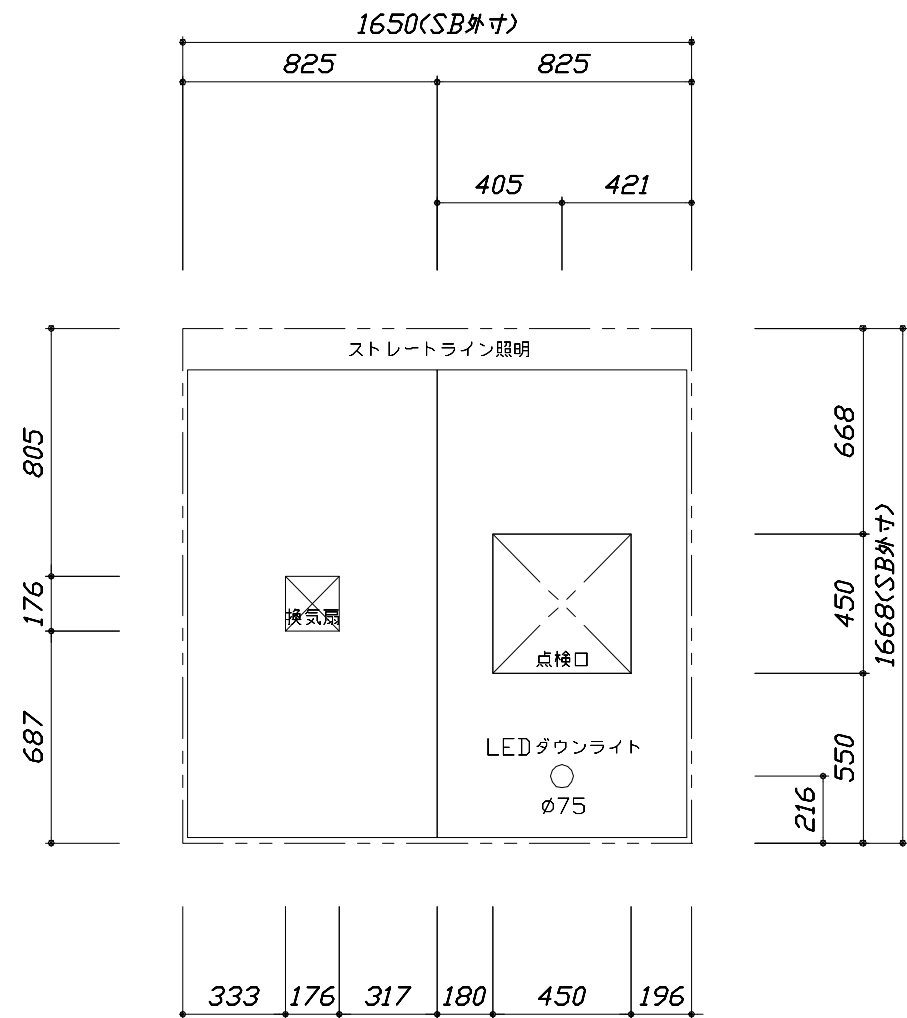

<天井伏図>

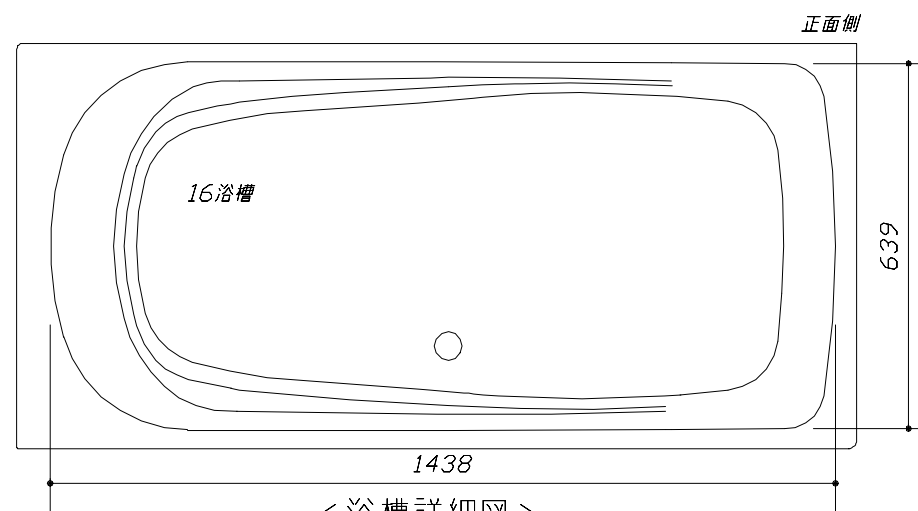


<浴槽詳細図>

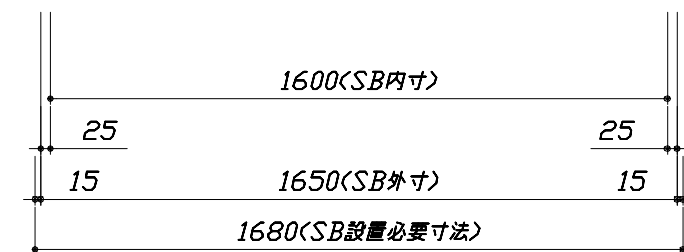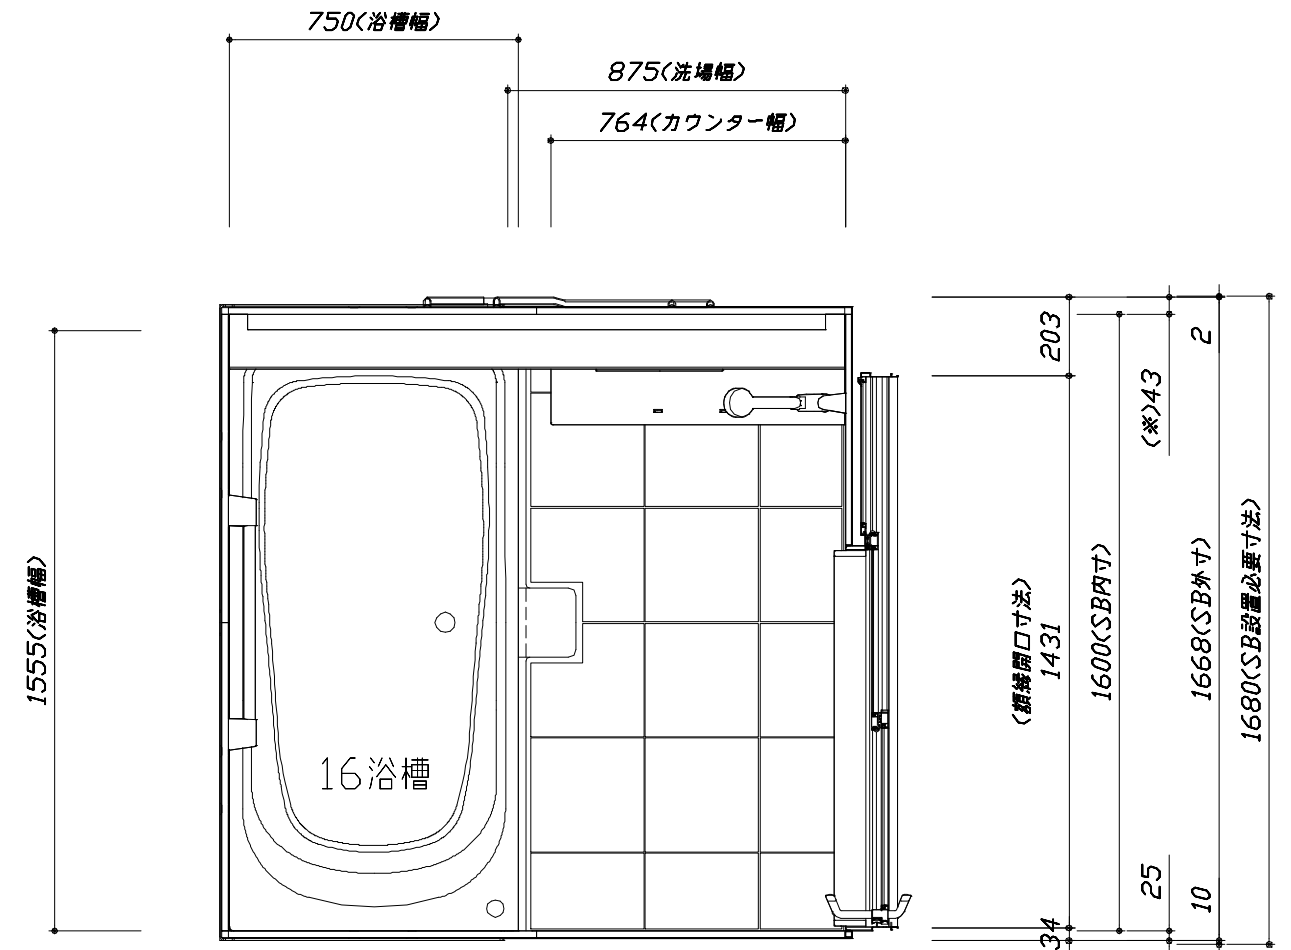

<平面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

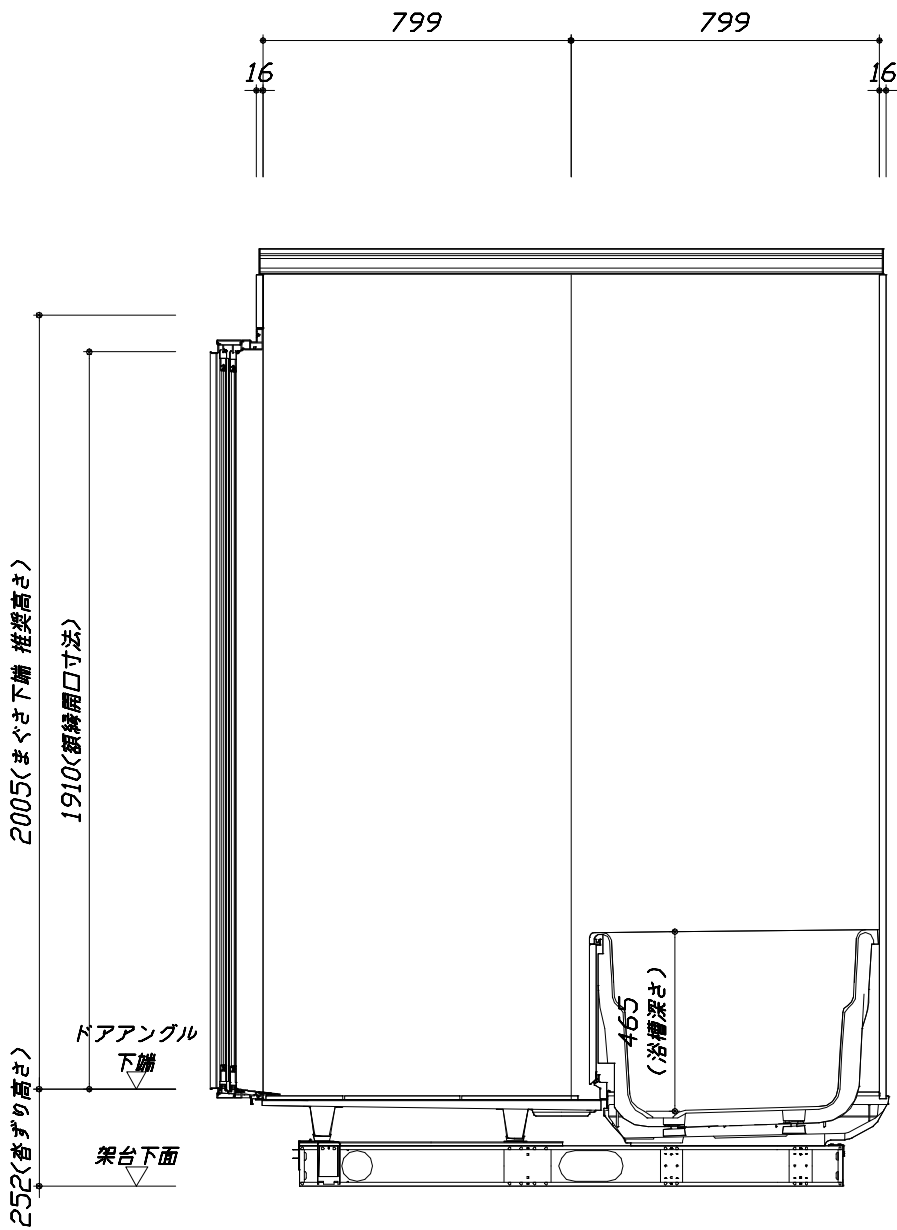

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

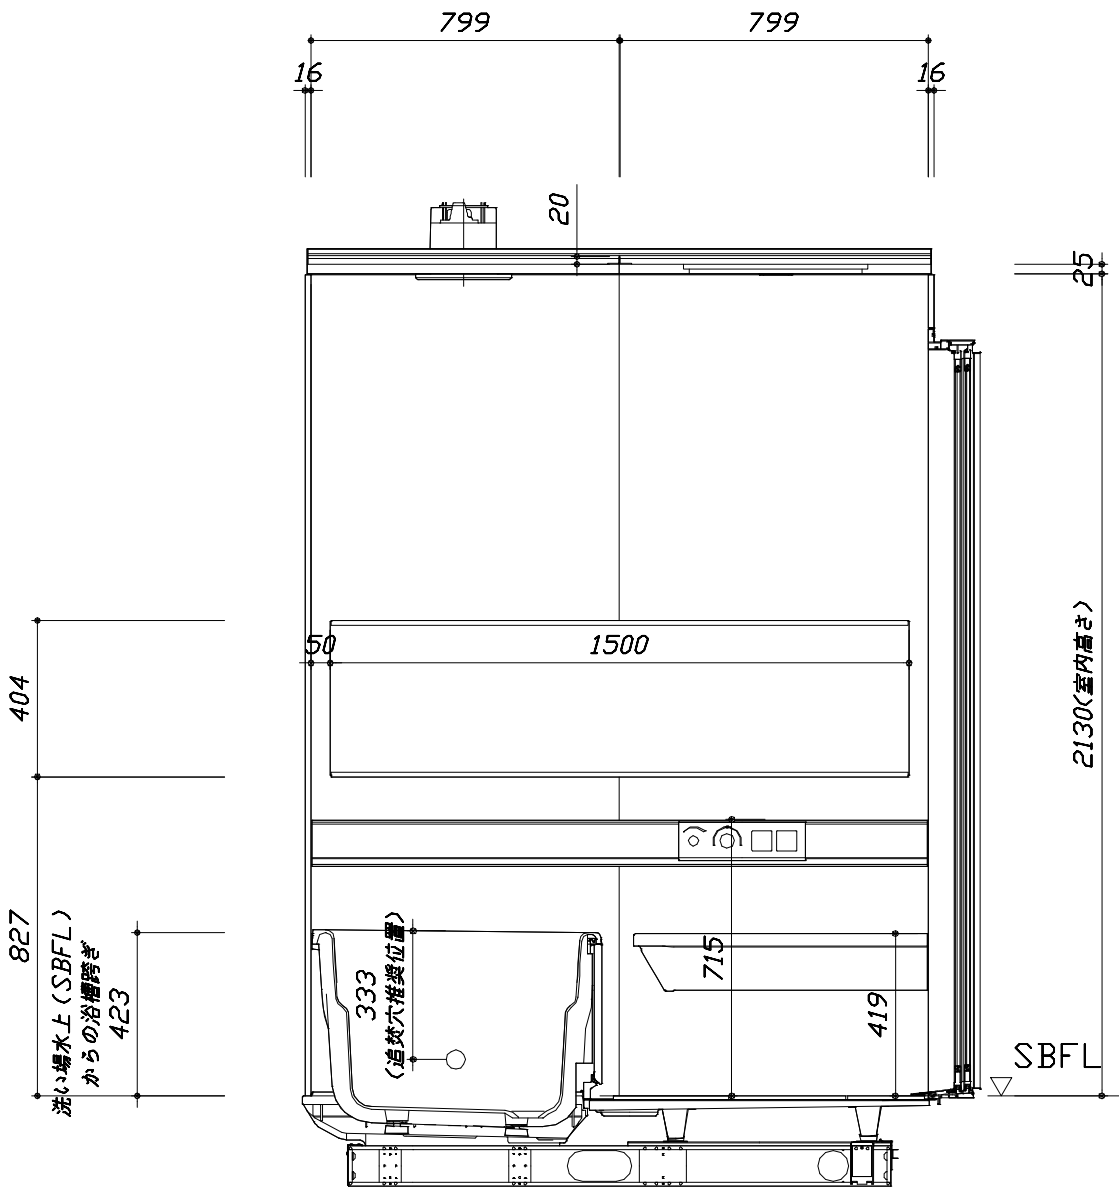

<カウンター面図>

Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： 北海道_札幌SR SB1様邸
現場番号： C4626025
北海道支店 販売一課


PREDENCIA プレデンスシア
プラン番号： 1200A-2505-0787T
担当営業 ：

施工図2
縮 尺： 1:20
作成日： 2025年5月26日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

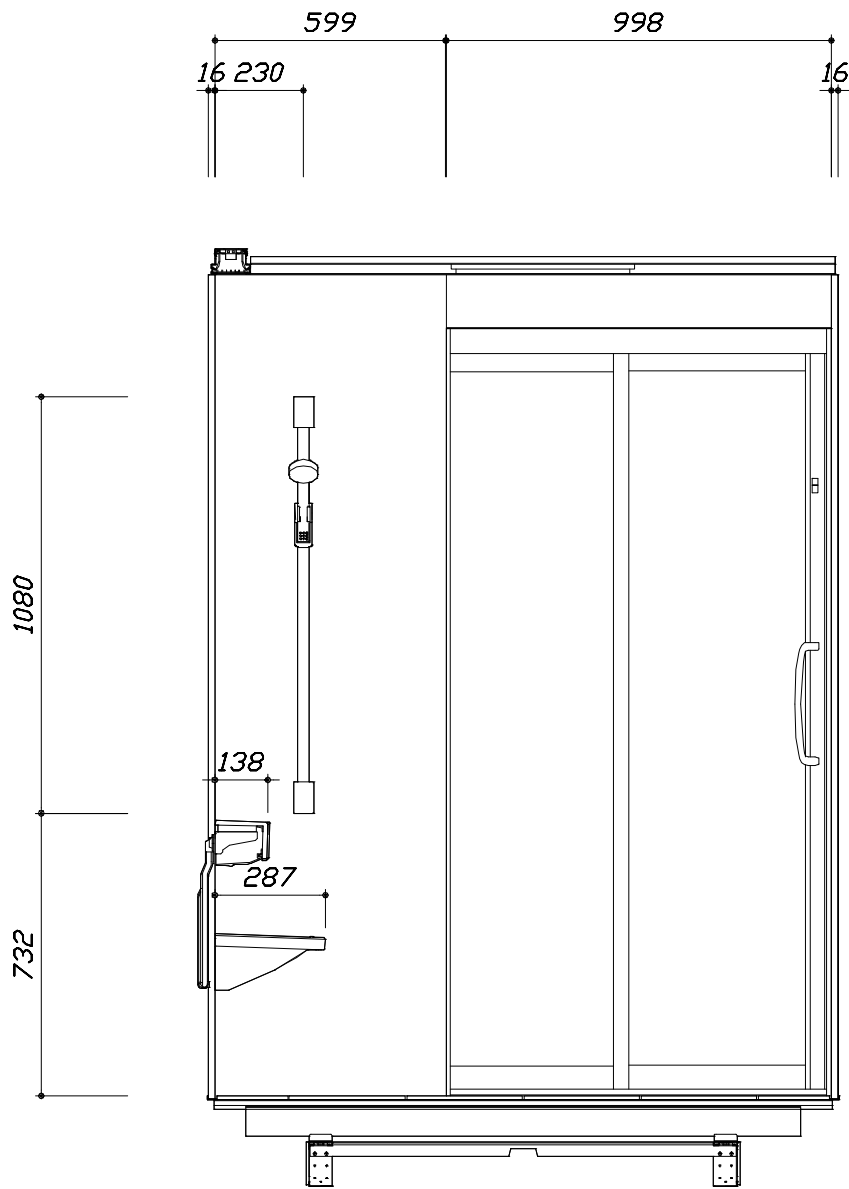

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

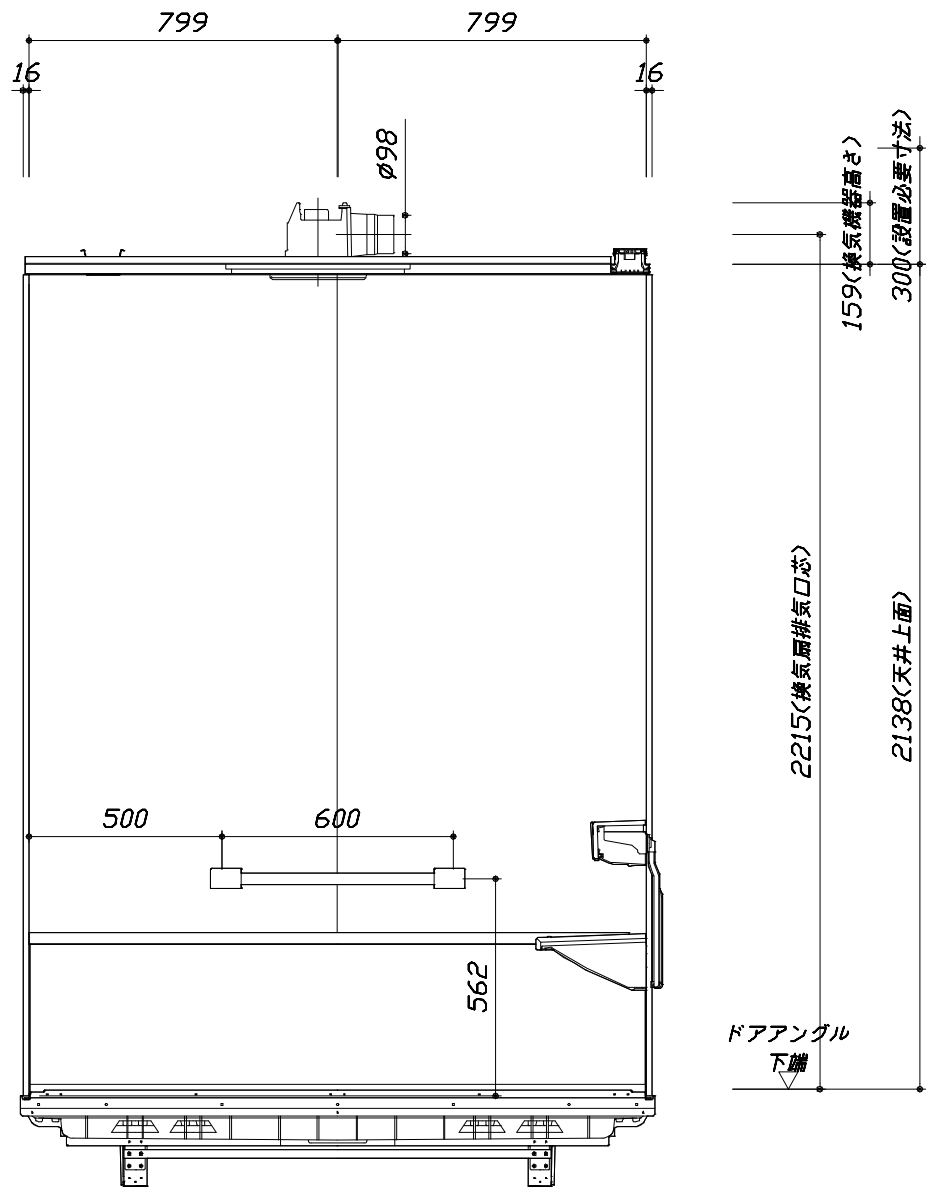

< 浴槽側面図 >

Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： 北海道_札幌SR SB1様邸
現場番号： C4626025
北海道支店 販売一課

PREDENCIA プレデンシア
プラン番号： 1200A-2505-0787T
担当営業：

施工図3 縮 尺： 1:20
作成日： 2025年5月26日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	BL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	鋳物ホーロー 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽（325リットル） 追い焚き穴:あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	クォーツストーンデュアルカウンター：クォーツストーン カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア:19高さ2枚引戸(アルミ框/樹脂ガラス/ﾀﾅﾔ型換気口)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	洗い場：A B S 樹脂, 浴槽：A S A 樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	410kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ラグジュアリーミラー くもり止め加工（13W）
収納棚	－
タオル掛け	－
洗場側水栓	プッシュ式・サーモスタット(SB280LABHK)（樹脂ホース:ﾏﾃﾞﾙ調）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ-T1020S MH）
照明	ストレーライン照明（LED 23.7W調光・調色機能付）ラグジュアリーライト（3.4W）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W) (ﾀﾞｲｬﾐｰﾀﾞ径φ98)ブラック
フロフタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具FW-LPLX：L型G1/2オスネジ仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	ステンレス製 I型600タイプ ﾏﾃﾞﾙ
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	K：ラスタブラック
カウンター	Q：ジュエルブラック
ﾊﾟﾅｰﾙ(ｶｳﾝﾀｰ面)	JDG：ジオマーブルモスグレー
ﾊﾟﾅｰﾙ(周辺・3面)	JDG：ジオマーブルモスグレー
水栓上部ｶｳﾝﾀｰ	－
浴槽エプロン	K：ブラック
洗場	HG：カームグレー
ドア / 天井	G：グレー / B：チャコールブラック
収納棚	－
タオル掛け	－
ﾗﾝﾄﾞﾘｰｾｯﾄ	－

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北海道_札幌SR SB1様邸	PREDENCIA プレデンシア	仕様表	
	現場番号： C4626025	プラン番号： 1200A-2505-0787T	作成日： 2025年5月26日	
	北海道支店 販売一課	担当営業：	担当アドバイザー：	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
			設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○	
排気ダクトの敷設工事							○				浴室換気機器のダクト敷設工事
浴室換気機器と排気ダクト接続工事							○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
浴室換気機器の電気・アース接続工事								○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
ウェザーカバーの外壁取付							○	○			建築の外装仕上げ工事
4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事					○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
		建築側排水配管との接続工事 【注記 3】					○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
		給湯機器本体工事（試運転・確認）					○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
1 3	電気 他	内装仕上げ工事		○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
		浴室用電源配線、接続工事						○			浴室機器の事後電気工事
		浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事	

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

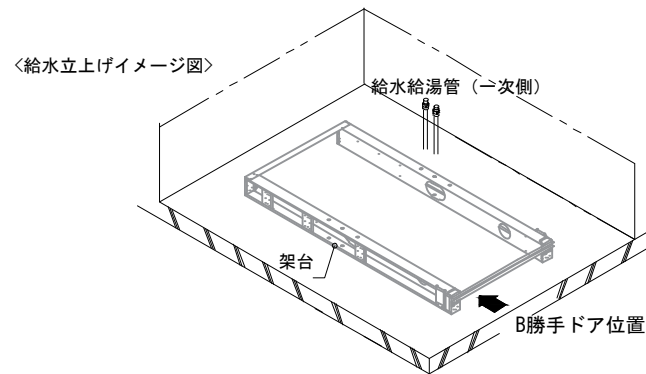

■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。


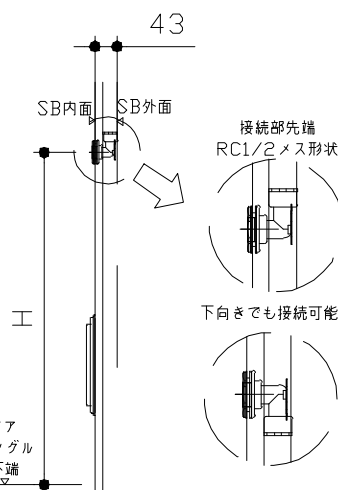
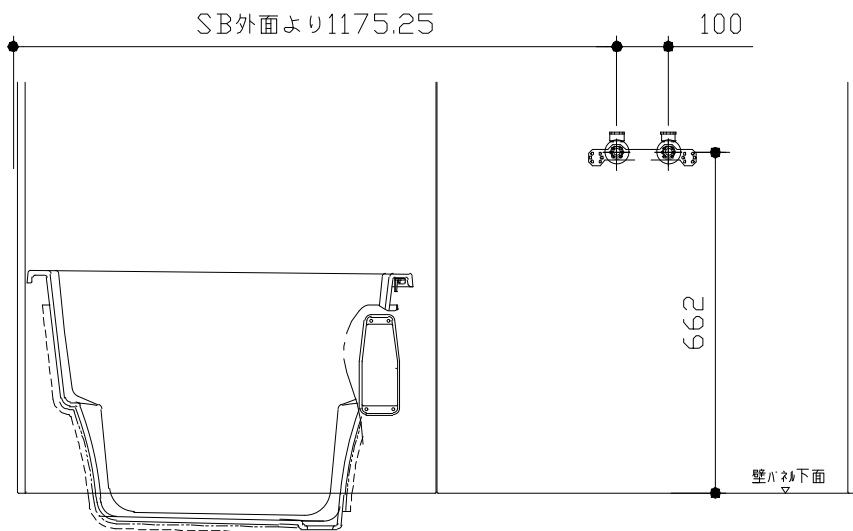


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	646
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	637


＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置

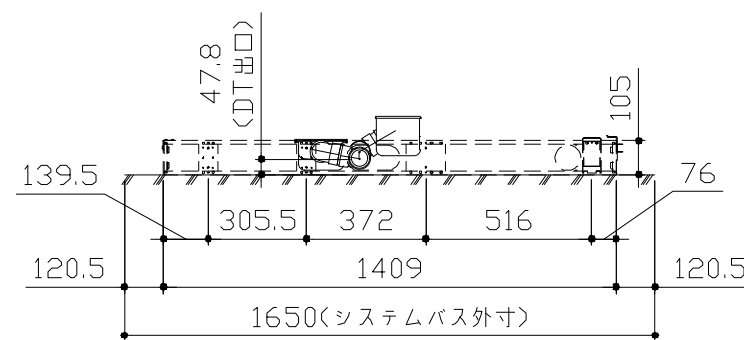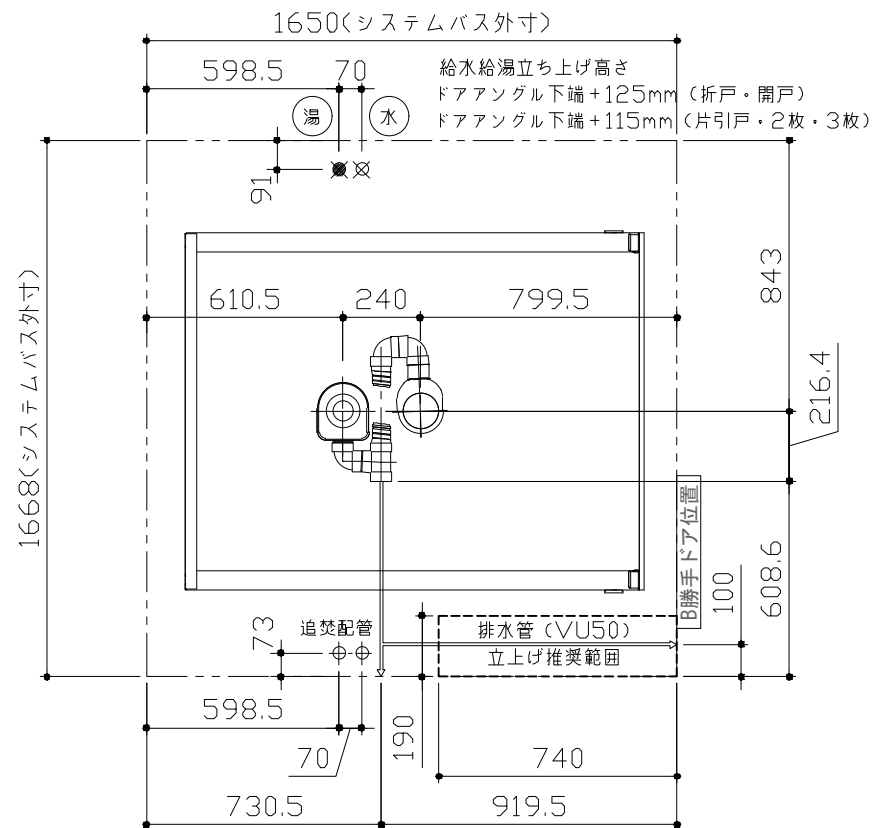

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

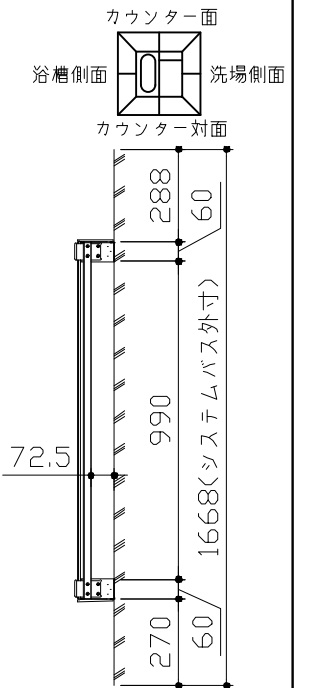


■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

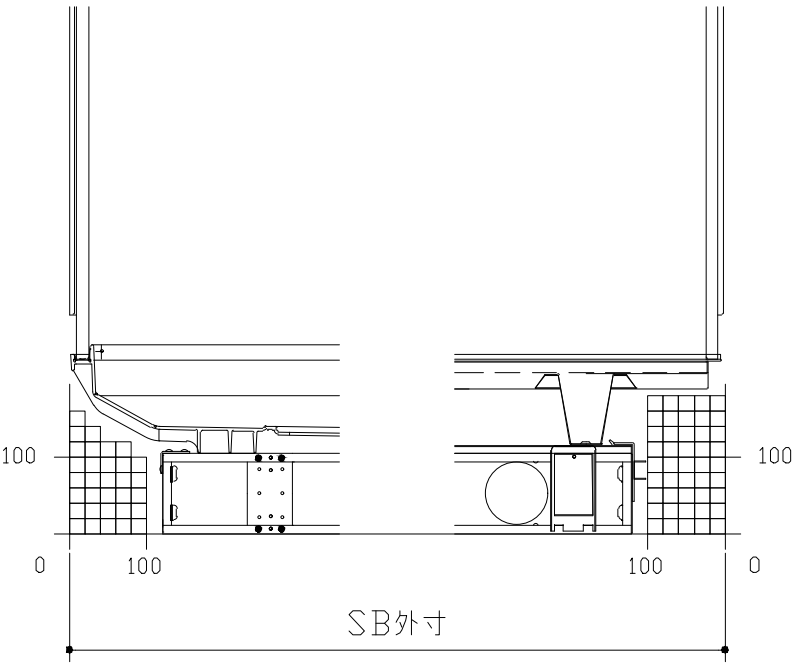


A矢視

B矢視

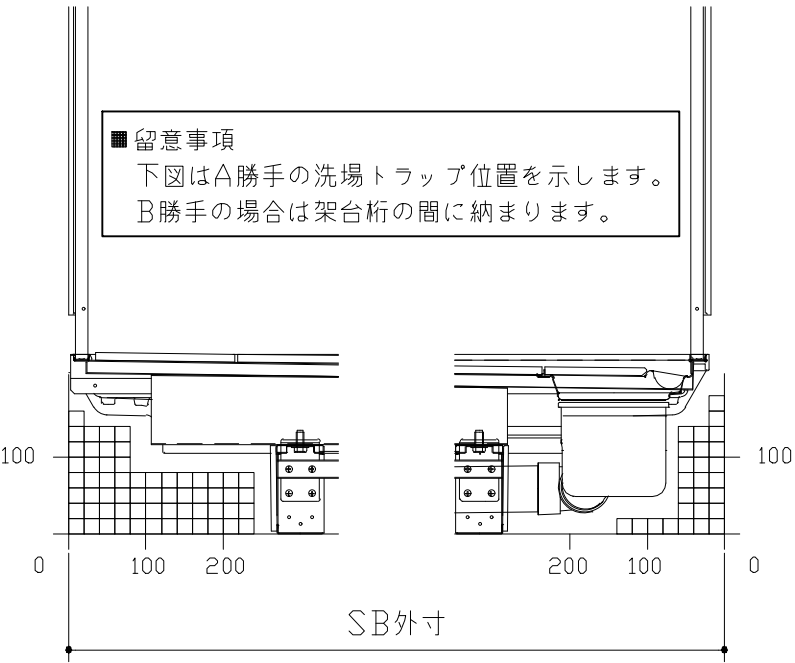

C矢視




D矢視

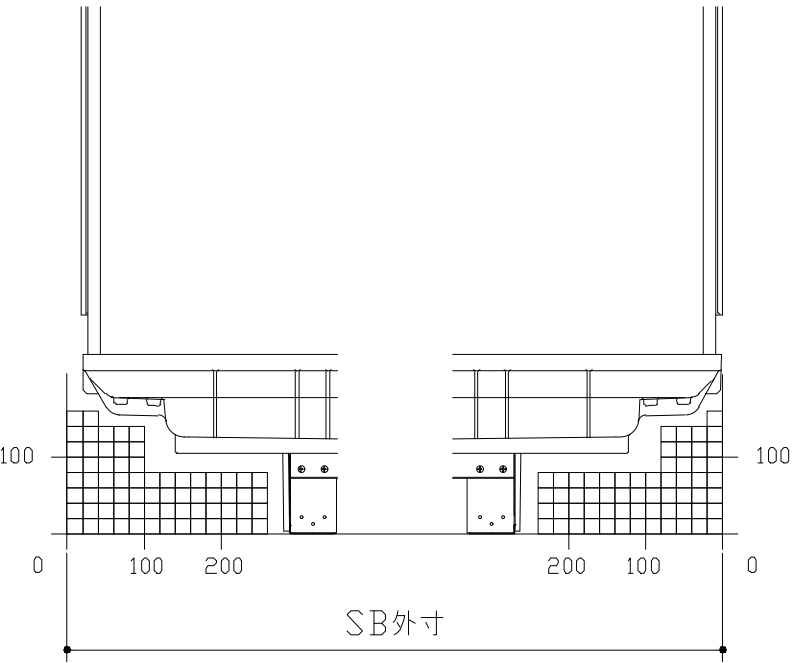


E矢視


F矢視

キープクリーンドア：2枚引戸・タテ型換気口

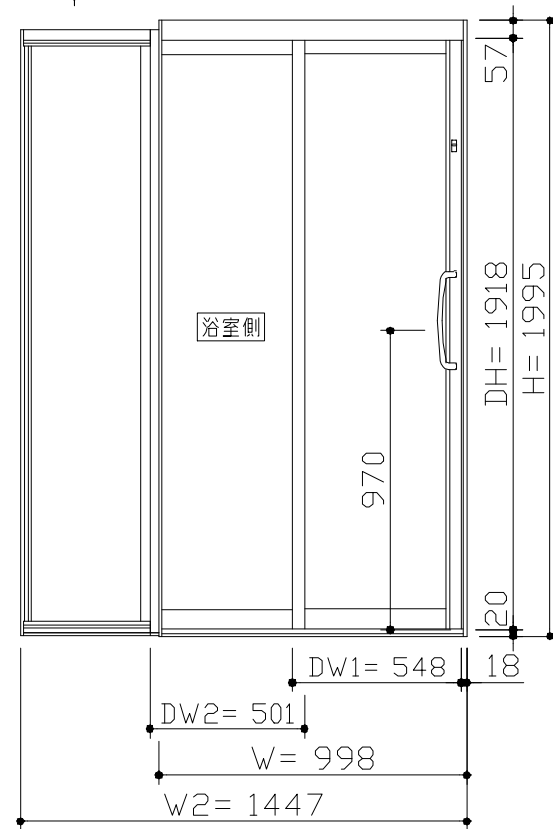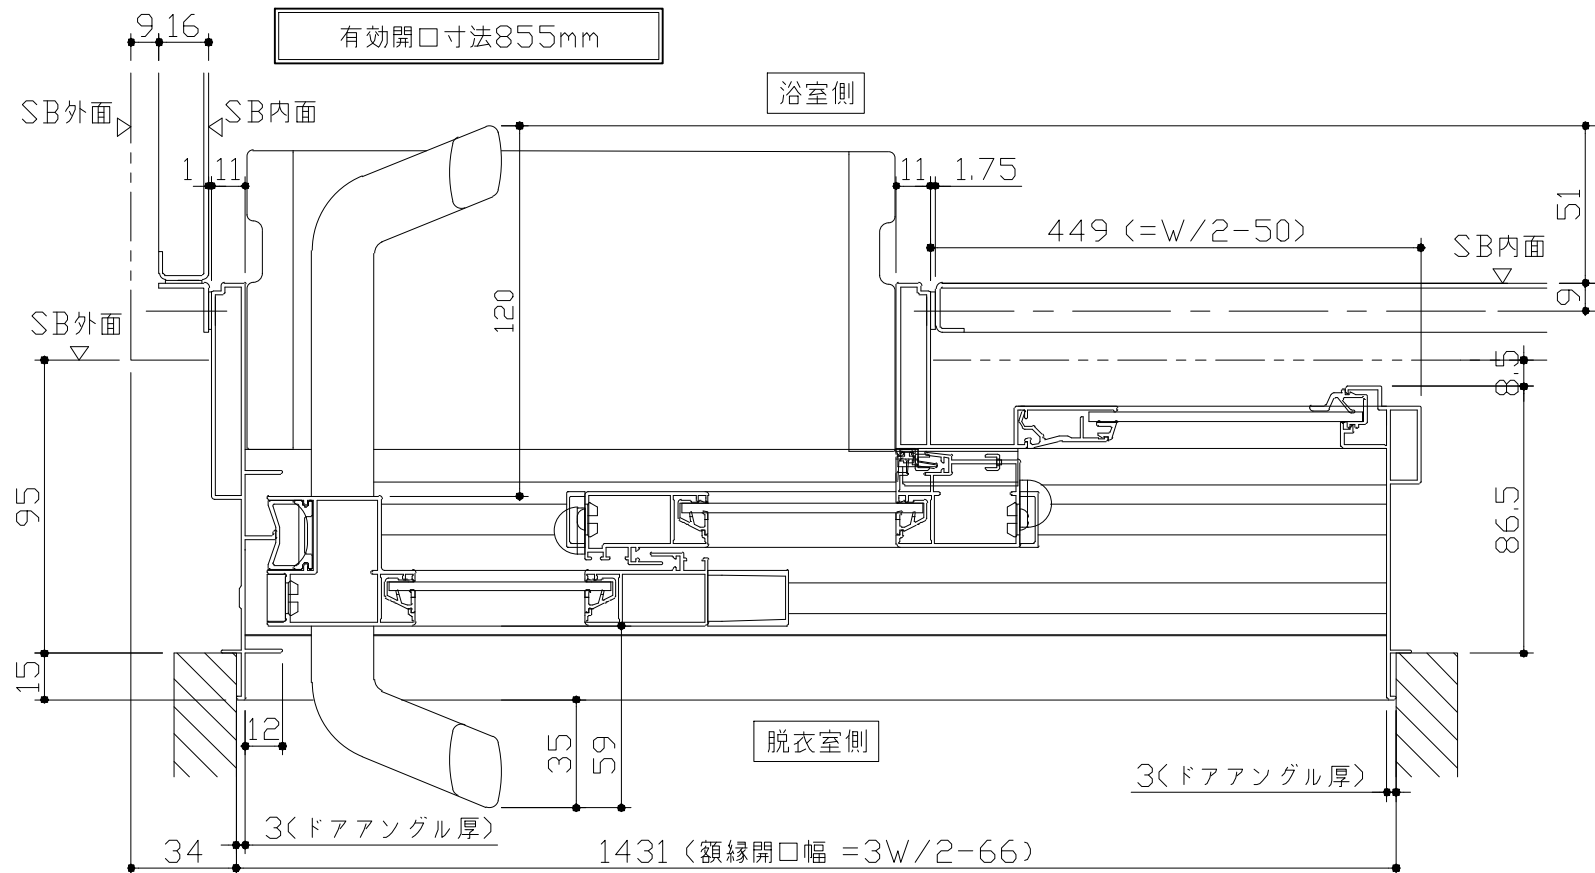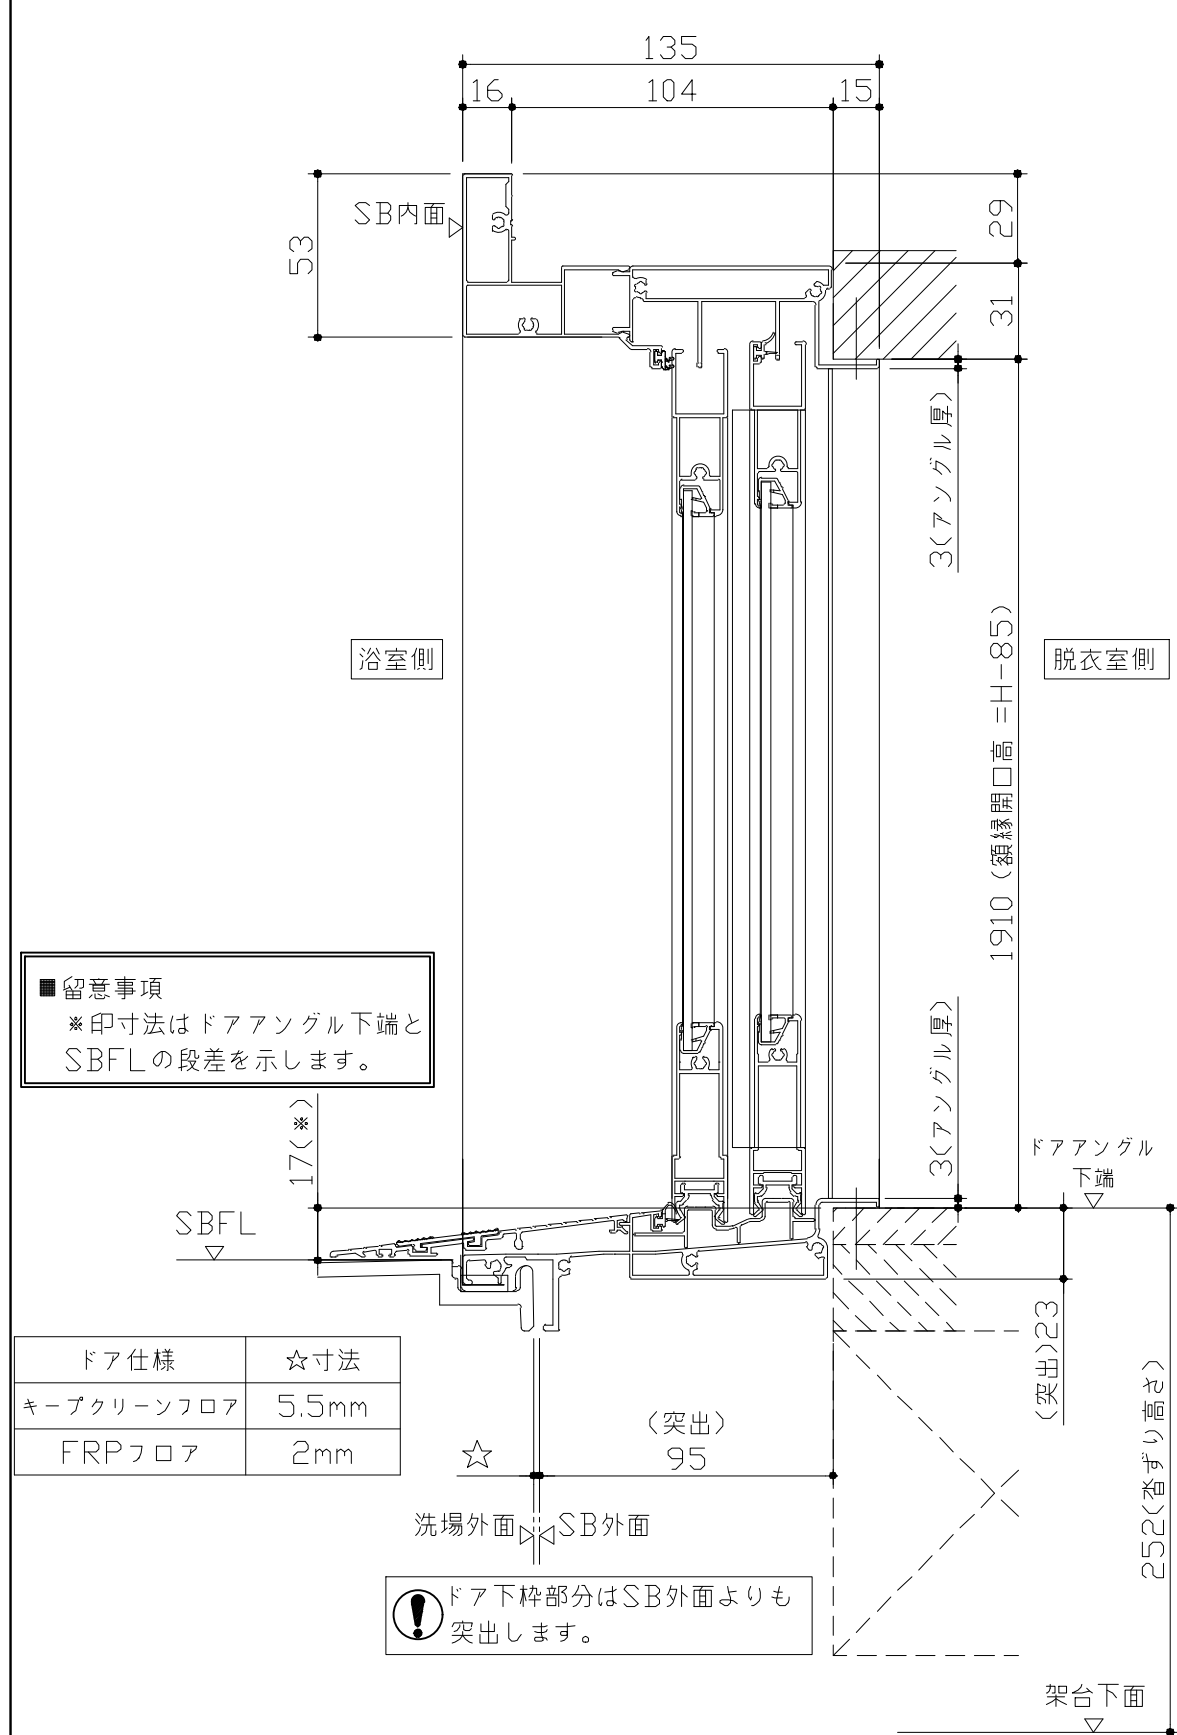

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

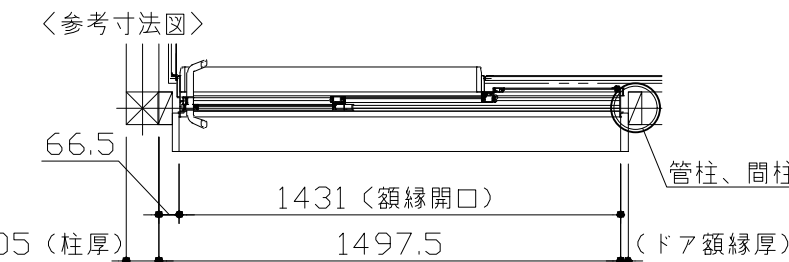


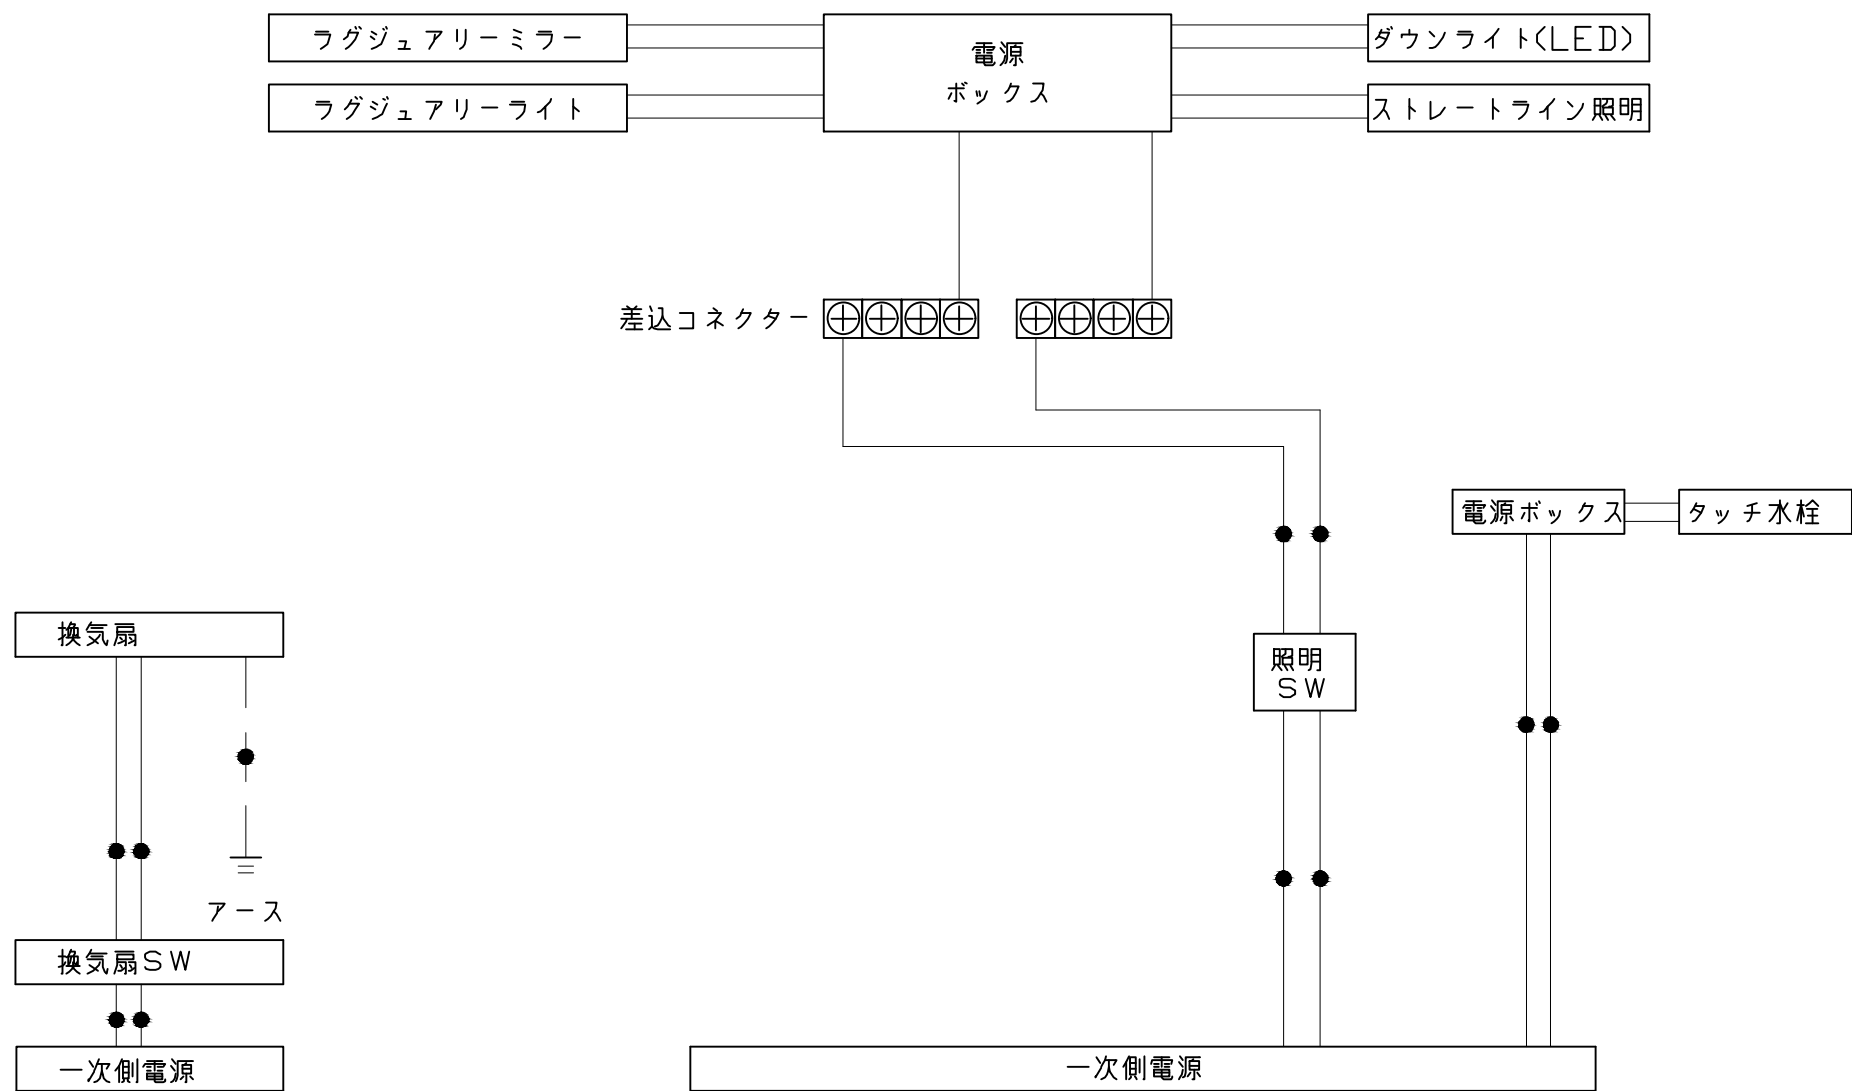

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。


 アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

吊り金具寸法図

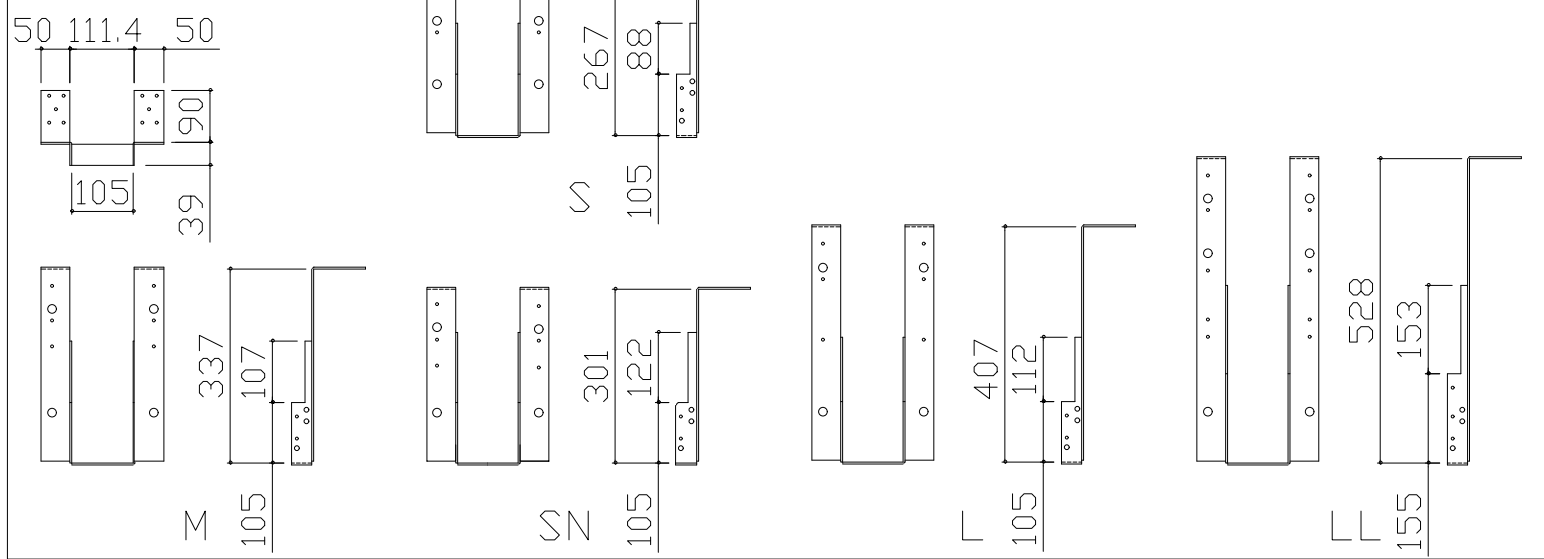


■吊金具設置条件について

- 吊金具を設置する梁（土台）には600～900kgの重量がかかります。十分な強度を確保した梁（土台）を設置してください。
- 吊金具を設置する梁（土台）の高さ寸法（h）に以下の制約条件があるのでご注意ください。


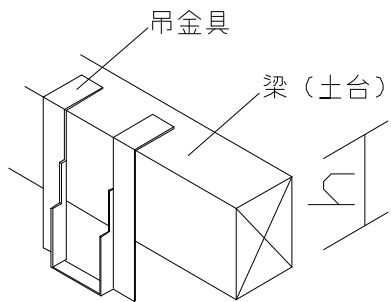


金具セット	h寸法
S	105以上
SN	105以上
M	150以上
L	210以上
LL	240以上

ウケバリ接続金具寸法図



ウケバリ断面図

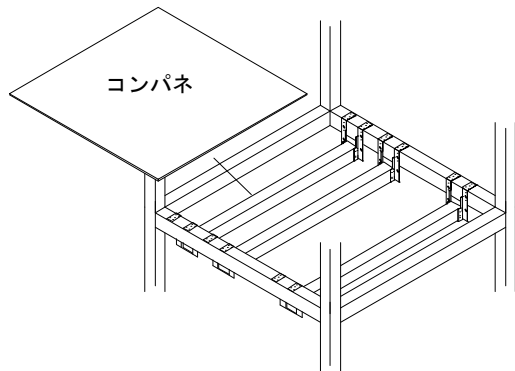

階上に設置する場合などは安全確保（落下防止）の観点よりコンパネを設置してください。

■設置必要材料（現地調達）

【受け梁材が木材の場合】



- 受け梁材（105角 材質：ベイツガ、ベイマツ1級相当品）
- 防錆釘（N-75 80本以上、N-32 20本程度）

【受け梁材が鉄パイプの場合】


- 皿タッピンネジ（クロメート、M4×25 20本程度）







【共通】

- コンパネ（厚み：12mm以上）
- （コーチスクリュー、アンカー、六角レンチ、ドリル）

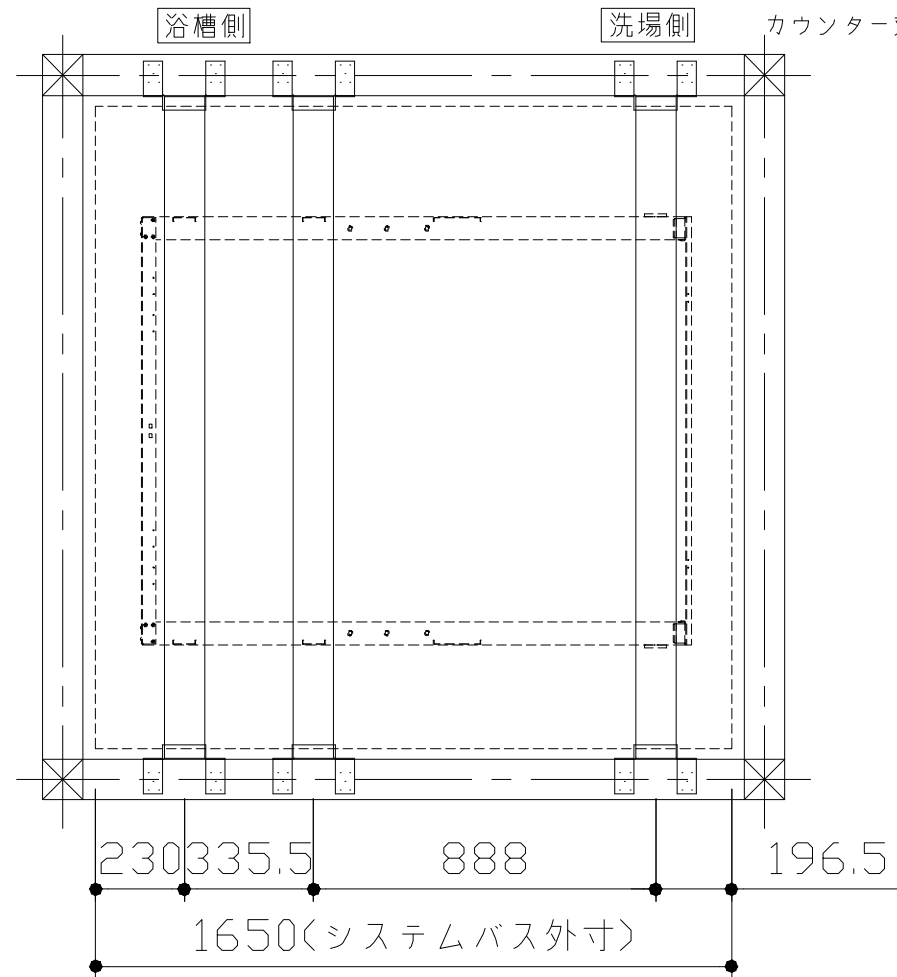

- 吊金具参考納まり
- ・床仕上がり36mm（※）
 - ・ツリカゲSN使用
 - ・SBウケバリ使用

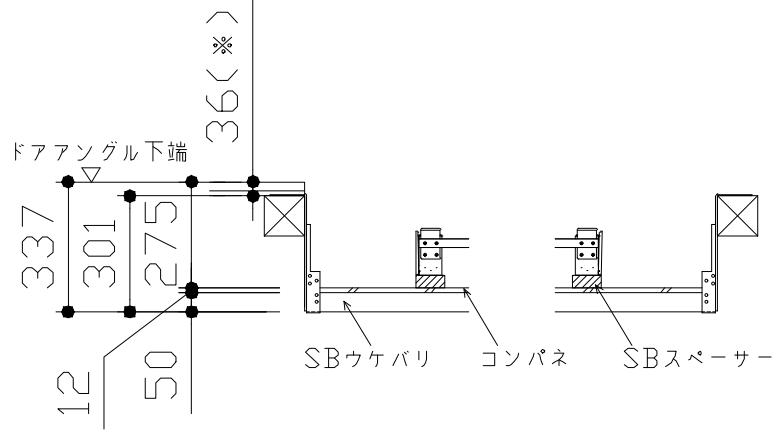

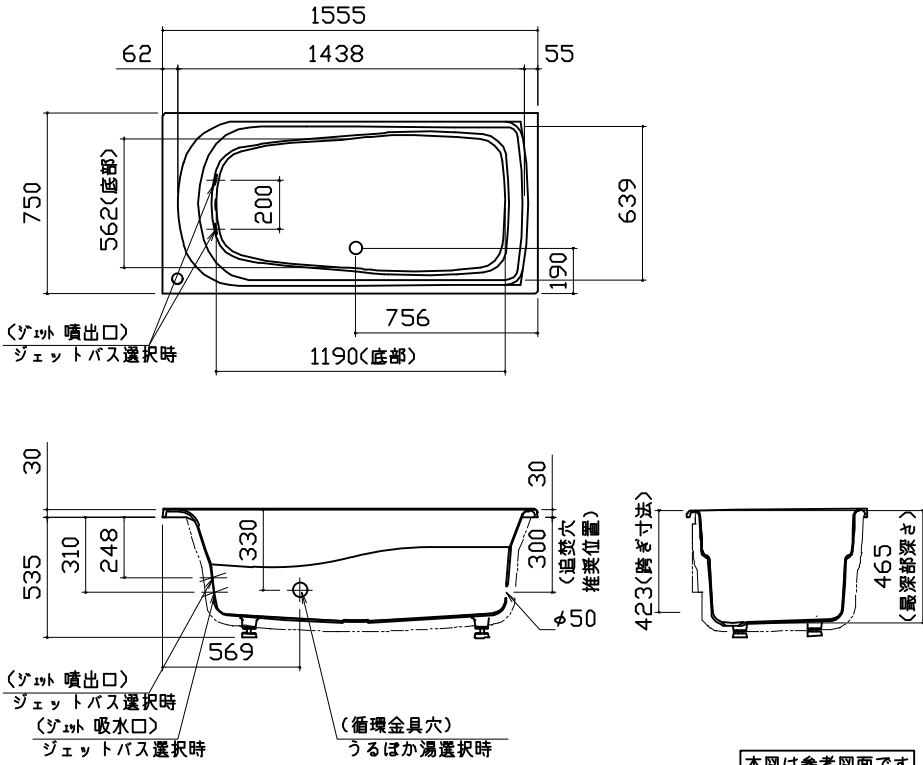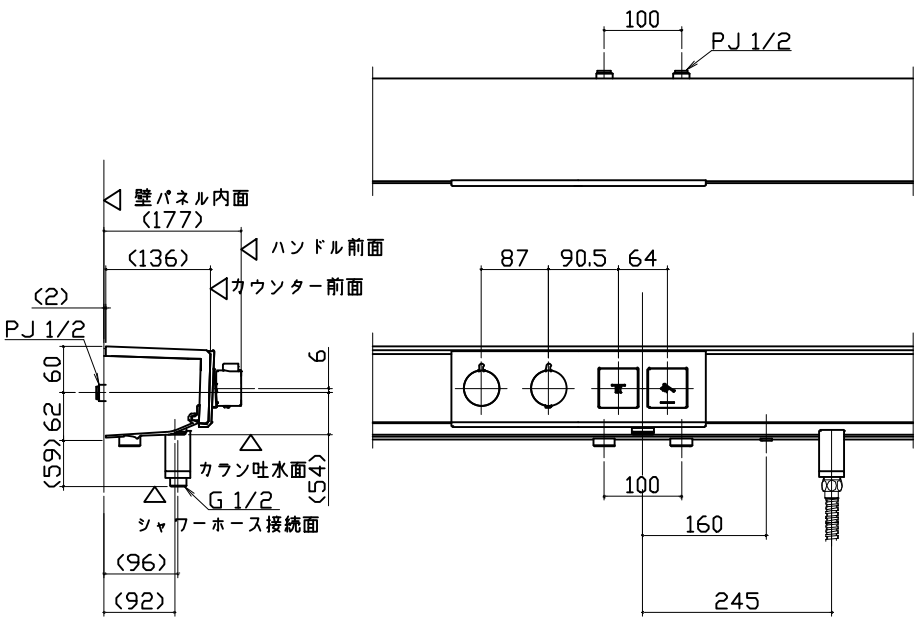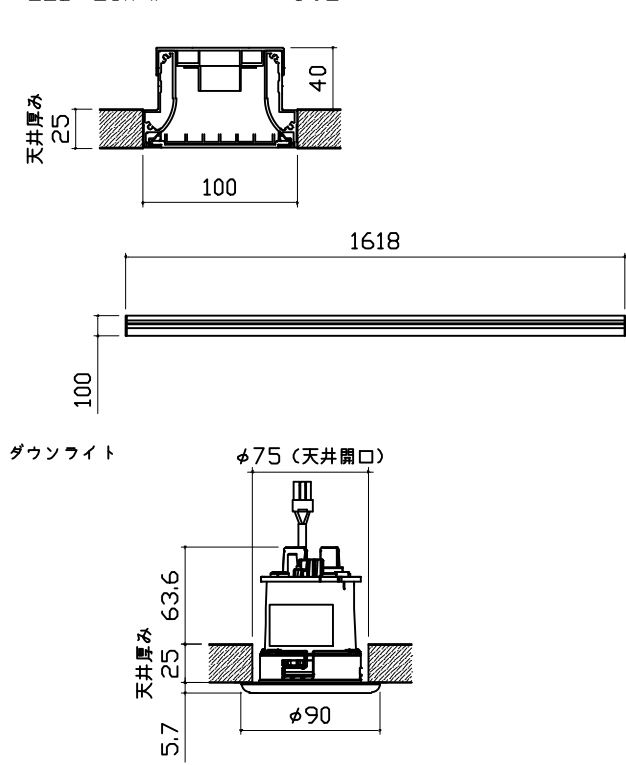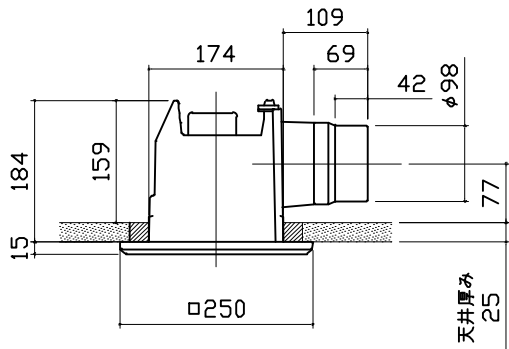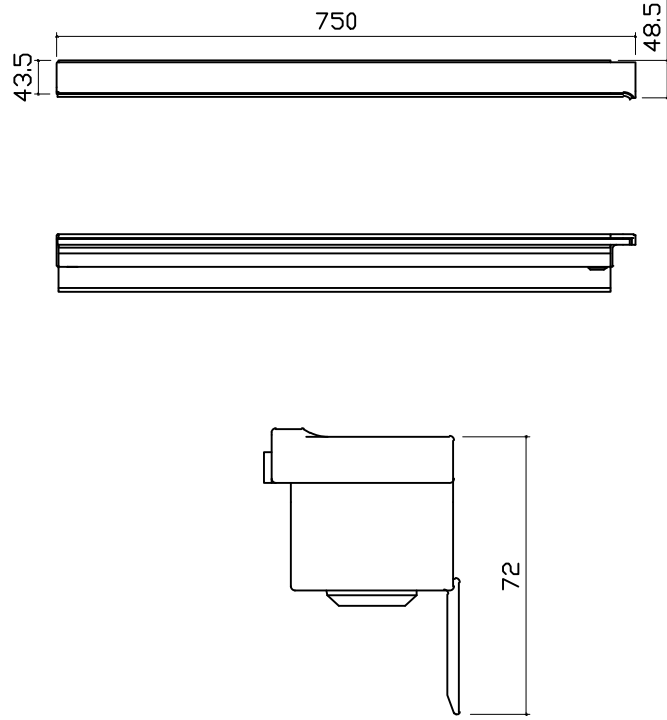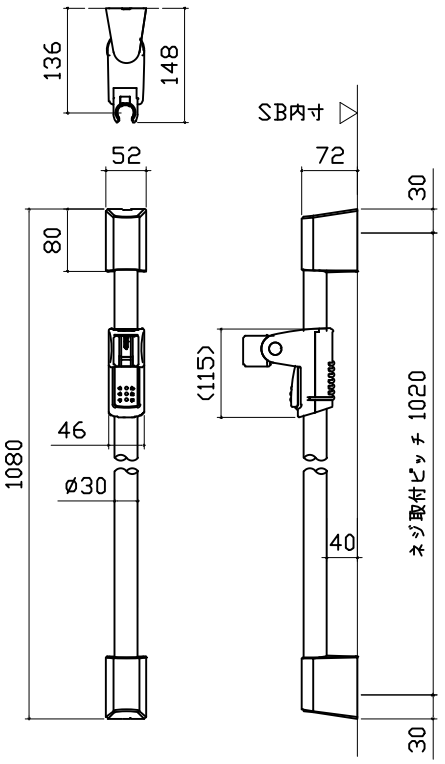浴槽	洗い場用水栓	照明		
		ストレーライン照明 LED 23.7W (ダウンライト1灯含む) 		
換気機器	ラグジュアリーライト	シャワーフックスライドバー		
管工事 	LED 3.4 W 	 材質 パイプ部：ステンレス 台座部：ABS、POM等 フック部：ABS等		
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：北海道_札幌SR SB1様邸 現場番号：C4626025 北海道支店 販売一課	PREDENCIA プレデンシア プラン番号：1200A-2505-0787T 担当営業：	部材詳細図 1/2 作成日：2025年5月26日 担当アドバイザー：	

ミラー 枠：SUS304 t0.8、PMMA ミラー：表面防曇コートあり LED：13W		ハンドバー支持部取合詳細図		循環金具・フロアダプタ関連			
風呂蓋 フロアMDH-16YK		洗い場側排水トラップ		浴槽側排水トラップ			
Takara standard タカスタンダード株式会社		現場名称：北海道_札幌SR SB1様邸 現場番号：C4626025 北海道支店 販売一課		PREDENCIA プレデンシア プラン番号：1200A-2505-0787T 担当営業 ：		部材詳細図 2 / 2 作成日：2025年5月26日 担当アドバイザー：	

パネル割図		ミラー		シャーフックスライドバー			
パネル割図		ミラー		シャーフックスライドバー			
ラグジュアリーライト							
ラグジュアリーライト							
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称：北海道_札幌SR SB1様邸 現場番号：C4626025 北海道支店 販売一課		PREDENCIA プレデンシア プラン番号：1200A-2505-0787T 担当営業：		穴開け指示図 1/1 作成日：2025年5月26日 担当アドバイザー：	
