

# システムバス 御見積書

御名前 大阪-堺SR SB9 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランスパ

作成日 2023年9月5日  
プラン番号 1819G-2305-0789T  
現場番号 C2871102

タカラスタンダード株式会社  
◆堺営業所  
大阪府堺市西区北条町2丁目22番地の4  
TEL 072-276-6007 / FAX 072-276-6008

◆堺ショールーム  
TEL 072-276-6011 / FAX 072-276-6012

商品  
御見積金額 **¥774,600 (税込 ¥852,060)**

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥139,000 (税込 ¥152,900)**

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

## ◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ 1418(BR勝手)

洗い場仕様 キープクリーンフロア:ハイクラス

洗い場カラー カームベージュ

浴槽材質 FRP

浴槽カラー ベージュ

浴槽形状 セミスクエア浴槽

カウンター材質 樹脂

カウンター/下カバーカラー ホワイト / -

浴槽前カウンターカラー -

エプロン材質/カラー 樹脂 / ベージュ

浴室パネル材質 高品位ホーロー

パネルカラー(正面) リネンホワイト

パネルカラー(周辺) ウォルナットグレージュ

ガス種 / 周波数 未定 / 60Hz

## ◆ 御確認事項

- ★組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。
- ★現場の状況により商品組付費、御見積内容(品番・数量)が変わる場合がございます。
- ★★上記商品ご発注の際は、右枠内にユーザー様もしくは元請業者様の捺印が必要です。  
発注後の仕様・カラー変更は出来かねますので、ご確認の上捺印宜しくお願い致します。

| 担当営業 | 担当アドバイザー | プラン作成者 |
|------|----------|--------|
|      | UGS-9-14 |        |

## ◆ 備考

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

No.\*

御名前 大阪-堺SR SB9

様

|      |          |       |                  |     |          |
|------|----------|-------|------------------|-----|----------|
| 現場番号 | C2871102 | プラン番号 | 1819G-2305-0789T | 作成日 | 2023/9/5 |
|------|----------|-------|------------------|-----|----------|

## 御見積明細 システムバス

| NO | 商品名           | 仕様   | 数量 | 単価      | 金額      |
|----|---------------|--|----|---------|---------|
| 1  | グランスパ 1418サイズ |  | 1  | 789,000 | 789,000 |
| 2  | 架台            | 低床タイプ ボルト脚架台                               | 1  |         |         |
| 3  | ドア            | 開き戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(18サイズ)          | 1  | +14,500 | +14,500 |
| 4  | ドア            | タテ型換気口                                     | 1  |         |         |
| 5  | ドアオプション部材     | ドア外タオル掛け(開き戸専用)/ブラケット:樹脂(白)                | 1  | +5,000  | +5,000  |
| 6  | ドア位置変更        | B勝手・移動なし・全面デザインハイクラス・800幅ドア                | 1  |         |         |
| 7  | 洗い場           | キーブクリーンフロア(ハイクラス・カームベージュ)                  | 1  |         |         |
| 8  | 排水口カバー        | タイル仕上げ                                     | 1  | +5,000  | +5,000  |
| 9  | 浴槽            | FRP(ベージュ)                                  | 1  | -32,000 | -32,000 |
| 10 | 浴槽追焚き穴        | あり   | 1  |         |         |
| 11 | エプロン          | FRP浴槽用保温材なし(ベージュ)                          | 1  |         |         |
| 12 | 浴槽形状          | FRPセミスクエア浴槽                                | 1  |         |         |
| 13 | 浴槽ハンドグリップ     | 1本仕様                                       | 1  | +5,000  | +5,000  |
| 14 | 浴槽パン          | あり   | 1  |         |         |
| 15 | 洗い場用水栓        | サーモ水栓:樹脂ホース(シルバー)SB18520SN 水栓上部カウンター(ホワイト) | 1  | -5,700  | -5,700  |
| 16 | 洗い場用水栓        | 標準シャワーヘッド:SB18520SN                        | 1  |         |         |
| 17 | 浴槽用水栓         | 浴槽側水栓なし                                    | 1  |         |         |
| 18 | カウンター         | ワイドカウンター                                   | 1  | -44,000 | -44,000 |
| 19 | シャワーフックスライドバー | あり   | 1  |         |         |
| 20 | 浴室パネル         | ハイクラス(全面デザインハイクラス)(Fパネル)                   | 1  | +40,000 | +40,000 |
| 21 | 浴室パネルタオル穴     | タオル掛け穴なし                                   | 1  |         |         |
| 22 | 天井            | フラット天井                                     | 1  | -15,000 | -15,000 |
| 23 | 換気機器          | 天井換気扇ホワイト                                  | 1  |         |         |
| 24 | 換気機器開口        | 工場開口                                       | 1  |         |         |
| 25 | 照明            | キュービッククリアライト<2灯>(電球色)                      | 1  | +5,000  | +5,000  |
| 26 | ミラー           | 横長ミラー                                      | 1  | -7,500  | -7,500  |
| 27 | 風呂フタ          | 組み合わせ式風呂フタ                                 | 1  |         |         |
| 28 | タオル掛け         | タオル掛けなし                                    | 1  | -1,000  | -1,000  |
| 29 | 収納棚           | 収納棚なし                                      | 1  |         |         |
| 30 | どこでもラック       | タオルハンガーL(ホワイト)                             | 1  | +2,800  | +2,800  |
| 31 | 循環金具セット       | PLLX                                       | 1  | +13,500 | +13,500 |

御名前 大阪-堺SR SB9 様

|      |          |       |                  |     |          |
|------|----------|-------|------------------|-----|----------|
| 現場番号 | C2871102 | プラン番号 | 1819G-2305-0789T | 作成日 | 2023/9/5 |
|------|----------|-------|------------------|-----|----------|

## 御見積明細 システムバス

| NO       | 商品名   | 仕様     | 数量 | 単価 | 金額       |
|----------|-------|--------|----|----|----------|
| 32       | 給水給湯管 | 洗い場1水栓 | 1  |    |          |
| システムバス合計 |       |        | 32 |    | ¥774,600 |

|       |  |  |    |  |          |
|-------|--|--|----|--|----------|
| 商品総合計 |  |  | 32 |  | ¥774,600 |
|-------|--|--|----|--|----------|

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

## 《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥139,000 ( 税込 ¥152,900 )


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格&lt;税率10%&gt;を表示しています。

パース

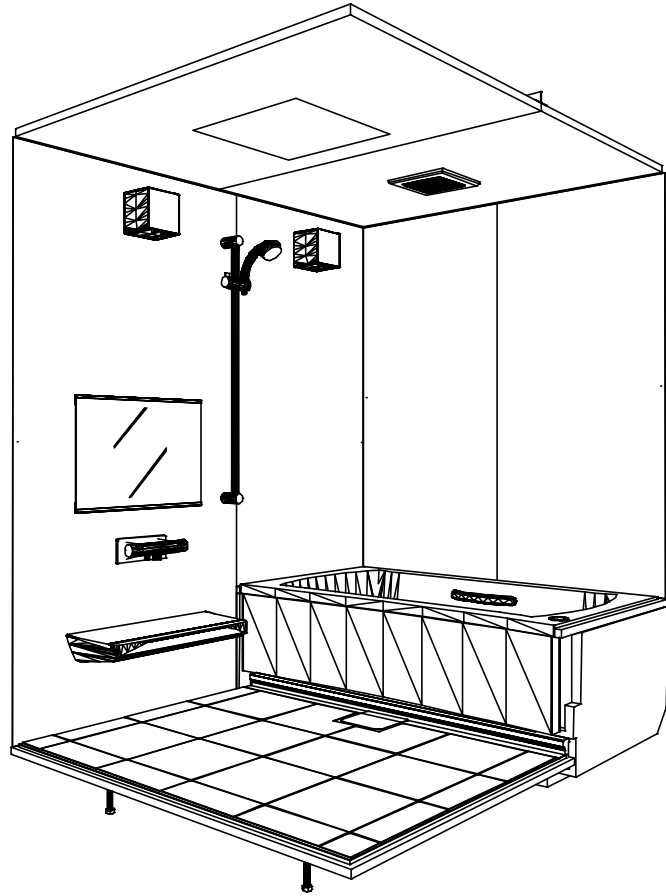

鳥瞰図

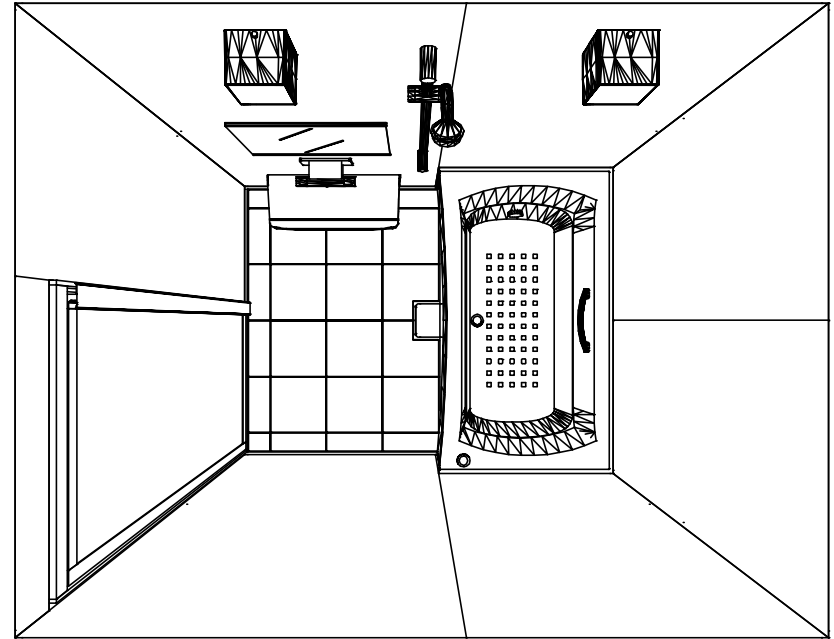

1418

フラット天井  
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。


**Takara standard**  
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 大阪-堺SR SB9様邸  
現場番号： C2871102  
堺営業所


GRANSPA グランSPA  
プラン番号： 1819G-2305-0789T  
担当営業：

姿図  
作成日： 2023年9月5日  
担当アドバイザー： UGS-9-14


縮尺：A3サイズ等倍





■留意事項  
 \*印寸法は給水給湯管の  
 突出寸法18mmを含みます。

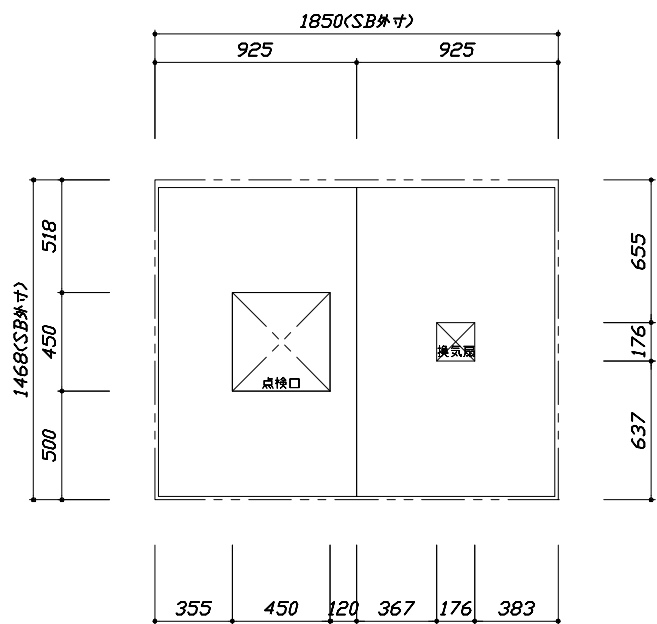

<天井伏図>

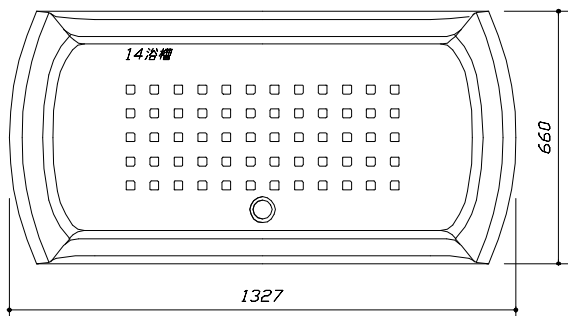

<浴槽詳細図>

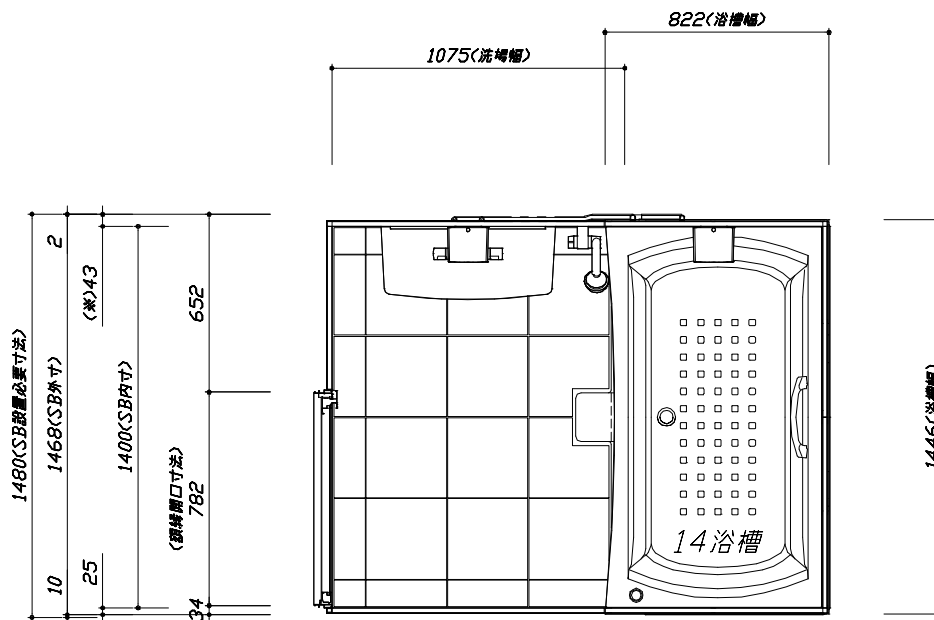

<平面図>

**Takara standard**  
 タカラストANDARD株式会社



現場名称： 大阪-堺SR SB9様邸  
 現場番号： C2871102  
 堺営業所

GRANSPA グランスパ  
 プラン番号： 1819G-2305-0789T  
 担当営業：

施工図1 縮尺： 1:25,20  
 作成日： 2023年9月5日  
 担当アドバイザー： UGS-9-14


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

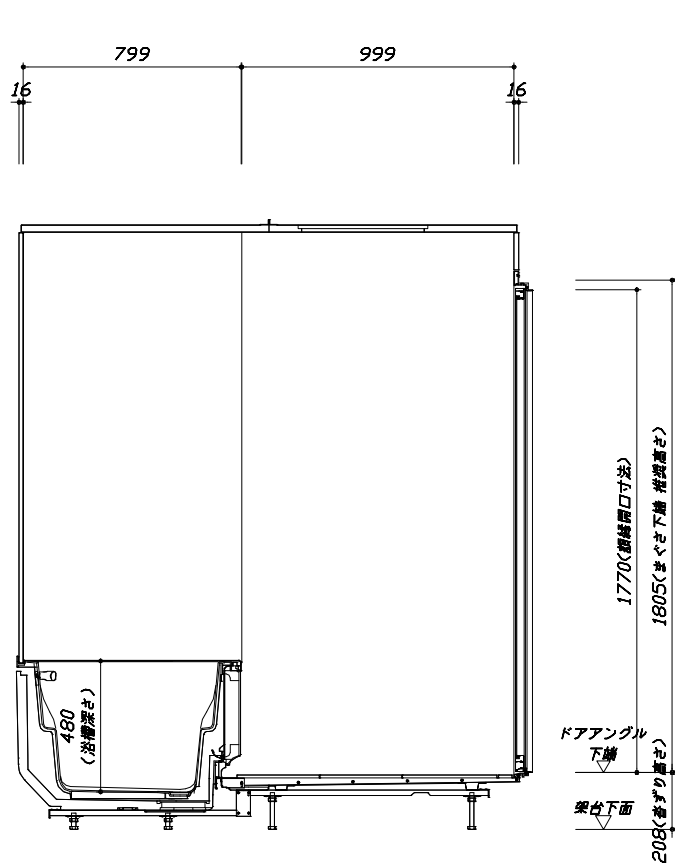

<カウンター対面図>

■ボルト 脚架台高さ寸法  
さずり高さに対して  
-9~+11mm調整可能

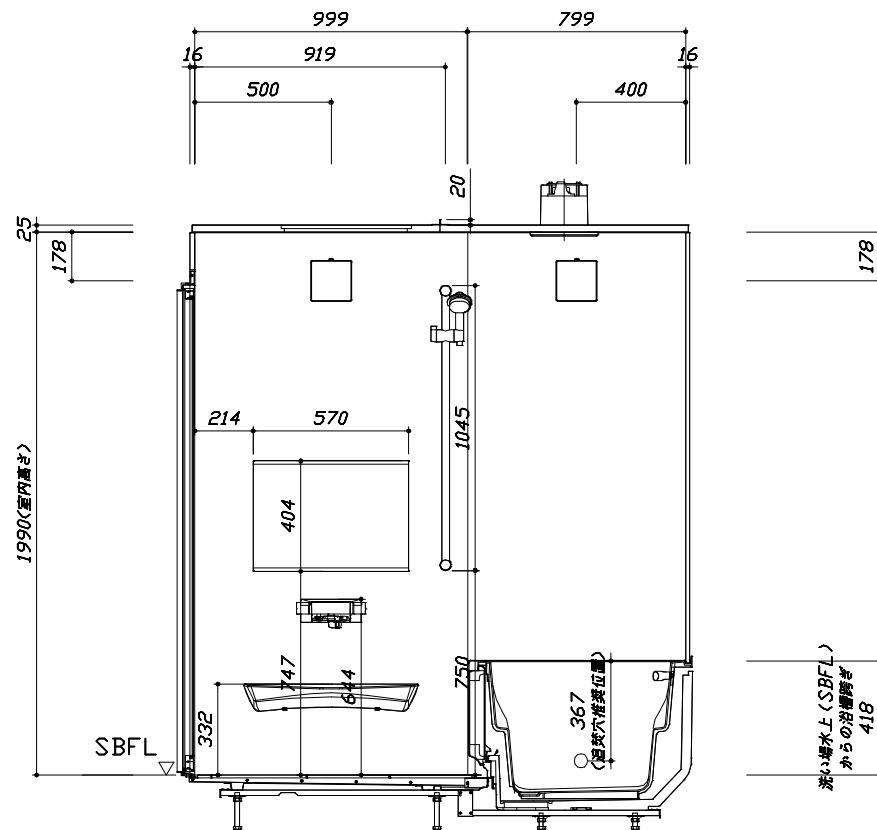

<カウンター面図>

Takara standard  
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 大阪-堺SR SB9様邸  
現場番号： C2871102  
堺営業所



GRANSPA グランspa  
プラン番号： 1819G-2305-0789T  
担当営業：

施工図2 縮尺： 1:20  
作成日： 2023年9月5日  
担当アドバイザー： UGS-9-14

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

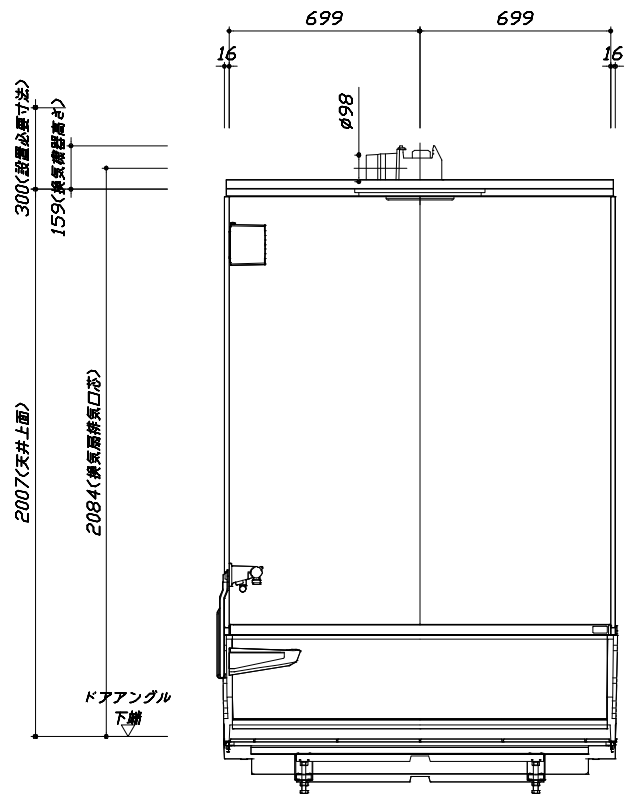

< 浴槽側面図 >

■ボルト脚架台高さ寸法  
 各ずり高さに対して  
 -9~+11mm調整可能

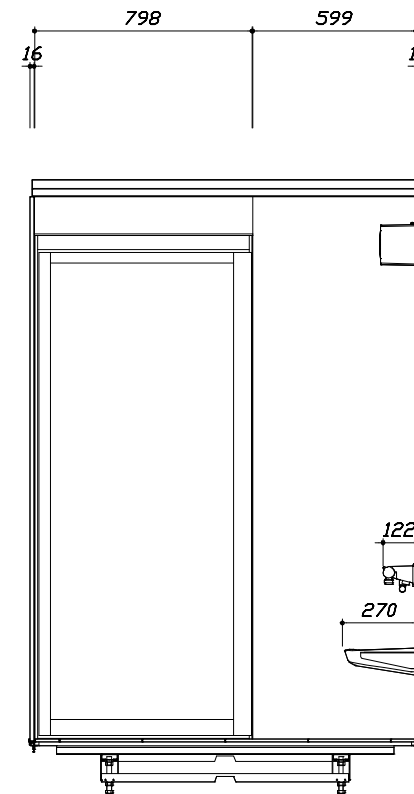

< 洗場側面図 >

**Takara standard**  
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 大阪-堺SR SB9様邸  
 現場番号： C2871102  
 堺営業所

GRANSPA グランスパ  
 プラン番号： 1819G-2305-0789T  
 担当営業：

施工図3 縮尺： 1:20  
 作成日： 2023年9月5日  
 担当アドバイザー： UGS-9-14

本体仕様表

|        |   |
|--------|---|
| 浴室サイズ  | 1418サイズ(室内容量5.0立方メートル)                            |
| ドア勝手   | BR勝手  |
| 架台     | ボルト脚架台(低床タイプ)：亜鉛メッキ鋼板                             |
| 洗場パン   | キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵                 |
| 浴槽材質   | ガラス繊維強化樹脂 (FRP) 裏面保温材なし                           |
| 浴槽形状   | セミスクエア浴槽 グリップ付 (14浴槽・300リットル) 追い焚き穴：あり            |
| 浴槽パン   | ビーズ法ポリスチレンフォーム (EPS) +ABS樹脂成型カバー                  |
| 浴槽エプロン | ABS樹脂   |
| カウンター  | ワイドカウンター：ABS樹脂                                    |
| 浴室パネル  | パネル高さFタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし                |
| 天井     | 化粧サッシ付(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：なし                |
| ドア     | キープクリーンドア：18高さ開き戸(アルミ框/樹脂ガラス/ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型換気口/ﾄﾞｱ外側掛け付) |
| 窓1     | －   |
| 窓2     | －   |
| 窓枠1    | －   |
| 窓枠2    | －   |
| 排水トラップ | ASA樹脂・封水50mm                                      |
| 雑排水配管  | 硬質塩ビパイプ VP50                                      |
| 製品重量   | 245kg   |

アクセサリ仕様表

|            |  |
|------------|--|
| ミラー        | 横長ミラー                                    |
| 収納棚        | －  |
| タオル掛け      | －  |
| 洗場側水栓      | サーモスタット(SB18520SN) (樹脂ホース：シルバー)          |
| 浴槽側水栓      | －  |
| 兼用水栓       | －  |
| フック/スライドバー | シャワーフックスライドバー (スライドバー-TN-1020)           |
| 照明         | キュービッククリアライト (LED 13.0W電球色) (2灯)         |
| 換気機器       | 天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W) (ﾀﾞｲﾌﾞﾙ径φ98) ホワイト |
| フロタ        | 組合せ式(アルミ複合板：2枚)                          |
| 給水給湯管      | 銅管(10A)                                  |
| 循環金具       | 循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様             |
| ハンドバー①     | －  |
| ハンドバー②     | －  |
| ハンドバー③     | －  |
| ハンドバー④     | －  |
| ハンドバー⑤     | －  |
| ハンドバー⑥     | －  |
| ハンドバー⑦     | －  |

本体カラー

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 浴槽          | D：ベージュ          |
| カウンター       | W：ホワイト          |
| パネル(カウンター面) | AW：リネンホワイト      |
| パネル(周辺・3面)  | YG：ウォルナットグレージュ  |
| 水栓上部カウンター   | W：ホワイト          |
| 浴槽エプロン      | D：ベージュ          |
| 洗場          | HD：カームベージュ      |
| ドア / 天井     | W：ホワイト / W：ホワイト |
| 収納棚         | －               |
| タオル掛け       | －               |
| ランドリセット     | －               |

**Takara standard**  
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 大阪-堺SR SB9様邸  
現場番号： C2871102  
堺営業所



GRANSPA グランspa  
プラン番号： 1819G-2305-0789T  
担当営業：

仕様表  
作成日： 2023年9月5日  
担当アドバイザー： UGS-9-14



# 基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。  
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。  
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。  
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

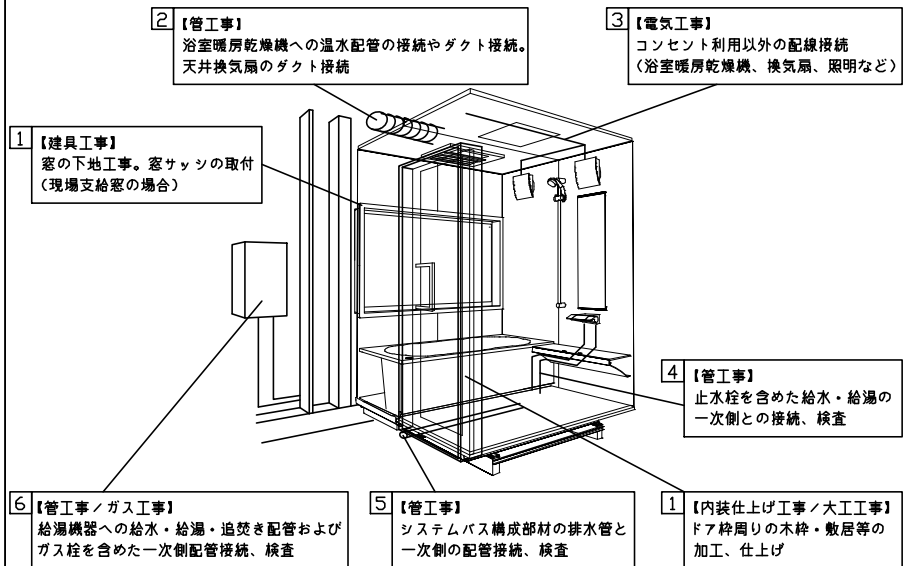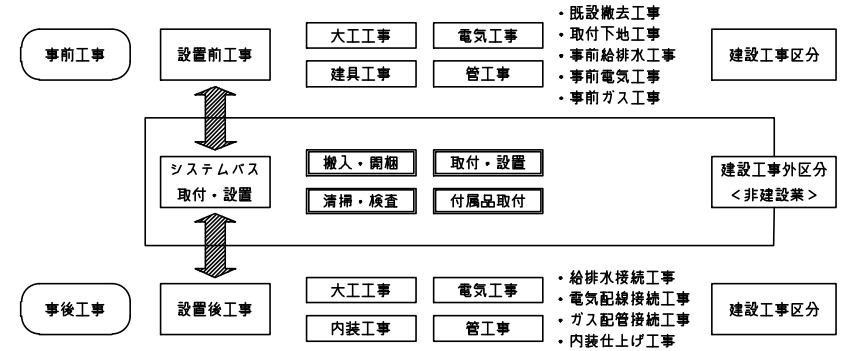

## ■システムバス 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

| 工事区分              | 部位<br>(図)    | 業種区分               | 作業名称(区分)                | 建設工事     |                       |                  |             |                  | 建設工事外                      |                                      | 作業内容                      |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------------------|----------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                   |              |                    |                         | 大工<br>工事 | と<br>び<br>土<br>工<br>事 | 建<br>具<br>工<br>事 | 管<br>工<br>事 | 電<br>気<br>工<br>事 | 給<br>湯<br>機<br>器<br>設<br>備 | シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>バ<br>ス<br>設<br>置 |                           |
| 設置前工事             | 1<br>2<br>3  | 大工<br>土<br>建具      | 設置基礎、設置床の工事             | ○        | ○                     |                  |             |                  |                            |                                      | 浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事     |
|                   |              |                    | 浴室ドア、窓サッシの下地工事          | ○        |                       | ○                |             |                  |                            |                                      | 建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事   |
|                   |              | 管                  | 給排水配管事前工事               |          |                       |                  | ○           |                  |                            |                                      | 浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事      |
|                   |              |                    | 換気機器のダクト配管事前工事          |          |                       |                  | ○           | ○                |                            |                                      | 浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工         |
| 電気                | 給湯機器専用配管事前工事 |                    |                         |          | ○                     |                  | □           |                  | 風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事          |                                      |                           |
| システムバス<br>本体取付・設置 | 建設工事<br>外区分  | 建設工事<br>外区分        | 浴室専用電気配線事前工事            |          |                       |                  |             | ○                |                            | 浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事                |                           |
|                   |              |                    | 架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置       |          |                       |                  |             |                  | □                          |                                      | 浴室専用の架台・浴槽パン、洗い場を所定の位置に設置 |
|                   |              |                    | 浴室専用排水トリアップ・配管セットの取付・設置 |          |                       |                  |             |                  | □                          |                                      | 洗い場・浴槽パンへの排水トリアップ取付       |
|                   |              |                    | 壁パネルの組立・設置              |          |                       |                  |             |                  | □                          |                                      | 浴室パネル部材の加工と組立             |
|                   |              |                    | 天井・浴槽の組立・設置             |          |                       |                  |             |                  | □                          |                                      | 天井部材・浴槽部材の取付              |
|                   |              |                    | 内装品、器具類の取付・設置【注記1】      |          |                       |                  |             |                  | □                          |                                      | カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付       |
|                   |              |                    | 水栓類の組立・取付【注記1】          |          |                       |                  |             |                  | □                          |                                      | 水栓類の組立、浴室部材への取付           |
|                   |              |                    | 浴室専用換気機器の取付【注記1】        |          |                       |                  |             |                  | □                          |                                      | 浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付      |
|                   |              |                    | 風呂追焚き部品の取付【注記1】         |          |                       |                  |             |                  | □                          | □                                    | 循環追焚き金具の取付                |
|                   |              |                    | 浴室内給湯機器用リモコンの取付         |          |                       |                  |             |                  | □                          | □                                    | 専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付       |
|                   |              |                    | 浴室照明器具の取付               |          |                       |                  |             |                  | □                          |                                      | 浴室照明器具の浴室パネル加工・取付         |
|                   |              |                    | その他浴室関連電化機器の取付【注記1】     |          |                       |                  |             |                  | □                          |                                      | 電化品、オプション品の取付             |
|                   |              |                    | 浴室ドアの組立・取付              |          |                       |                  |             |                  | □                          |                                      | システムバス構成部材のドアの組立・取付       |
|                   |              |                    | 浴室窓サッシの取付【注記1】          |          |                       |                  |             |                  | □                          |                                      | システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付     |
|                   |              |                    | 浴室窓枠の組立・取付【注記1】         |          |                       |                  |             |                  | □                          |                                      | システムバス構成部材の窓枠の組立・取付       |
|                   |              |                    | シリコンの充填                 |          |                       |                  |             |                  | □                          |                                      | 接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填       |
|                   |              |                    | 試運転・完成検査【注記2】           |          |                       |                  |             |                  | □                          |                                      | 完成後の試運転、性能確認検査            |
| 設置後工事             | 1<br>2<br>3  | 管<br>大工<br>電気      | 建築外壁の穴あけ                |          | ○                     |                  |             | ○                |                            | 建築壁の躯体加工作業                           |                           |
|                   |              |                    | 排気ダクトの敷設工事              |          |                       |                  |             | ○                |                            | 浴室換気機器のダクト敷設工事                       |                           |
|                   |              |                    | 浴室換気機器と排気ダクト接続工事        |          |                       |                  |             | ○                |                            | 建築側ダクトと換気機器の接続、検査                    |                           |
|                   | 4<br>5<br>6  | 管                  | 浴室換気機器の電気・アース接続工事       |          |                       |                  |             | ○                |                            | 建築側の屋内配線と配線器具、アース工事                  |                           |
|                   |              |                    | ウェザーカバーの外壁取付            |          |                       |                  |             | ○                | ○                          | 建築の外装仕上げ工事                           |                           |
|                   |              |                    | 給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事    |          |                       |                  |             | ○                |                            | 給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査              |                           |
| 1<br>3            | 電気<br>他      | 建築側排水配管との接続工事【注記3】 |                         |          |                       |                  | ○           |                  | 浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査      |                                      |                           |
|                   |              | 給湯機器本体工事（試運転・確認）   |                         |          |                       |                  | ○           | □                | 機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）        |                                      |                           |
|                   |              | 内装仕上げ工事            |                         | ○        |                       | ○                |             |                  | 床、ドア細修、脱衣室仕上げ工事            |                                      |                           |
|                   |              |                    | 浴室用電源配線、接続工事            |          |                       |                  | ○           |                  | 浴室機器の事後電気工事                |                                      |                           |
|                   |              |                    | 浴室天井裏の電源、スイッチ工事         |          |                       |                  | ○           |                  | 浴室全体の電気器具、配線接続工事           |                                      |                           |

※【注記1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする  
 ※【注記2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する  
 ※【注記3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする





■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



■ 給水給湯管工事注意事項



- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

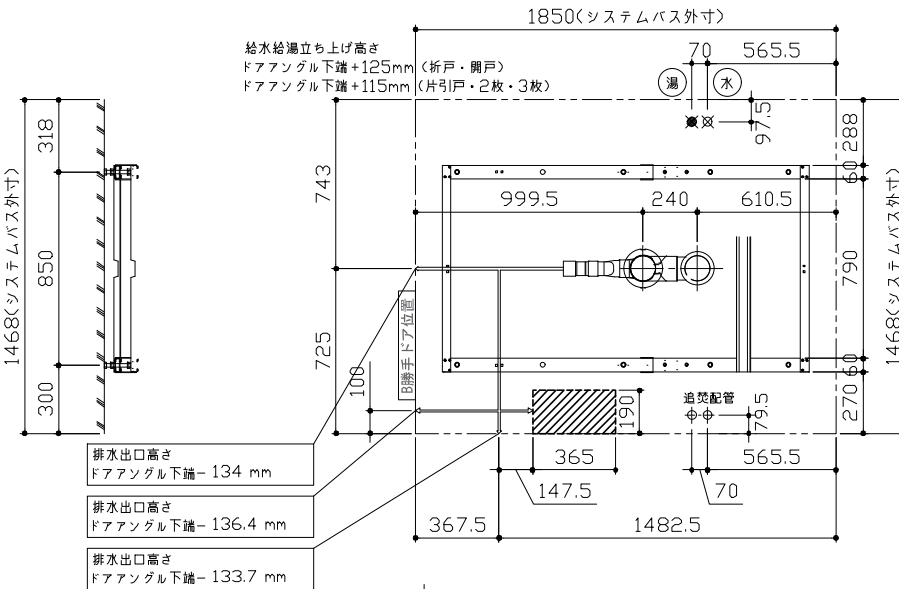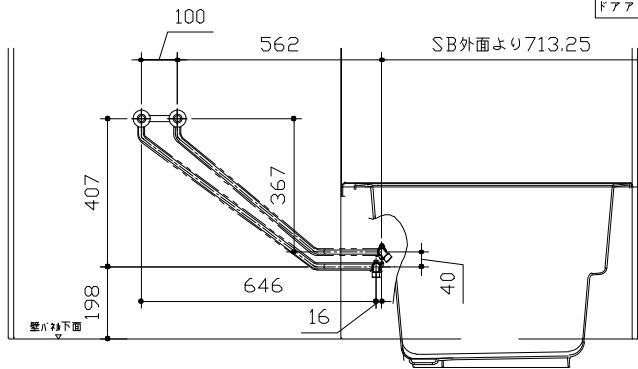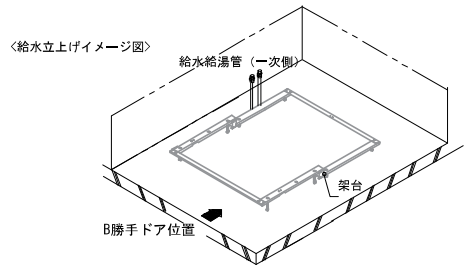

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

■ 設備記号

| 記号 | 記号の意味             |
|----|-------------------|
| ☒  | 給水位置              |
| ☒  | 給湯位置              |
| ▨  | 排水管立上げ推奨範囲 (VP50) |



〈給水給湯管取合詳細図〉





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・浴槽パンの配管導入口下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。  
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

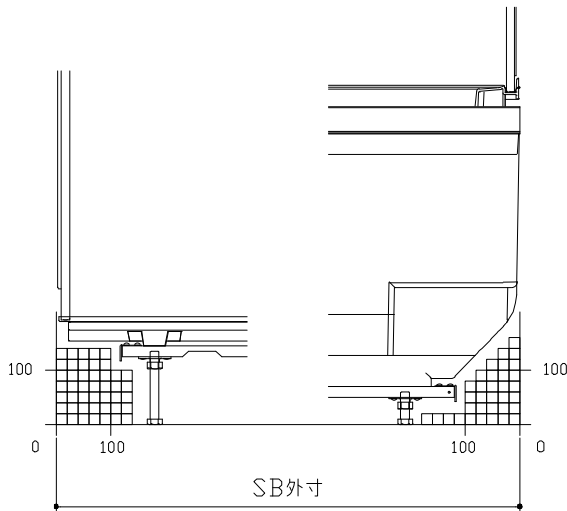


B矢視

A矢視

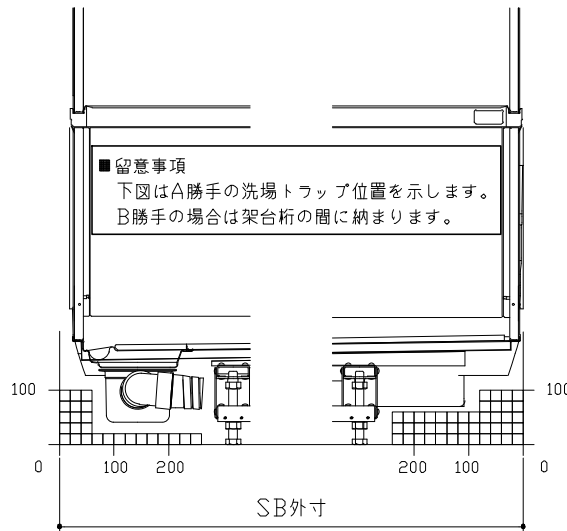

D矢視

C矢視


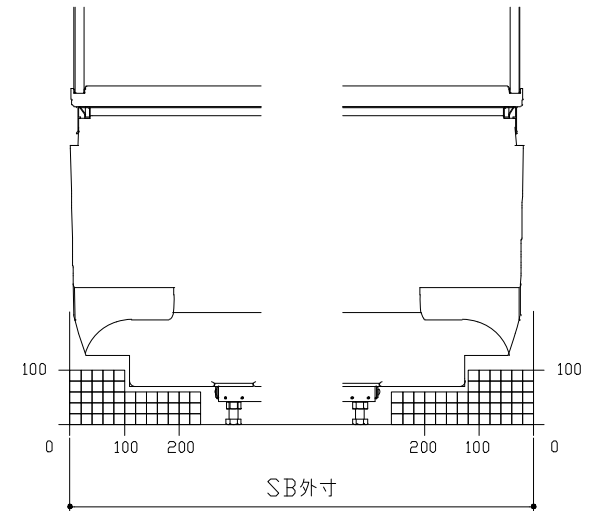


F矢視

E矢視

# キープクリーンドア：開き戸・タテ型換気口

有効開口寸法720mm

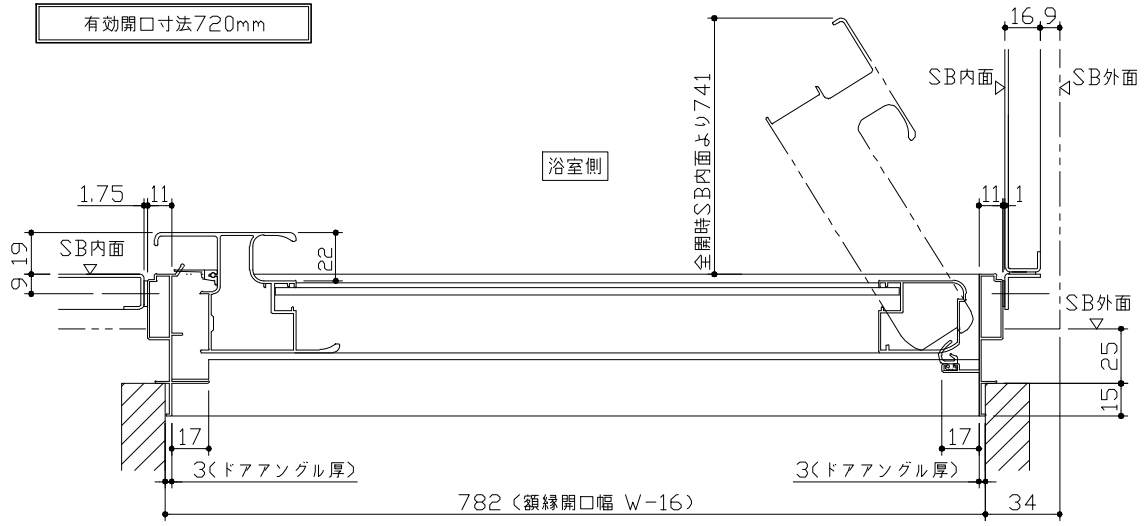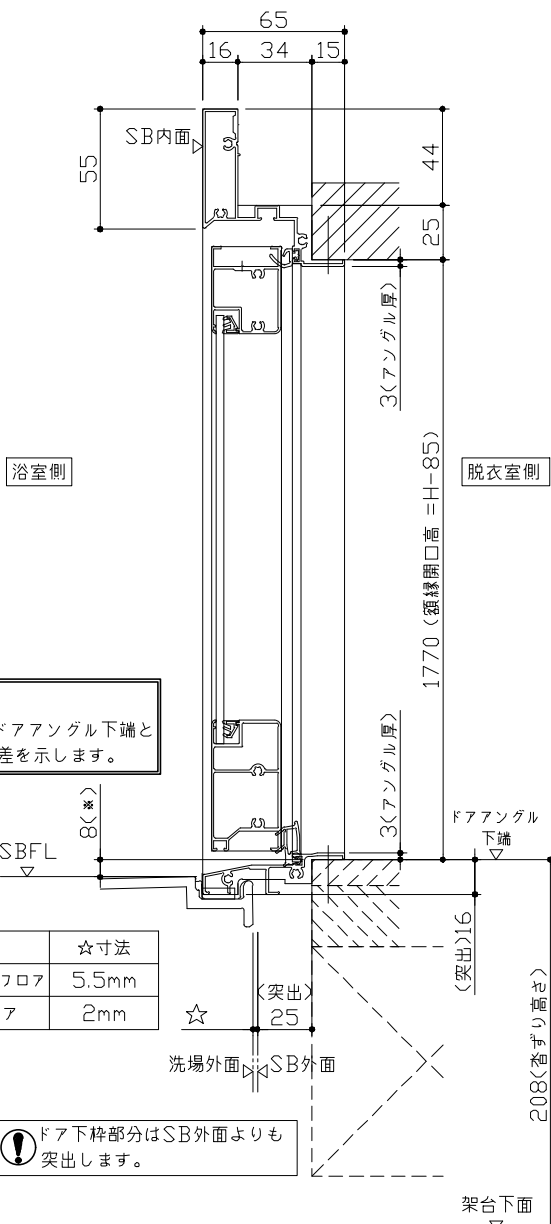


ドア開き角度65°以上でタオル掛けと干渉の恐れがあります。

■留意事項  
\*印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。


| ドア仕様       | ☆寸法   |
|------------|-------|
| キープクリーンフロア | 5.5mm |
| FRPフロア     | 2mm   |


⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

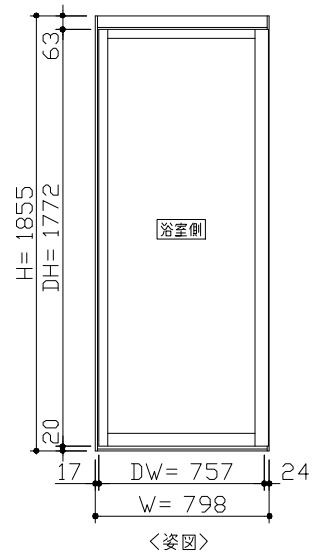

■ドア横の管柱、間柱について  
・ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。  
・躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

<参考寸法図>



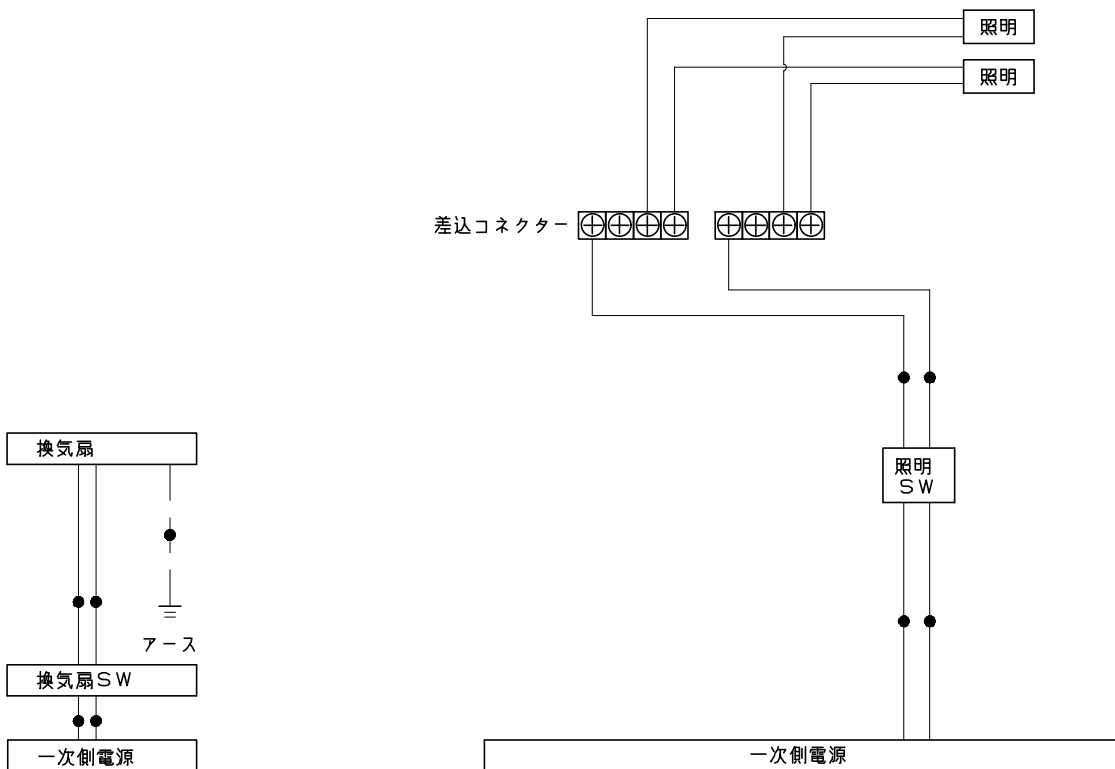

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。  
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">浴槽</p> <p style="text-align: center;">* 漏水受け仕様の場合は &lt;&gt; 内寸法参照のこと</p> | <p style="text-align: center;">洗い場用水栓</p>                   | <p style="text-align: center;">照明</p> <p>キュービッククリアライト<br/>LED 6.5W (1灯あたり) 口金E17</p> |  |
| <p style="text-align: center;">換気機器</p>   | <p style="text-align: center;">カウンター</p>                    | <p style="text-align: center;">シャワーフックスライドバー</p>                                     |  |
| <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">管工事</p>                            | <p>本体: ABS</p>  | <p style="text-align: center;">シャワーフック本体部分詳細</p>                                     |  |
| <p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">Takara standard</p> <p>タカラスタンダード株式会社</p>                 | <p>現場名称: 大阪-堺SR SB9様邸</p> <p>現場番号: C2871102</p> <p>堺営業所</p> | <p>GRANSPA グランスパ</p> <p>プラン番号: 1819G-2305-0789T</p> <p>担当営業:</p>                     | <p>部材詳細図 1/3</p> <p>作成日: 2023年9月5日</p> <p>担当アドバイザー: UGS-9-14</p> |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">ミラー</p> <p>枠: SUS304 ±0.8<br/>ミラー: 表面防曇コートあり(横長クリアミラー)<br/>表面防曇コートなし(横長ミラー)</p> | <p style="text-align: center;">ドア外タオル掛け</p> <p>パイプ部材質: ステンレス (ヘアライン仕上げ)<br/>脚部材質: ABS</p> | <p style="text-align: center;">ドア外タオル掛け 設置位置</p>             |  |
| <p style="text-align: center;">循環金具・フロアダプタ関連</p>   | <p style="text-align: center;">風呂蓋 フワクMZA-14</p>  | <p style="text-align: center;">洗い場側排水トラップ</p>                |  |
| <p style="text-align: center;">温熱配管立上図</p>   | <p style="text-align: center;">断面図</p>  |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Takara standard</b><br/>タカラスタンダード株式会社</p>                                    | <p>現場名称: 大阪-堺SR SB9様邸<br/>現場番号: C2871102<br/>堺営業所</p>                                     | <p>GRANSPA グランspa<br/>プラン番号: 1819G-2305-0789T<br/>担当営業 :</p> | <p>部材詳細図 2/3<br/>作成日: 2023年9月5日<br/>担当アドバイザー: UGS-9-14</p> |



浴槽側排水トラップ

