

システムバス 御見積書

御名前 長野-新佐久平SR SB1 様

業者 _____ 様

商品名 PREDENCIA プレデンシア

商品
御見積金額 ¥1,925,200 (税込 ¥2,117,720)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 ¥202,000 (税込 ¥222,200)

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

作成日 2020年11月25日
プラン番号 2612B-2005-0006T
現場番号 C1300719

タカスタンダード株式会社
佐久平営業所
長野県佐久市長土呂157-1
TEL 0267-77-7505 / FAX 0267-77-7606

佐久平ショールーム
TEL 0267-88-7604 / FAX 0267-88-7605

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

備考

御見積仕様

(システムバス)	
ユニットサイズ	1620(AL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア(プレミアムクラス)
浴槽材質	鋳物ホーロー
カラー	ラスターブラック
形状	くつろぎラウンジ浴槽(ハンチ付)
浴槽・風呂フタ	高断熱仕様
カウンター材質	クォーツストーン
カラー	ジュエルブラック
エプロン材質	ステンレス(カラーコーティング)
カラー	ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
カラー	ウォルナットブラウン(HDタイプ)
ガス種	LPG
周波数	60Hz

御確認事項

--	--

御名前 長野-新佐久平SR SB1

様

現場番号	C1300719	プラン番号	2612B-2005-0006T	作成日	2020/11/25
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシアプレミアム 1620サイズ		1	1,305,000	1,305,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	キーブクリーンドア:開き戸<800幅>(ブラック)(19サイズ)	1	+57,000	+57,000
4	洗い場	キーブクリーンフロア(プレミアムクラス・グラングレー)	1	+20,000	+20,000
5	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)	1		
6	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
7	浴槽追焚き穴	あり	1		
8	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)	1		
9	浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付)	1	+50,000	+50,000
10	ヘルシージェット	なし	1		
11	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1		
12	ガス温水式床暖房	なし	1		
13	洗い場用水栓	プッシュ式水栓(メタルホース)SB280	1		
14	洗い場用水栓	マッサージシャワー	1	+13,000	+13,000
15	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
16	カウンター	クォーツストーンデュアルカウンター	1	+212,000	+212,000
17	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	1	+5,200	+5,200
18	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザイン4面同柄)	1	+70,000	+70,000
19	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
20	窓枠フリー	窓枠フリー(樹脂タイプ)L1512 G<グレー色>	1	+19,000	+19,000
21	天井	高光沢フラット天井	1		
22	換気機器	浴室暖房乾燥機(200V)	1	+83,000	+83,000
23	換気機器	ランドリーパイプメタルタイプ(1本)	1	+1,500	+1,500
24	換気機器開口	工場開口	1		
25	照明	ストレートライン照明(調光機能付き)	1	+29,000	+29,000
26	天井照明開口	工場開口	1		
27	ミラー	ワイドクリアミラー(収納棚対応)	1	+26,000	+26,000
28	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
29	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-4,000	-4,000
30	収納棚	クリアタイプ(2段)	1	-4,000	-4,000
31	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500

御名前 長野-新佐久平SR SB1

様

現場番号	C1300719	プラン番号	2612B-2005-0006T	作成日	2020/11/25
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
33	トラップカバー	洗い場側トラップカバー	1		
34	トラップカバー	浴槽側トラップカバー(浴槽パンあり)	1		
35	壁面スピーカー	どこでもスピーカー	1	+25,000	+25,000
システムバス合計			35		¥1,925,200

商品総合計	35	¥1,925,200
-------	----	------------

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥202,000 (税込 ¥222,200)


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

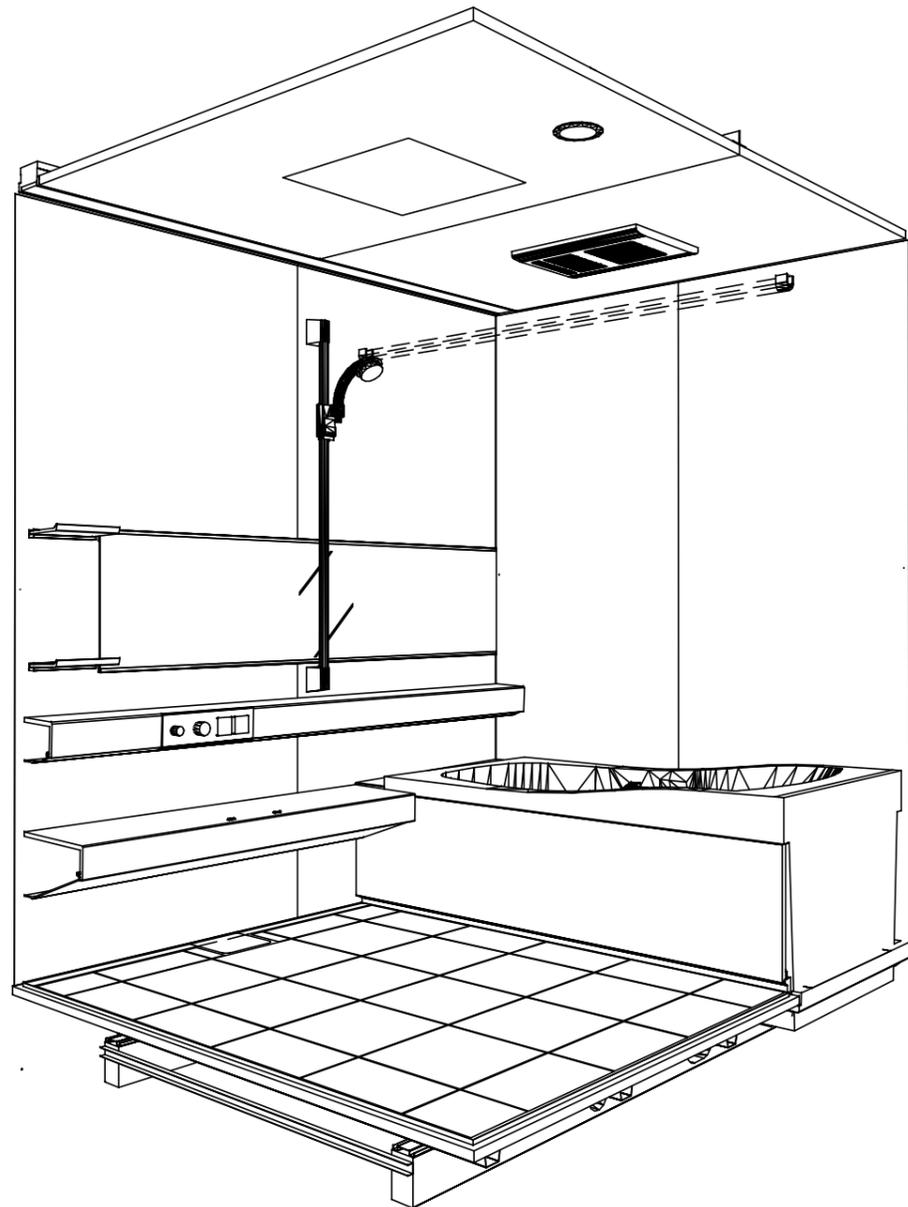

鳥瞰図

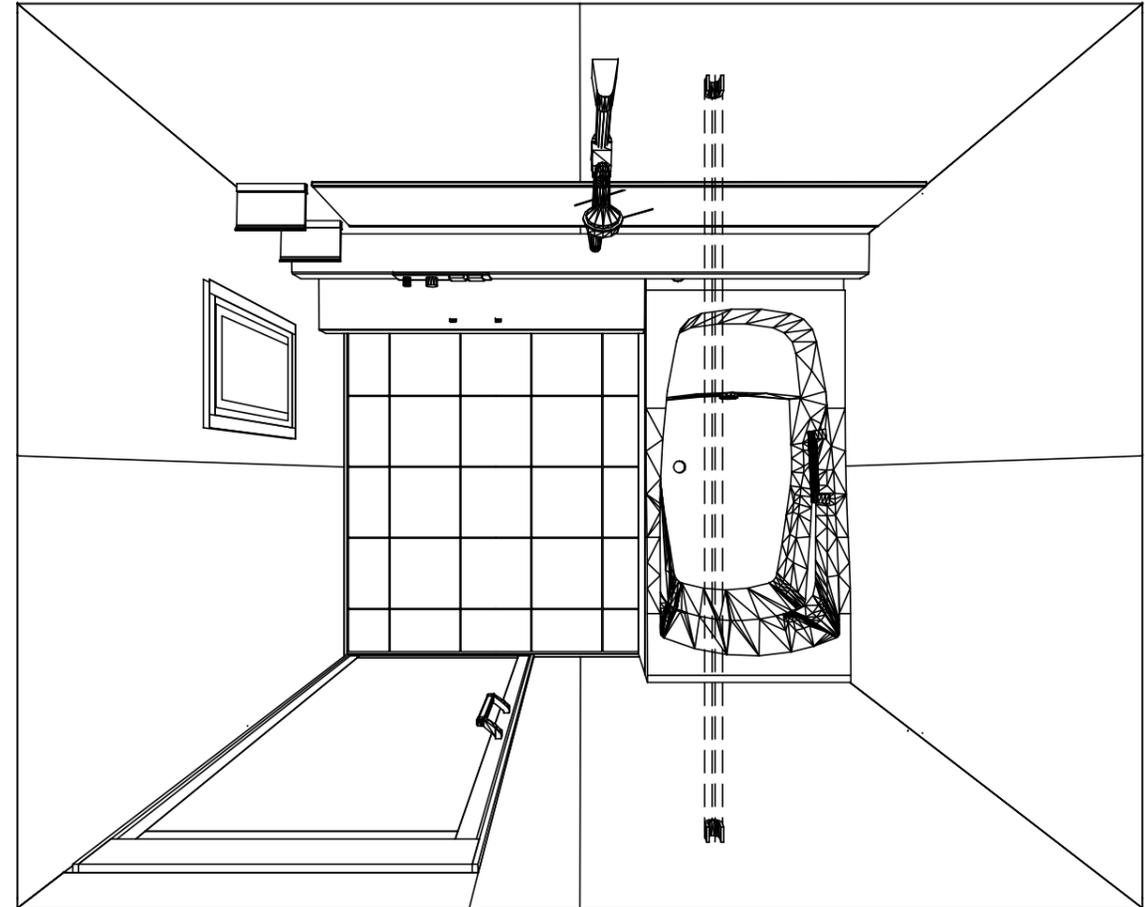

1620

鋳物ホーロー浴槽

高光沢フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、200Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

Takara standard
タカラストANDARD株式会社

現場名称： 長野-新佐久平SR SB1様邸

現場番号： C1300719

佐久平営業所

PREDENCIA プレデンスシア

プラン番号： 2612B-2005-0006T

担当営業：

姿図


作成日： 2020年11月25日

担当アドバイザー：


縮尺：A3サイズ等倍





■留意事項
 ※印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

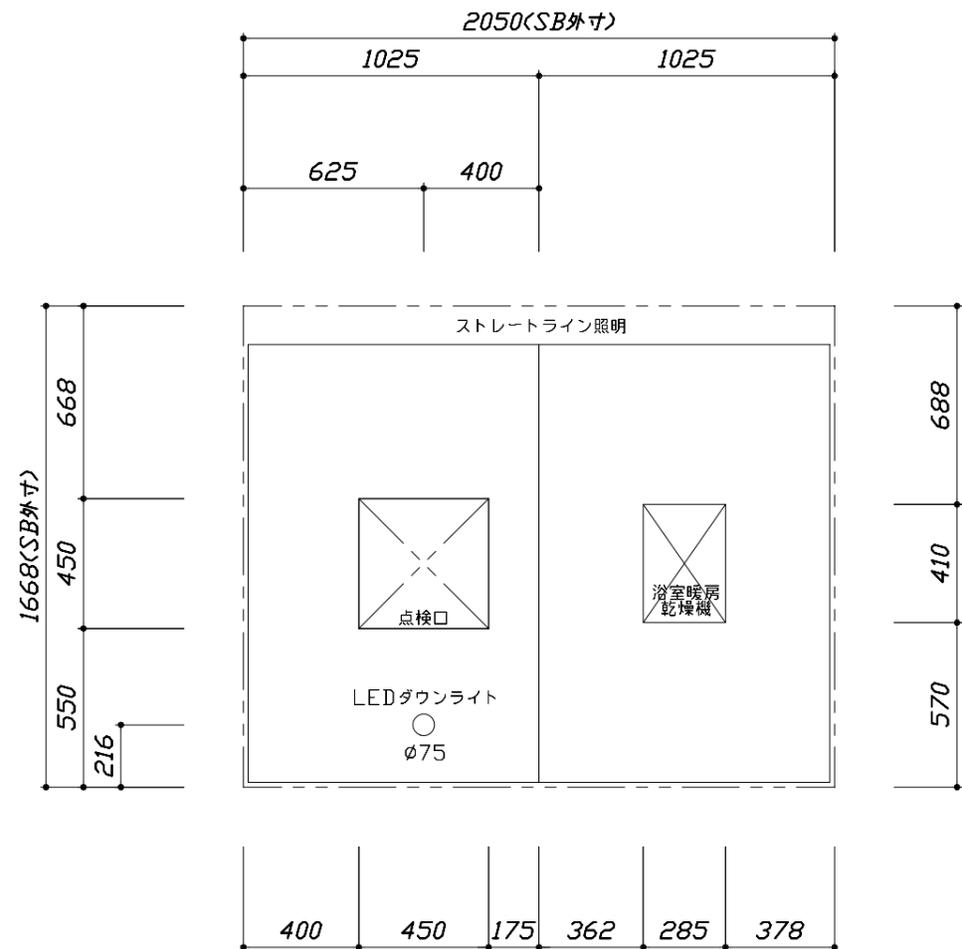

<天井伏図>

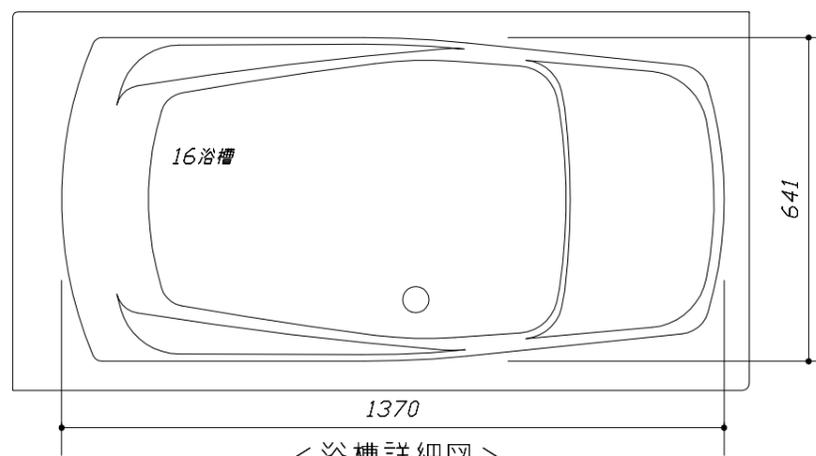

<浴槽詳細図>

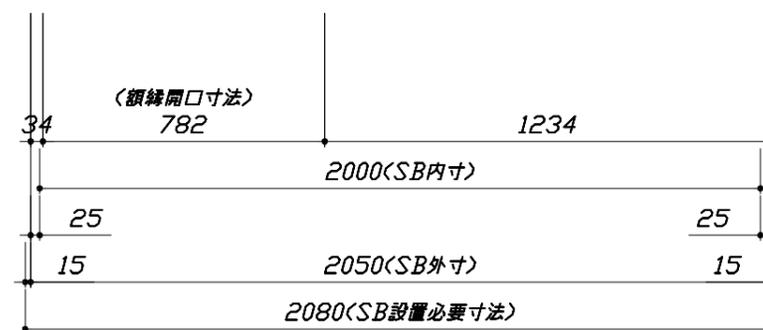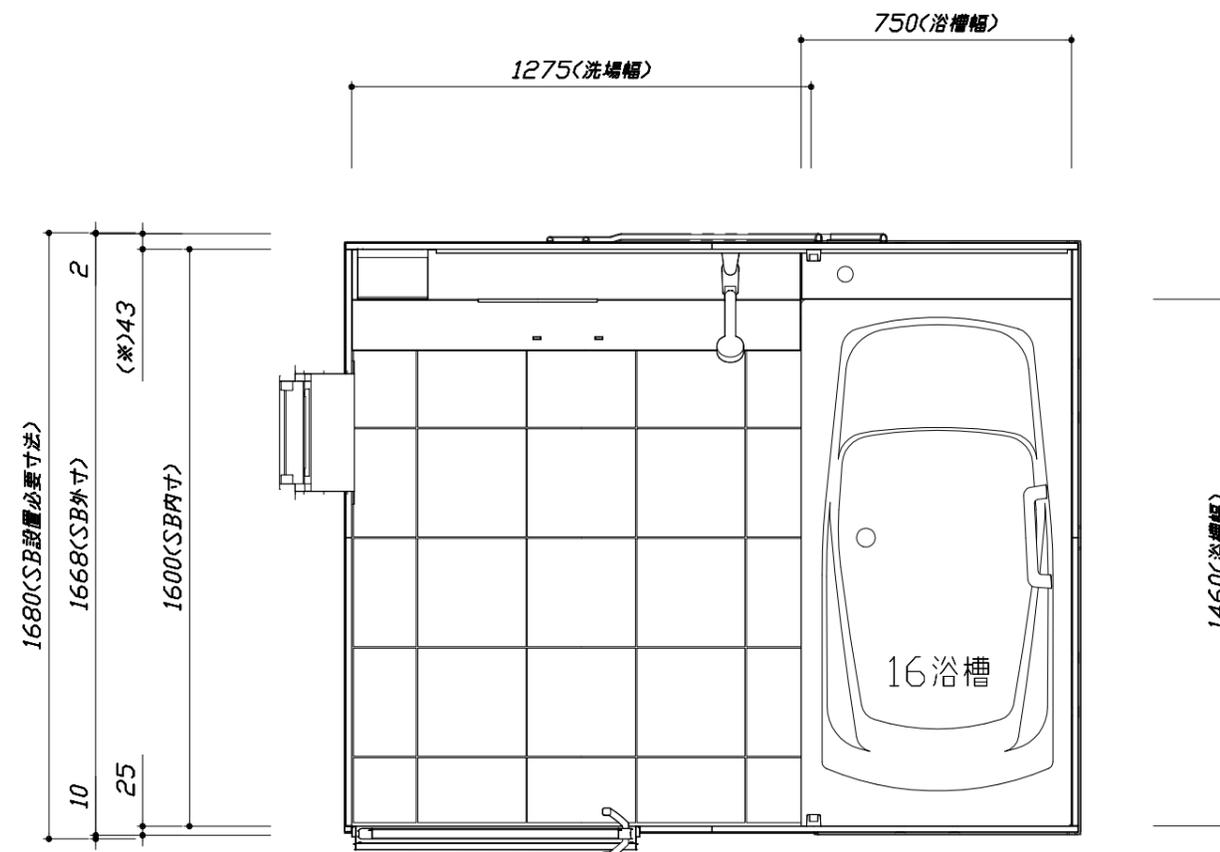

<平面図>

Takara standard
 タカラストANDARD株式会社



現場名称： 長野-新佐久平SR SB1様邸
 現場番号： C1300719
 佐久平営業所

PREDECENCIA プレデンスシア
 プラン番号： 2612B-2005-0006T
 担当営業：

施工図1 縮尺： 1:25,20
 作成日： 2020年11月25日
 担当アドバイザー：


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・浴槽側面の窓は参考です。窓は現地手配となります。
- ・大きさ、設置位置等確認をお願いします。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

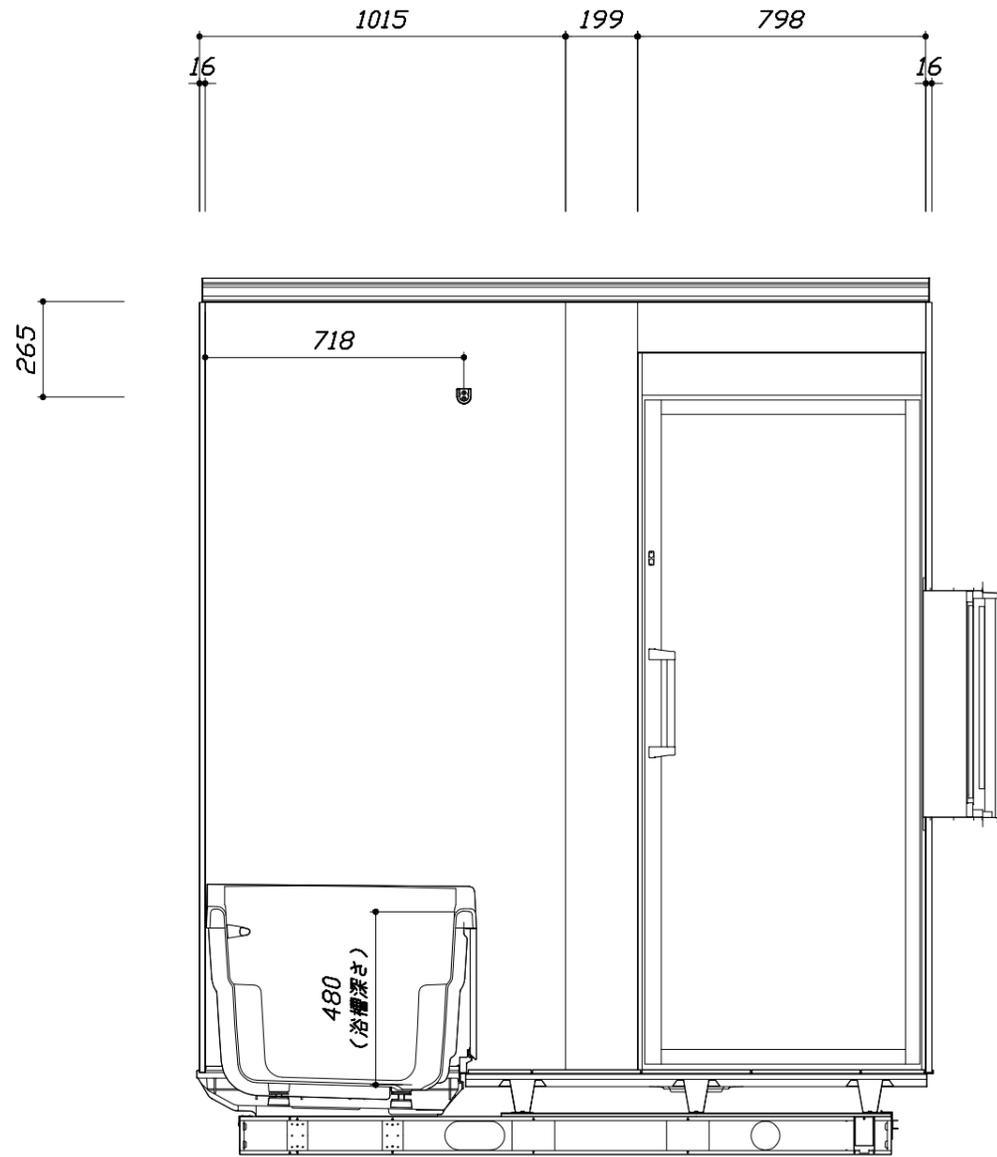

<カウンター対面図>

■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)

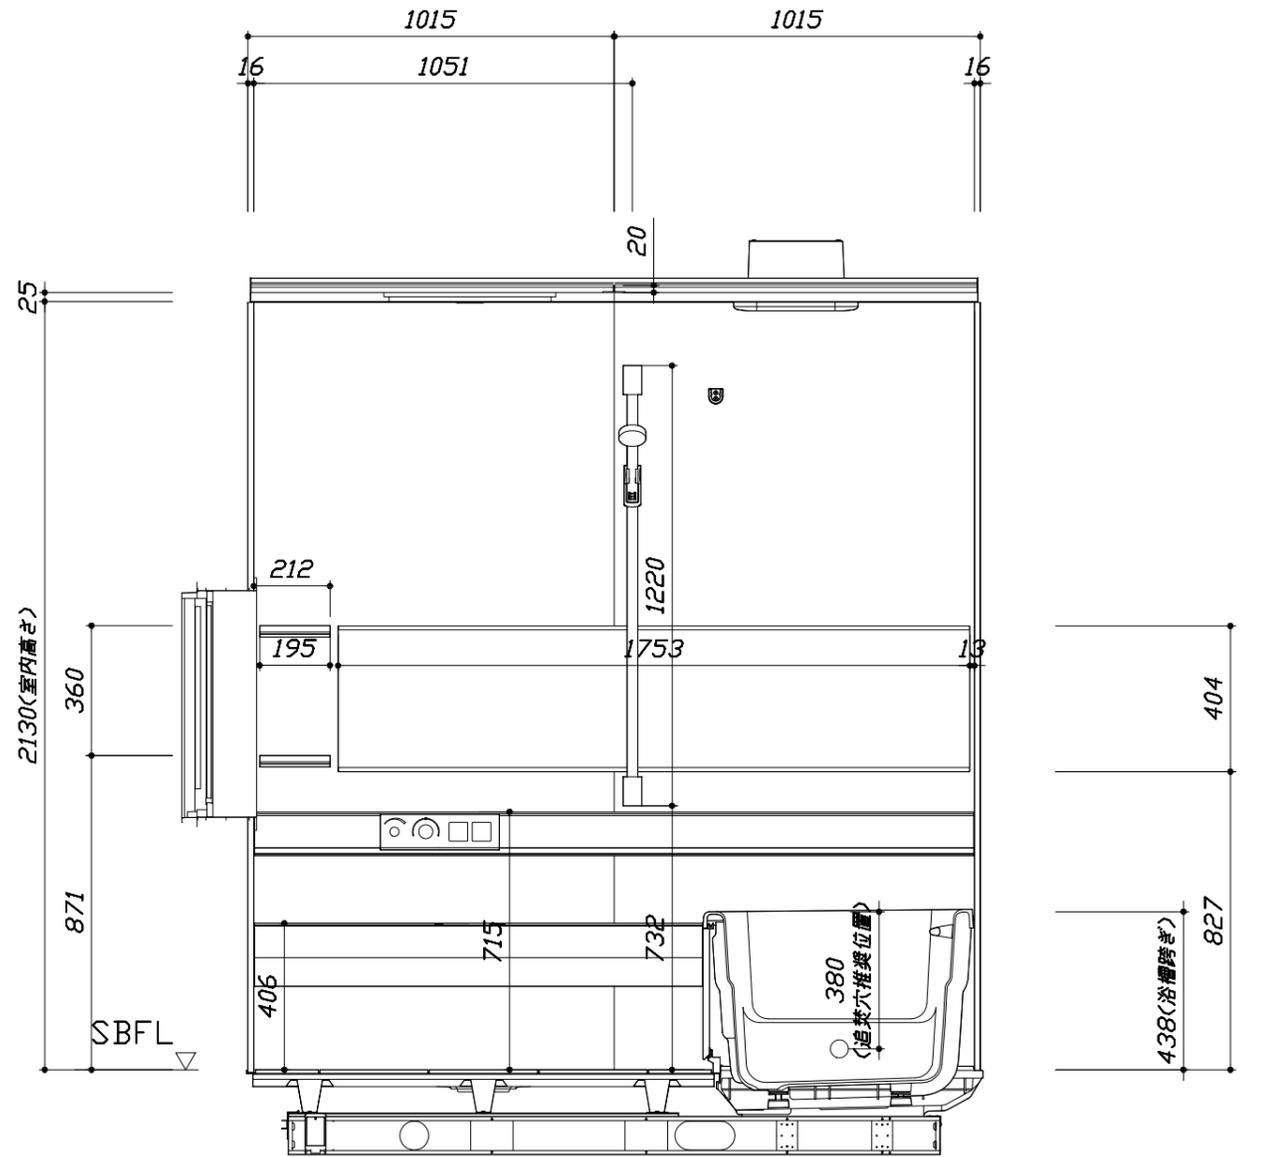

<カウンター面図>

Takara standard
 タカラストANDARD株式会社



現場名称： 長野-新佐久平SR SB1様邸
 現場番号： C1300719
 佐久平営業所

PREDECENCIA プレデンスシア
 プラン番号： 2612B-2005-0006T
 担当営業：

施工図2 縮尺： 1:20
 作成日： 2020年11月25日
 担当アドバイザー：


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・浴槽側面の窓は参考です。窓は現地手配となります。
- ・大きさ、設置位置等確認をお願いします。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法をご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

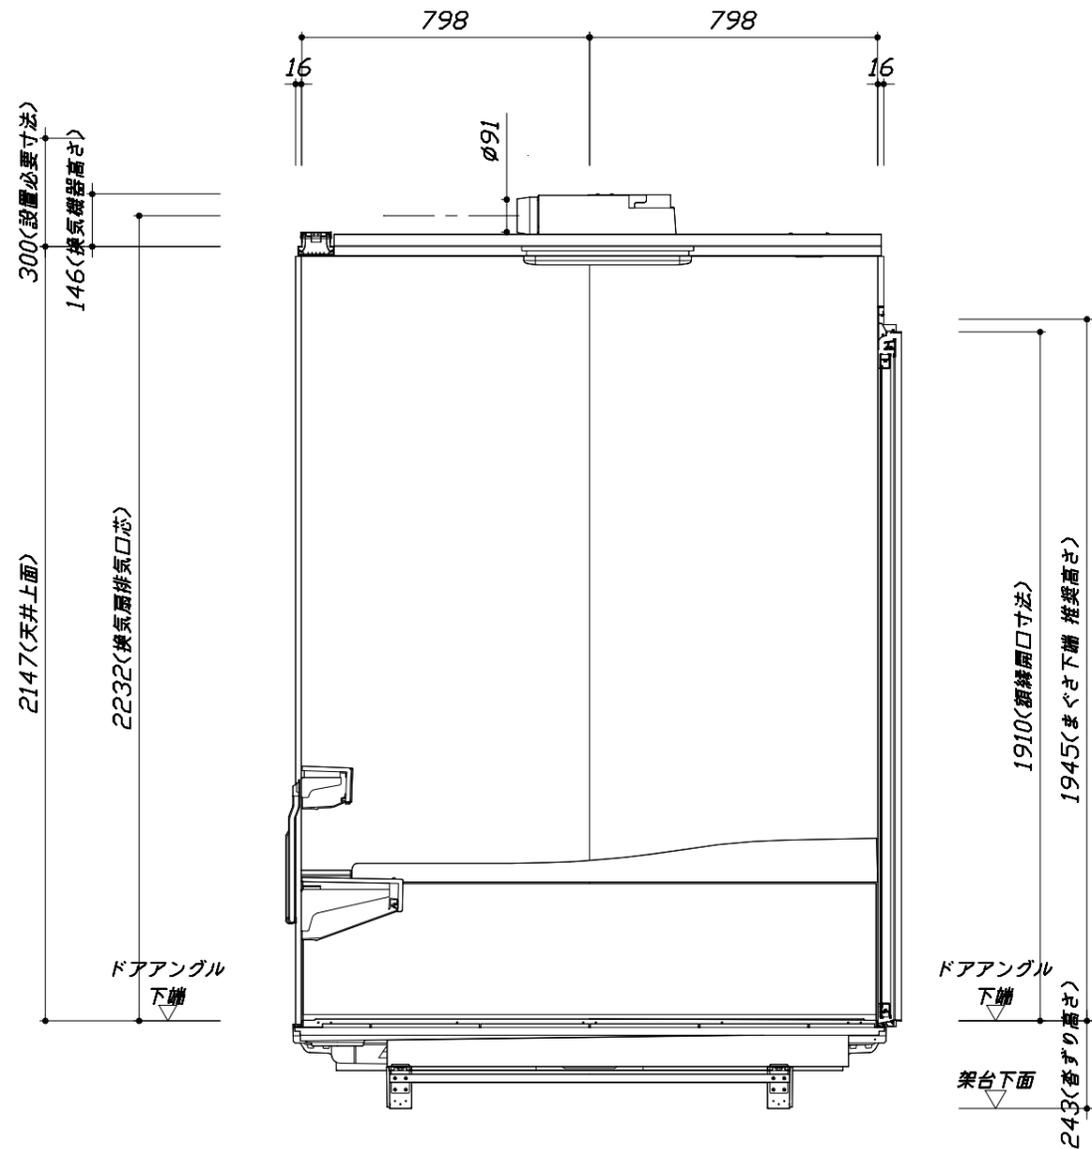

■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)

< 浴槽側面図 >

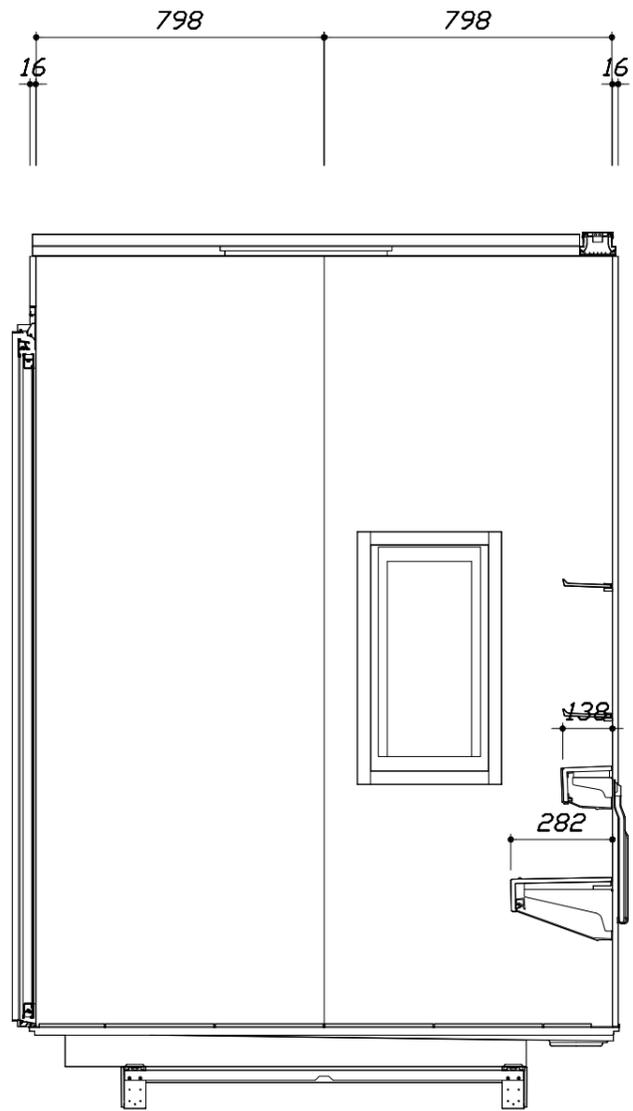

< 洗場側面図 >

Takara standard
 タカラストANDARD株式会社


現場名称： 長野-新佐久平SR SB1様邸
 現場番号： C1300719
 佐久平営業所

PREDECENCIA プレデンスシア
 プラン番号： 2612B-2005-0006T
 担当営業：

施工図3 縮尺： 1:20
 作成日： 2020年11月25日
 担当アドバイザー：


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

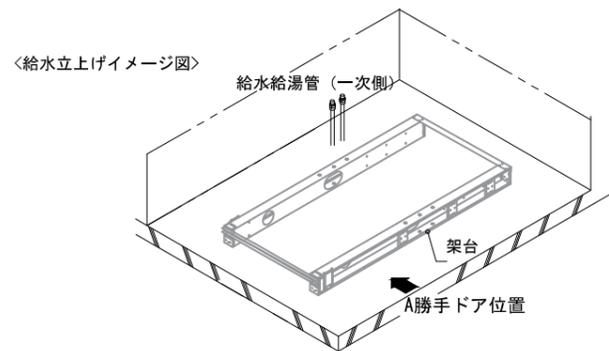




■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

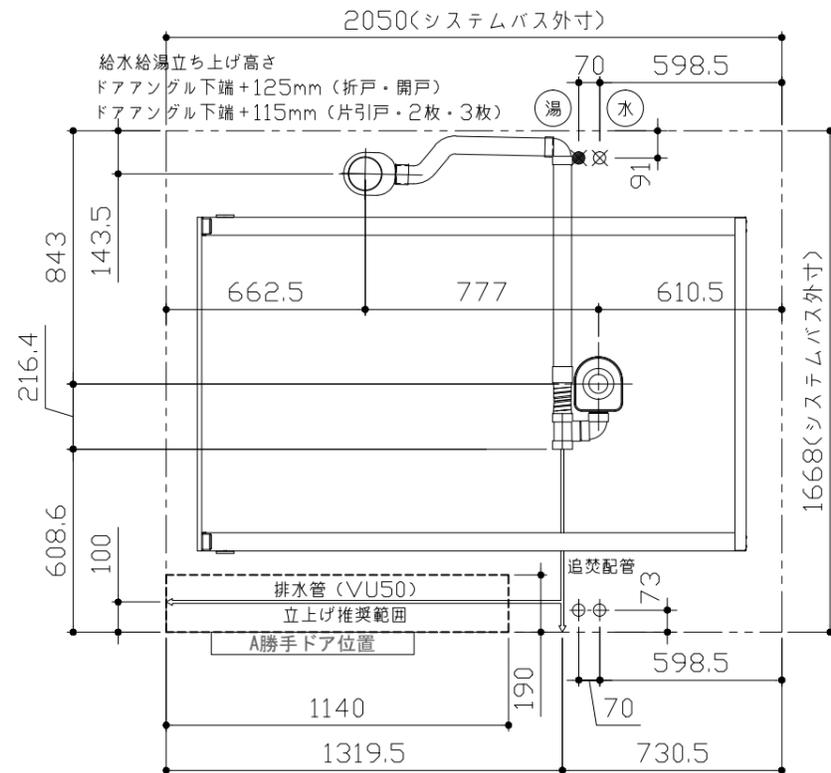

■ 設備記号

記号	記号の意味
⊗	給水位置
⊙	給湯位置

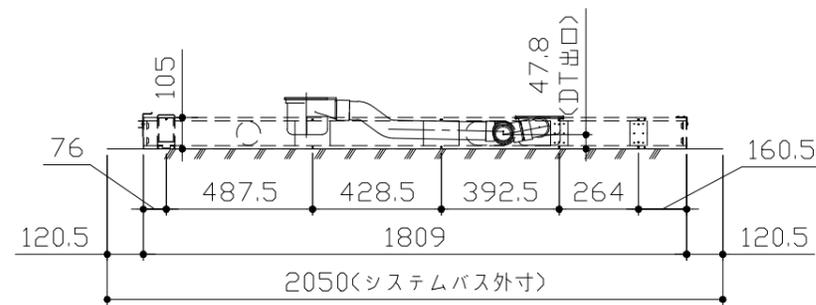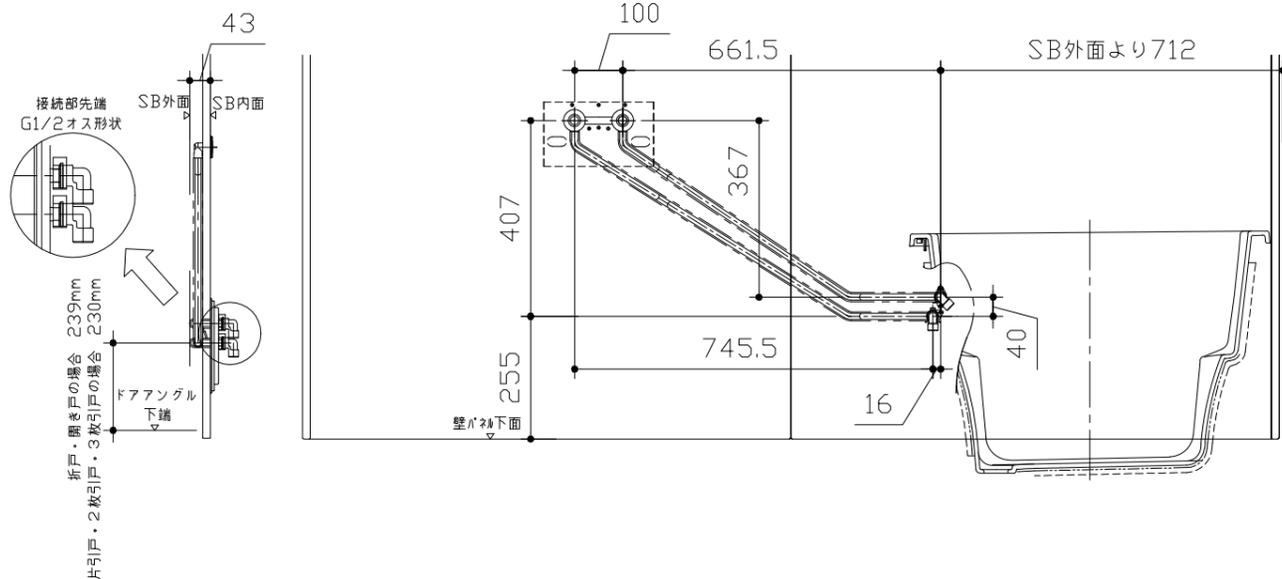

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 長野-新佐久平SR SB1様邸
現場番号： C1300719
佐久平営業所

PREDECENCIA プレデンスシア
プラン番号： 2612B-2005-0006T
担当営業：

排水配管図
作成日： 2020年11月25日
担当アドバイザー：





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

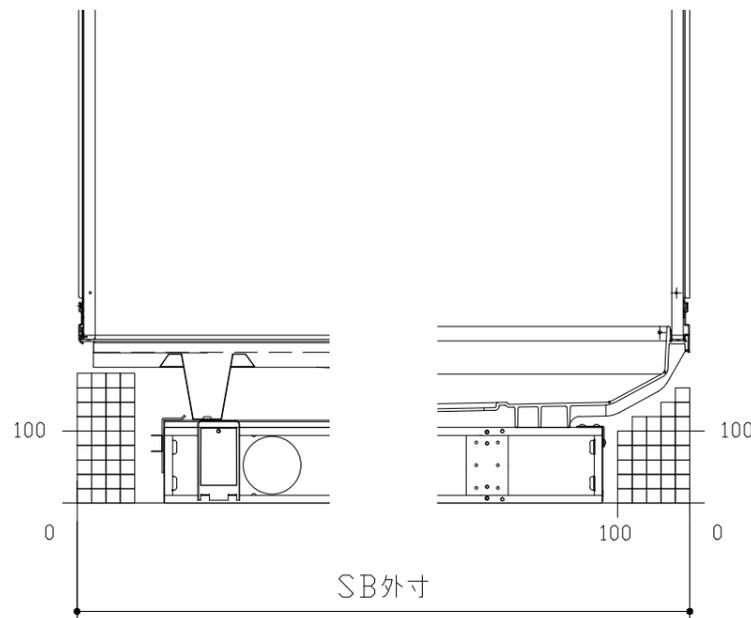


B矢視

A矢視

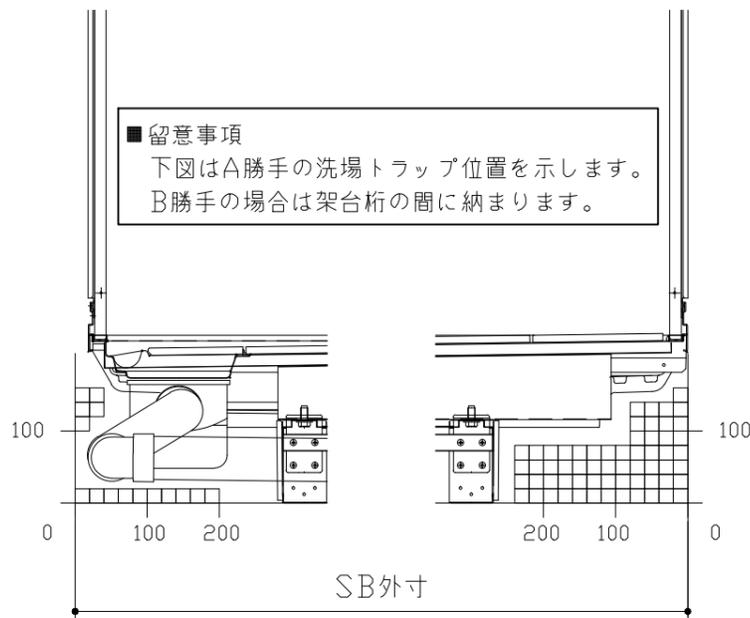

D矢視


C矢視

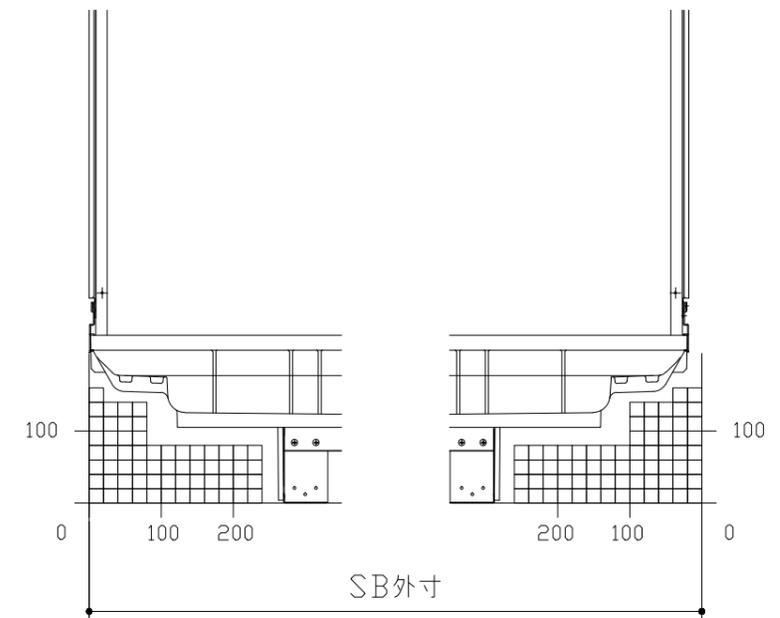

F矢視

E矢視


キープクリーンドア：開き戸グレー・ブラック（YGTド78・YBTド78）

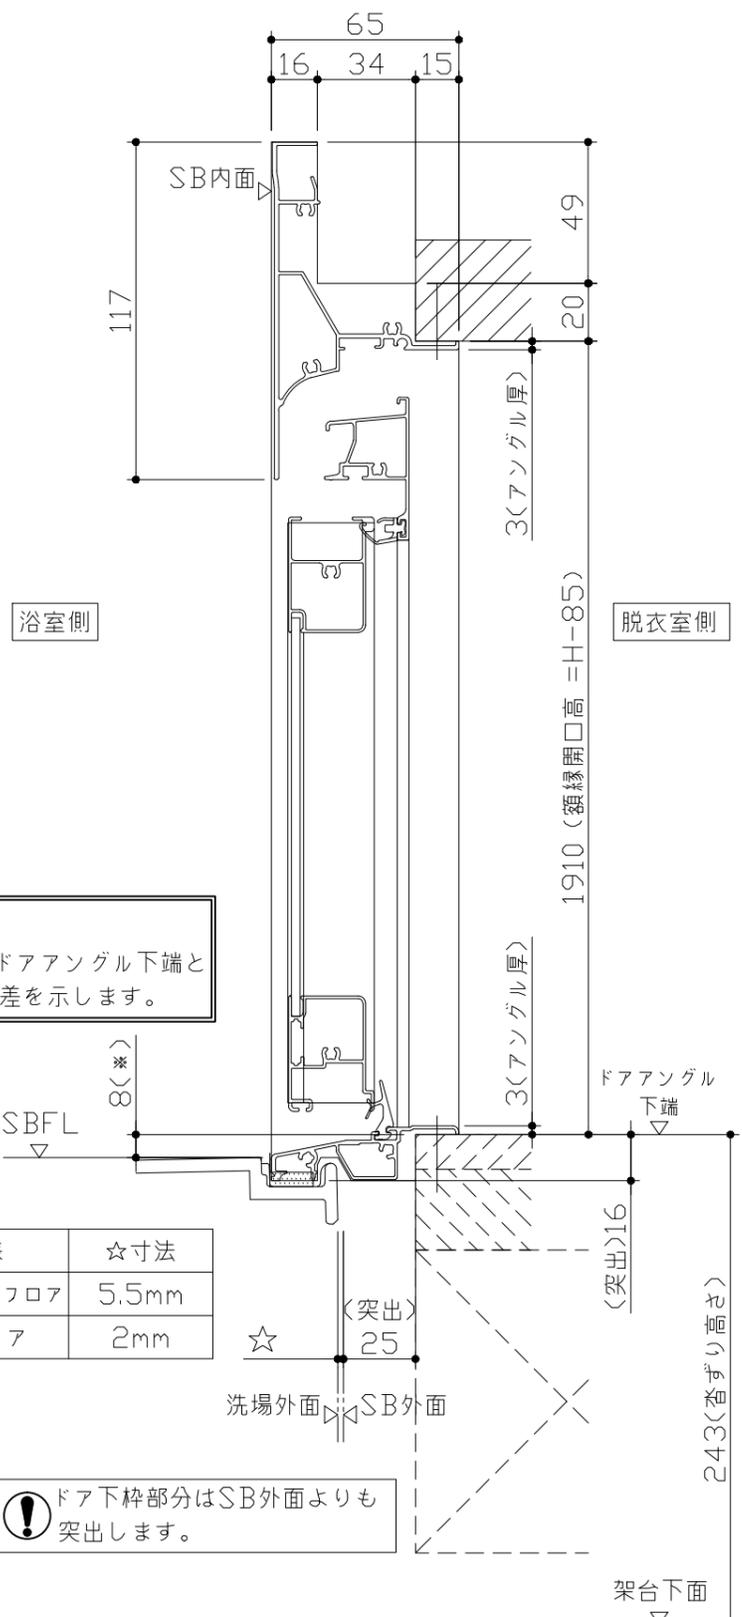


■ 留意事項
 * 印寸法はドアアンゲル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm


⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

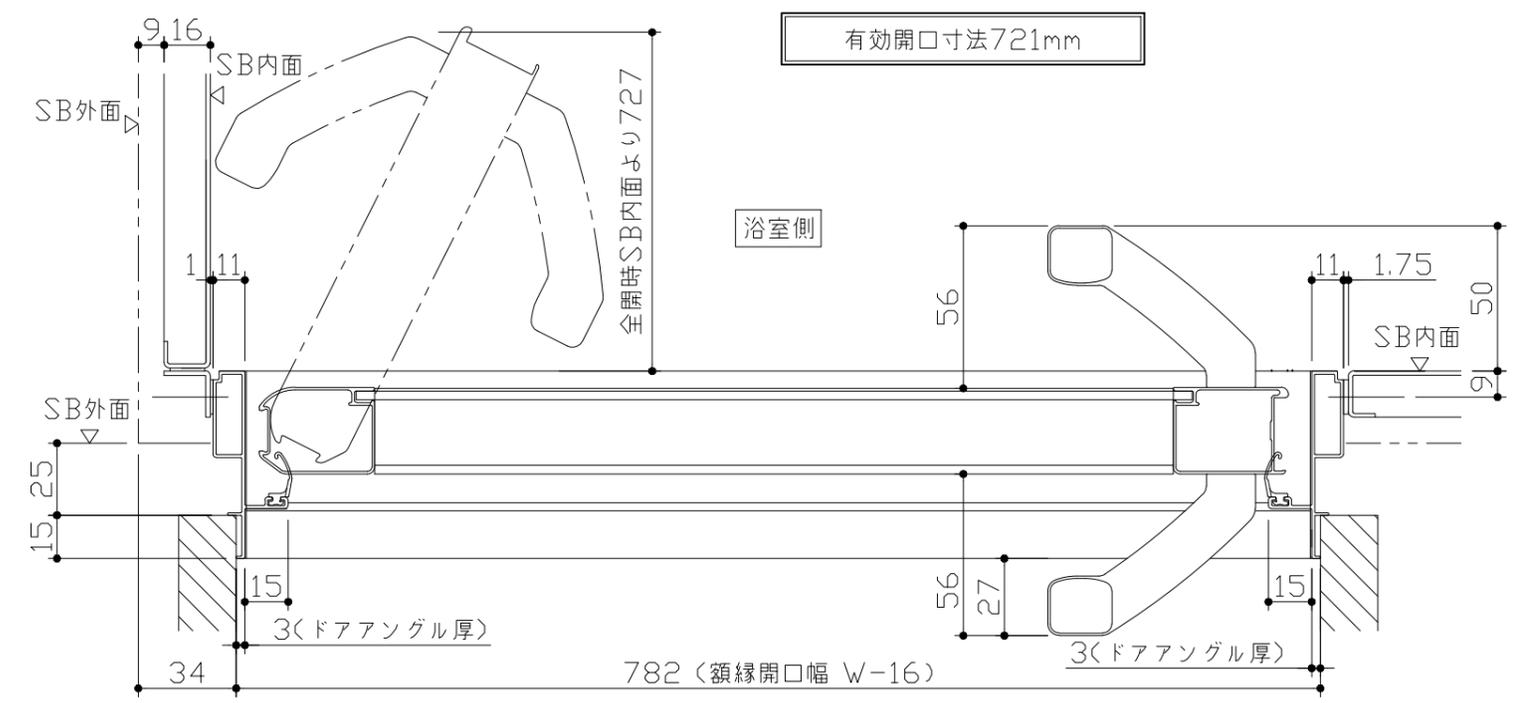


ドア開き角度65°以上でタオル掛けと干渉の恐れがあります。

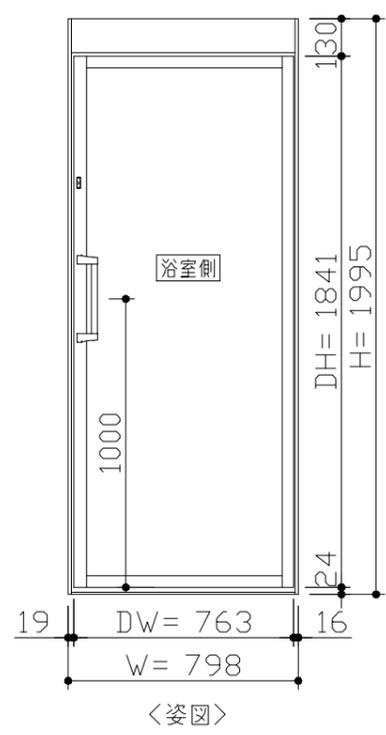


■ ドア横の管柱、間柱について
 ・ ドアが管柱、間柱にあたらぬよう十分に考慮してください。
 ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

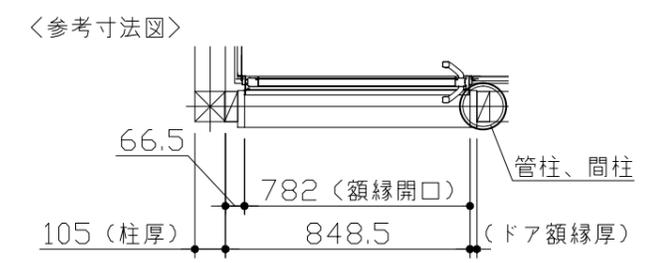

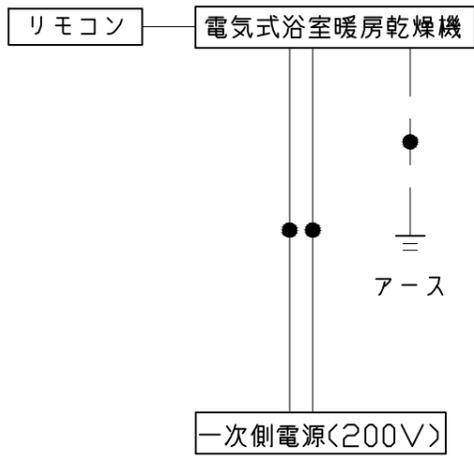

*浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

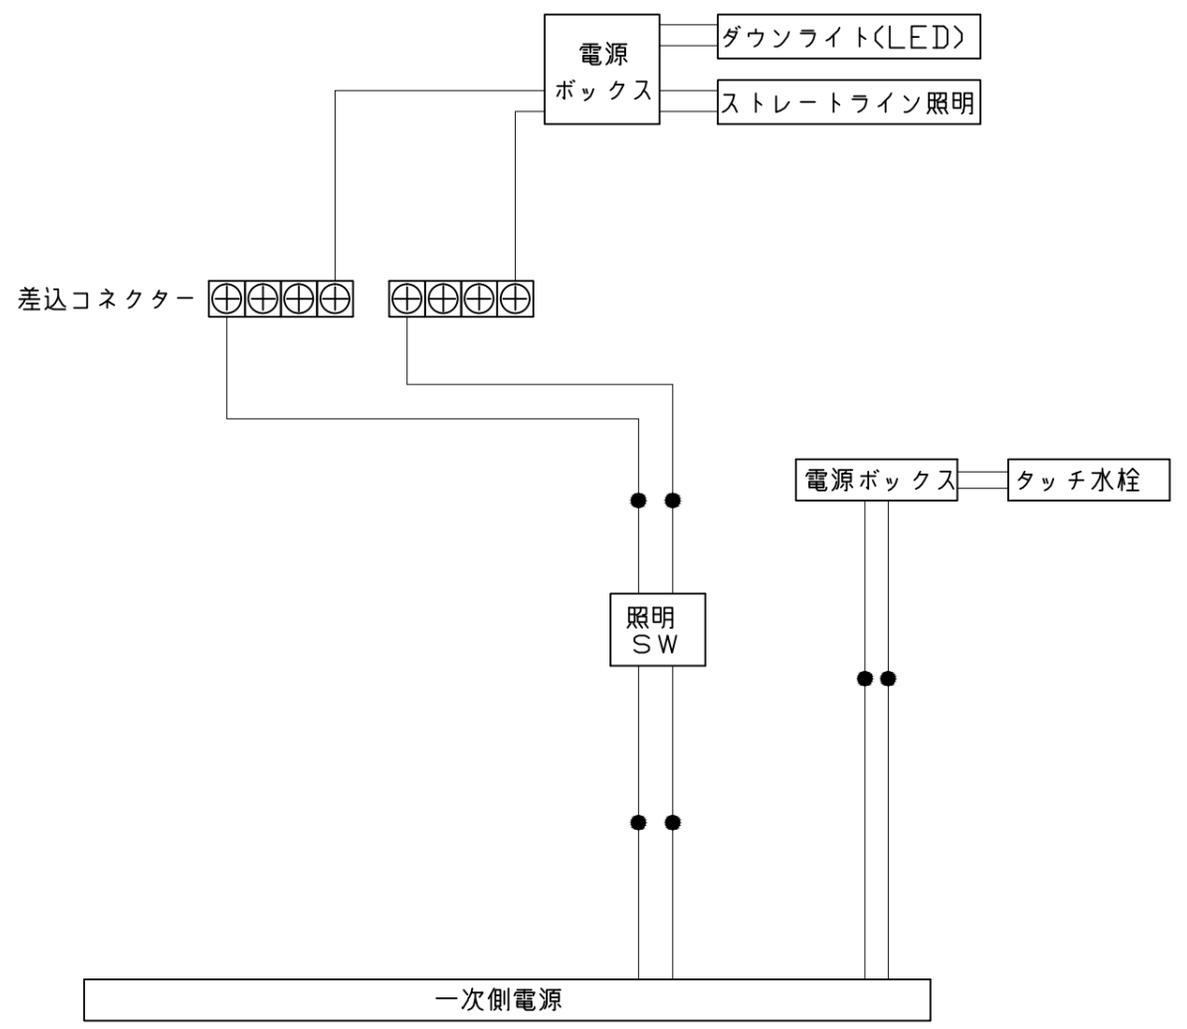

一次側電源から差し込みコネクタ及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。

パネル割図	ミラー	収納棚
<p>パネル割図</p>	<p>ミラー</p>	<p>収納棚</p>
シャワーフックスライドバー	ランドリーパイプ	
<p>シャワーフックスライドバー</p>	<p>ランドリーパイプ</p>	
