

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 長野-新佐久平SR SB4 様

業者 様

商品名 RELAGE レラージュ

作成日 2020年10月28日
プラン番号 2612B-2008-0256T
現場番号 C1301231

タカスタンダード株式会社
佐久平営業所
長野県佐久市長土呂157-1
TEL 0267-77-7505 / FAX 0267-77-7606

商品
御見積金額 **¥874,700 (税込 ¥962,170)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 ¥131,000 (税込 ¥144,100)

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

佐久平ショールーム
TEL 0267-88-7604 / FAX 0267-88-7605

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

御見積仕様

(システムバス)

ユニットサイズ 1616(AL勝手)

洗い場仕様 キーブクリンフロア(ハイクラス)

浴槽材質 アクリル人造大理石

カラー シュガーライトグレー

形状 ラウンド浴槽

浴槽・風呂フタ 高断熱仕様

カウンター材質 アクリル人造大理石

カラー シュガーライトグレー

エプロン材質 ステンレス(カラーコーティング)

カラー ホワイト

浴室パネル材質 高品位ホーロー

カラー ブリックグレー

ガス種 LPG

周波数 60Hz

御確認事項

備考

No.*

御名前 長野-新佐久平SR SB4

様

現場番号	C1301231	プラン番号	2612B-2008-0256T	作成日	2020/10/28
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	レラージュ 1616サイズ		1	684,000	684,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	キープクリーンドア:片引戸<800幅>(グレー)(19サイズ)	1	+56,500	+56,500
4	洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームダークグレー)	1		
5	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)	1		
6	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
7	浴槽追焚き穴	あり	1		
8	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)	1		
9	浴槽形状	16ラウンド浴槽	1		
10	ヘルシージェット	なし	1		
11	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1		
12	ガス温水式床暖房	なし	1		
13	洗い場用水栓	サーモ水栓(メタルホース)SB181-5UT	1		
14	洗い場用水栓	エコシャワー(節水)	1	+10,000	+10,000
15	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
16	カウンター	人大スクエアカウンター	1		
17	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	1	+5,200	+5,200
18	浴室パネル	ハイクラス(全面デザイン4面同柄)	1	+40,000	+40,000
19	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
20	天井	高光沢フラット天井	1		
21	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V規格)	1	+41,000	+41,000
22	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
23	換気機器開口	工場開口	1		
24	照明	天井付スクエア照明+ダウンライト(1灯)(白色)	1		
25	天井照明開口	工場開口	1		
26	ミラー	ロングクリアミラー	1		
27	風呂フタ	断熱風呂フタ	1	+5,000	+5,000
28	タオル掛け	クリアタイプ	1	+2,500	+2,500
29	ハンドバー	ステン I型600タイプ	1	+8,000	+8,000
30	収納棚	クリアタイプB(3段)	1	+5,000	+5,000
31	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500

御名前 長野-新佐久平SR SB4

様

現場番号	C1301231	プラン番号	2612B-2008-0256T	作成日	2020/10/28
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
33	トラップカバー	洗い場側トラップカバー	1		
34	トラップカバー	浴槽側トラップカバー (浴槽パンあり)	1		
システムバス合計			34		¥874,700

商品総合計	34	¥874,700
-------	----	----------

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥131,000 (税込 ¥144,100)


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。

パース

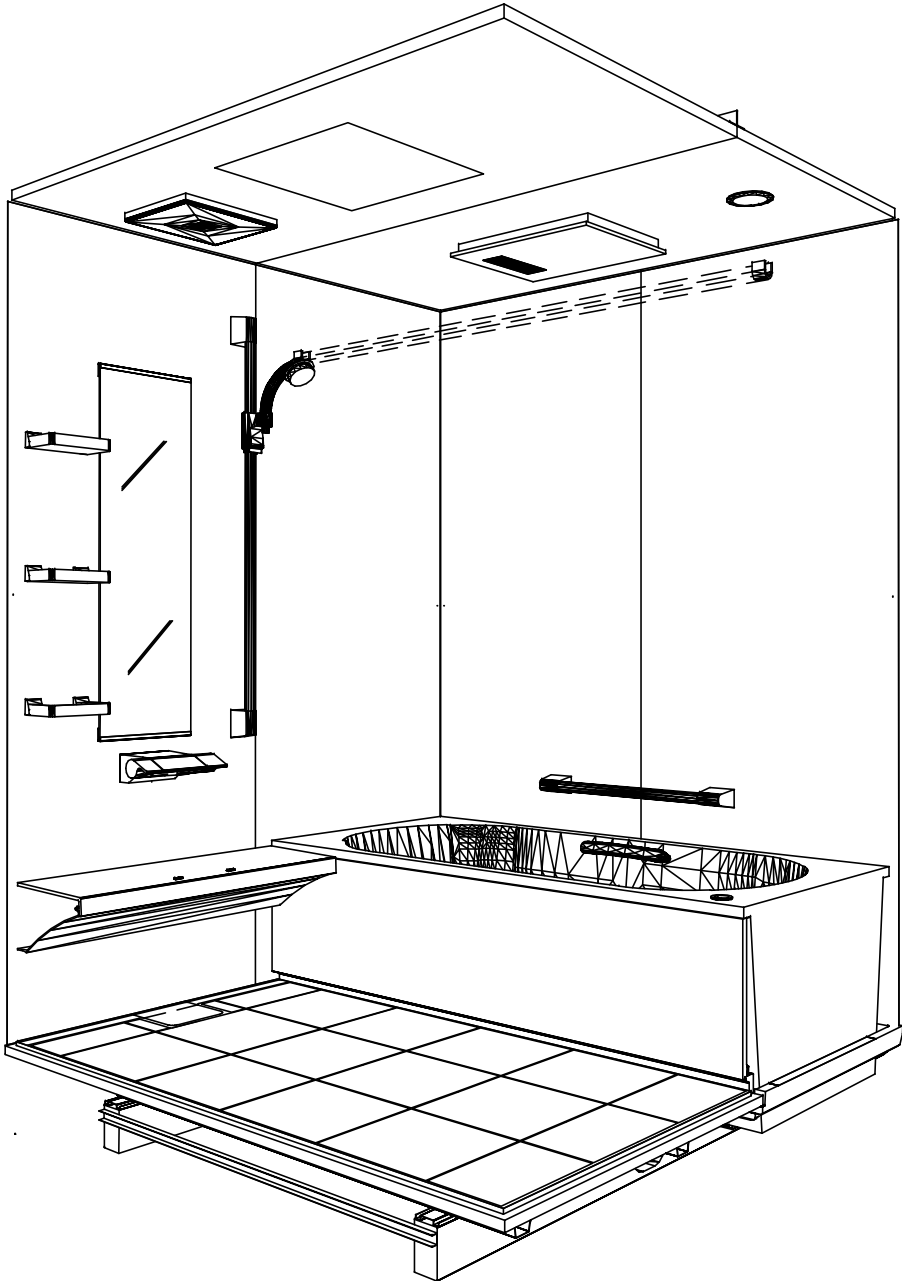

鳥瞰図

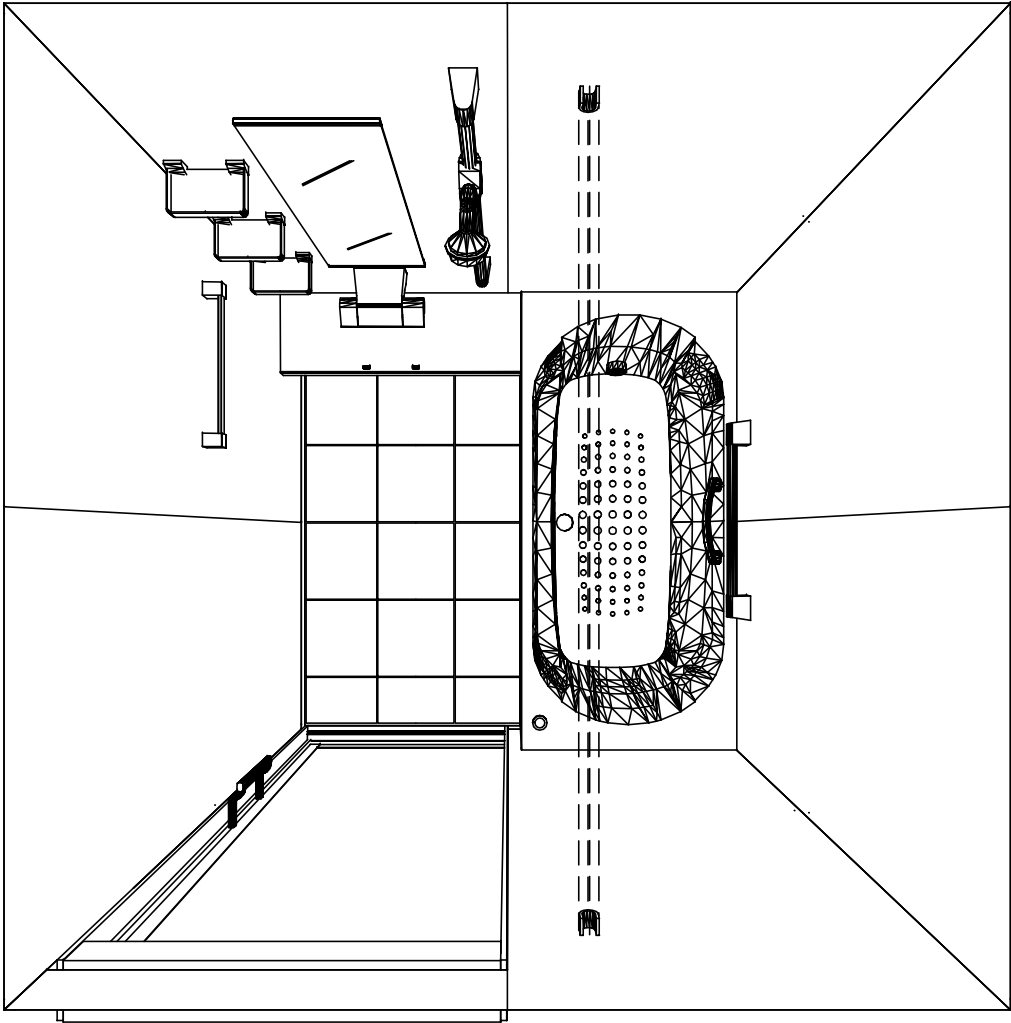

1616
キープクリーン浴槽＜アクリル人造大理石＞
高光沢フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ（常時換気対応）

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・
納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認
して頂きますようお願い致します。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 長野-新佐久平SR SB4様邸	RELAGE レラージュ	姿図	
	現場番号： C1301231	プラン番号： 2612B-2008-0256T	作成日： 2020年10月28日	
	佐久平営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

カウンター面


洗場側面

浴槽側面


カウンター対面

■留意事項


※印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

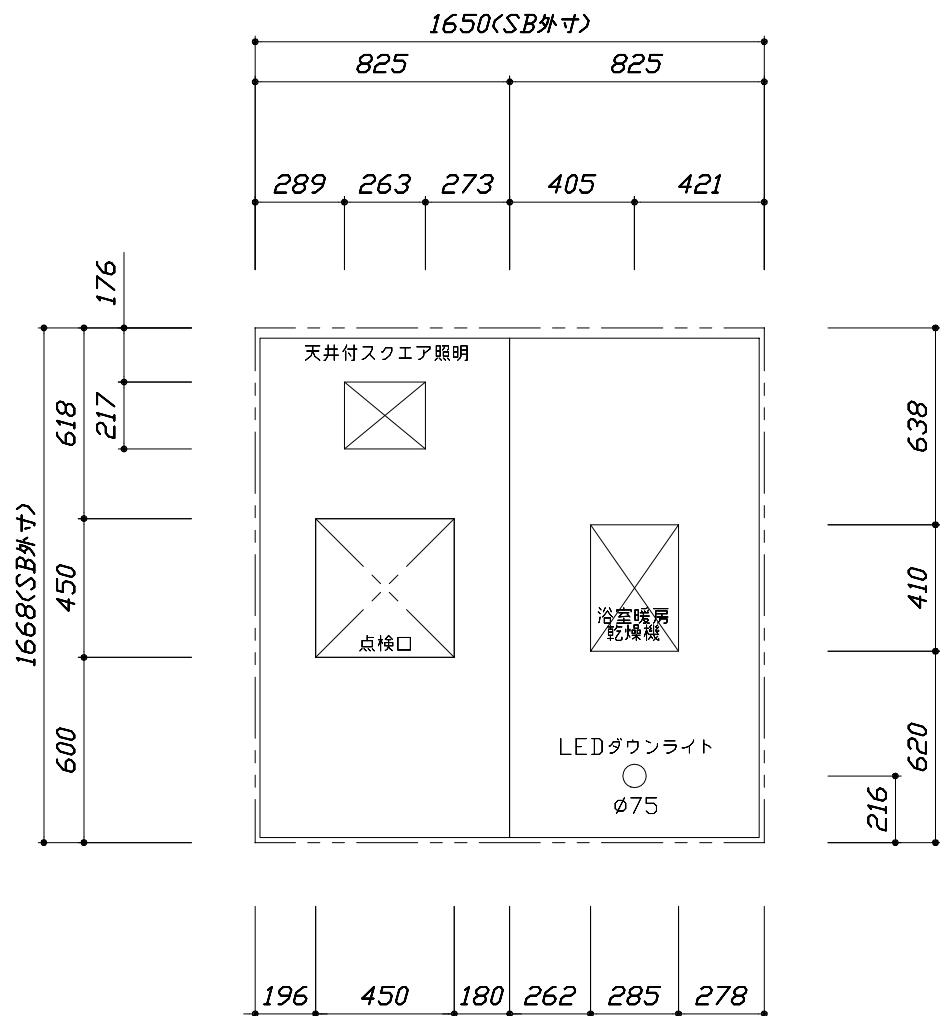

<天井伏図>

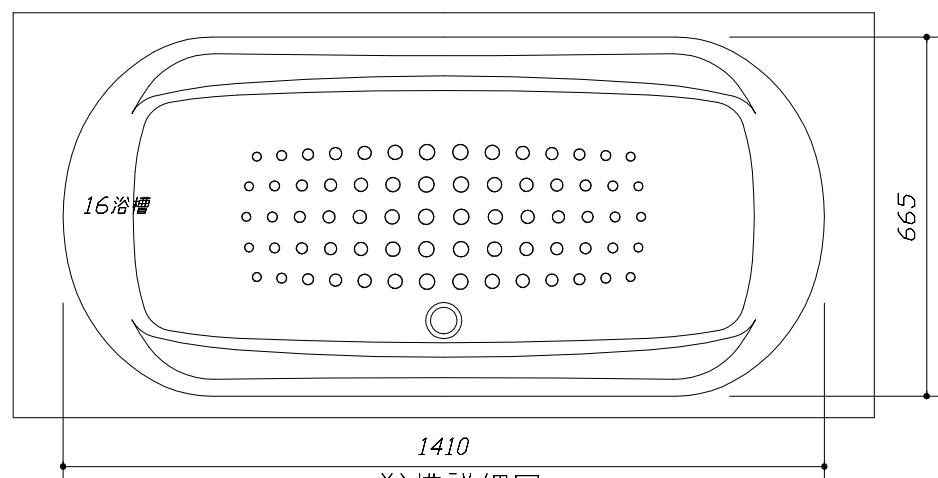



<浴槽詳細図>

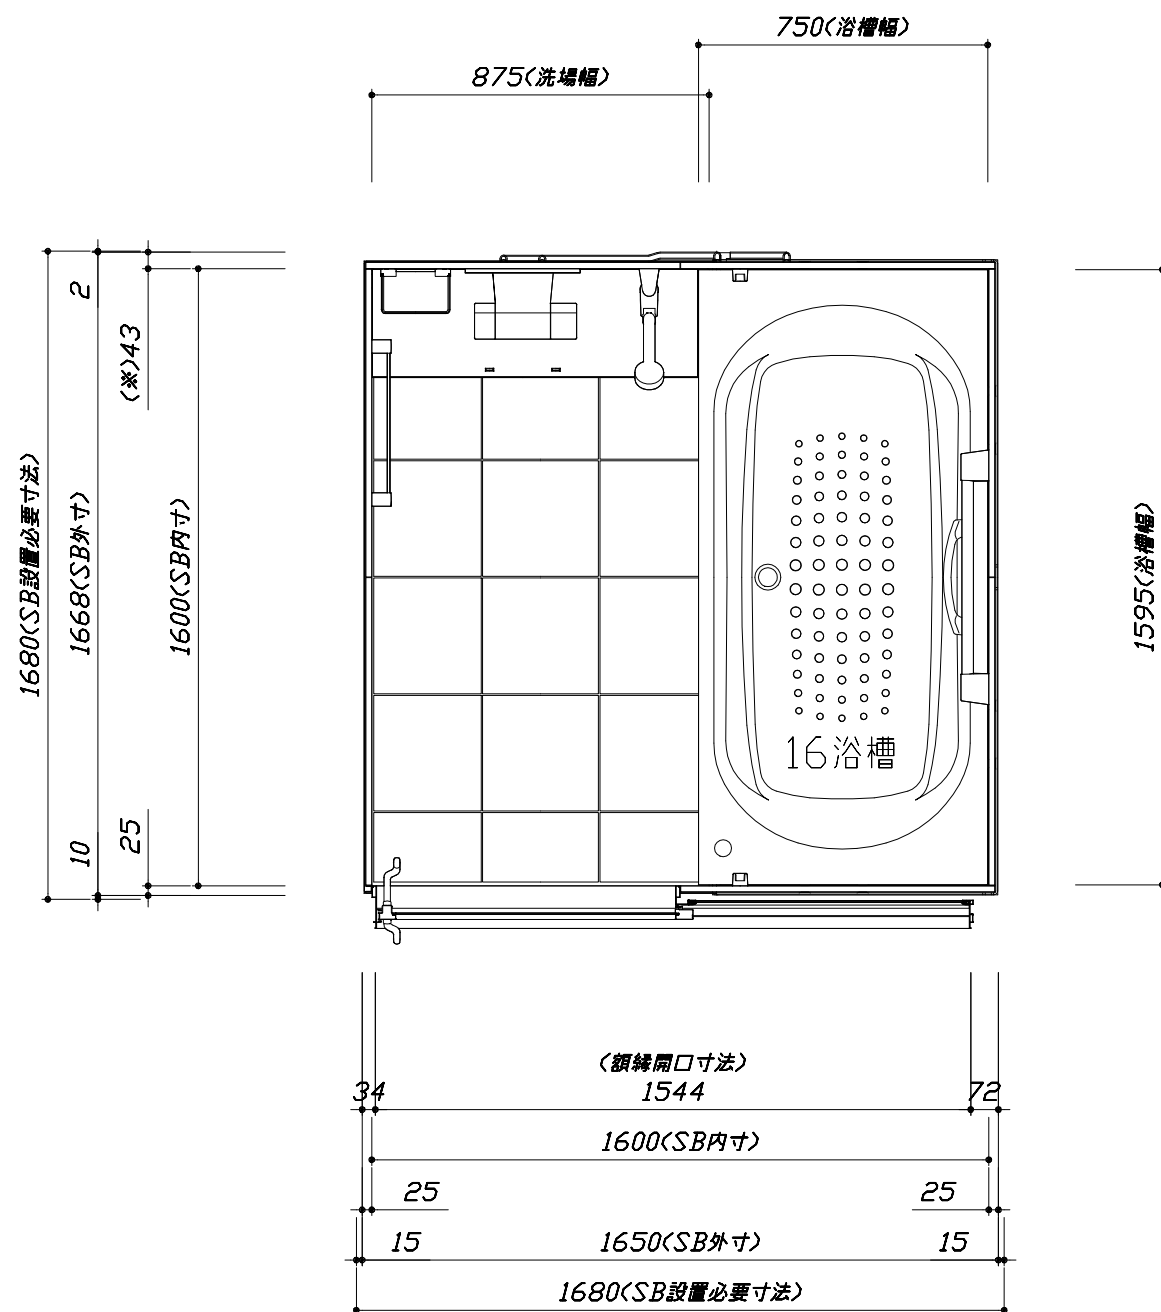

<平面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

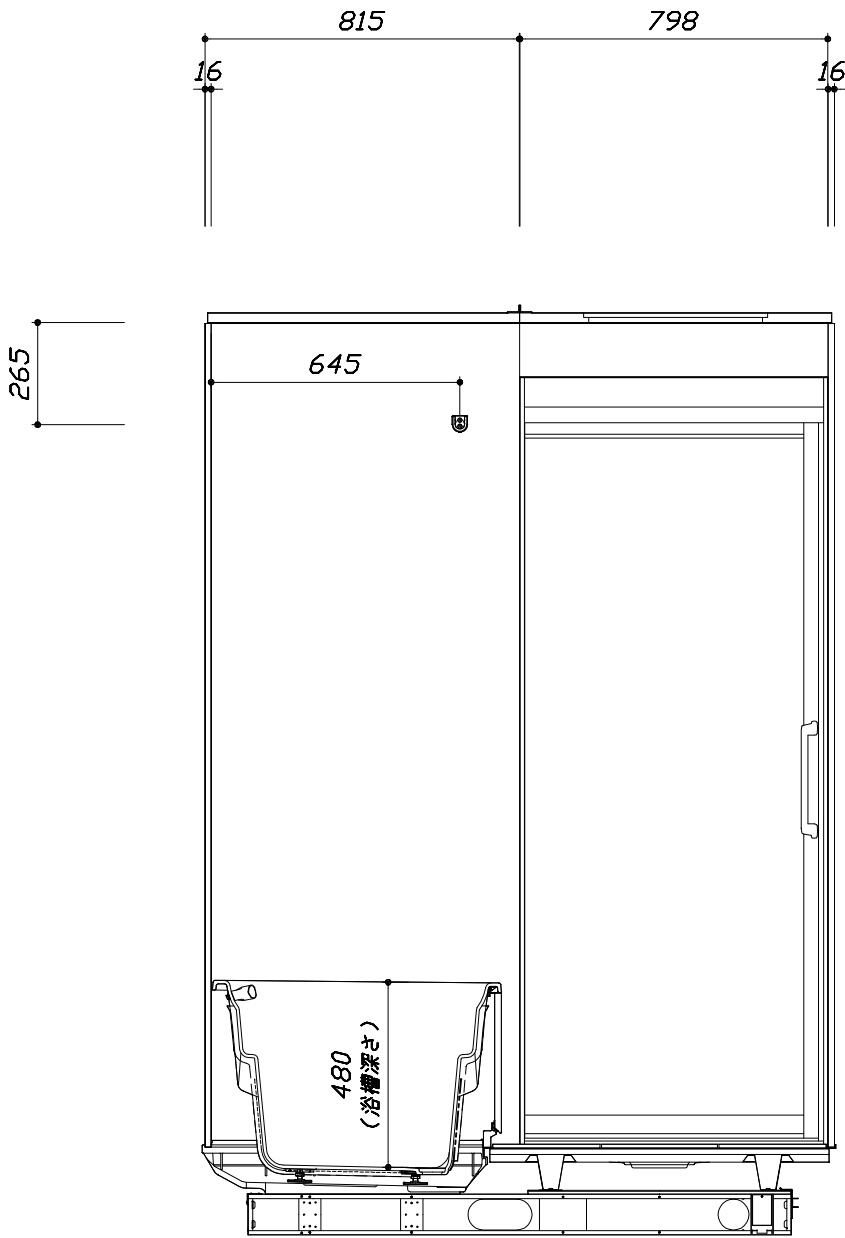

<カウンター対面図>



■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

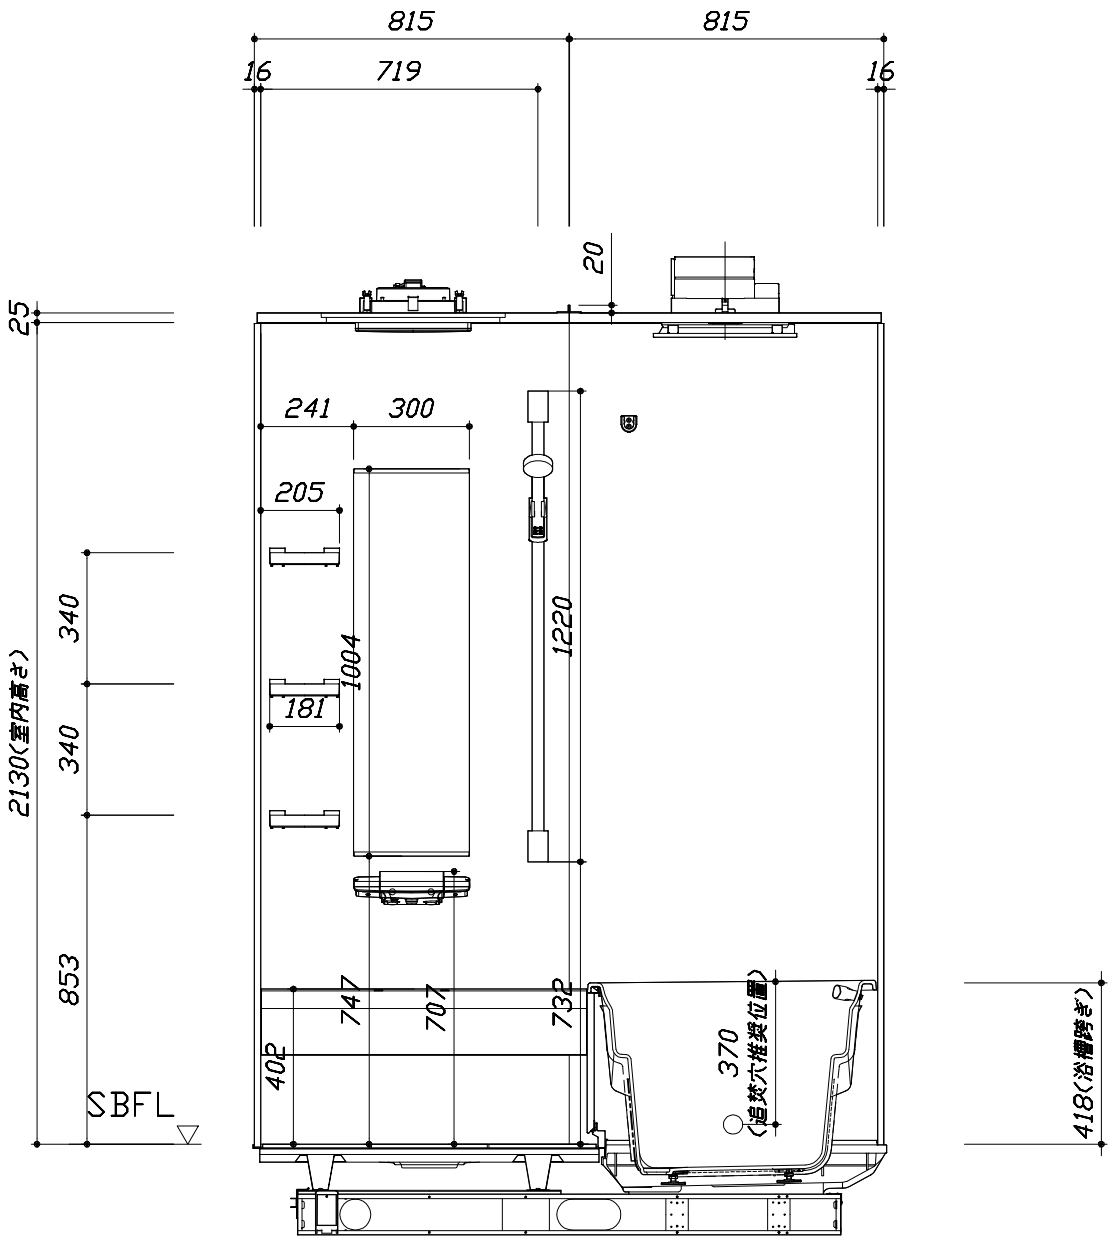

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認お願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

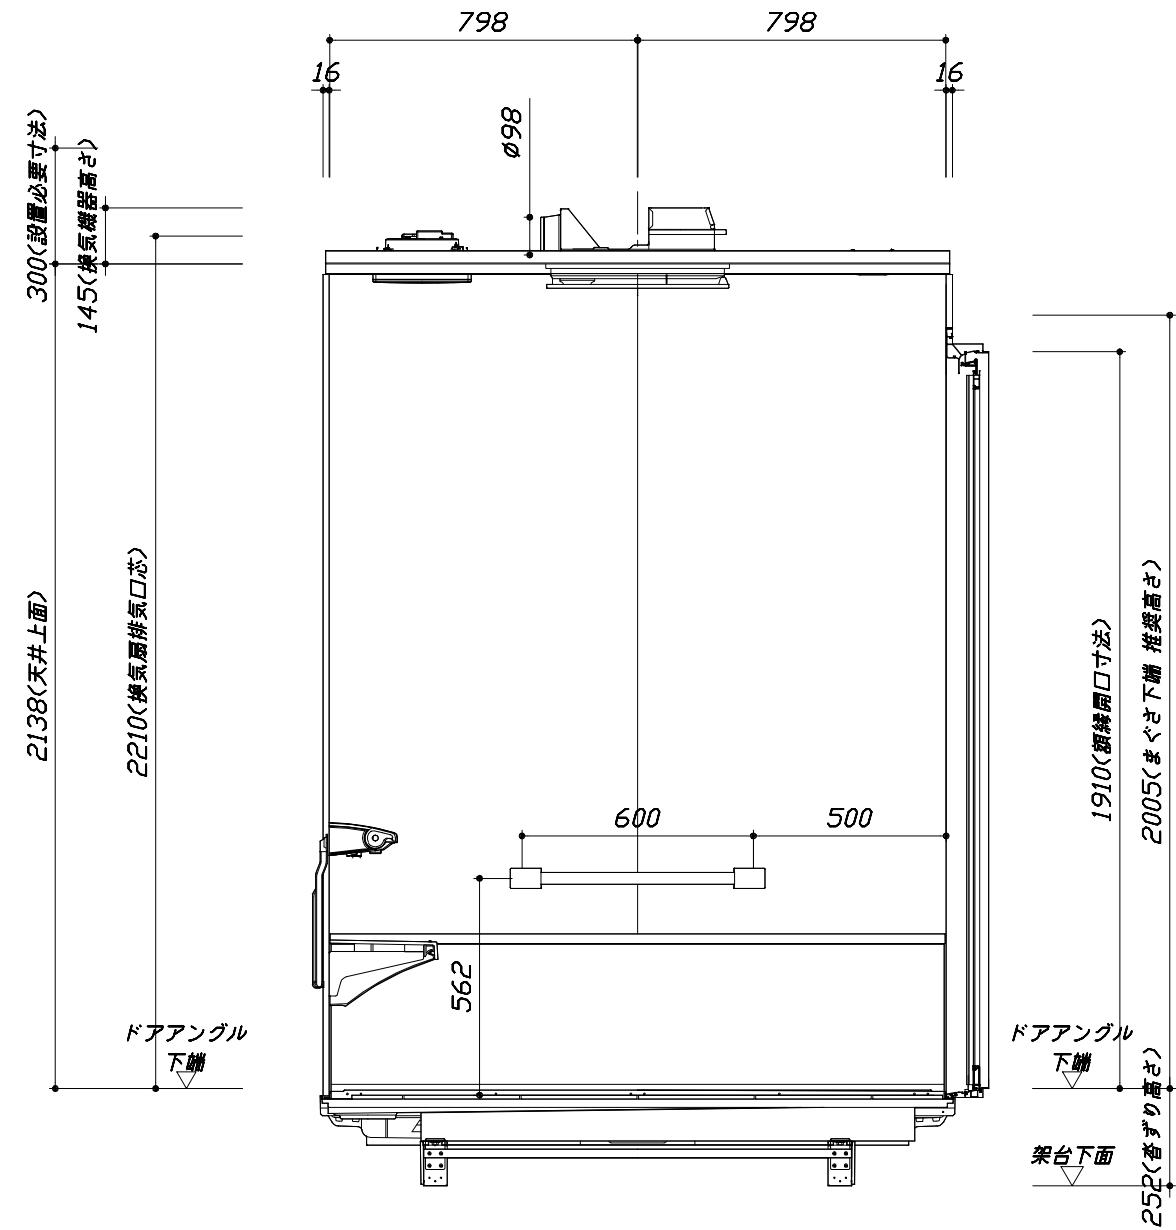

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)


< 浴槽側面図 >

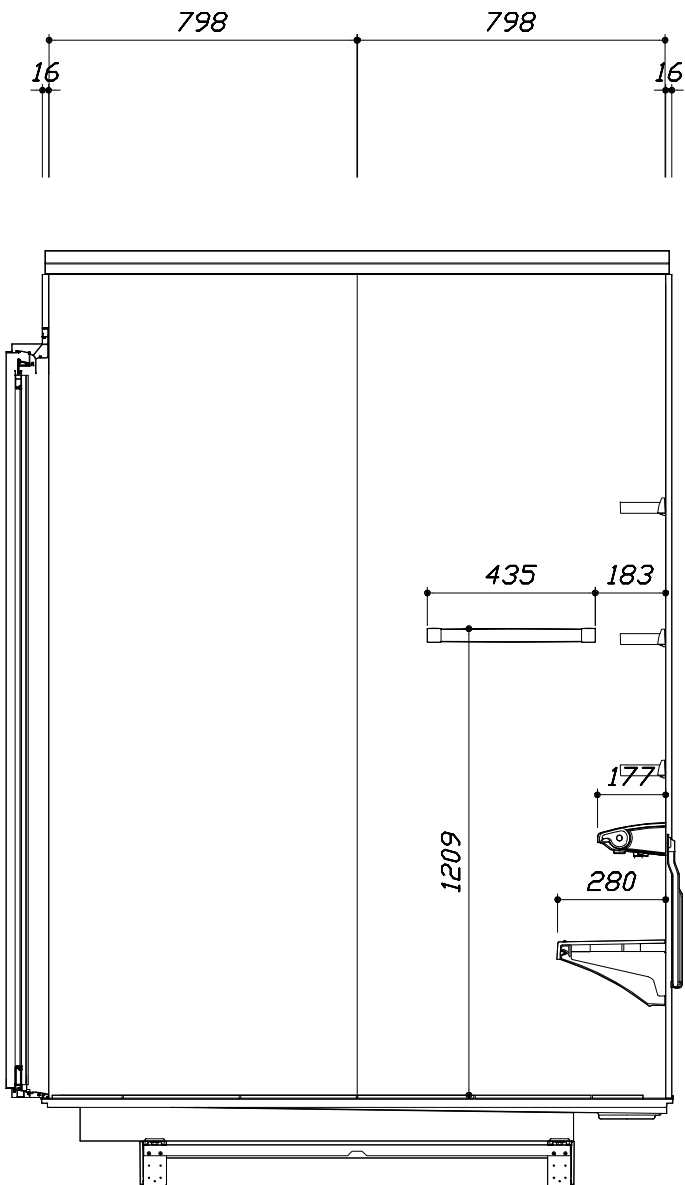

< 洗場側面図 >


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。




■ 給水給湯管工事注意事項



- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

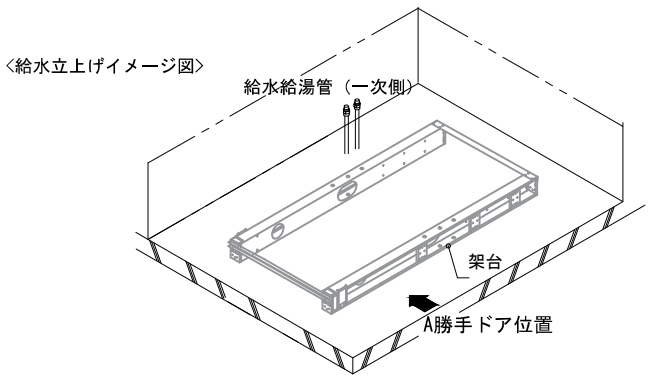



■ 土間コンクリート仕上げ寸法
ドアアングル下端より 265mm 下がりで打設してください。

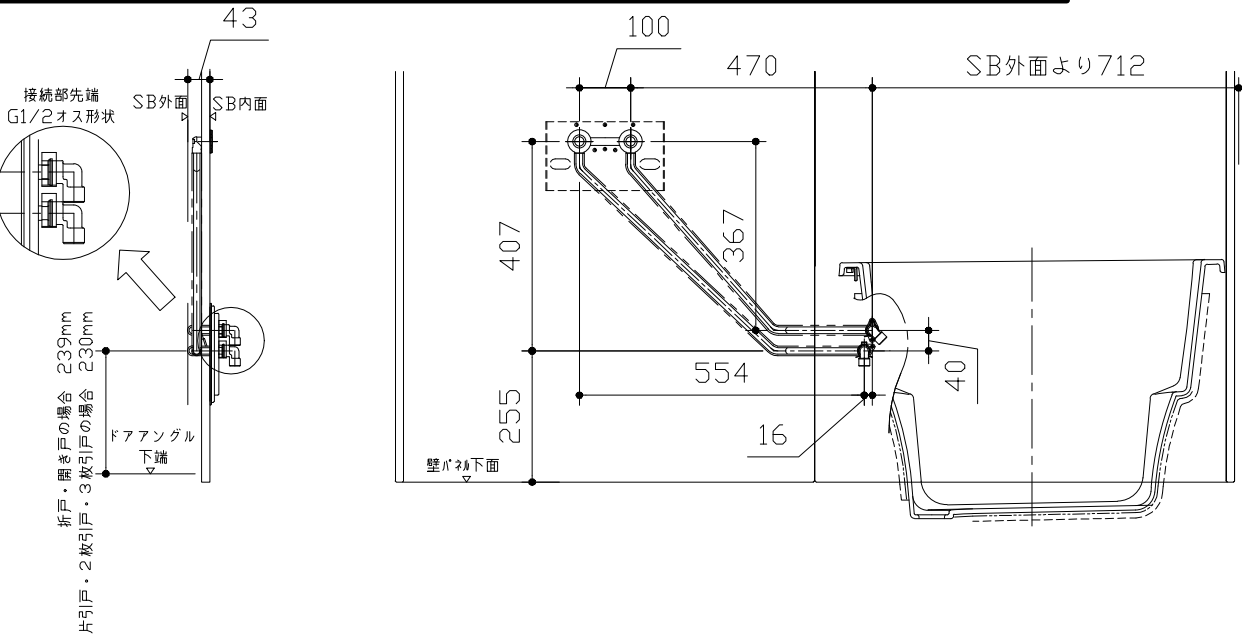

＜給水給湯管取合詳細図＞

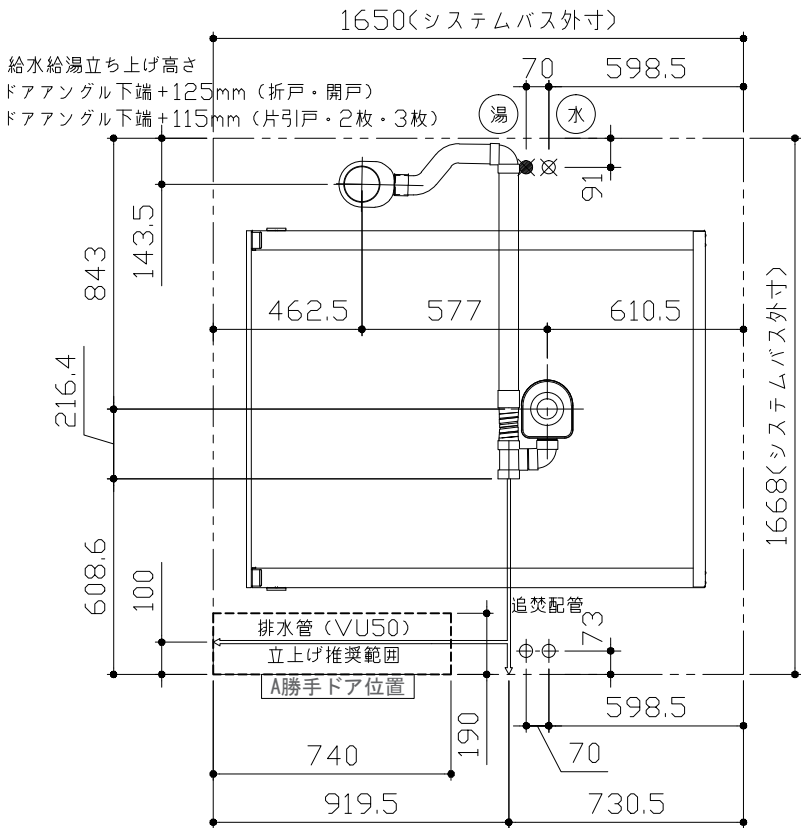

■ 設備記号	
記号	記号の意味
☒	給水位置
☑	給湯位置

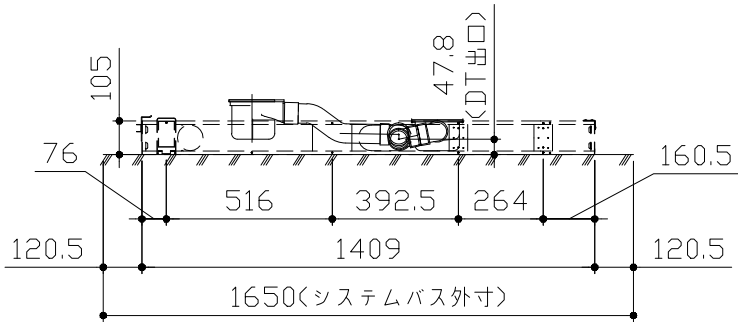

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

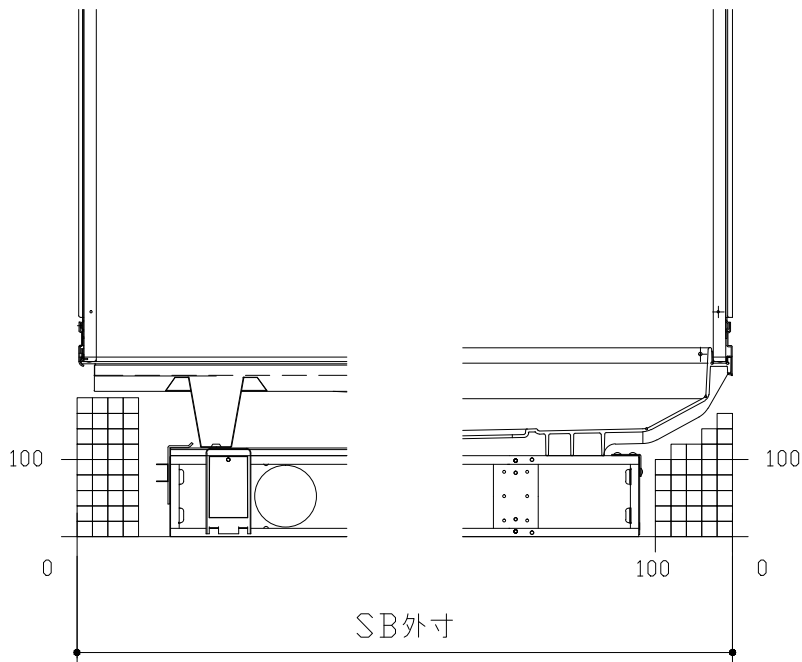


B矢視

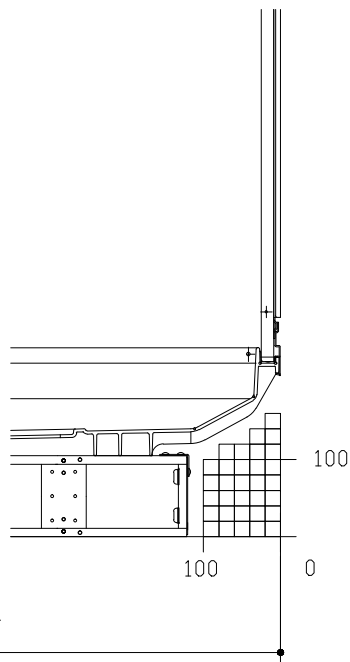


A矢視

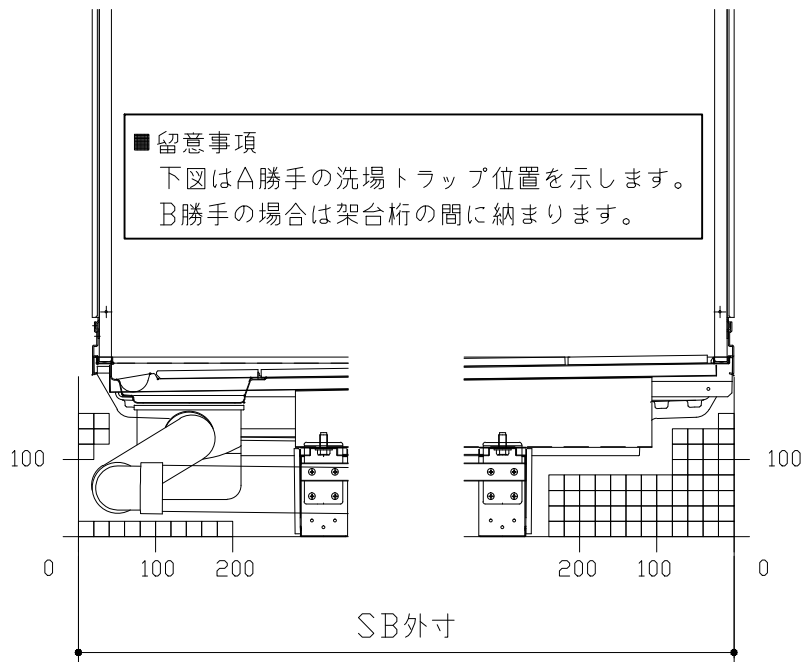


D矢視

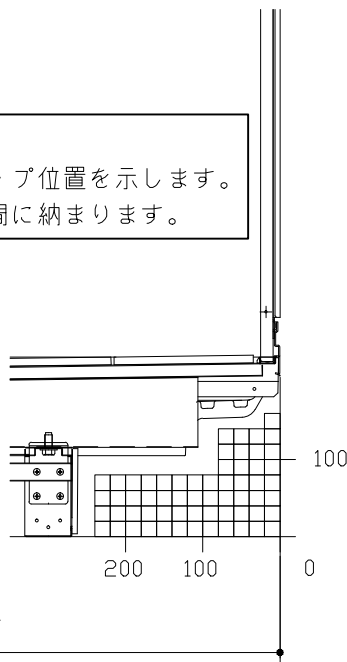

C矢視



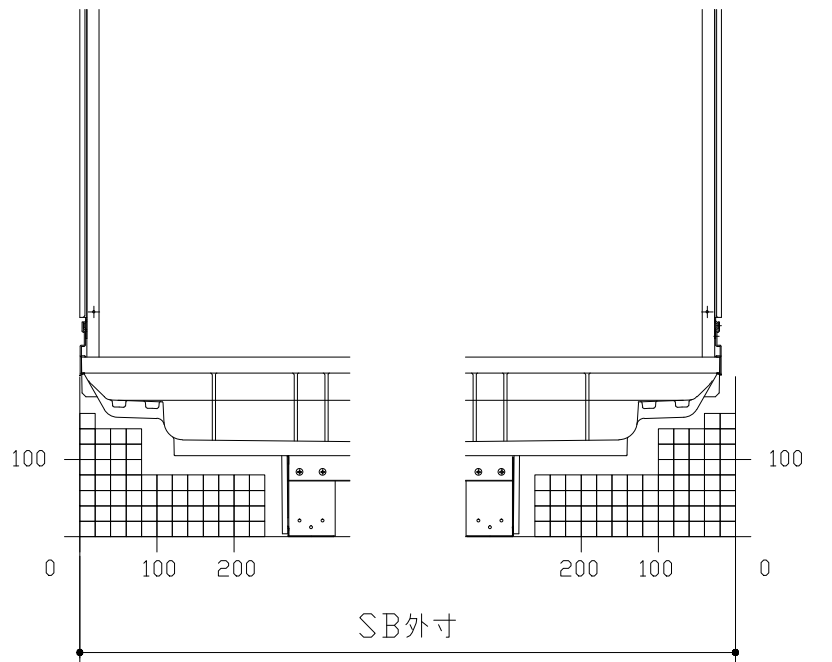


F矢視

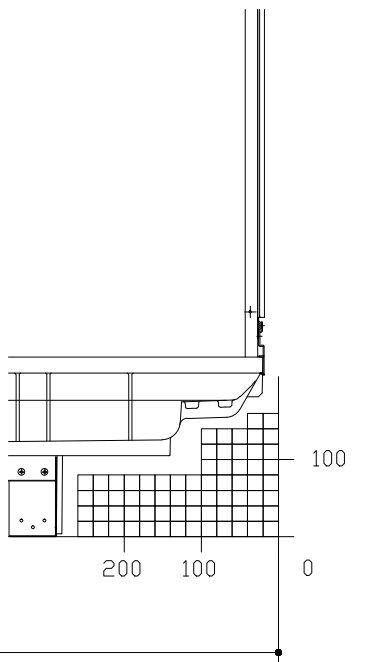


E矢視


キープクリーンドア：片引戸グレー（YGTヒキド[®]8）

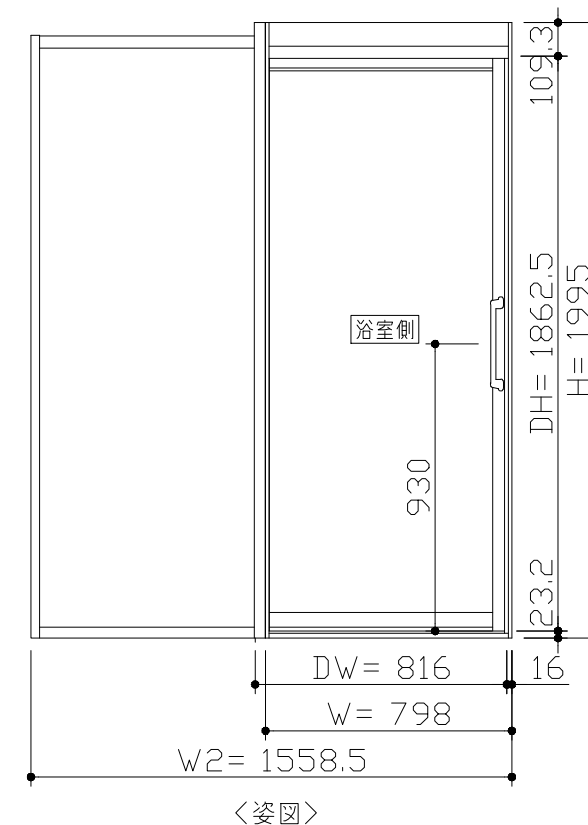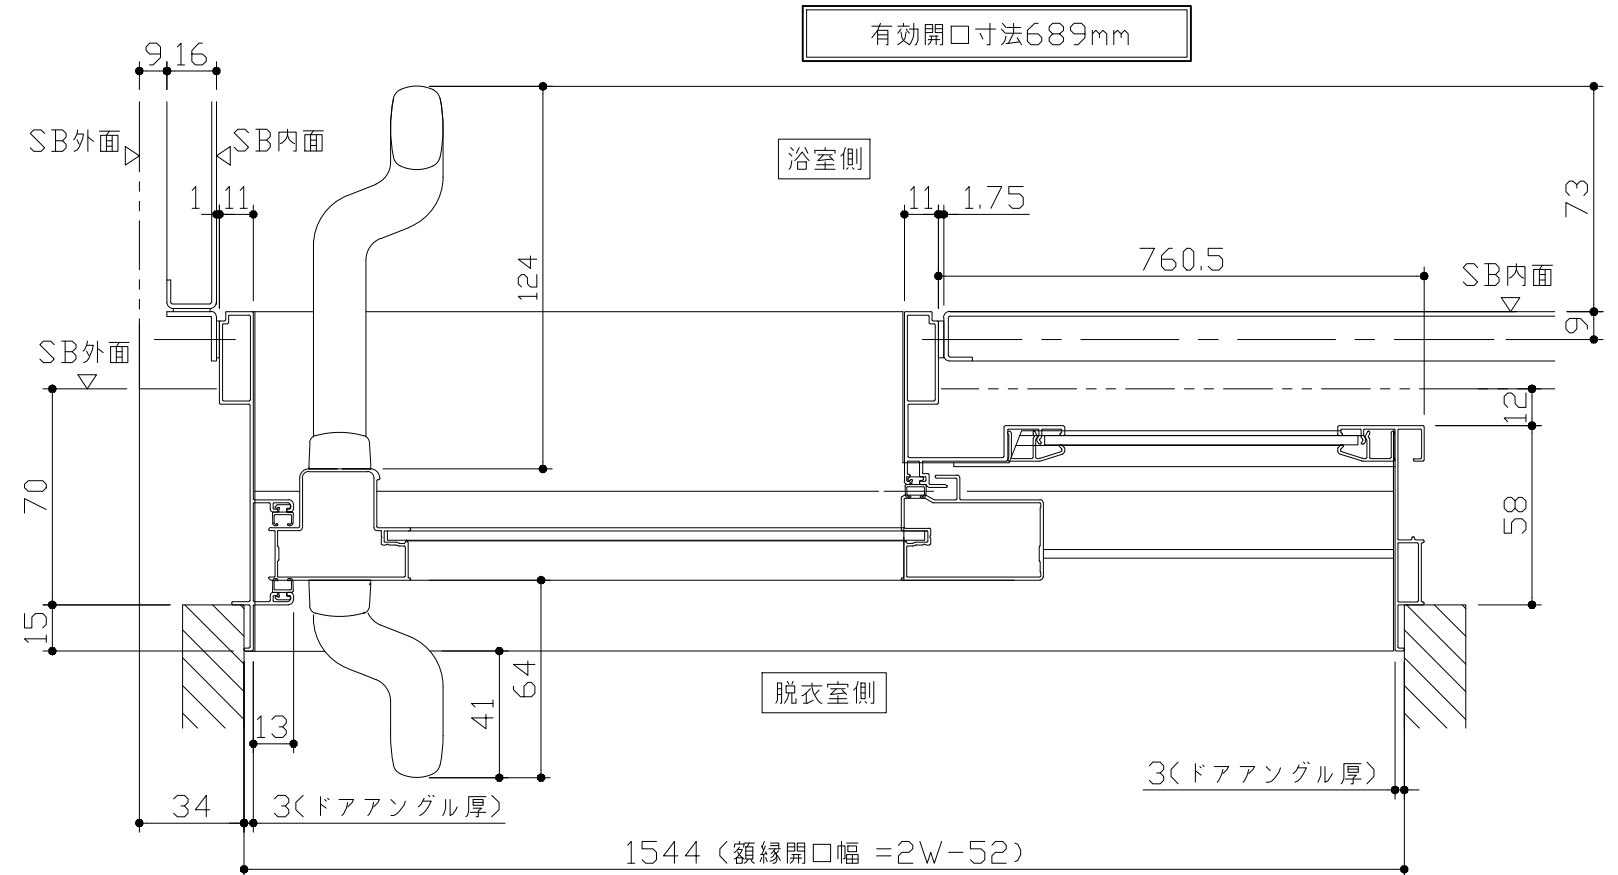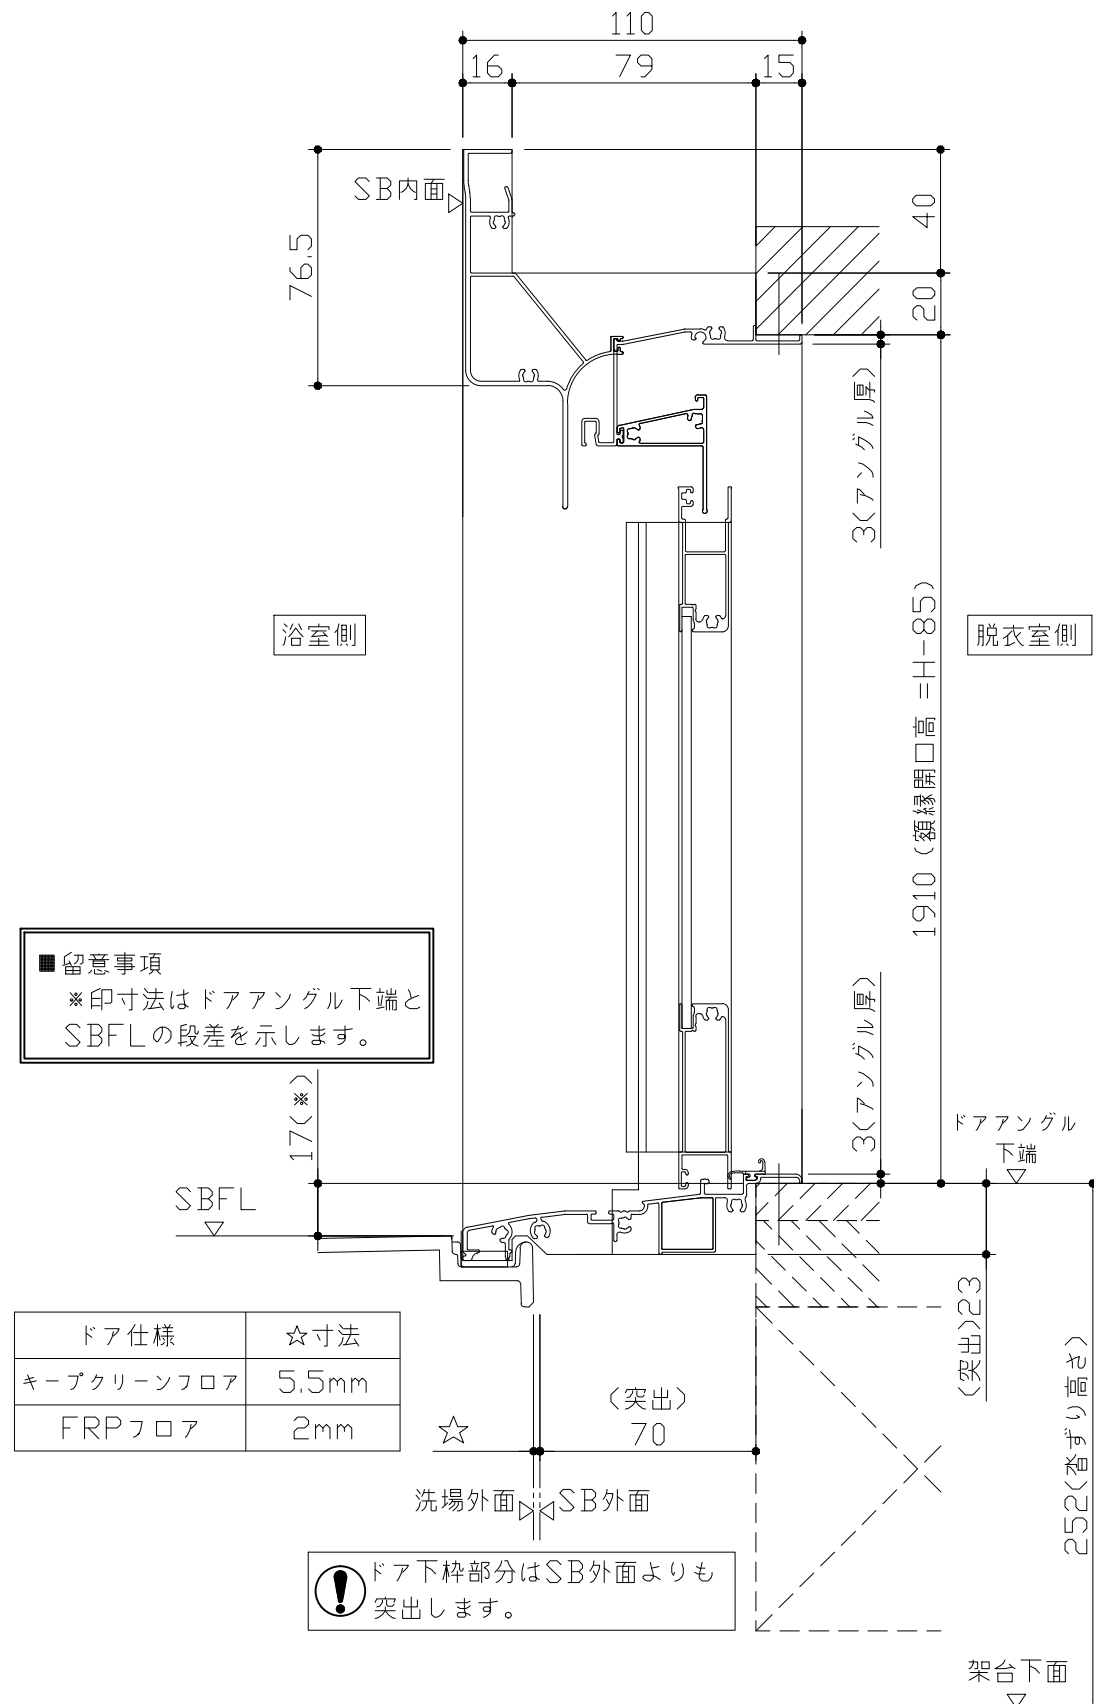

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



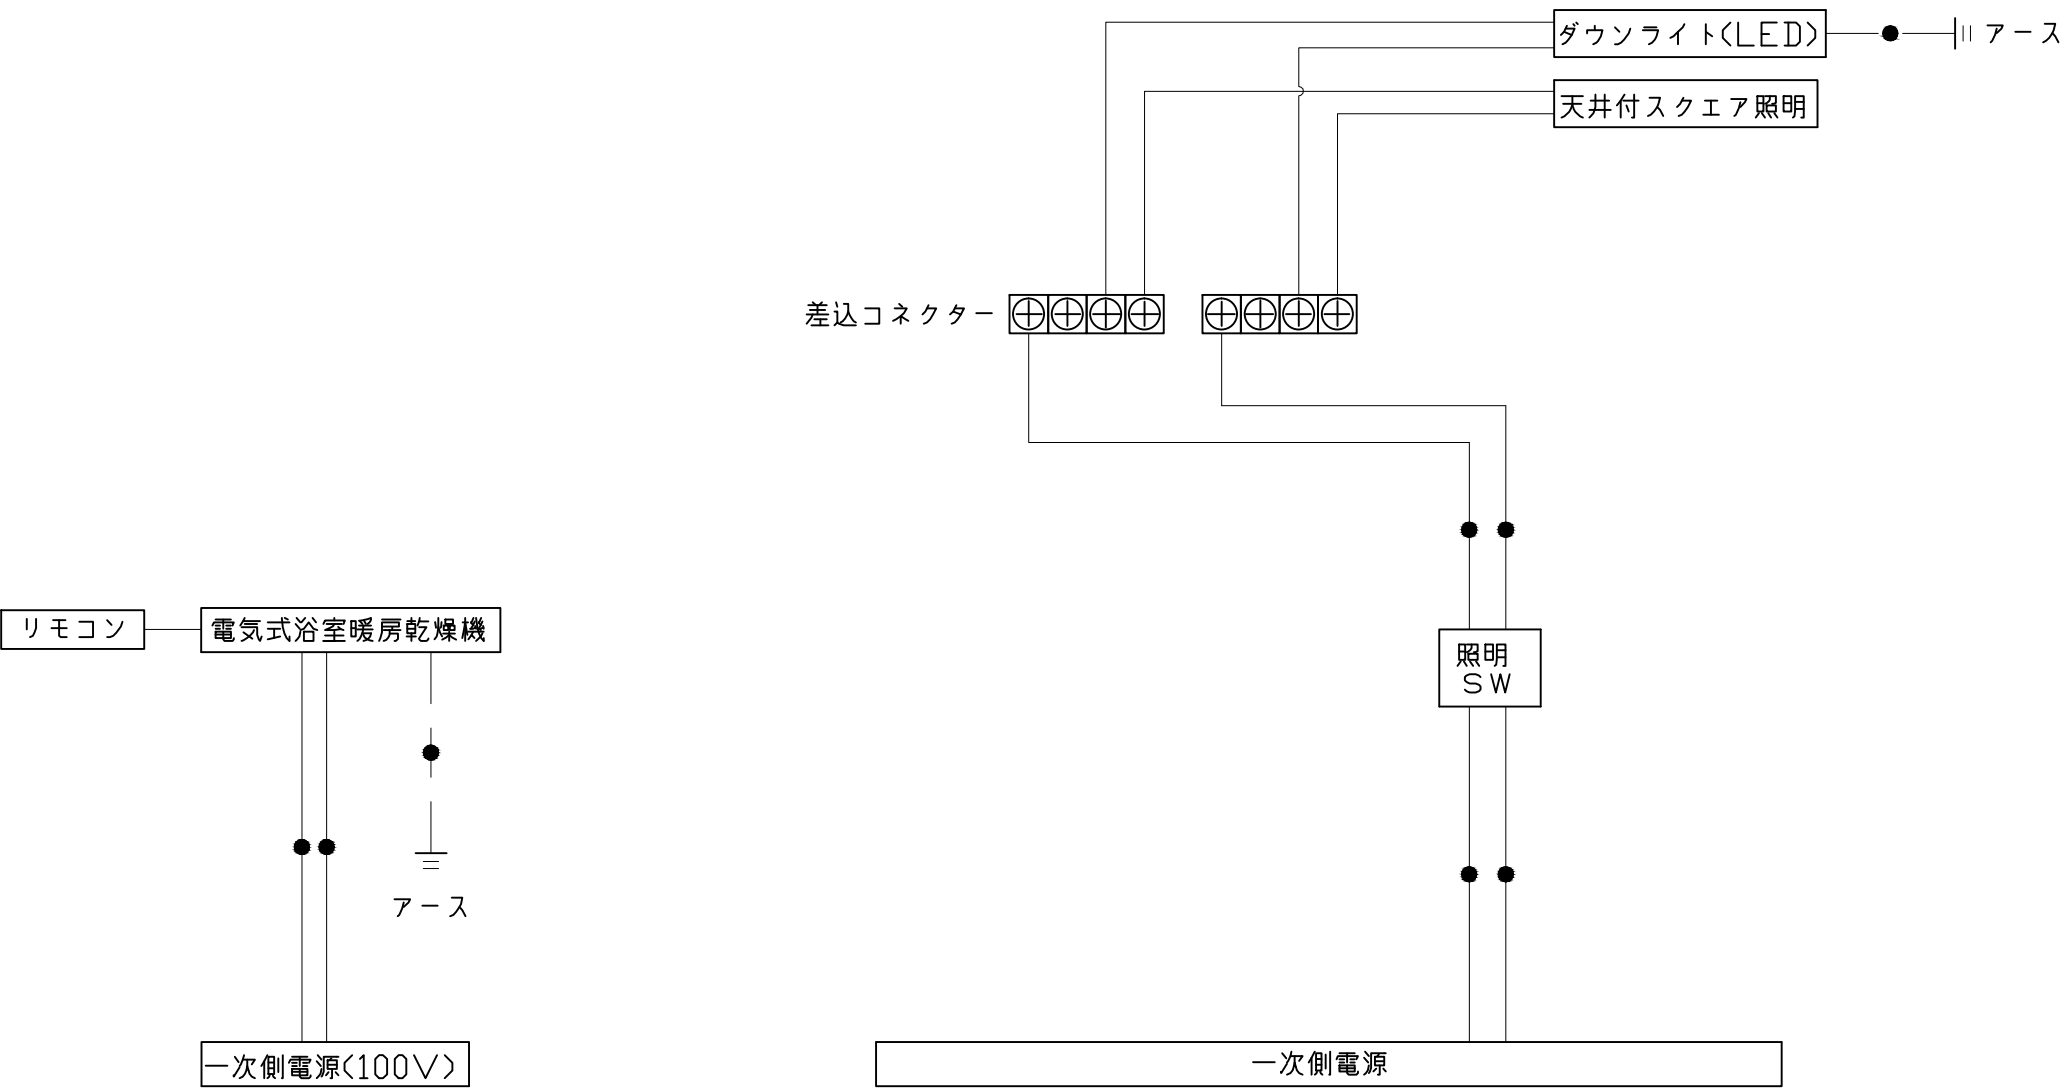

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

Takara standard タカラストンダード株式会社	現場名称： 長野-新佐久平SR SB4様邸	RELAGE レラージュ	電気配線図	
	現場番号： C1301231	プラン番号： 2612B-2008-0256T	作成日： 2020年10月28日	
	佐久平営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

パネル割図		ミラー		収納棚	
シャワーフックスライドバー		ランドリーパイプ		タオル掛け	
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 長野ー新佐久平SR SB4様邸	RELAGE レラージュ	穴開け指示図		1/1
	現場番号： C1301231	プラン番号： 2612B-2008-0256T	作成日： 2020年10月28日		
	佐久平営業所	担当営業：	担当アドバイザー：		
			■留意事項 ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。		
