

# システムバス 御見積書

御名前 北海道-中央SR SB1 様

業者 様

商品名 PREDECIA プレデンシア

作成日 2023年6月2日  
プラン番号 1200B-2306-0020T  
現場番号 C3870175

タカラスタンダード株式会社  
◆札幌中央ショールーム  
札幌市中央区北3条東11丁目338番地  
苗穂ヒラクスEAST 1階  
TEL 011-219-1611 / FAX 011-219-1614  
◆北海道支店 販売課  
TEL 011-862-6111 / FAX 011-862-6183

商品  
御見積金額 **¥2,245,400 (税込 ¥2,469,940)**

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥235,000 (税込 ¥258,500)**

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様 ★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

《システムバス》

ユニットサイズ	1620(AL勝手)
洗い場仕様	キーブクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	グランベージュ
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	プレシャスホワイト
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	クォーツストーン
カウンター/下カバーカラー	ブランソルベ / ホワイト
浴槽前カウンターカラー	ブランソルベ
エプロン材質/カラー	ステンレス / ベージュ
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	パールミルフィーユ
パネルカラー(周辺)	ツイードベージュ
ガス種 / 周波数	13A / 50Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		木津谷

◆ 備考

御名前 北海道-中央SR SB1

様

現場番号	C3870175	プラン番号	1200B-2306-0020T	作成日	2023/6/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

## 御見積明細 システムバス

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1620サイズ		1	1,306,000	1,306,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	2枚引戸<1000幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1	+63,000	+63,000
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	洗い場	キーブクリーンフロア(プレミアムクラス・グランベージュ)	1	+20,000	+20,000
6	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
7	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(プレシャスホワイト)	1		
8	浴槽追焚き穴	あり	1		
9	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ベージュ)	1		
10	浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)	1		
11	ヘルシージェット	なし	1		
12	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
13	うるぽか湯	なし	1		
14	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
15	ガス温水式床暖房	なし	1		
16	洗い場用水栓	プッシュ式水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB280	1	+71,000	+71,000
17	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド(節水+手元止水)	1		
18	浴槽用水栓	デッキ2ハンドル水栓(KM71CUR23TK)	1	+70,000	+70,000
19	カウンター	クォーツストーンカウンター	1	+138,000	+138,000
20	カウンター	クォーツストーンデュアルカウンター	1	+138,000	+138,000
21	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
22	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザインプレミアム)(Kパネル)	1	+85,000	+85,000
23	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
24	天井	カラーフラット天井(ベージュ)	1		
25	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ホワイト	1	+45,500	+45,500
26	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
27	換気機器開口	工場開口	1		
28	照明	ストレートライン照明(調光機能付・ラグジュアリーミラー/ライト対応用)	1	+91,000	+91,000
29	天井照明開口	工場開口	1		
30	ミラー	ラグジュアリーミラー(収納棚対応)	1	+127,000	+127,000
31	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		

御名前 北海道-中央SR SB1 様

現場番号	C3870175	プラン番号	1200B-2306-0020T	作成日	2023/6/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

## 御見積明細 システムバス

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	タオル掛け	クリアタイプ クリア	1		
33	ハンドバー	ステン 1型600タイプ	1	+9,000	+9,000
34	収納棚	クリアタイプ クリア(2段)	1	-4,000	-4,000
35	どこでもラック	マルチラック(ホワイト)	1	+1,900	+1,900
36	風呂フタフック	風呂フタフック(固定式)(ホワイト)	1	+4,000	+4,000
37	吊り金具	20LL	1	+21,500	+21,500
38	循環金具	FW-LHLX	1	+5,000	+5,000
39	給水給湯管	デッキ2水栓用<上配管 カウンター側接続>	1	+29,500	+29,500
40	トラップカバー	洗い場側トラップカバー	1		
41	トラップカバー	浴槽側トラップカバー(浴槽パンあり)	1		
システムバス合計			41		¥2,245,400

商品総合計	41	¥2,245,400
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

## 《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥235,000 (税込 ¥258,500)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格&lt;税率10%&gt;を表示しています。

パース

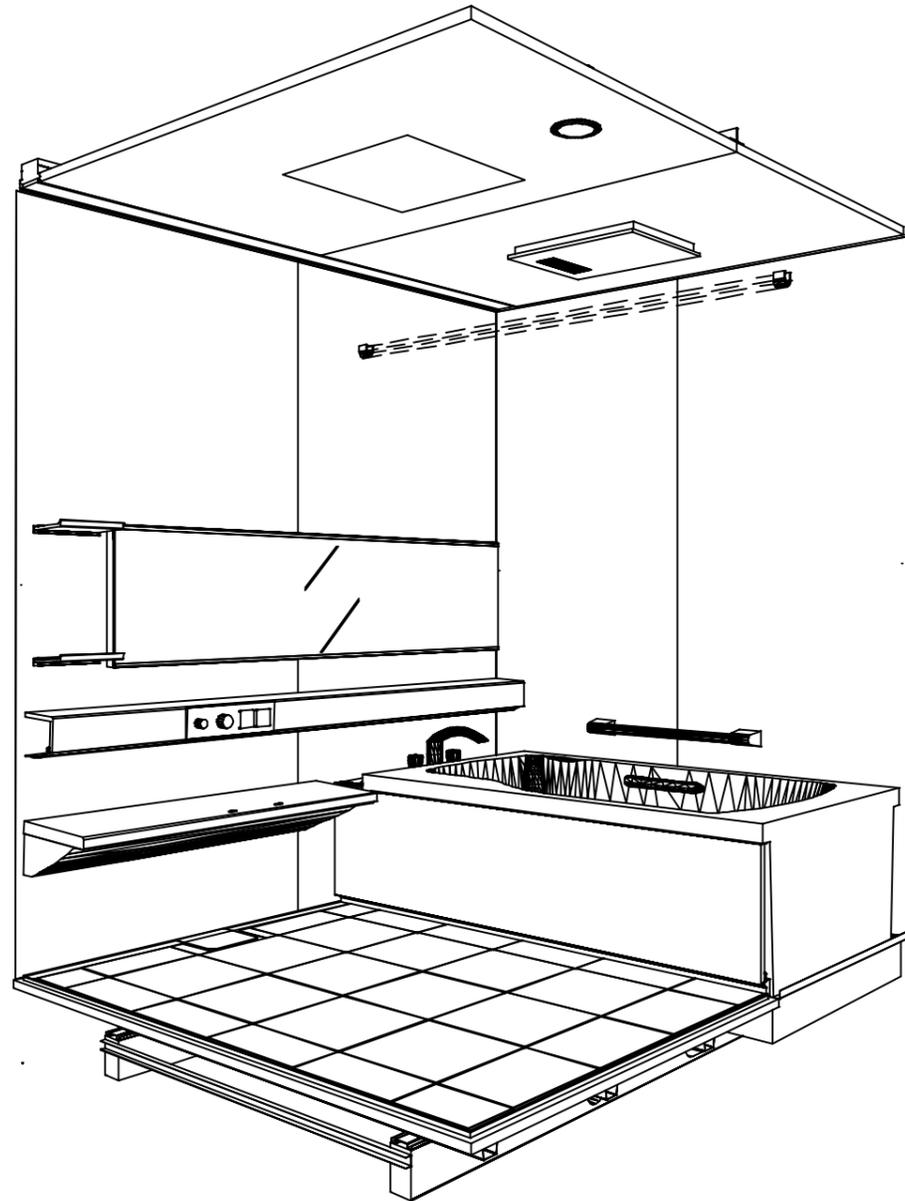

鳥瞰図

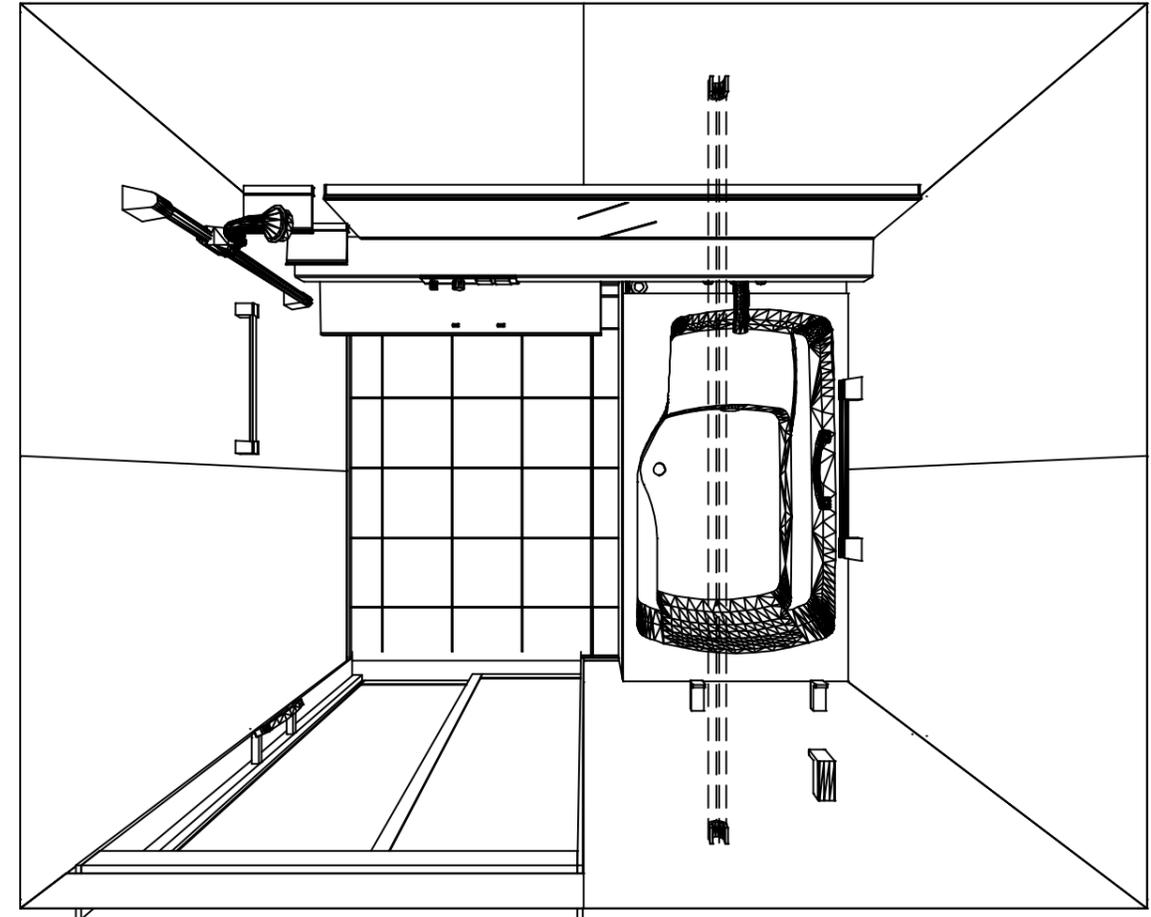

1620

フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。


**Takara standard**  
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北海道-中央SR SB1様邸  
現場番号： C3870175  
札幌中央ショールーム


PREDENCIA プレデンスΙΑ  
プラン番号： 1200B-2306-0020T  
担当営業：

姿図  
作成日： 2023年6月2日  
担当アドバイザー：


縮尺：A3サイズ等倍




■ 留意事項  
 \* 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

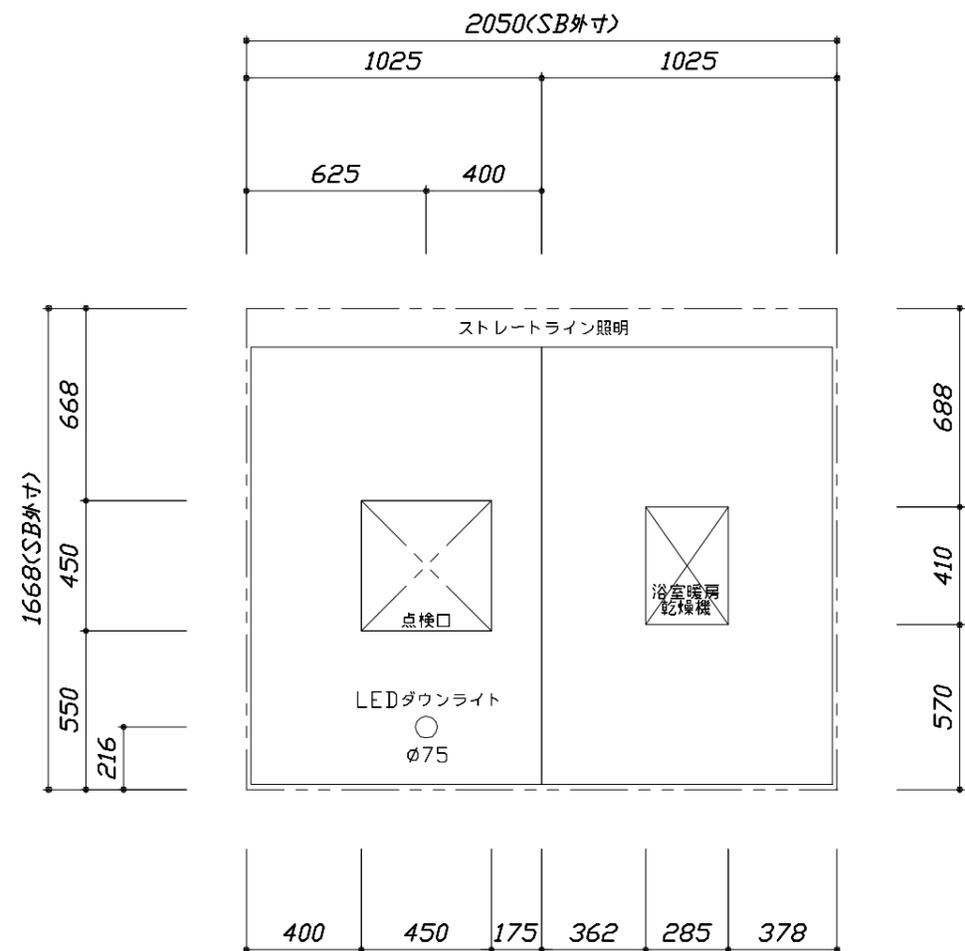

<天井伏図>

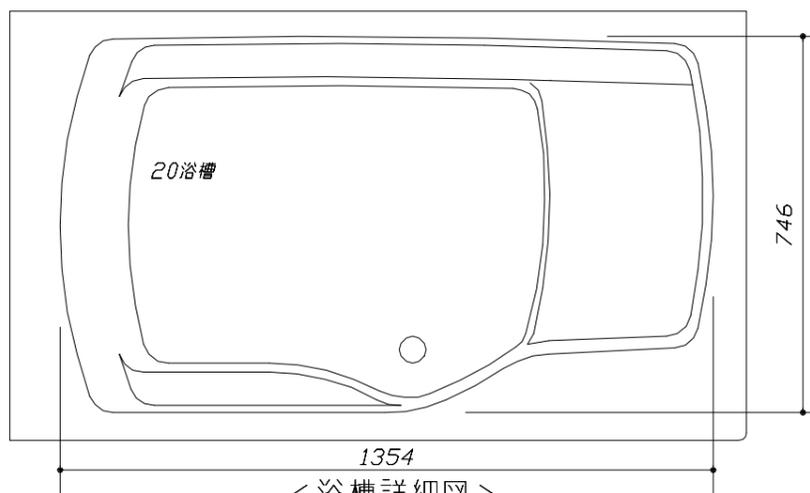

<浴槽詳細図>

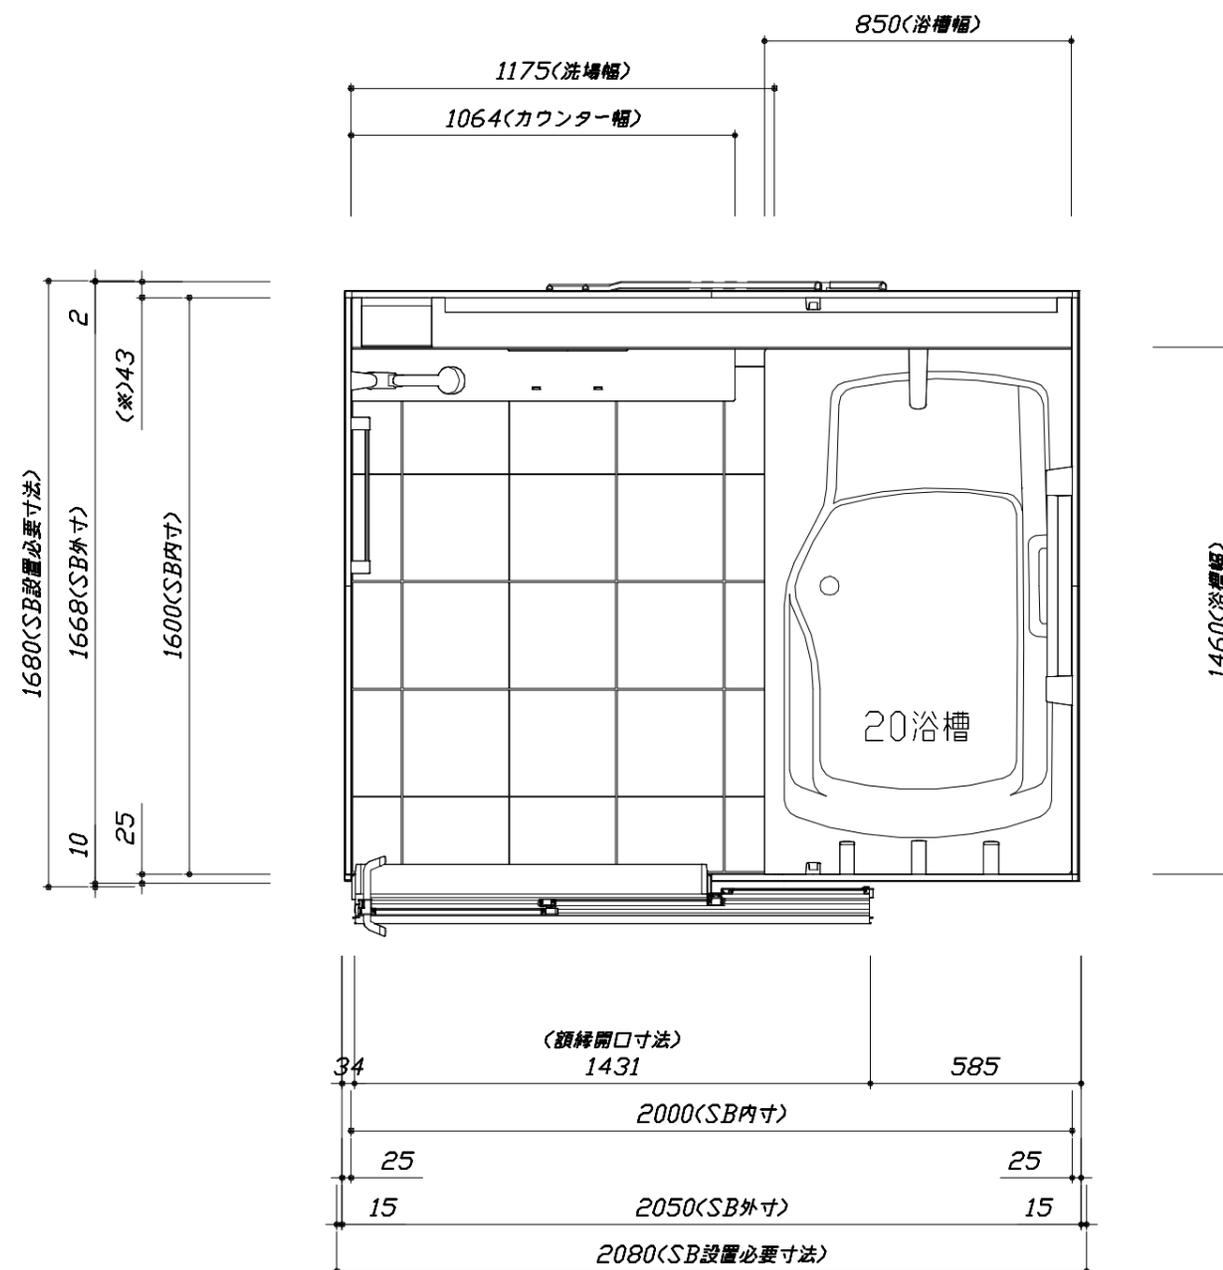

<平面図>

**Takara standard**  
 タカラスタンダード株式会社



現場名称：北海道-中央SR SB1様邸  
 現場番号：C3870175  
 札幌中央ショールーム

PREDECENCIA プレデンスシア  
 プラン番号：1200B-2306-0020T  
 担当営業：

施工図1 縮尺：1:25,20  
 作成日：2023年6月2日  
 担当アドバイザー：


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

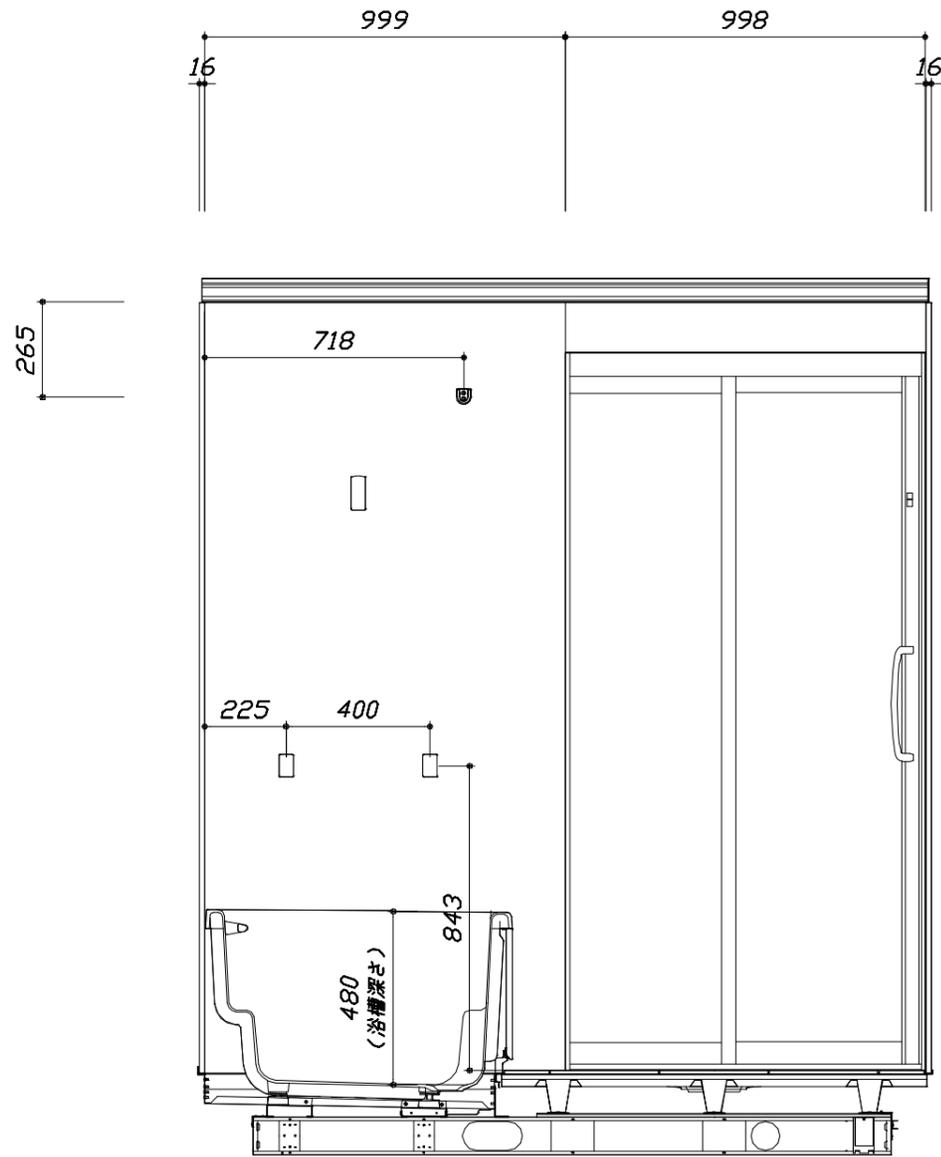

<カウンター対面図>

■土間コン仕上げ寸法  
 ドアアングル下端より  
 265mm下がり  
 (クリア寸法含む)

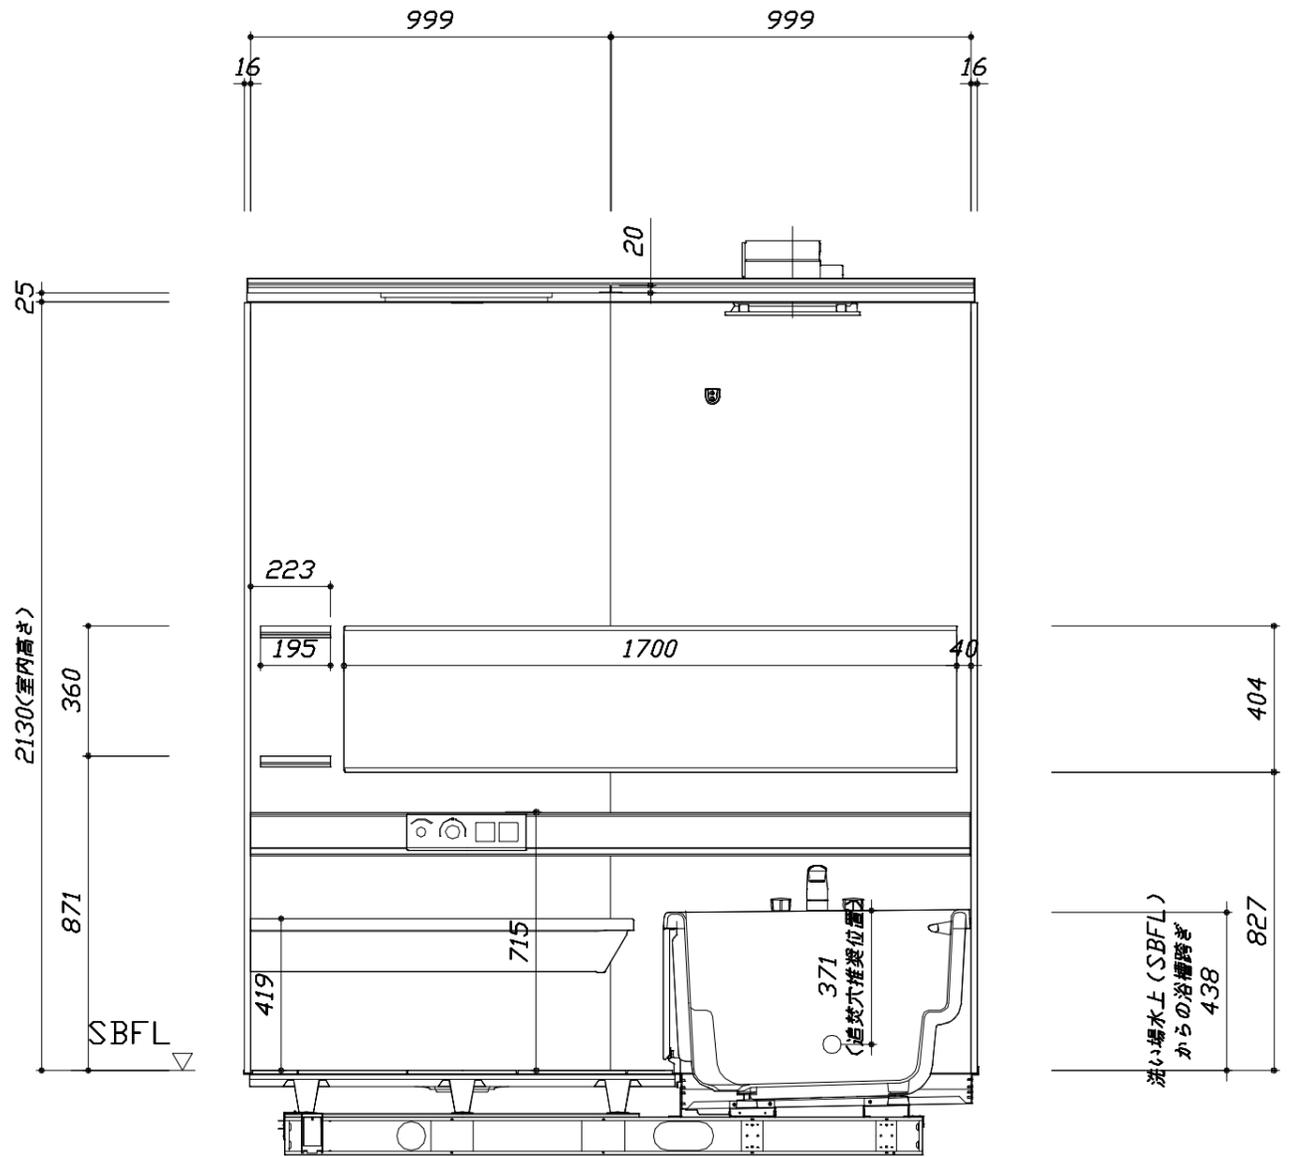

<カウンター面図>

Takara standard  
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北海道-中央SR SB1様邸  
 現場番号： C3870175  
 札幌中央ショールーム



PREDECENCIA プレデンスシア  
 プラン番号： 1200B-2306-0020T  
 担当営業：

施工図2 縮尺： 1:20  
 作成日： 2023年6月2日  
 担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

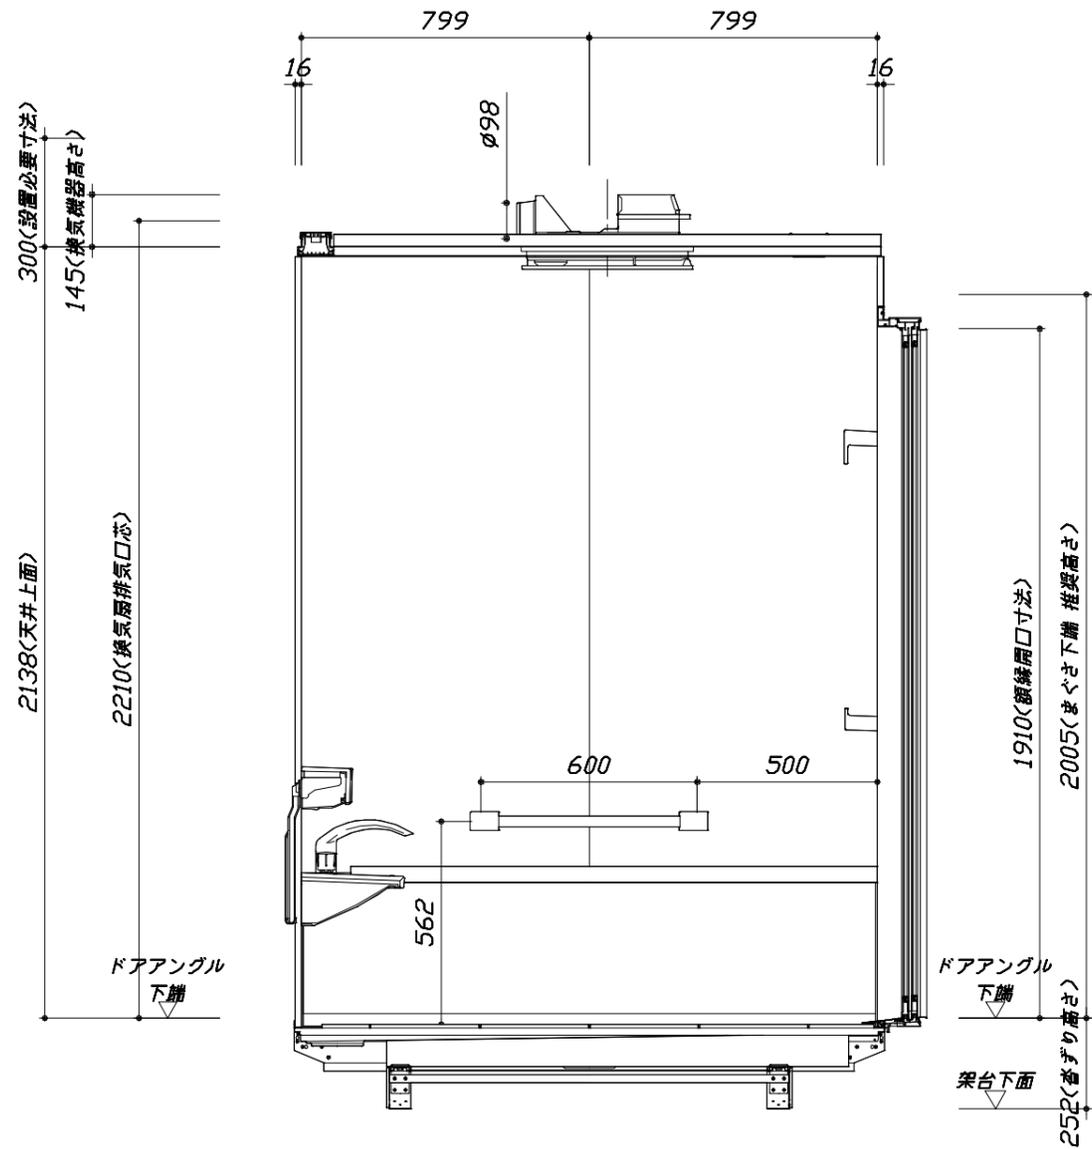

< 浴槽側面図 >

■土間コン仕上げ寸法  
 ドアアングル下端より  
 265mm下がり  
 (クリア寸法含む)

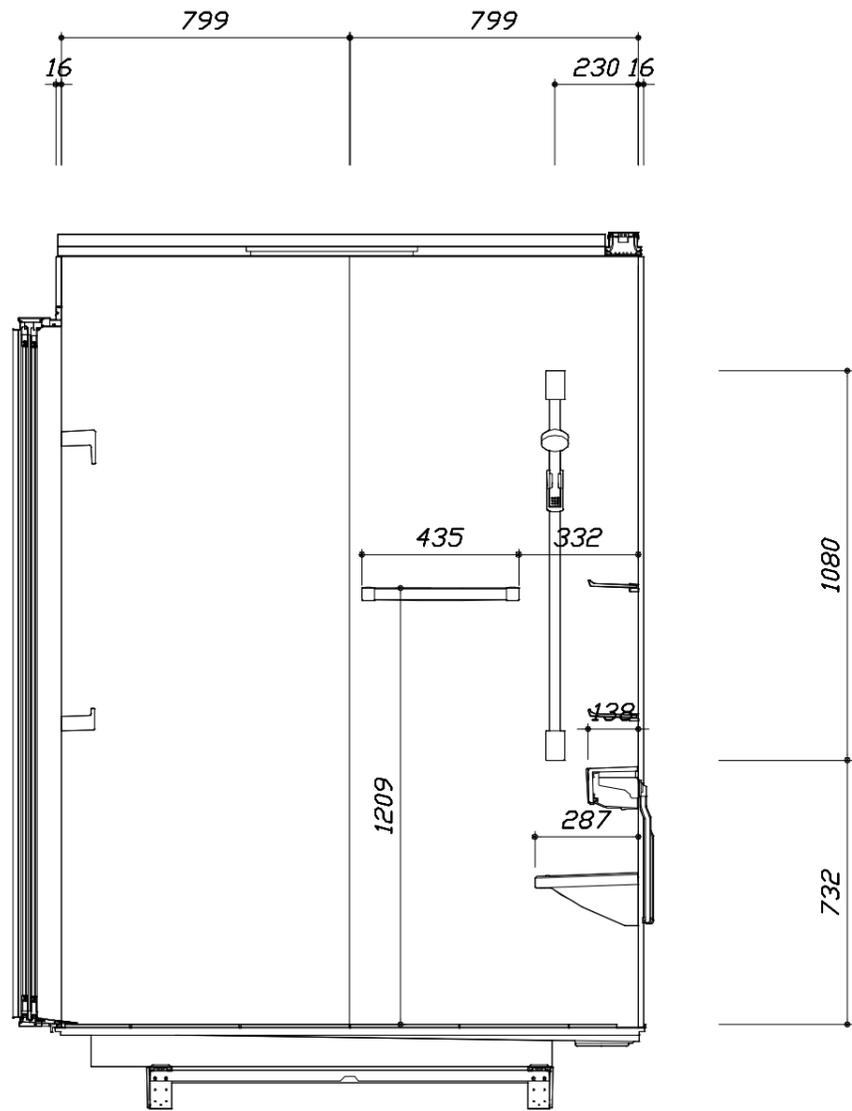

< 洗場側面図 >

Takara standard  
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北海道-中央SR SB1様邸  
 現場番号： C3870175  
 札幌中央ショールーム

PREDECENCIA プレデンスシア  
 プラン番号： 1200B-2306-0020T  
 担当営業：

施工図3 縮尺： 1:20  
 作成日： 2023年6月2日  
 担当アドバイザー：

本体仕様表

浴室サイズ	1620サイズ(室内容量6.8立方メートル)
ドア勝手	AL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	鋳物ホーロー 裏面保温材・高断熱仕様(発泡ウレタン)
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付) グリップ付(305リットル) 追い焚き穴：あり
浴槽パン	ステンレス
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材(発泡ポリエチレン)
カウンター	クォーツストーンデュアルカウンター：クォーツストーン カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	化粧サドル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ2枚引戸(アルミ框/樹脂ガラス/ﾀﾞｲﾌﾞﾙ換気口)
窓1	－
窓2	－
窓枠1	－
窓枠2	－
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂、浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	505kg

アクセサリ仕様表


ミラー	ラグジュアリーミラー(収納棚対応) くもり止め加工(13W)
収納棚	クリアタイプ：アクリル樹脂製(2段)
タオル掛け	クリアタイプ：アクリル樹脂製
洗場側水栓	プッシュ式・サーモスタット(SB280RABNS(H)) (樹脂ホース：メタル調)
浴槽側水栓	2ハンドル(KM71CUR23TK)
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ) (スライドバー-T1020S MH)
照明	ストレートライン照明(LED 23.7W調光機能付)
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V・最大消費電力1250W) (ﾀﾞｲｱﾞｸﾞ外径φ98) (常時換気対応品) ホワイト
フロフタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具FW-LHLX：L型ホース接続仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	ステンレスタイプ I型600タイプ
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	WP：プレシヤスホワイト
カウンター	H：ブランソルベ
ﾊﾟｰﾙ(ｶｳﾝﾀｰ面)	JDN：パールミルフィーユ
ﾊﾟｰﾙ(周辺・3面)	JDT：ツイードベージュ
水栓上部カウンター	－
浴槽エプロン	D：ベージュ
洗場	PD：グランベージュ
ドア	W：ホワイト
収納棚	クリアタイプ(クリア)
タオル掛け	クリアタイプ(クリア)
ﾗﾝﾄﾞﾘｰセット	ホワイト

# 基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。  
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。  
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。  
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

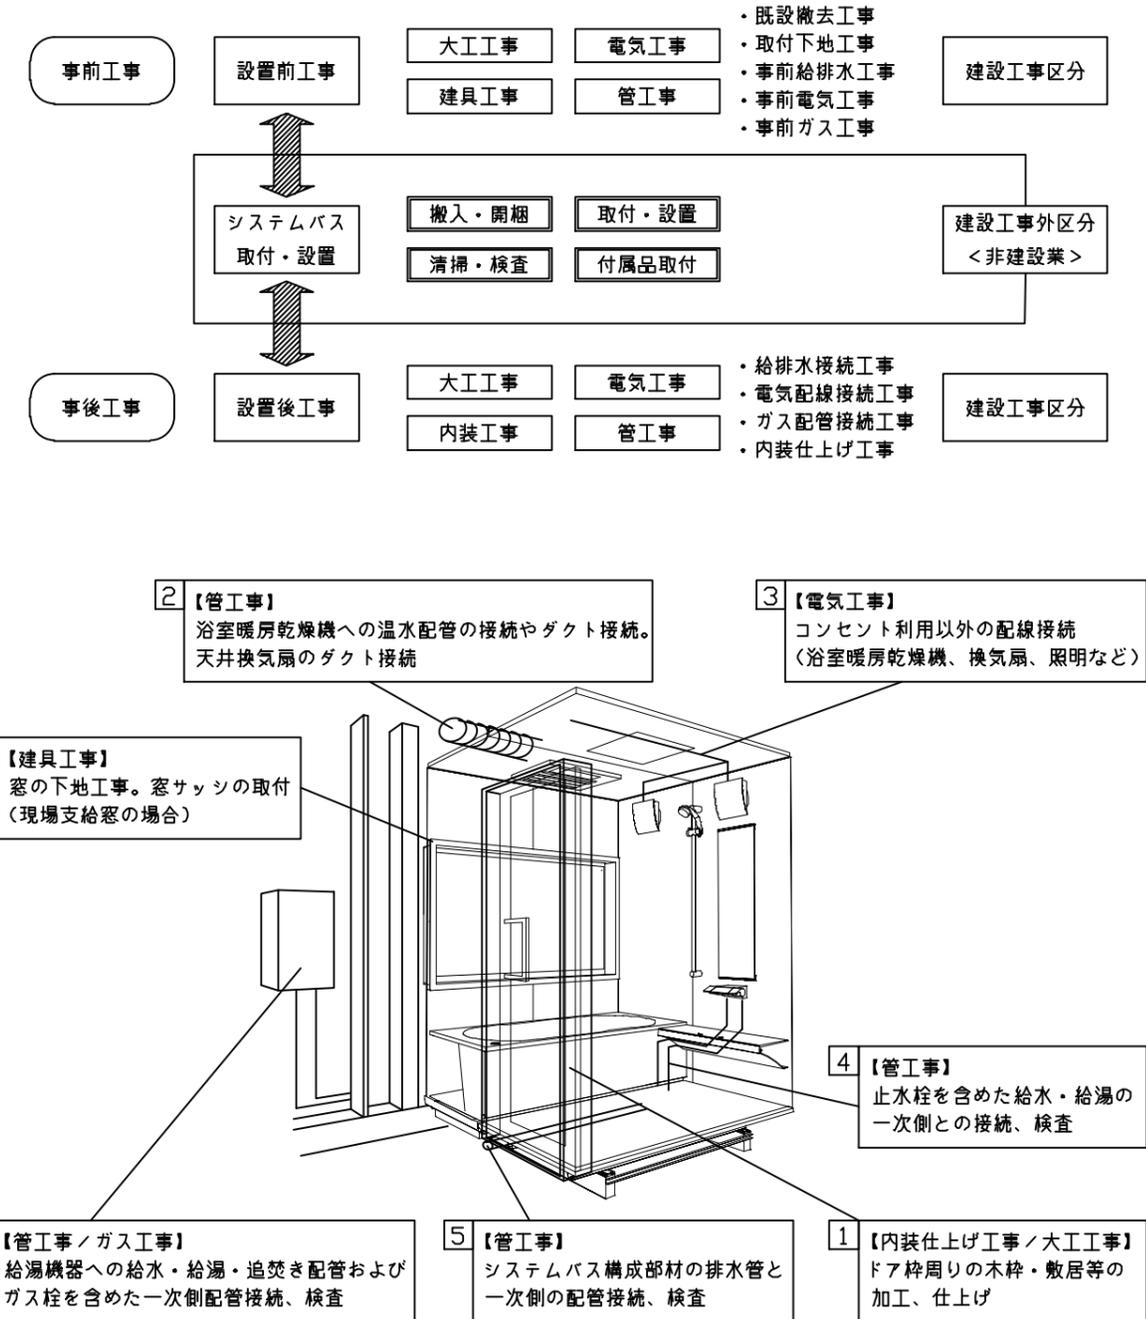

## ■システムバス 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置	
設置前工事	1 2 3	大工 土 建 具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
電気	給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事		
	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事		
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□		浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置						□		洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置						□		浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置						□		天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置【注記1】						□		カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付【注記1】						□		水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付【注記1】						□		浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付【注記1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付【注記1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付【注記1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付【注記1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
試運転・完成検査【注記2】							□	完成後の試運転、性能確認検査			
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ		○						建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事					○			浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事					○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査
	4 5 6	管	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付					○	○		建築の外装仕上げ工事
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事					○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
	1 3	電気 他	建築側排水配管との接続工事【注記3】					○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）					○	□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
			内装仕上げ工事		○	○					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
			浴室用電源配線、接続工事						○		浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○		浴室全体の電気器具、配線接続工事	

※【注記1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする  
 ※【注記2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する  
 ※【注記3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする




■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。




■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

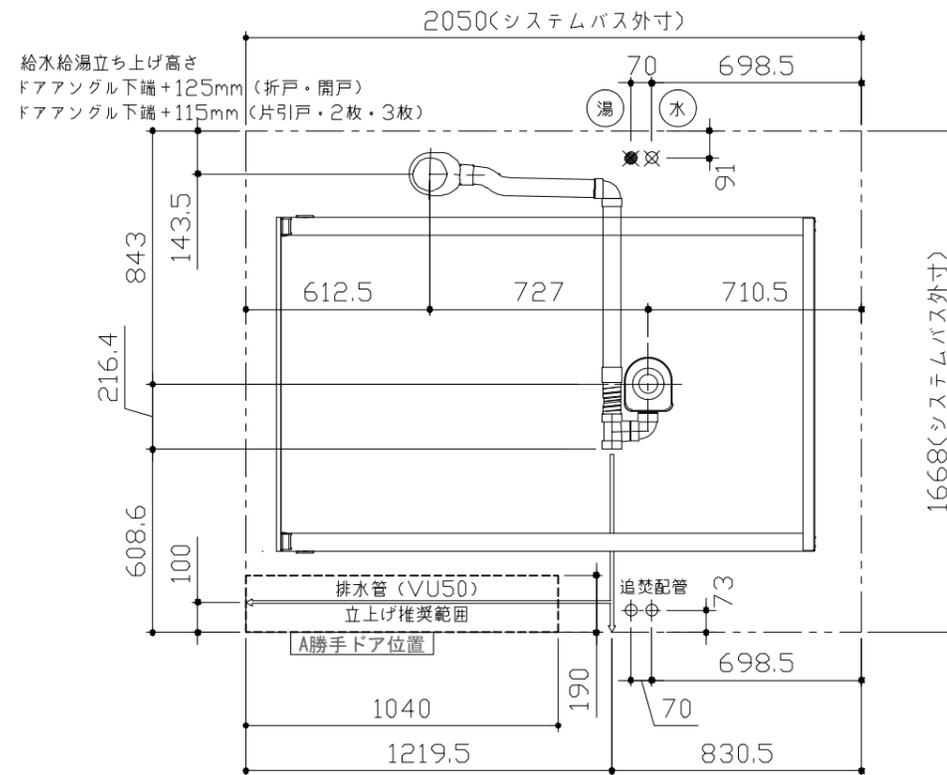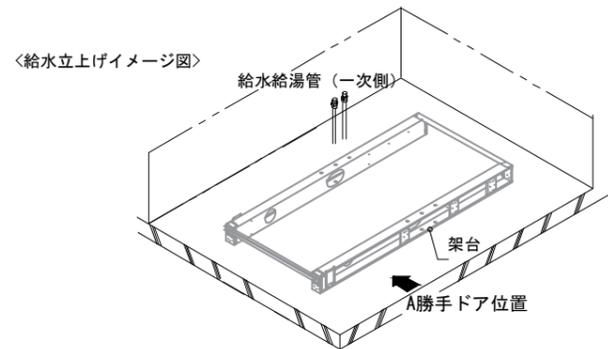



■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置



■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

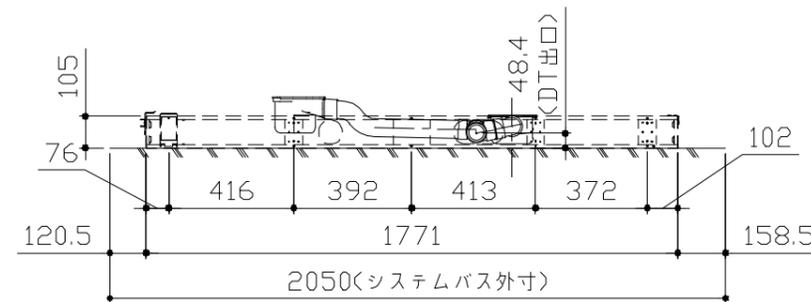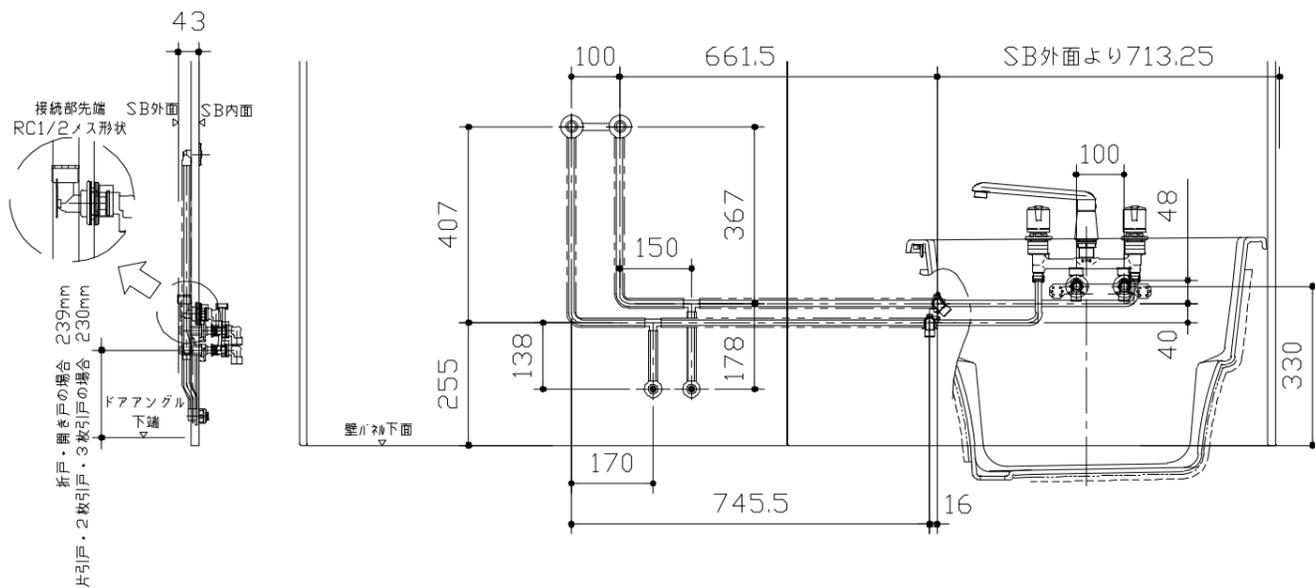

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉




■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。  
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

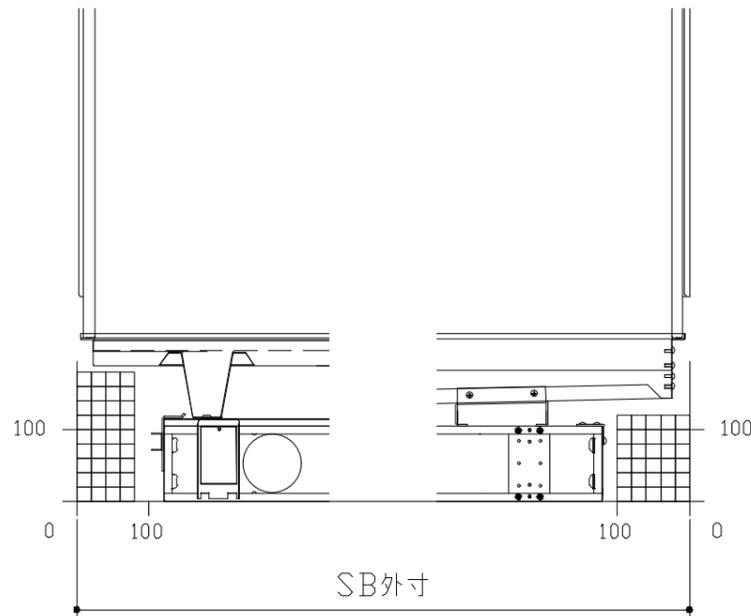


B矢視

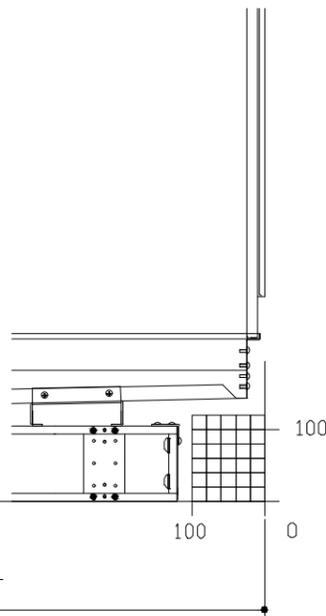


A矢視

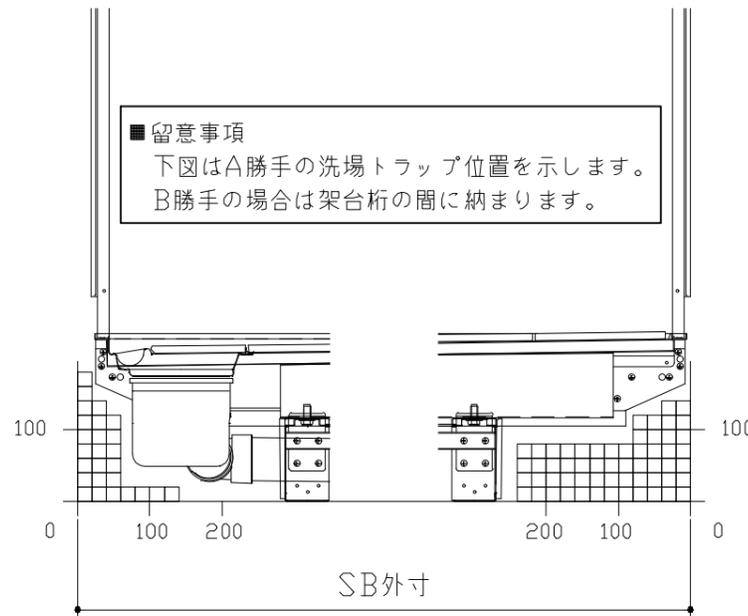


D矢視

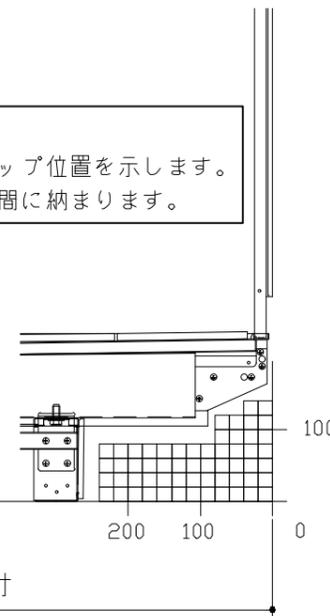

C矢視



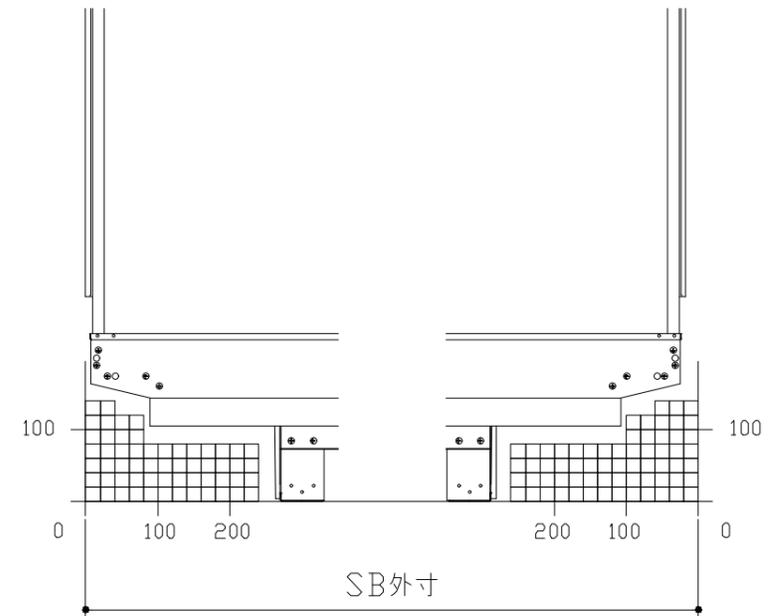


F矢視

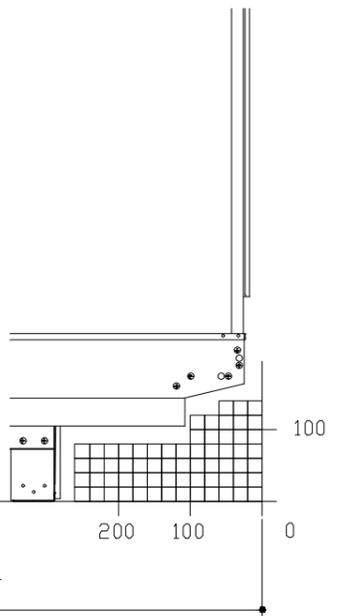

E矢視

# キープクリーンドア：2枚引戸・タテ型換気口

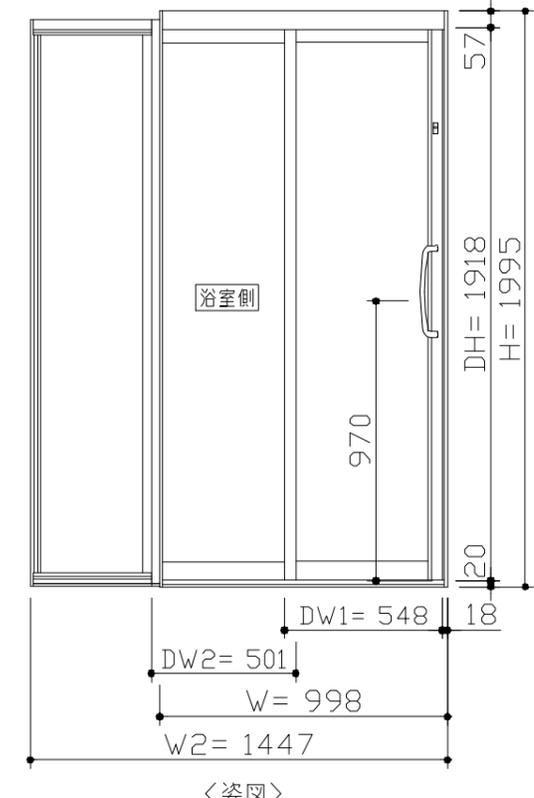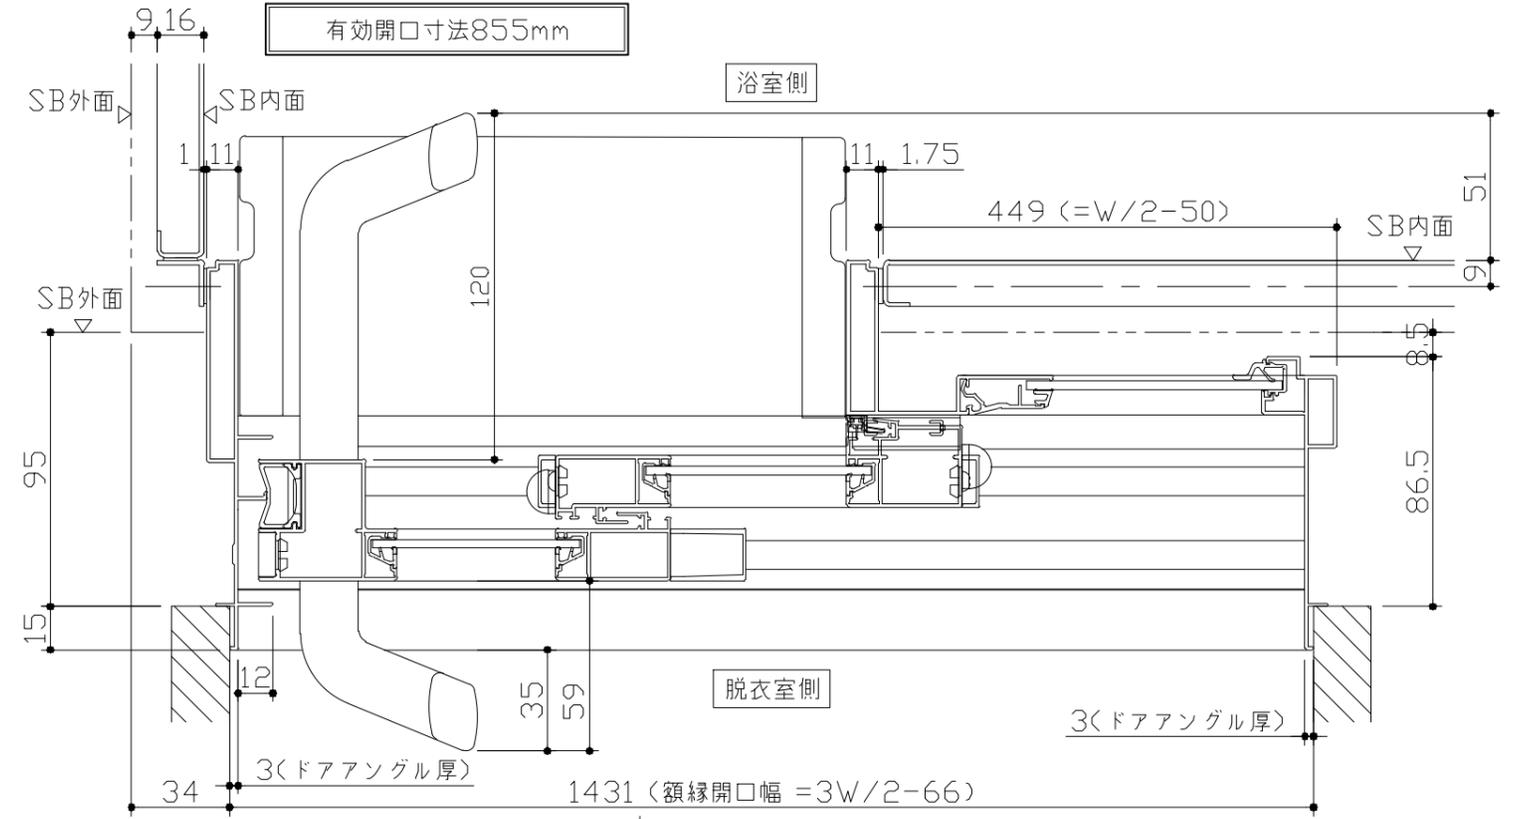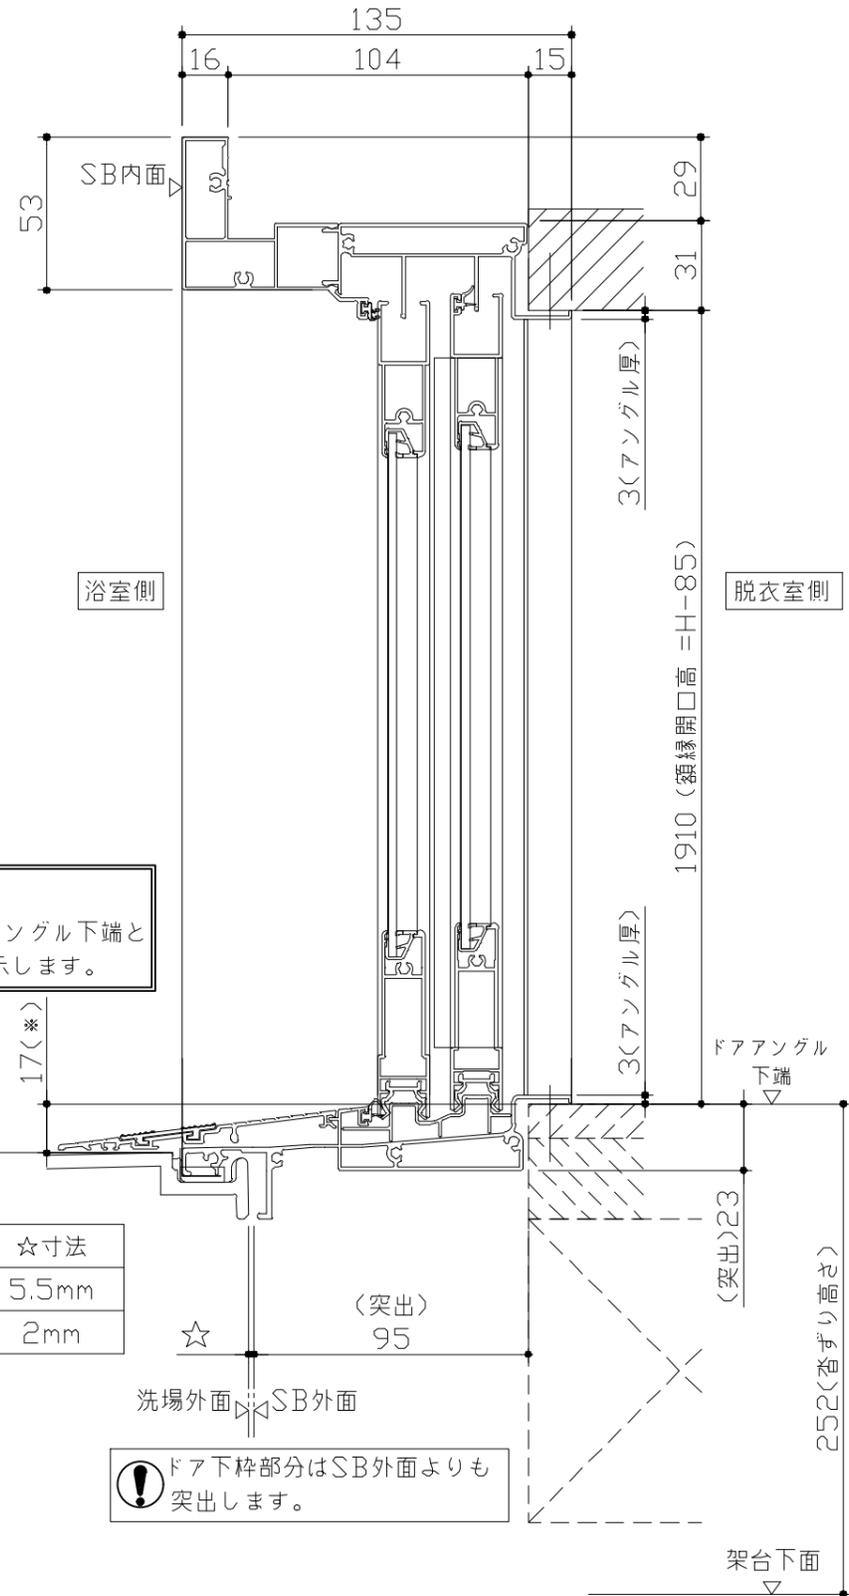

■ ドア横の管柱、間柱について

- ・ ドアが管柱、間柱にあたらぬよう十分に考慮してください。
- ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。


＜参考寸法図＞

66.5  
1431 (額縁開口)  
1497.5 (ドア額縁厚)  
105 (柱厚)  
管柱、間柱

■ 留意事項  
※印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

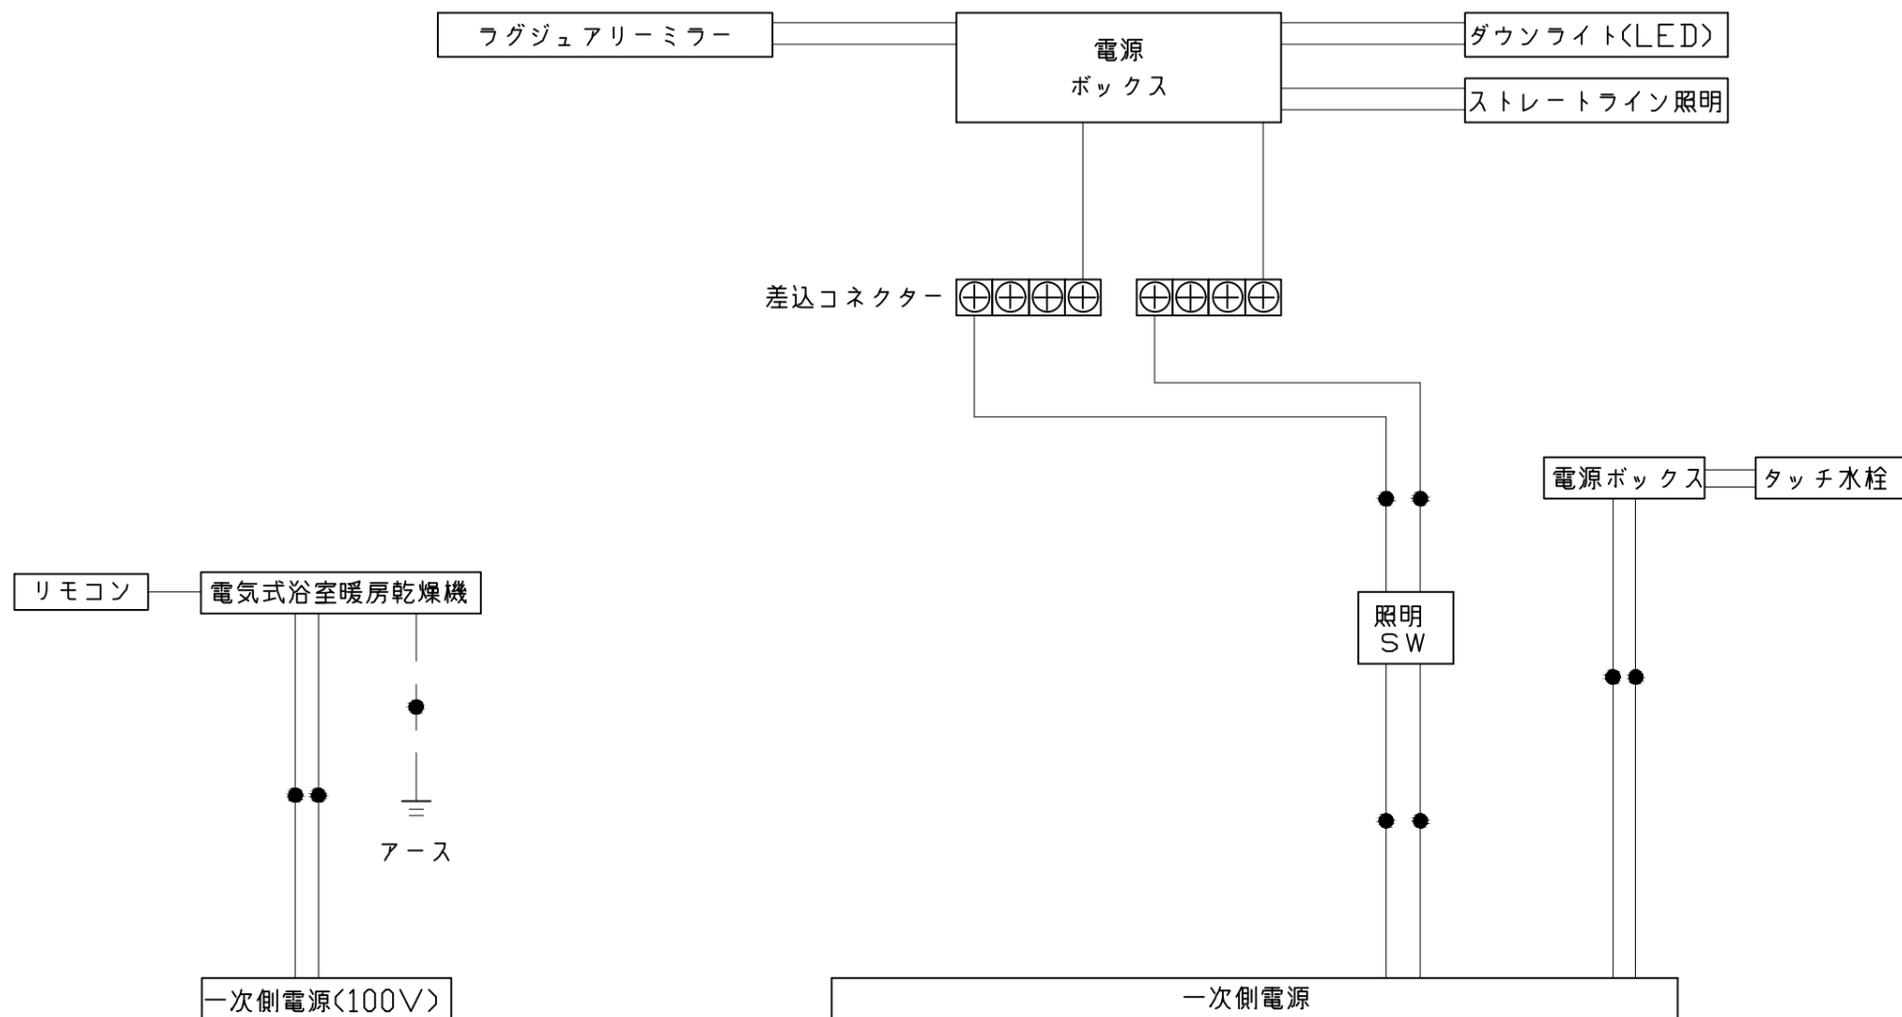


\*浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

一次側電源から差し込みコネクタ及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。


アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行ってください。  
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

吊り金具寸法図

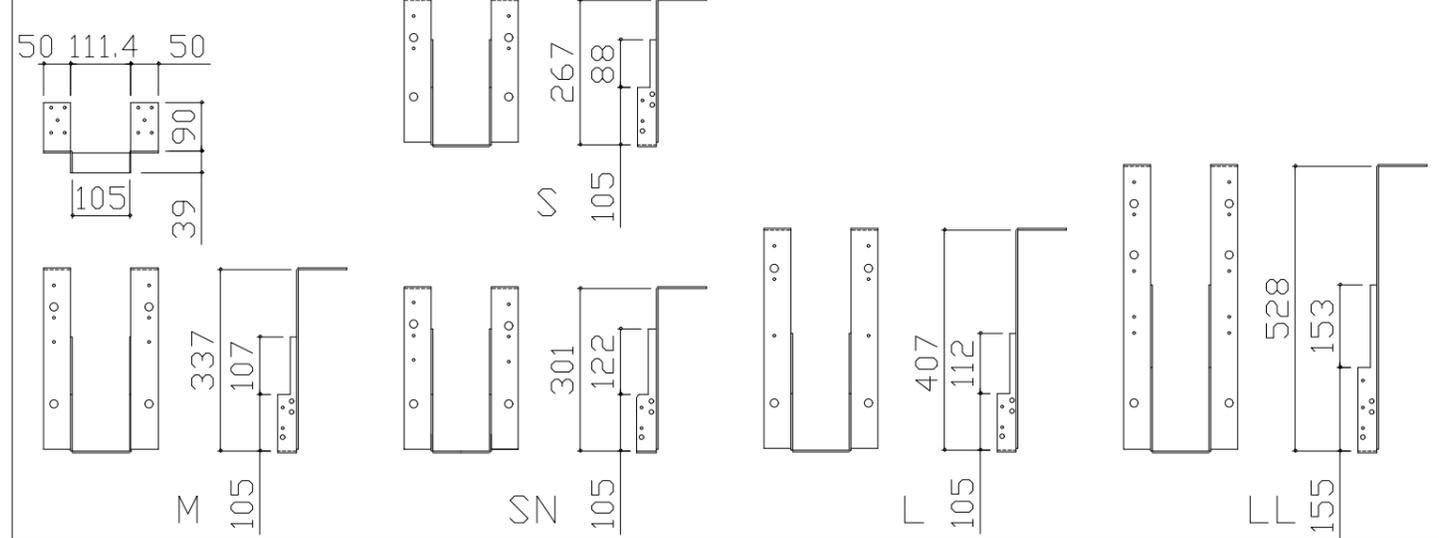


■吊り金具設置条件について

- 吊り金具を設置する梁（土台）には600~900kgの重量がかかります。十分な強度を確保した梁（土台）を設置してください。
- 吊り金具を設置する梁（土台）の高さ寸法（h）に以下の制約条件があるのでご注意ください。

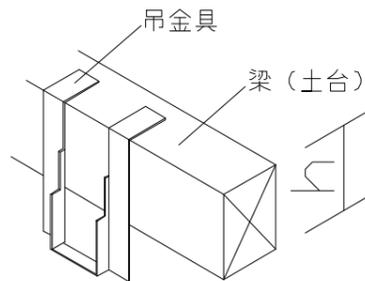


金具セット	h寸法
S	105以上
SN	105以上
M	150以上
L	210以上
LL	240以上

ウケバリ接続金具寸法図



ウケバリ断面図  
100 金具厚：3.2mm

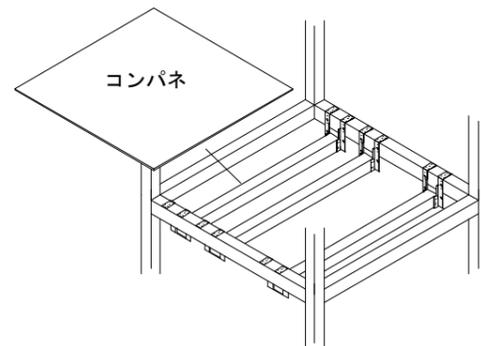

階上に設置する場合などは安全確保（落下防止）の観点よりコンパネを設置してください。

■設置必要材料（現地調達）

【受け梁材が木材の場合】



- 受け梁材（105角 材質：ベイツガ、ベイマツ1級相当品）
- 防錆釘（N-75 80本以上、N-32 20本程度）

【受け梁材が鉄パイプの場合】

- 皿タップネジ（クロメート、M4×25 20本程度）


【共通】

- コンパネ（厚み：12mm以上）
- （コーチスクリュー、アンカー、六角レンチ、ドリル）

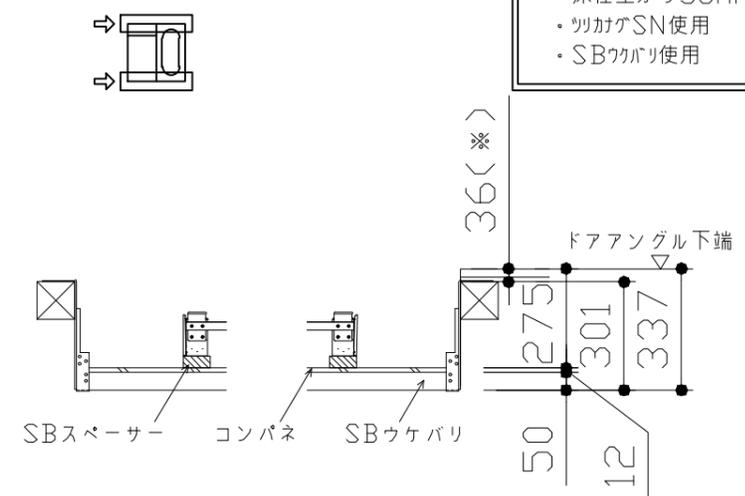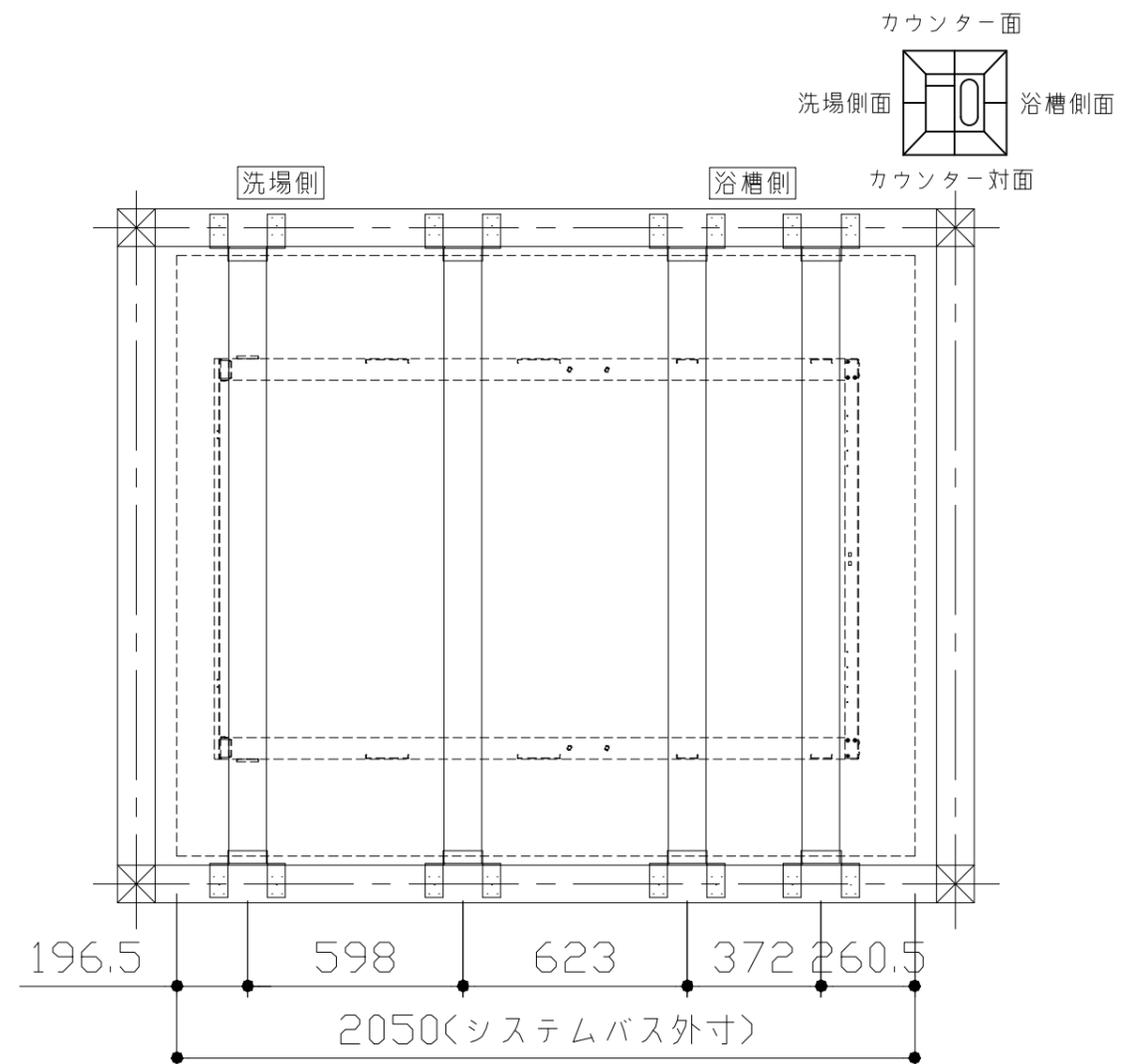


- 吊り金具参考納まり
- ・床仕上がり36mm(※)
- ・ツリカゲSN使用
- ・SBウケバリ使用


浴槽

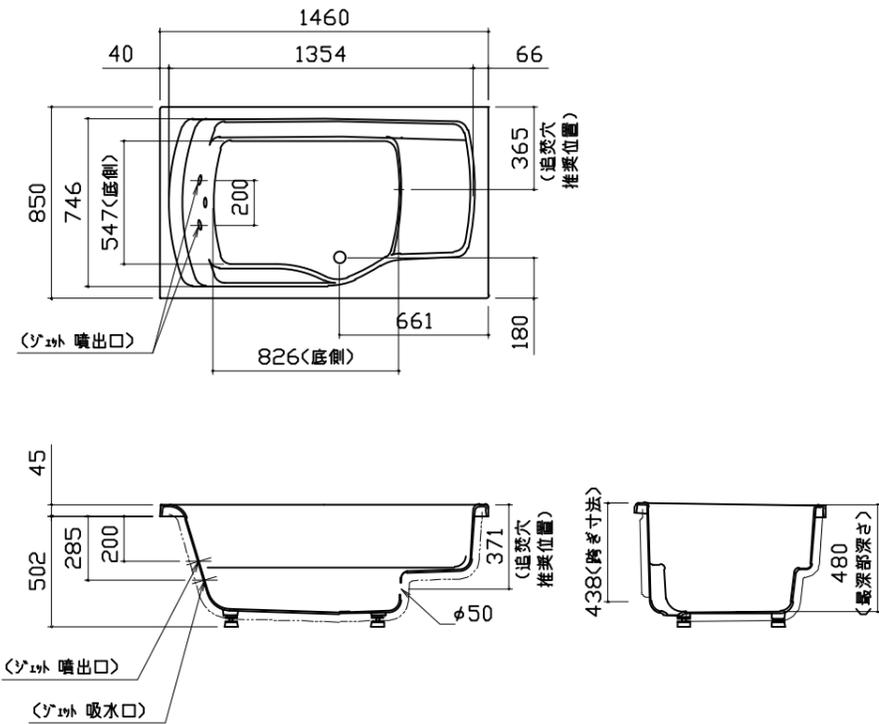

洗い場用水栓

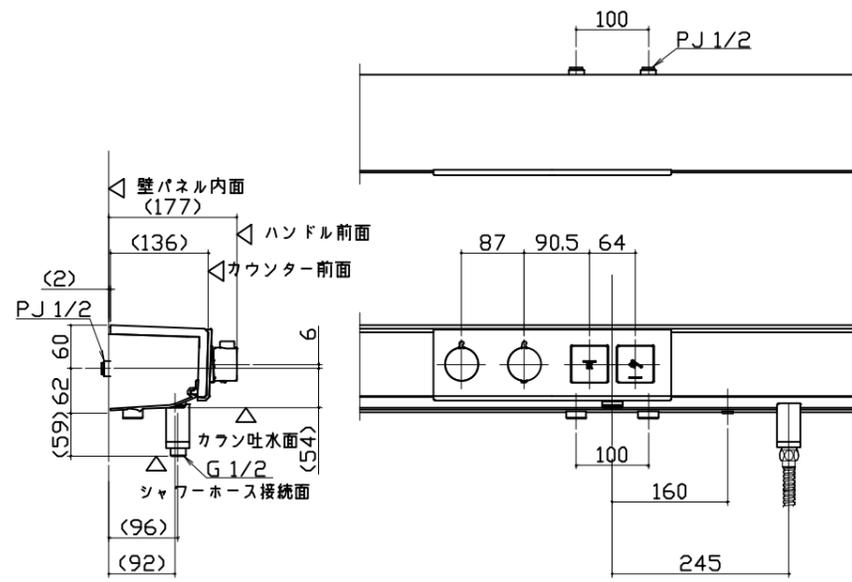


浴槽用水栓

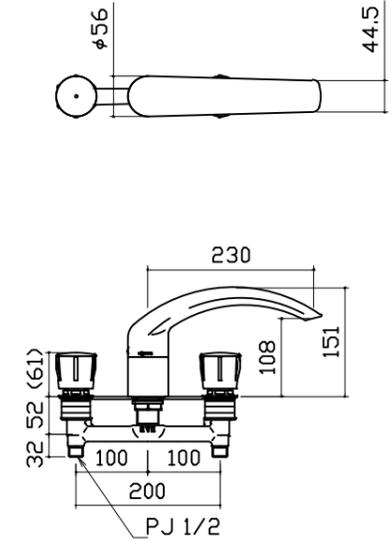

照明


ストレートライン照明  
LED 23.7W (ダウンライト1灯含む)

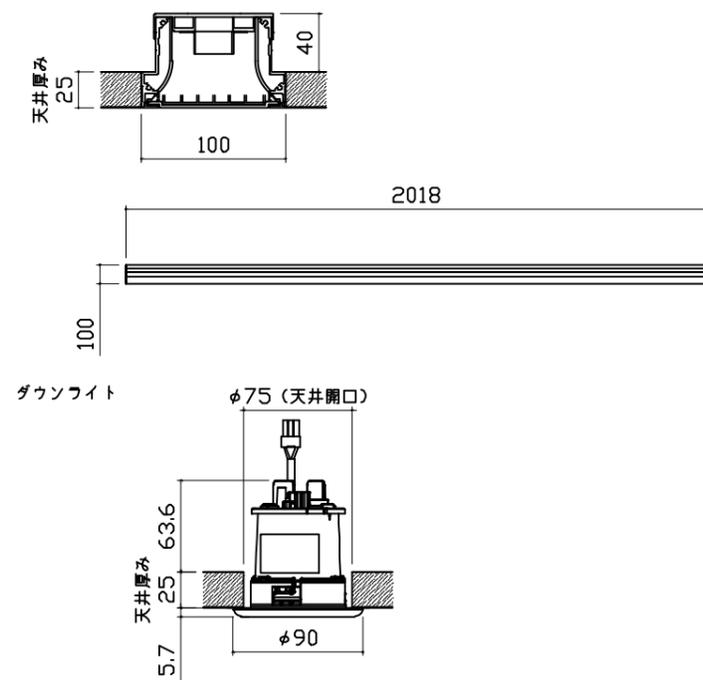


換気機器







リモコンコード長さ：5m  
外形：縦120mm×横116mm

管工事

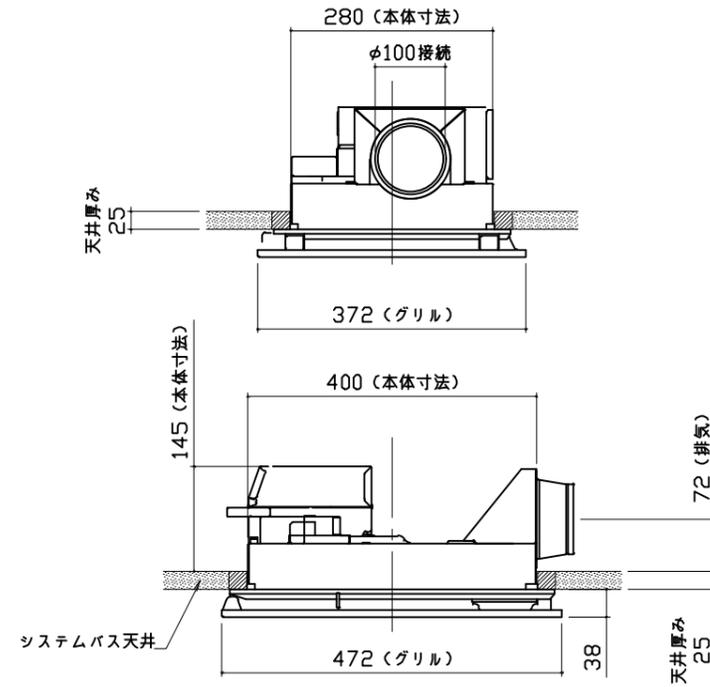


シャワーフックスライドバー

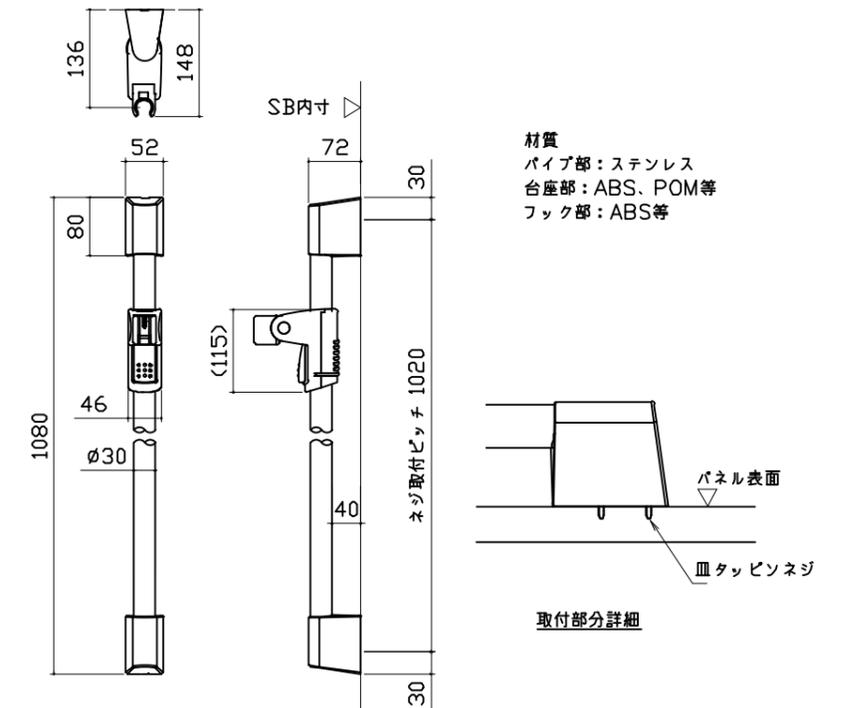


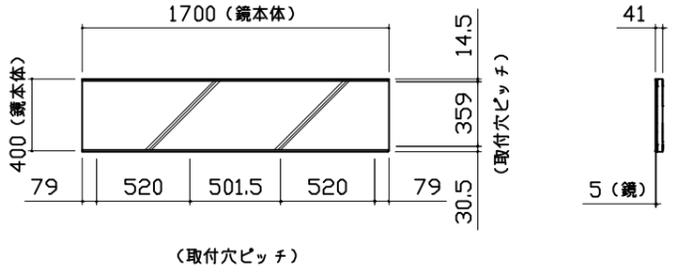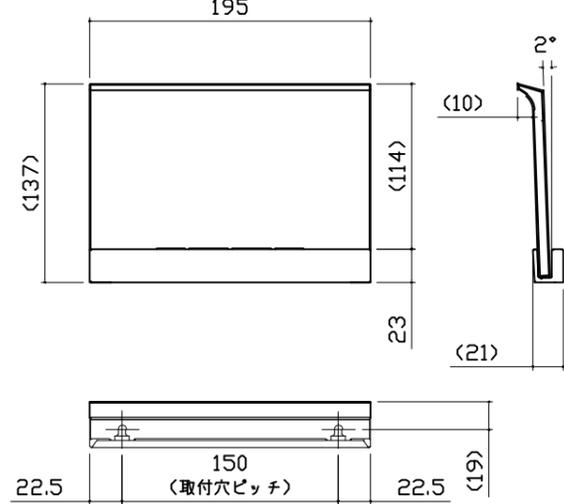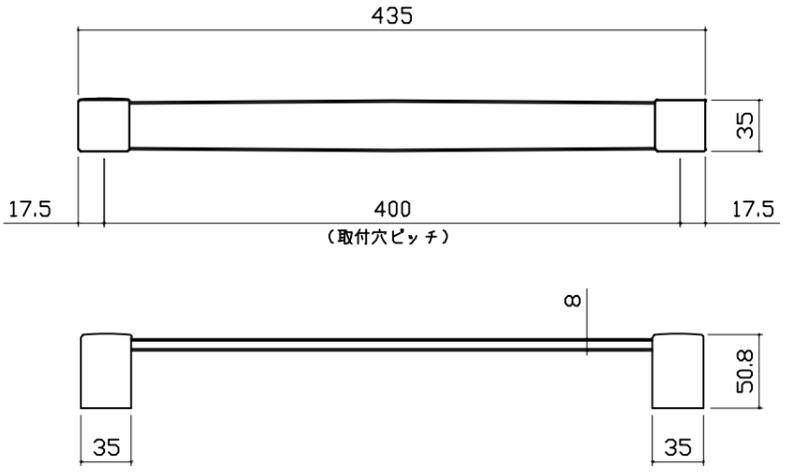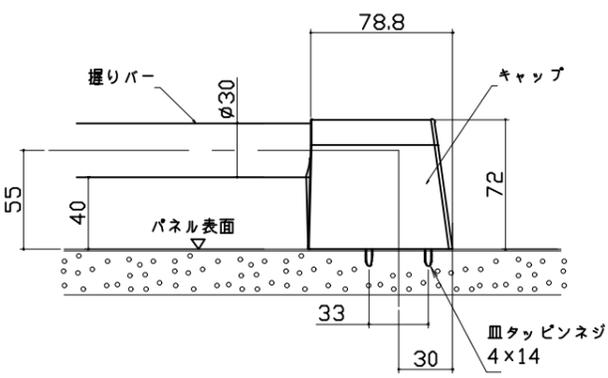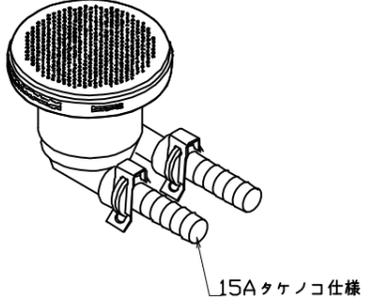
ミラー	収納棚	タオル掛け	
<p>枠：SUS304 t0.8、PMMA ミラー：表面防曇コートあり LED：13W</p>  <p>1700 (鏡本体) 400 (鏡本体) 79 520 501.5 520 79 14.5 359 30.5 41 5 (鏡) (取付穴ピッチ)</p>	<p>本体：PMMA</p>  <p>195 (137) (114) 23 (10) 2° (21) 150 (取付穴ピッチ) 22.5 (19)</p>	<p>本体：PMMA フック：ABS (クロムメッキ仕上げ)</p>  <p>435 17.5 400 17.5 (取付穴ピッチ) 35 8 35 50.8 35</p>	
ハンドバー支持部取合詳細図	循環金具・フロアダプタ関連	風呂蓋 7079MDH-20WSK	
 <p>78.8 握りバー φ30 キャップ 72 パネル表面 33 30 皿タップピネジ 4×14</p>	 <p>15Aタケノコ仕様</p>	 <p>830 720 720 1440</p>  <p>断面図 21.5 24</p>	
<p><b>Takara standard</b> タカスタンダード株式会社</p>	<p>現場名称： 北海道-中央SR SB1様邸 現場番号： C3870175 札幌中央ショールーム</p>	<p>PREDECENCIA プレデンスシア プラン番号： 1200B-2306-0020T 担当営業：</p>	<p>部材詳細図 2/3 作成日： 2023年6月2日 担当アドバイザー：</p>

洗い場側排水トラップ

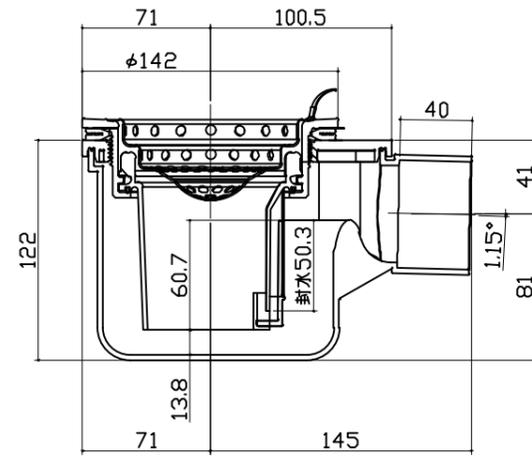


浴槽側排水トラップ

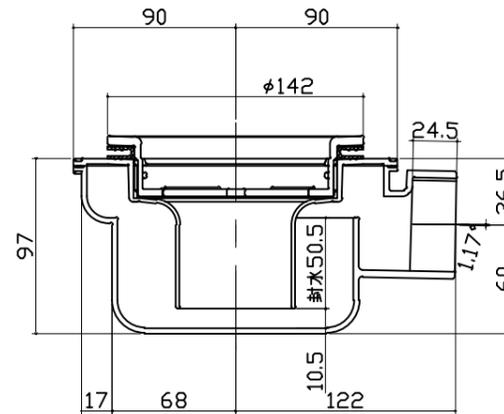

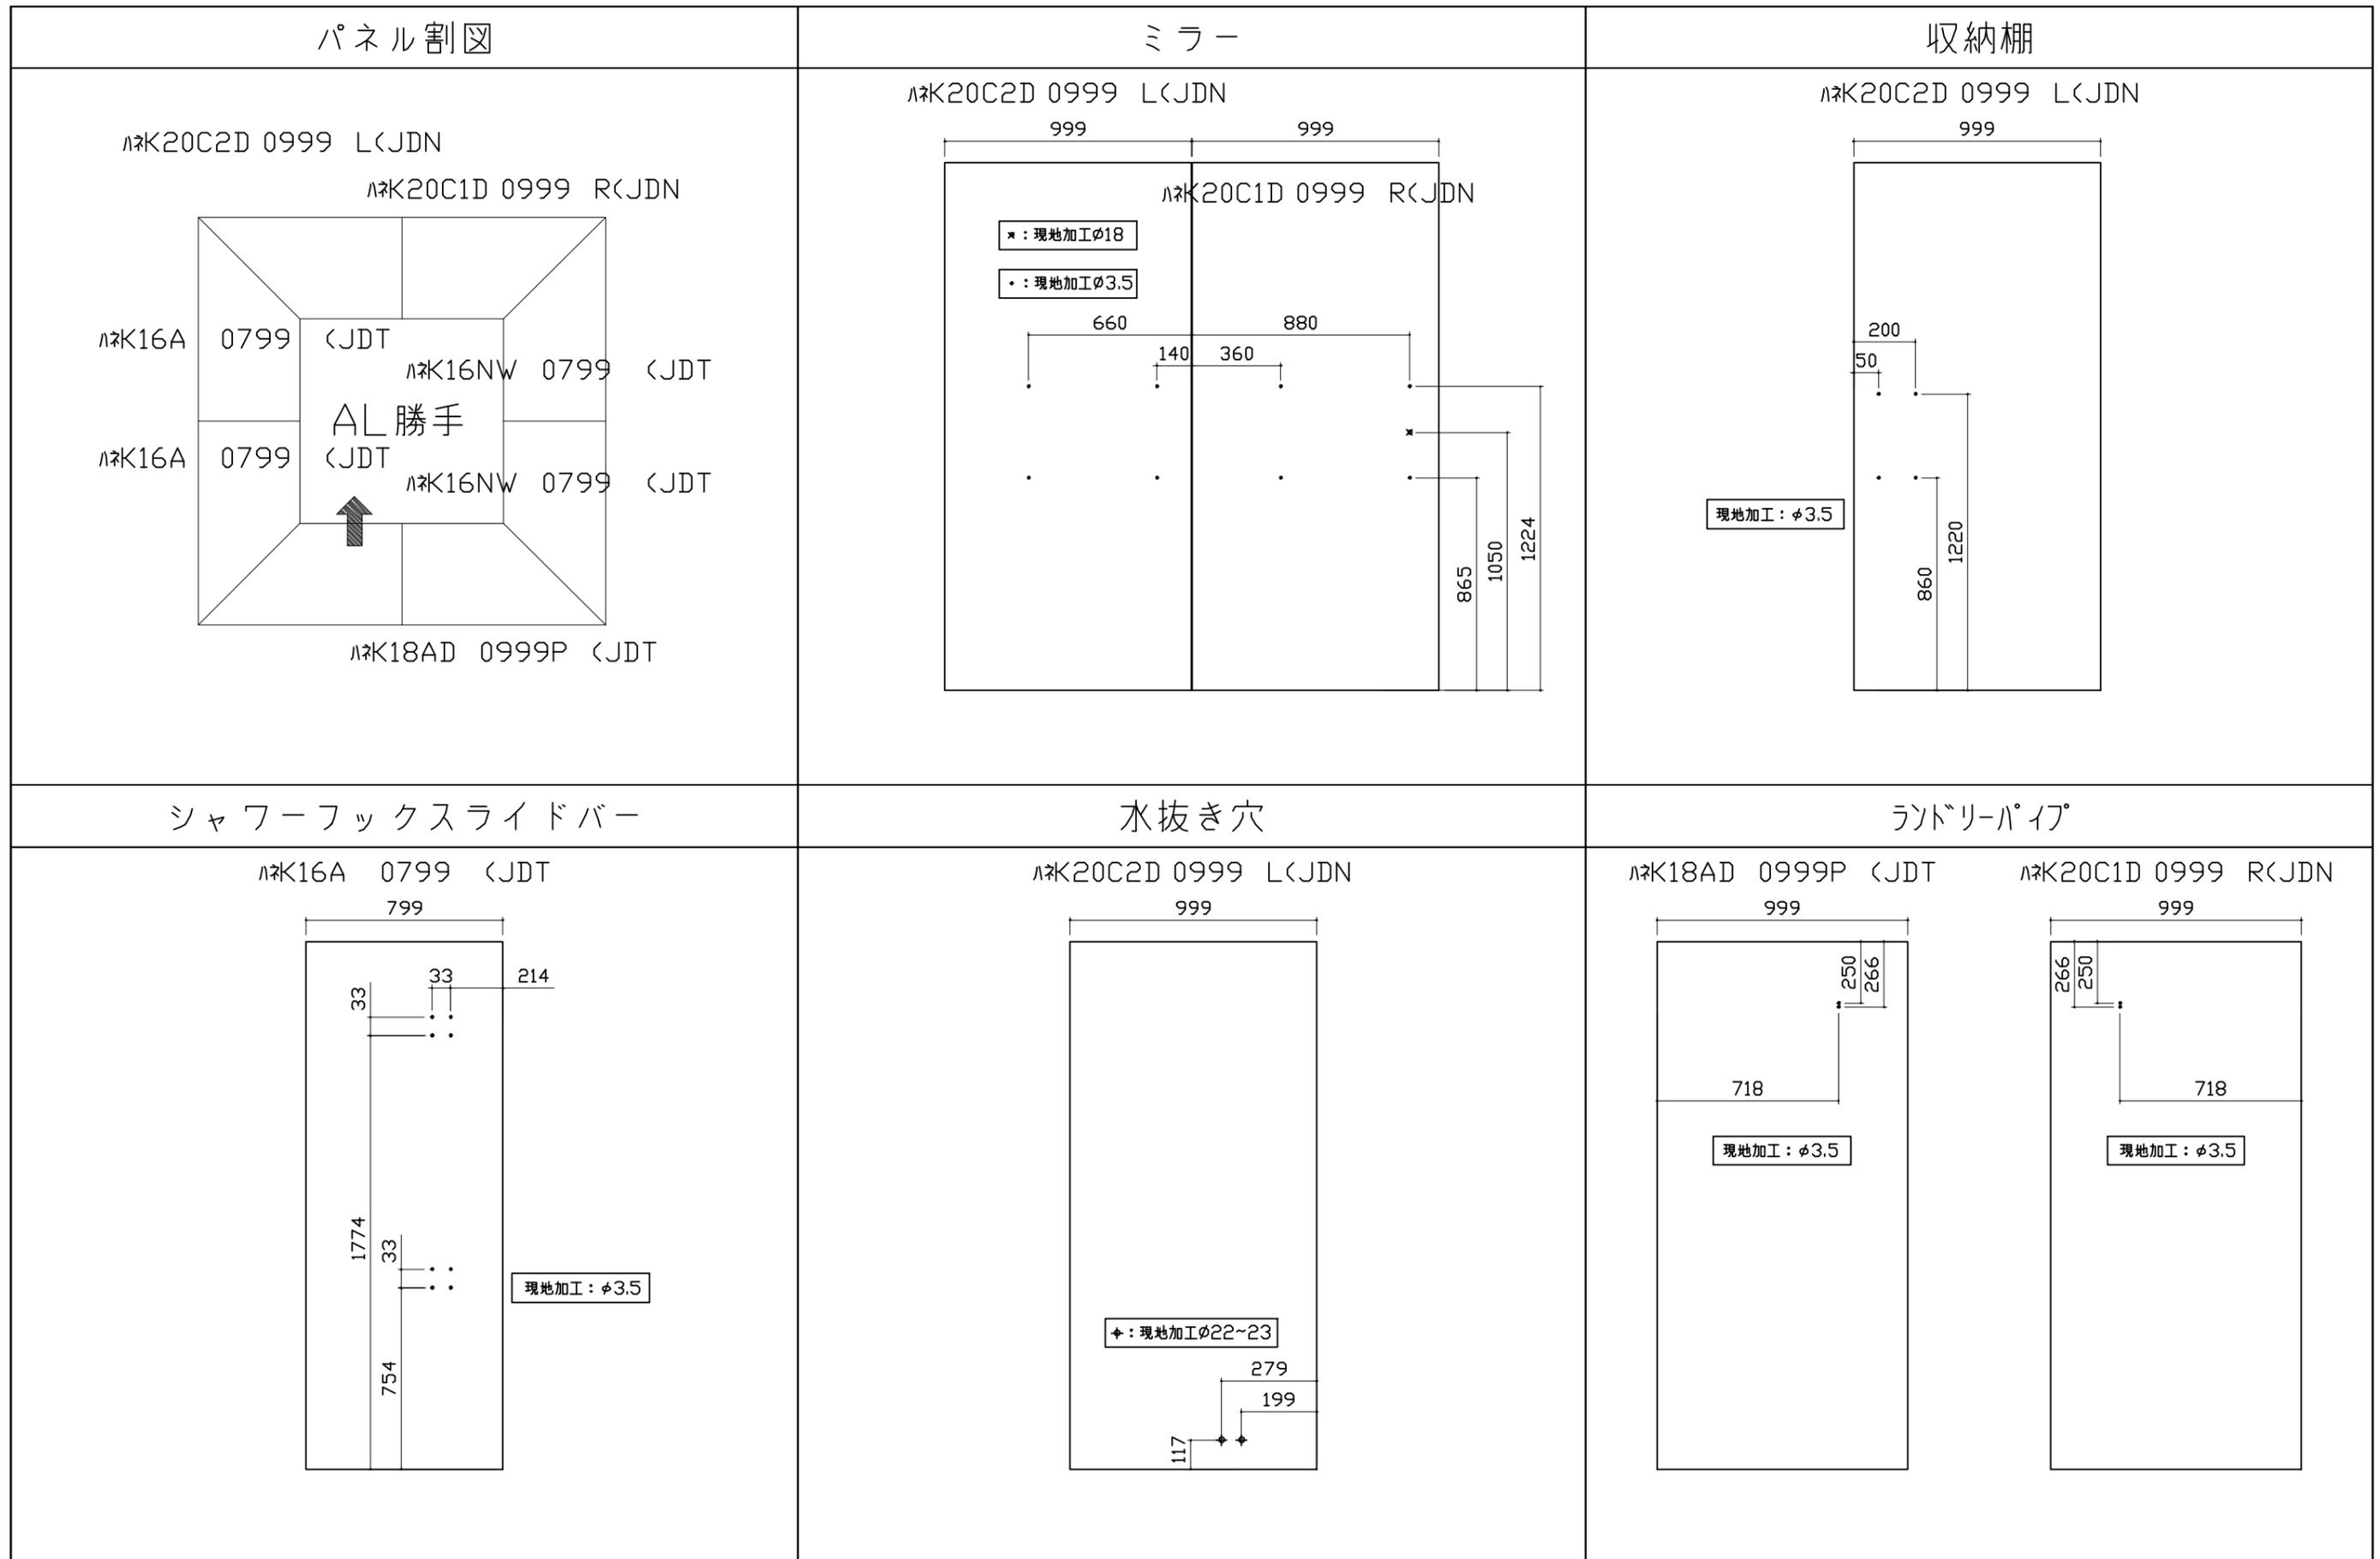

タオル掛け


ハネK16A 0799 <JDT

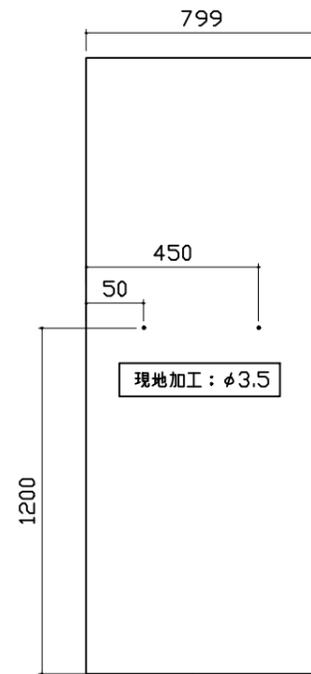

■留意事項  
ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。

風呂蓋収納

ハネK18AD 0999P <JDT

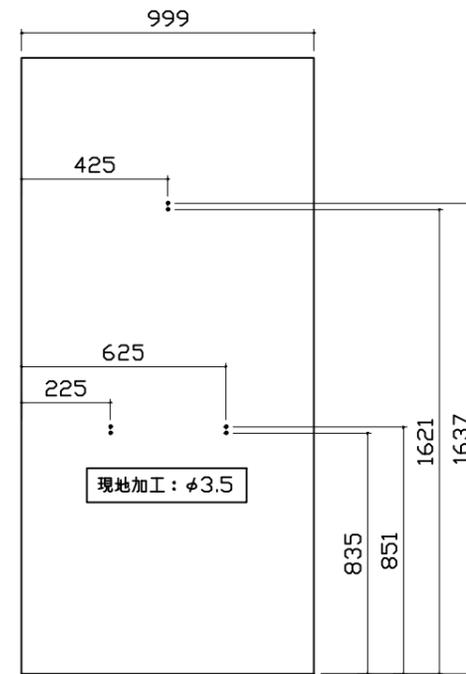

■留意事項  
タオルカケ・ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。
