

システムバス 御見積書

御名前 東京-墨田SR SB24 様

業者 様

商品名 PREDECIA プレデンシア

商品
御見積金額 **¥1,161,900 (税込 ¥1,278,090)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 別途

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

御見積仕様

(システムバス)

ユニットサイズ 1616 (AR勝手)

洗い場仕様 キープクリーンフロア:プレミアムクラス

洗い場カラー グランホワイト

浴槽材質 鋳物ホーロー

浴槽カラー シルキーベージュ

浴槽形状 くつろぎラウンジ浴槽(ハンチ付)

浴槽・風呂フタ 高断熱仕様

カウンター材質 -

カウンターカラー -

エプロン材質/カラー ステンレス / ホワイト

浴室パネル材質 高品位ホーロー

パネルカラー(正面) ノルディックグリーン

パネルカラー(周辺) アジロホワイト

ガス種 / 周波数 13A / 50Hz

御確認事項

作成日 2021年4月2日
プラン番号 1434F-2104-0013T
現場番号 A6858557

タカスタンダード株式会社
墨田ショールーム
東京都墨田区東向島3-39-3

TEL 03-5631-5190 / FAX 03-5631-5193
東京東営業所
TEL 03-3860-0295 / FAX 03-3860-0296

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

備考

No.*

御名前 東京-墨田SR SB24

様

現場番号	A6858557	プラン番号	1434F-2104-0013T	作成日	2021/4/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1616サイズ		1	1,038,000	1,038,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	片引戸<800幅>(グレー)/樹脂ガラス(半透明)(20サイズ)	1	+56,500	+56,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・全面デザインハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・グランホワイト)	1	+20,000	+20,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(シルキーベージュ)	1		
9	浴槽追い焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ホワイト)	1		
11	浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付)	1	+50,000	+50,000
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	浴槽ハンドグリップ	2本仕様	1	+7,000	+7,000
14	ガス温水式床暖房	なし	1		
15	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)KF3000HC	1		
16	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:KF3000HCN	1		
17	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
18	カウンター	カウンターなし(洗い場1水栓)	1	-125,800	-125,800
19	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	1	+5,200	+5,200
20	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザインハイクラス)(Kパネル)	1	+55,000	+55,000
21	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
22	天井	高光沢フラット天井	1		
23	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V規格)	1	+41,000	+41,000
24	換気機器	ランドリーパイプメタルタイプ(1本)	1	+1,500	+1,500
25	換気機器開口	工場開口	1		
26	照明	ダウンライト照明(3灯)(電球色)	1	-8,000	-8,000
27	天井照明開口	工場開口	1		
28	ミラー	ロングクリアミラー	1		
29	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
30	タオル掛け	クリアタイプ クリア	1		
31	収納棚	クリアタイプ クリア(3段)	1		

御名前 東京-墨田SR SB24 様

現場番号	A6858557	プラン番号	1434F-2104-0013T	作成日	2021/4/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	風呂フタフック	風呂フタフック(固定式)(ホワイト)	1	+4,000	+4,000
33	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500
34	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
35	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			35		¥1,161,900

商品総合計	35	¥1,161,900
-------	----	------------

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費


システムバス商品組付費

別途


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

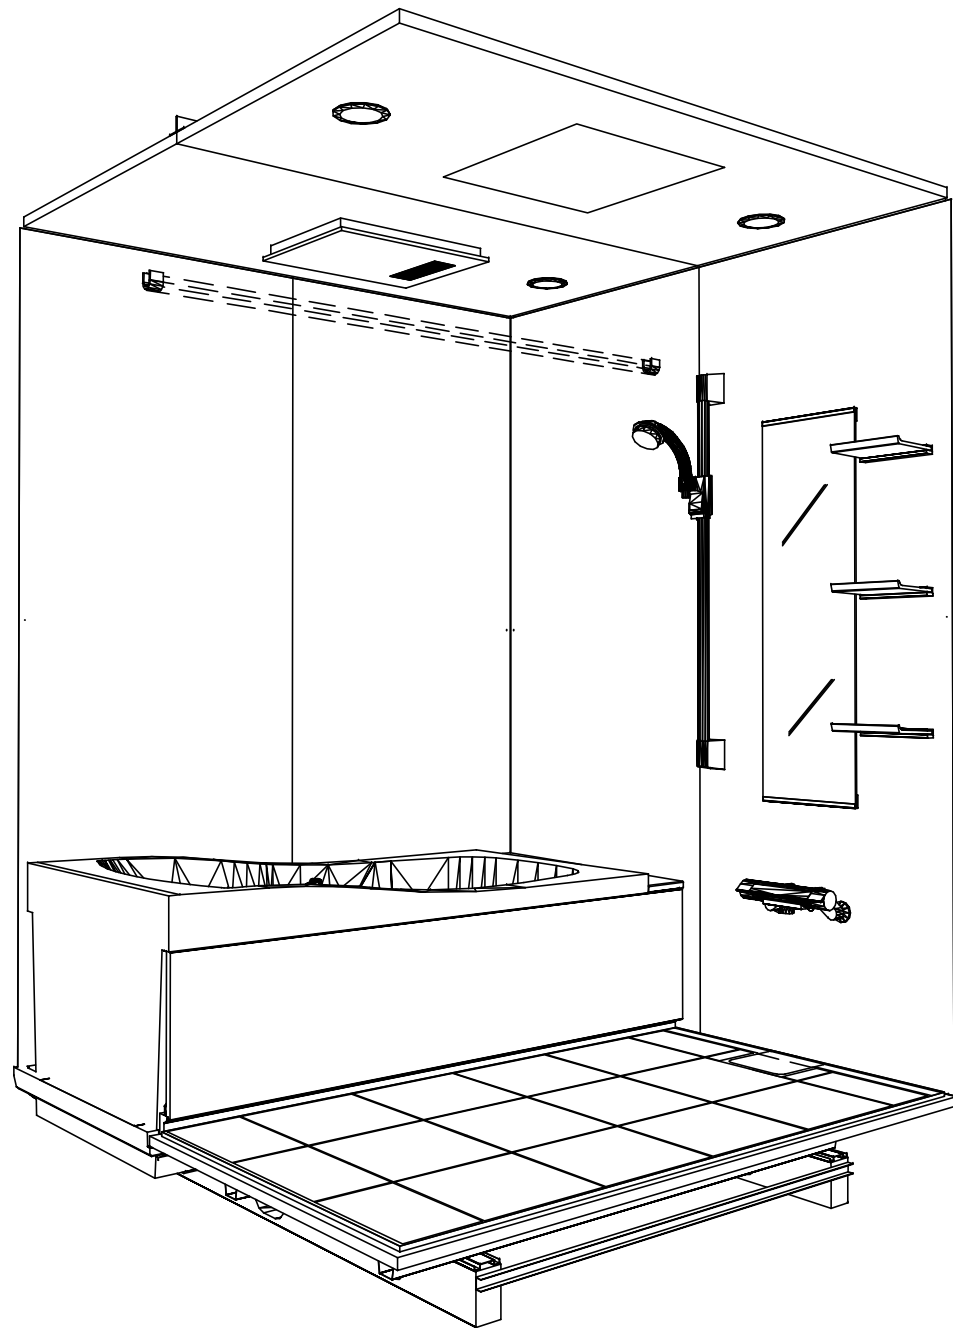

鳥瞰図

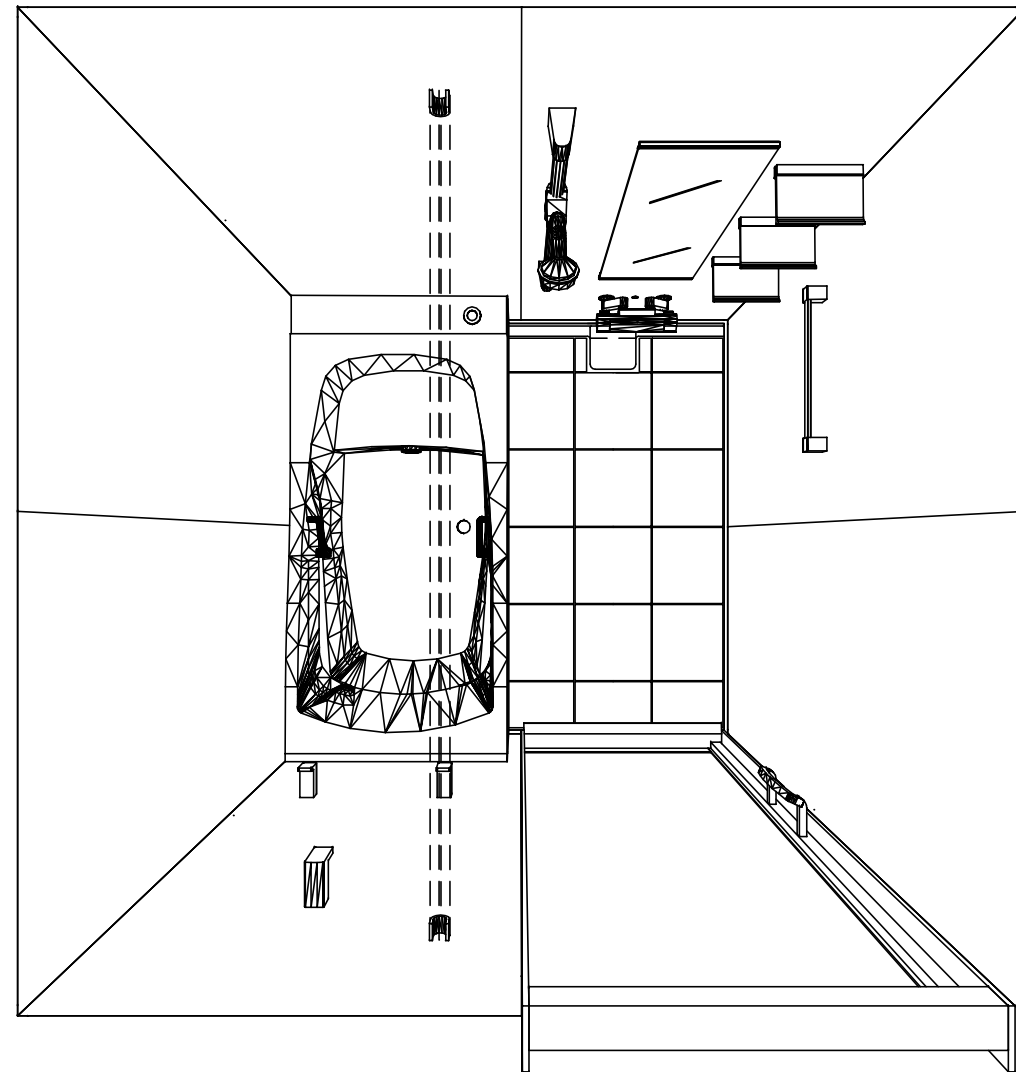

1616

鋳物ホーロー浴槽

高光沢フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。



Takara standard
タカラストANDARD株式会社

現場名称： 東京-墨田SR SB24様邸
現場番号： A6858557
墨田ショールーム




PREDENCIA プレデンスシア
プラン番号： 1434F-2104-0013T
担当営業：

姿図
作成日： 2021年4月2日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

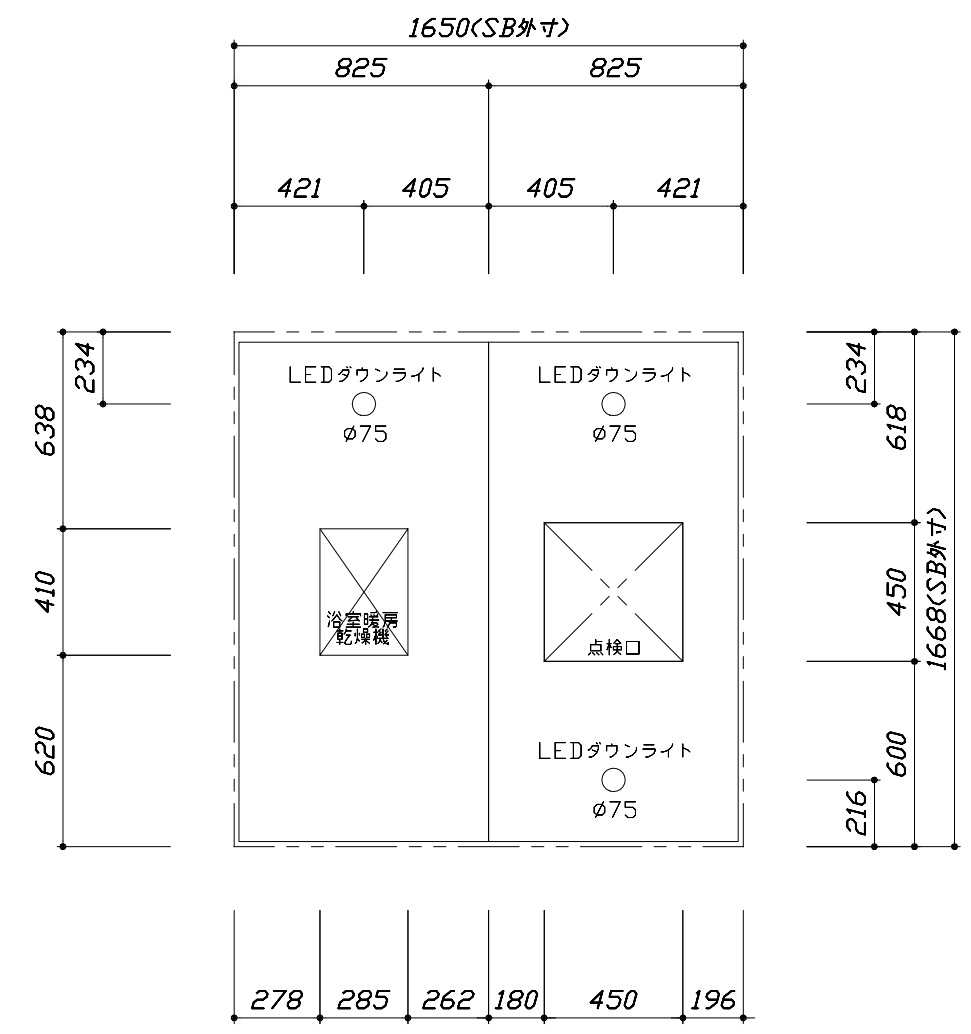

< 天井伏図 >

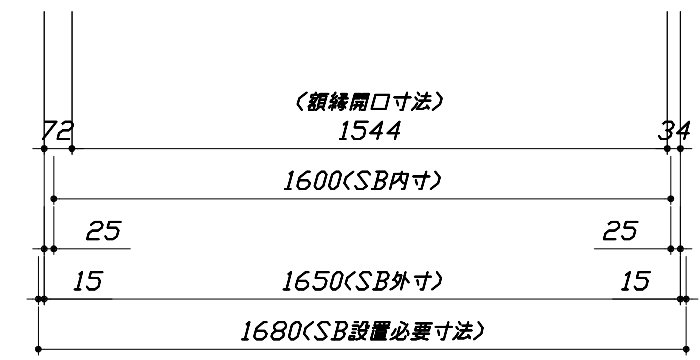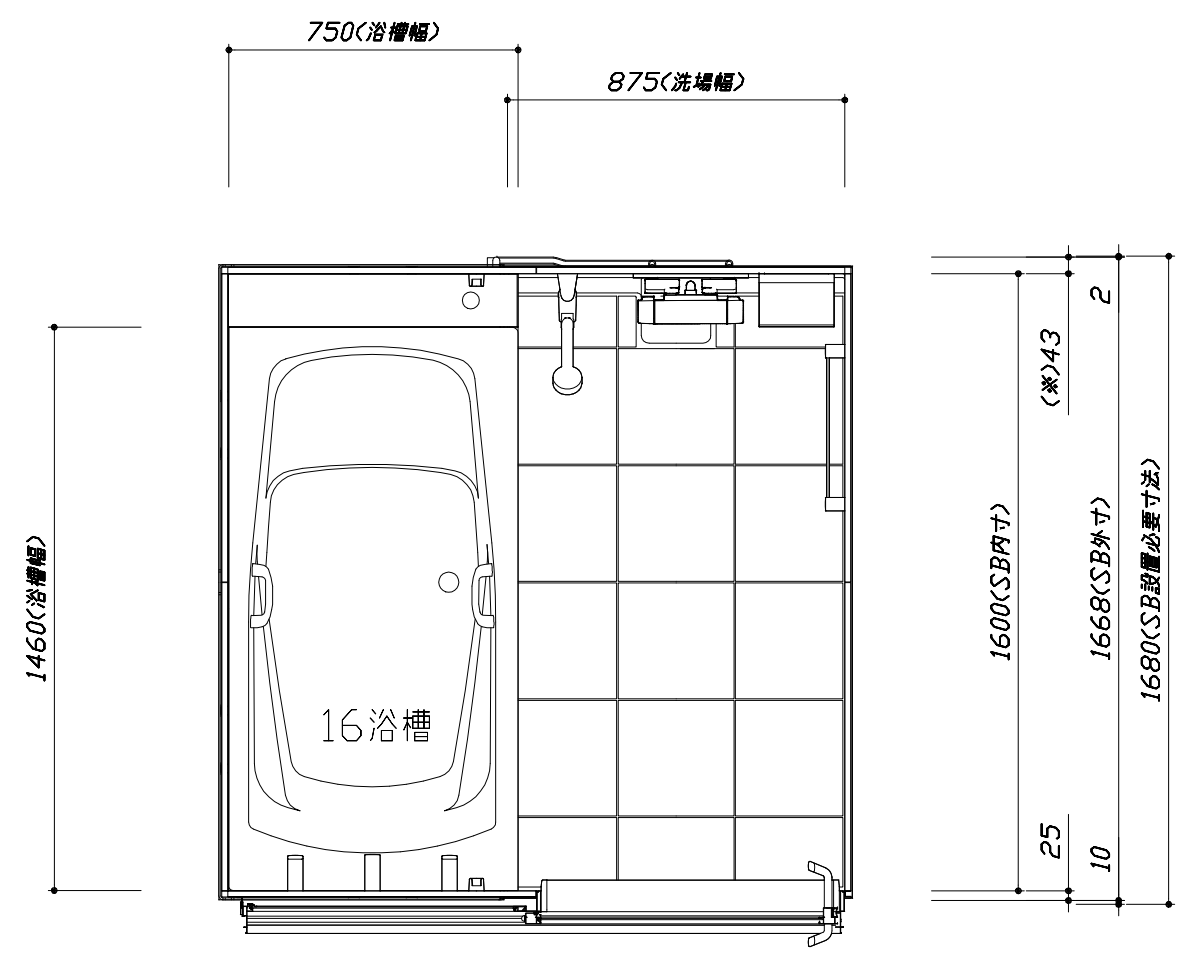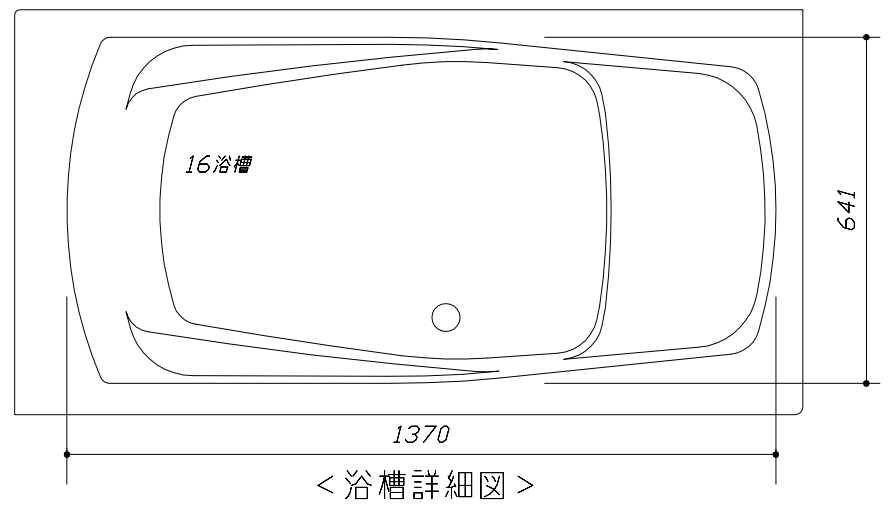

< 平面図 >

Takara standard
 タカラスタンダード株式会社





現場名称： 東京-墨田SR SB24様邸
 現場番号： A6858557
 墨田ショールーム

PREDECENCIA プレデンスシア
 プラン番号： 1434F-2104-0013T
 担当営業：

施工図1 縮尺： 1:25,20
 作成日： 2021年4月2日
 担当アドバイザー：




このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

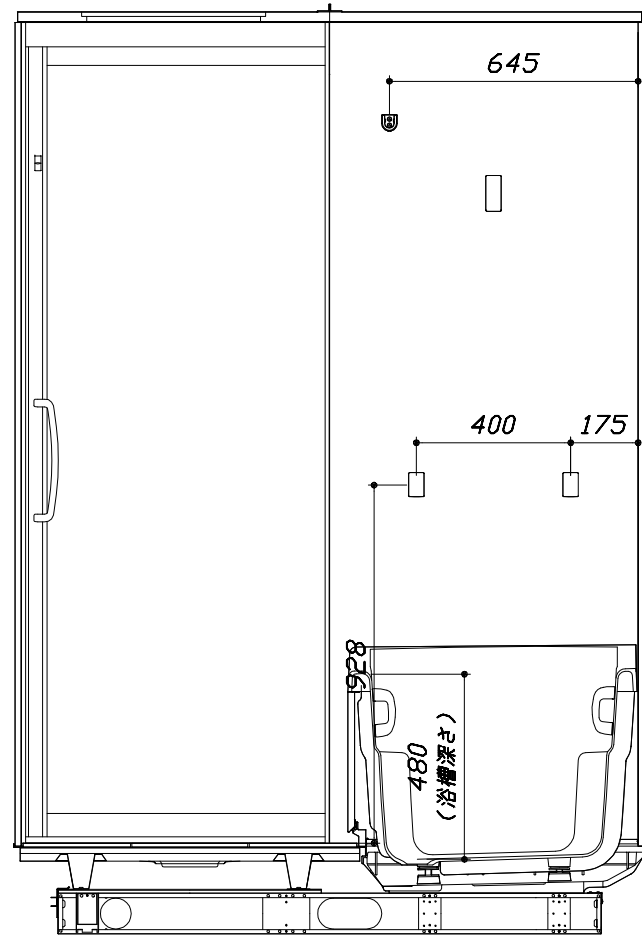

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

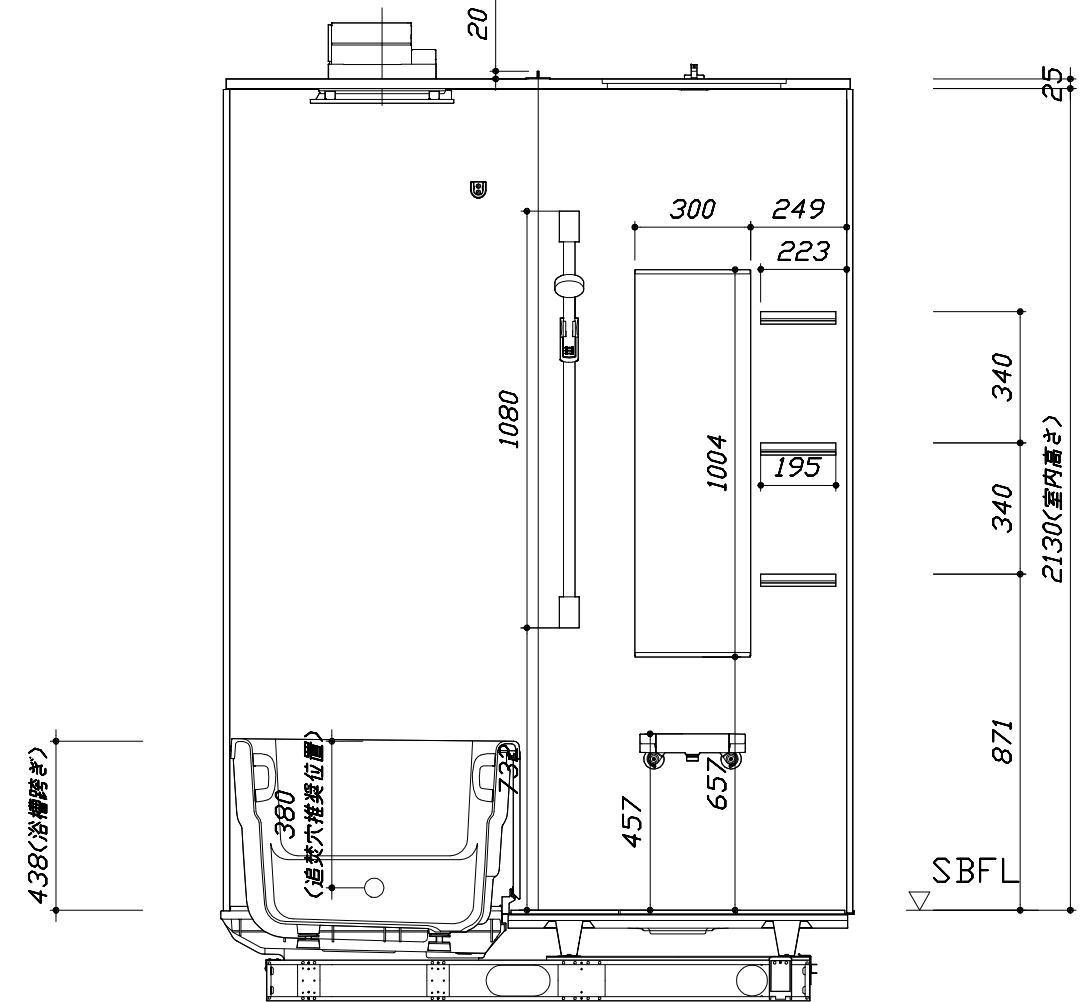

<カウンター面図>

Takara standard
タカスタンダード株式会社



現場名称： 東京-墨田SR SB24様邸
現場番号： A6858557
墨田ショールーム

PREDECENCIA プレデンスシア
プラン番号： 1434F-2104-0013T
担当営業：

施工図2 縮尺： 1:20
作成日： 2021年4月2日
担当アドバイザー：


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

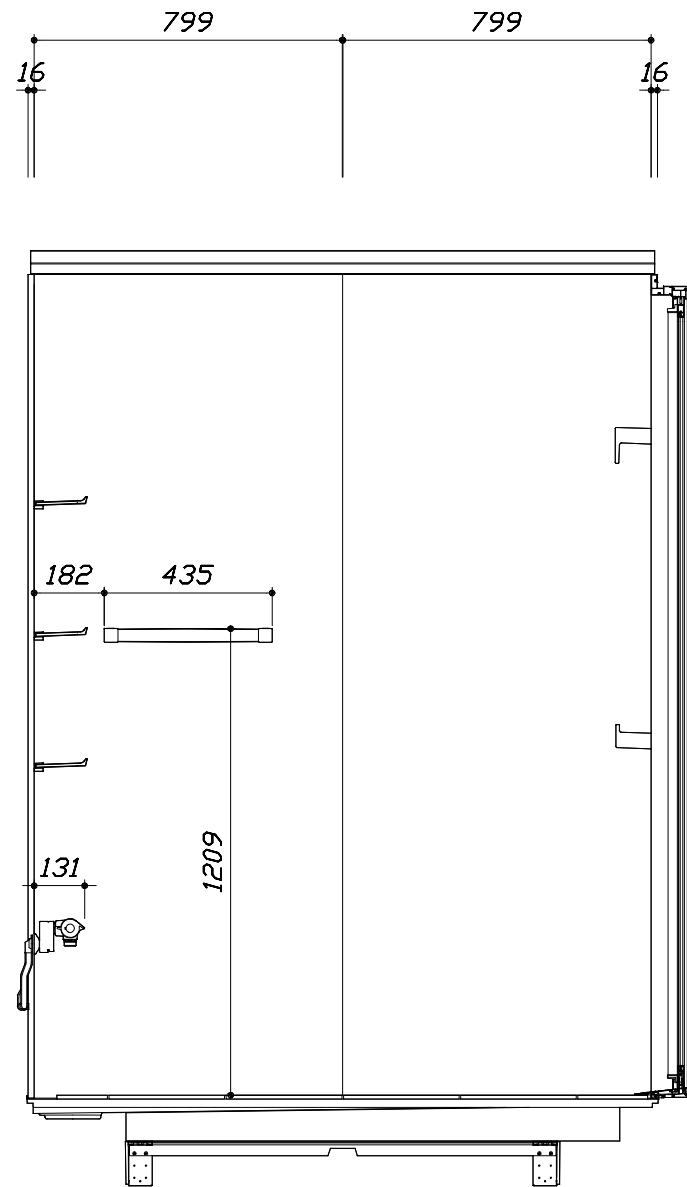

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)

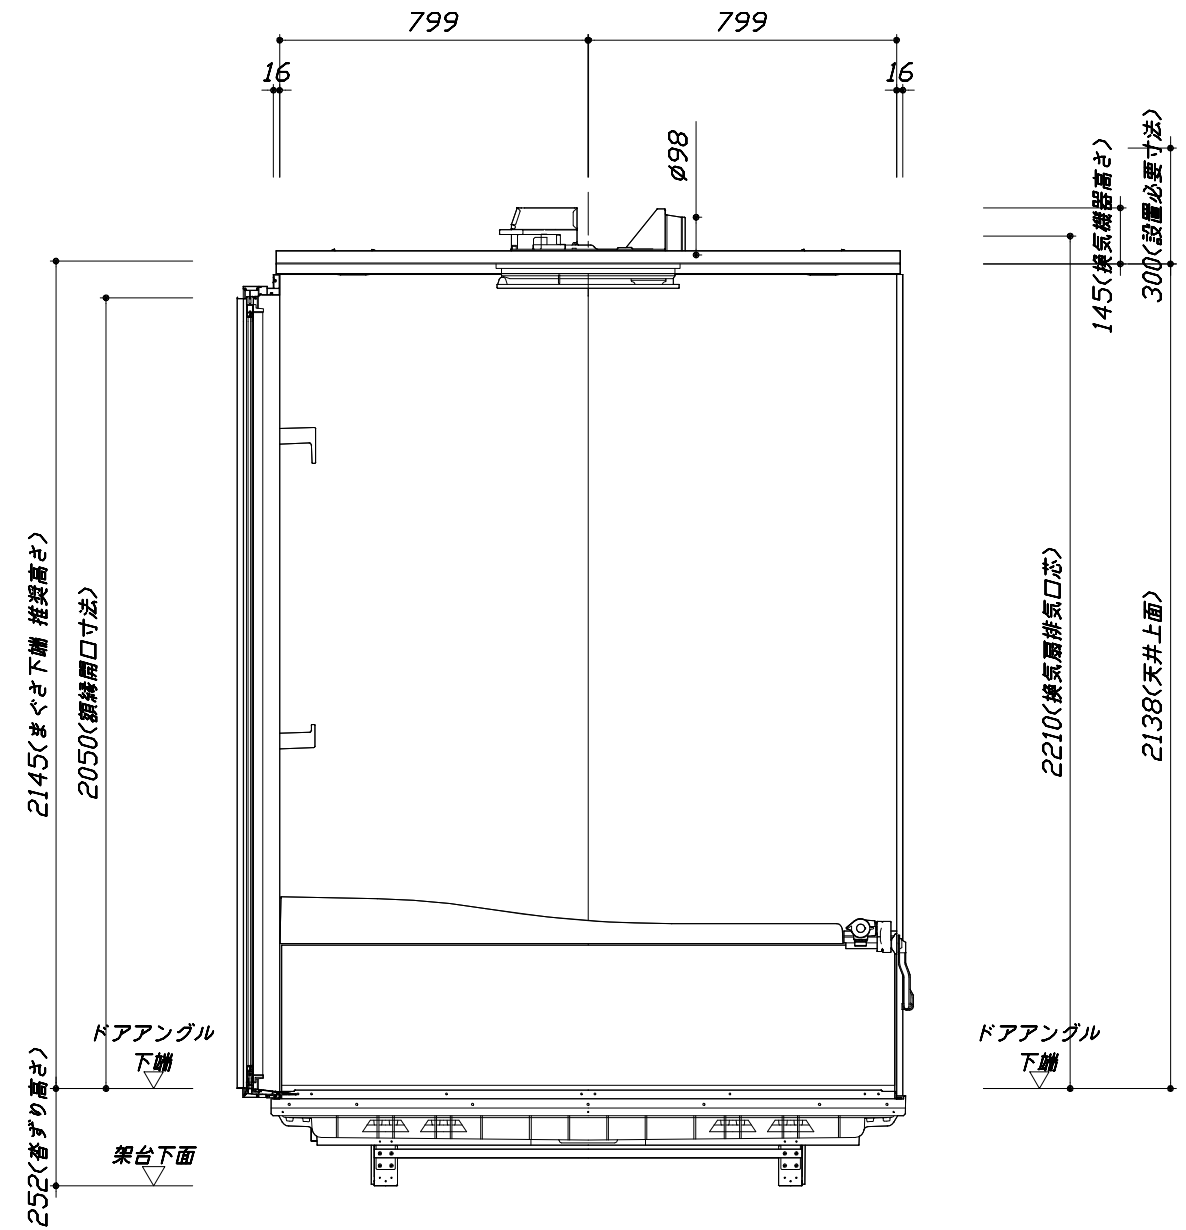

< 浴槽側面図 >

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	AR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	鋳物ホーロー 裏面保温材・高断熱仕様(発泡ウレタン)
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付) グリップ付(270リットル) 追い焚き穴：あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂(FRP)
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材(発泡ポリエチレン)
カウンター	—
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	高光沢パッドイッチャー(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：20高さ片引戸(アルミ框/樹脂ガラス/ﾀﾞｲﾈｰﾑ型換気口)
窓1	—
窓2	—
窓枠1	—
窓枠2	—
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂、浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	410kg

アクセサリ仕様表


ミラー	ロングクリアミラー くもり止め加工
収納棚	クリアタイプ：アクリル樹脂製(3段)
タオル掛け	クリアタイプ：アクリル樹脂製
洗場側水栓	サーモスタット(KF3000HCN)(樹脂ホース：メタル調)
浴槽側水栓	—
兼用水栓	—
スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ) (ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ-T1020S MH)
照明	LEDダウンライト(LED 12.3W電球色)(3灯)
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V・最大消費電力1250W)(ﾀﾞｲｱﾐｰﾀﾞ径φ98)(常時換気対応品)
フロタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	—
ハンドバー②	—
ハンドバー③	—
ハンドバー④	—
ハンドバー⑤	—
ハンドバー⑥	—
ハンドバー⑦	—

本体カラー

浴槽	DA：シルキーベージュ
カウンター	—
パネル(カウンター面)	JYH：ノルディックグリーン
パネル(周辺・3面)	JAW：アジロホワイト
水栓上部カウンター	—
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	PW：グランホワイト
ドア	G：グレー
収納棚	クリアタイプ(クリア)
タオル掛け	クリアタイプ(クリア)
ランドリーセット	M：メタル

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

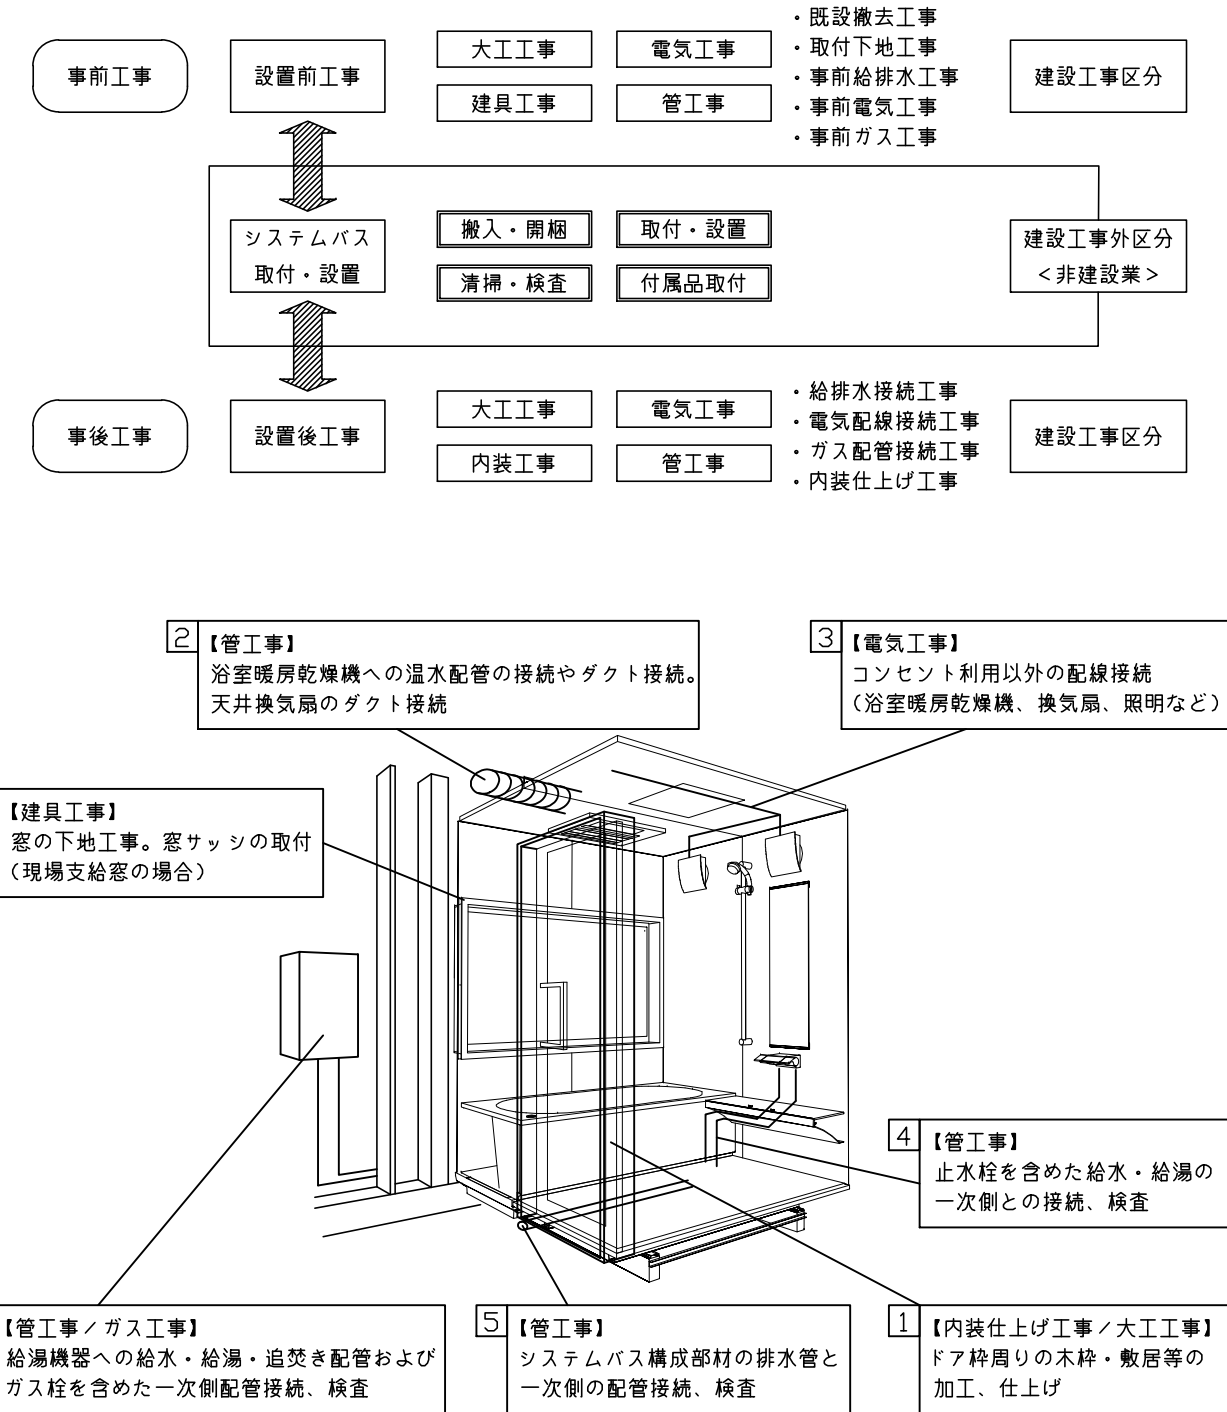

■システムバス 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事					建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置		
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
			給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
			浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
設置後工事		管 大工 電気	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□		浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置							□		洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置							□		浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□		天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置【注記 1】							□		カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付【注記 1】							□		水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付【注記 1】							□		浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付【注記 1】							□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付							□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付								□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付【注記 1】								□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付								□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付【注記 1】								□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付【注記 1】								□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
シリコンの充填								□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填			
試運転・完成検査【注記 2】								□	完成後の試運転、性能確認検査			
設置後工事	1 2 3 4 5 6	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事					○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事					○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・アース接続工事						○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付						○	○	建築の外装仕上げ工事	
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事						○		給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
設置後工事	1 3	電気 他	建築側排水配管との接続工事【注記 3】					○		浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査		
			給湯機器本体工事（試運転・確認）					○	□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
			内装仕上げ工事	○	○						床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
設置後工事			浴室用電源配線、接続工事					○		浴室機器の事後電気工事		
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事						○		浴室全体の電気器具、配線接続工事	

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
 ※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
 ※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。




■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

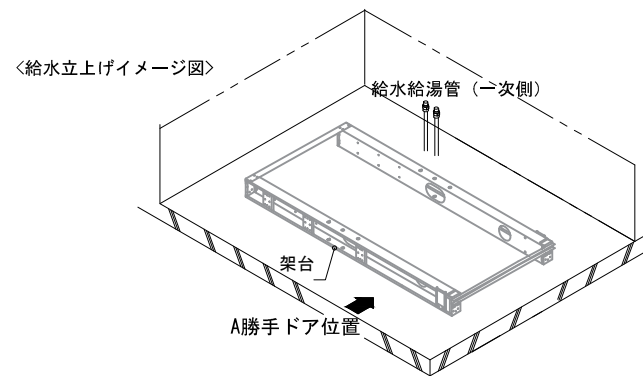



■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

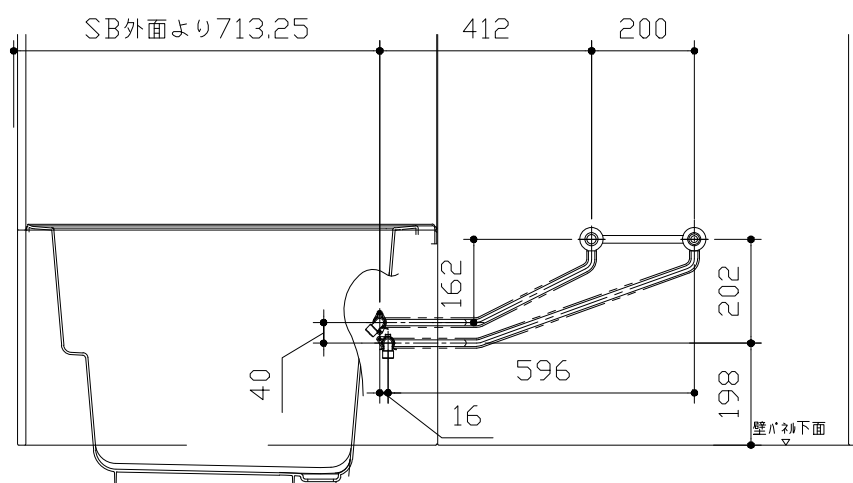

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置

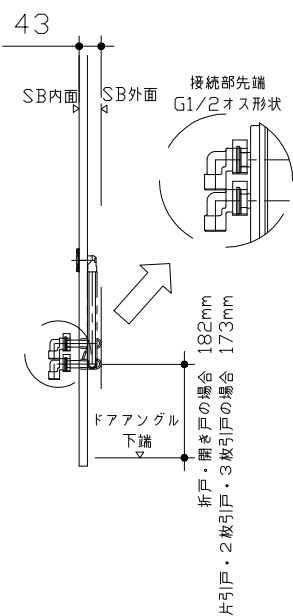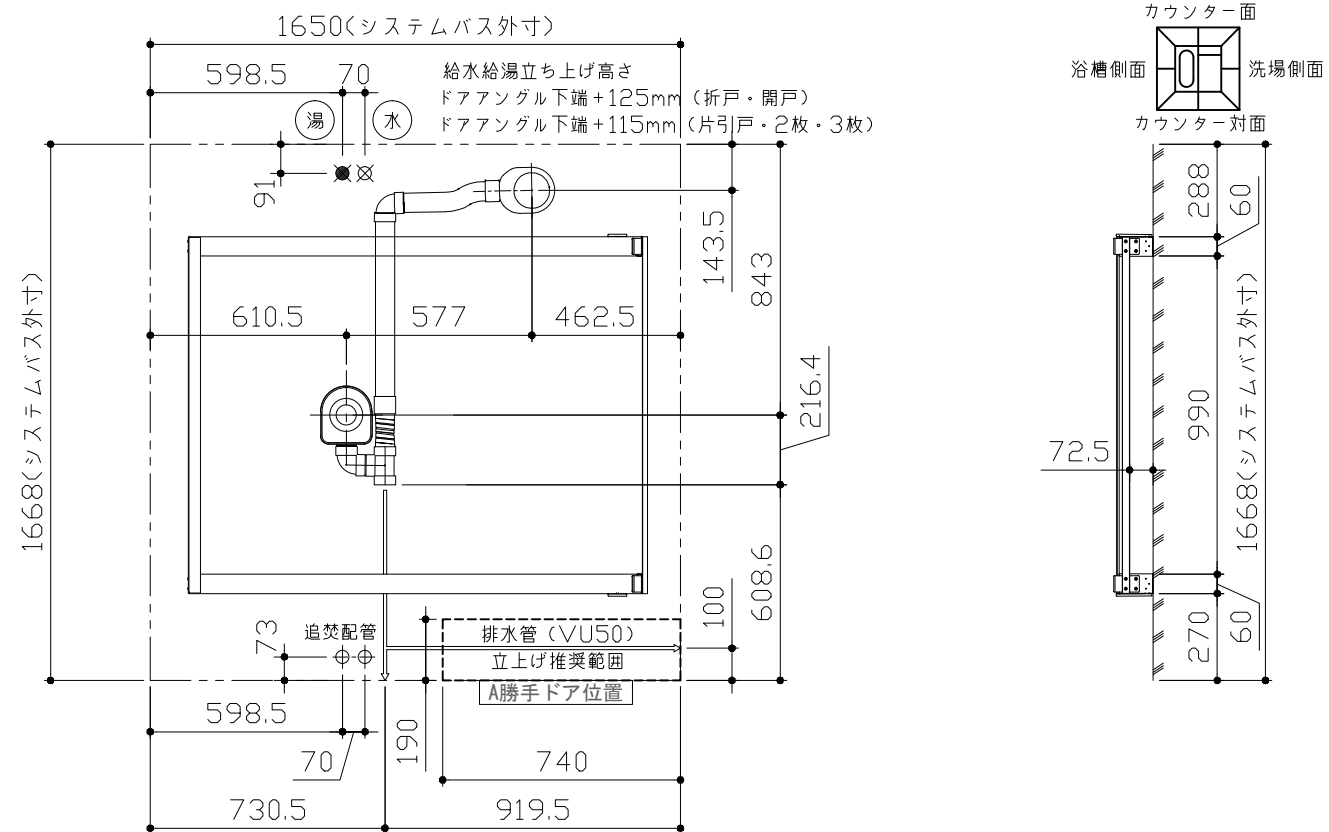

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

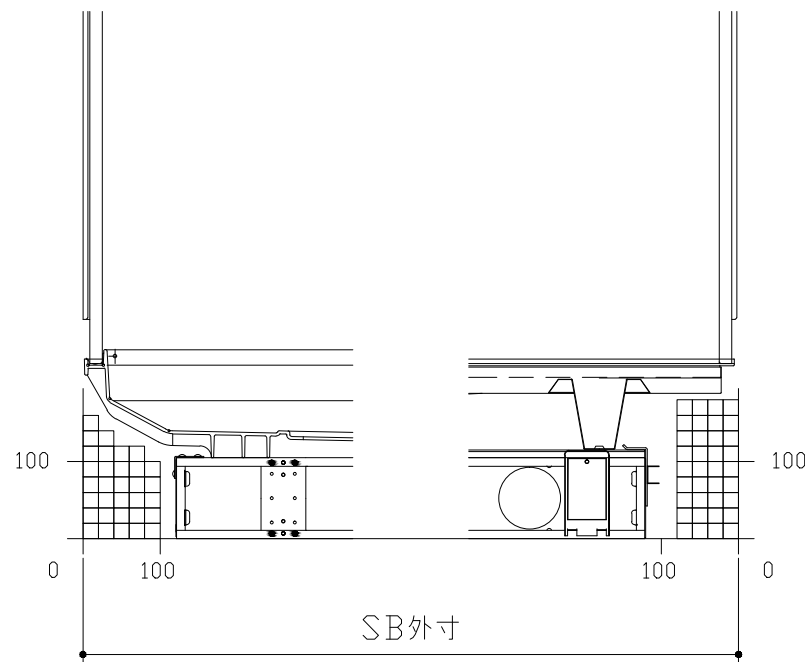


A矢視

B矢視

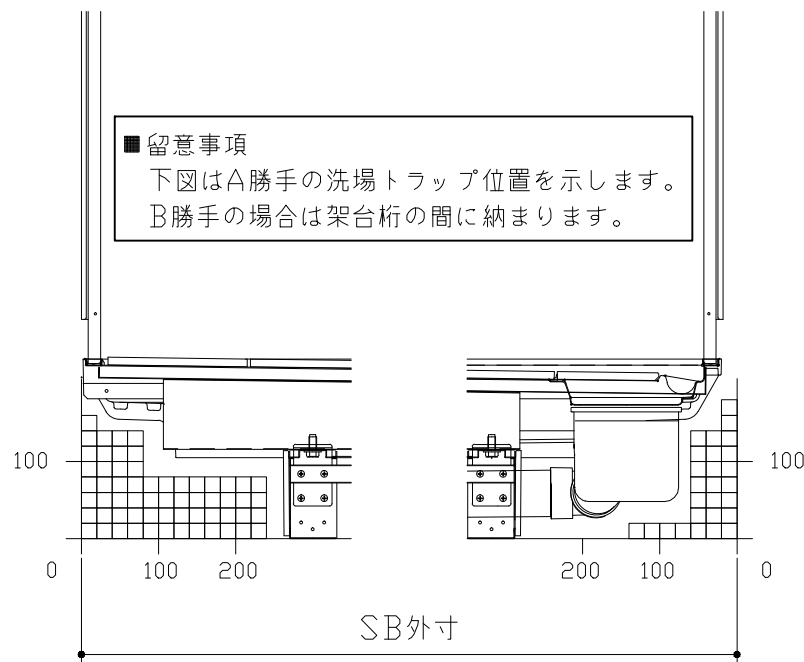

C矢視




D矢視

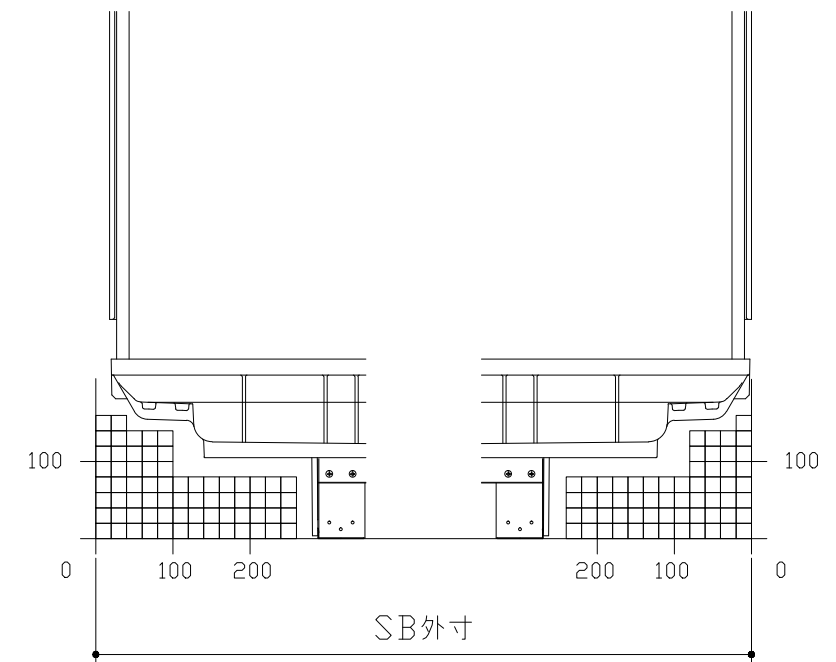

E矢視

F矢視

キープクリーンドア：片引戸・タテ型換気口

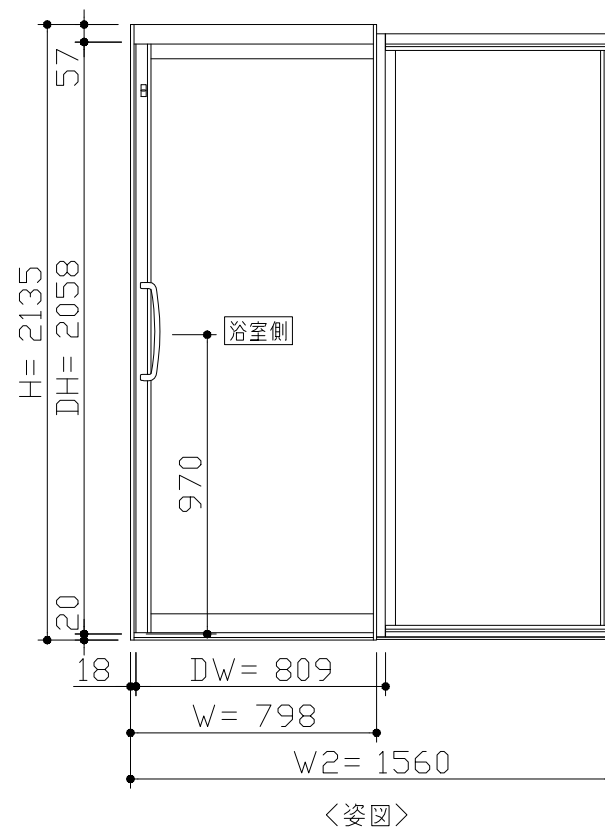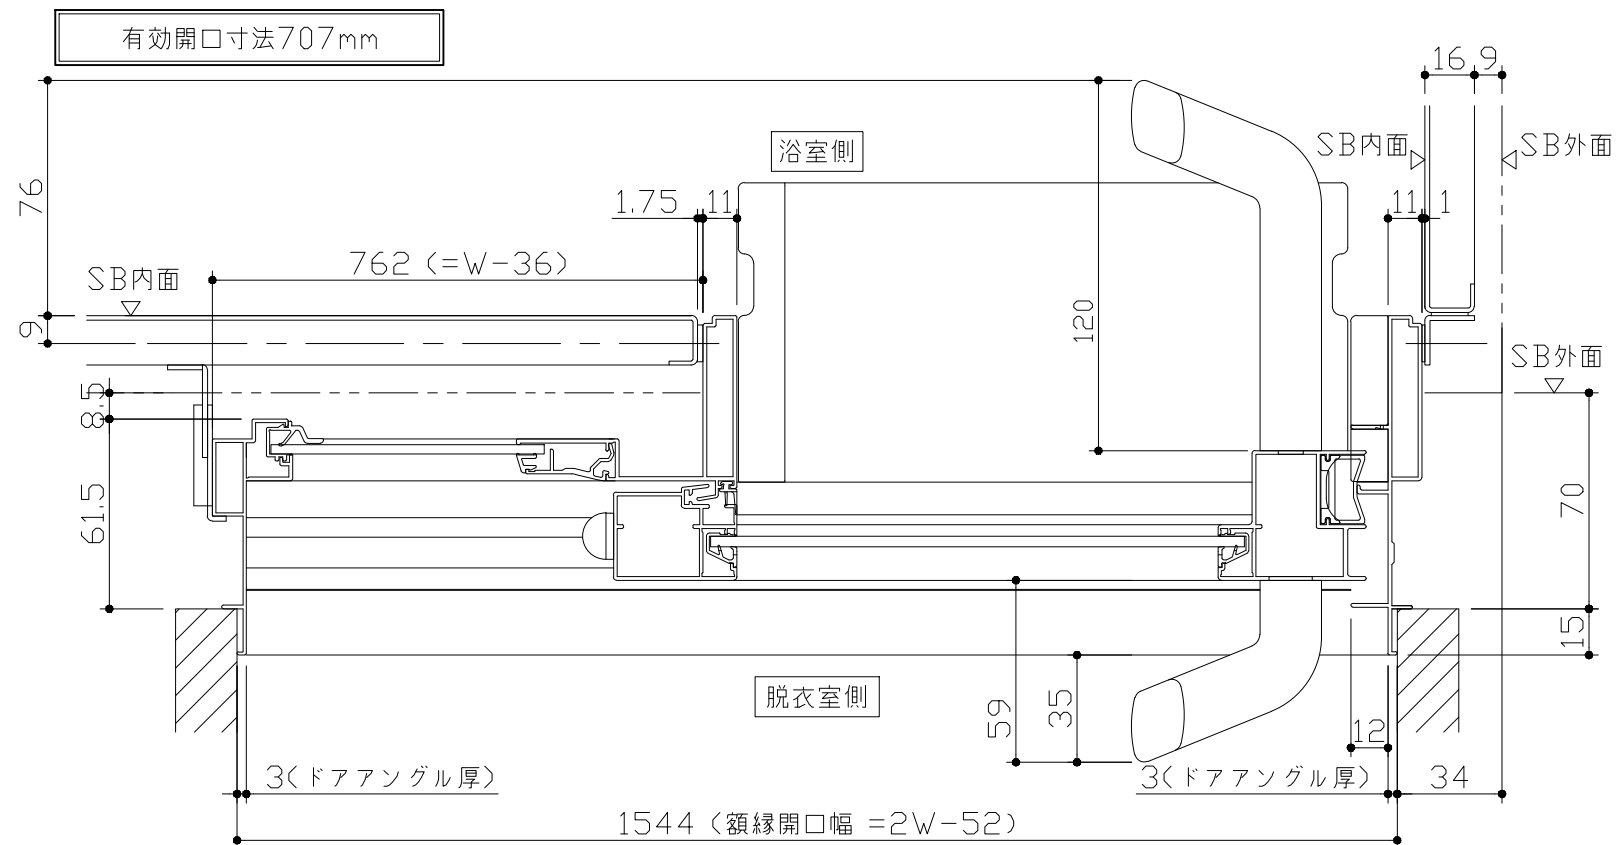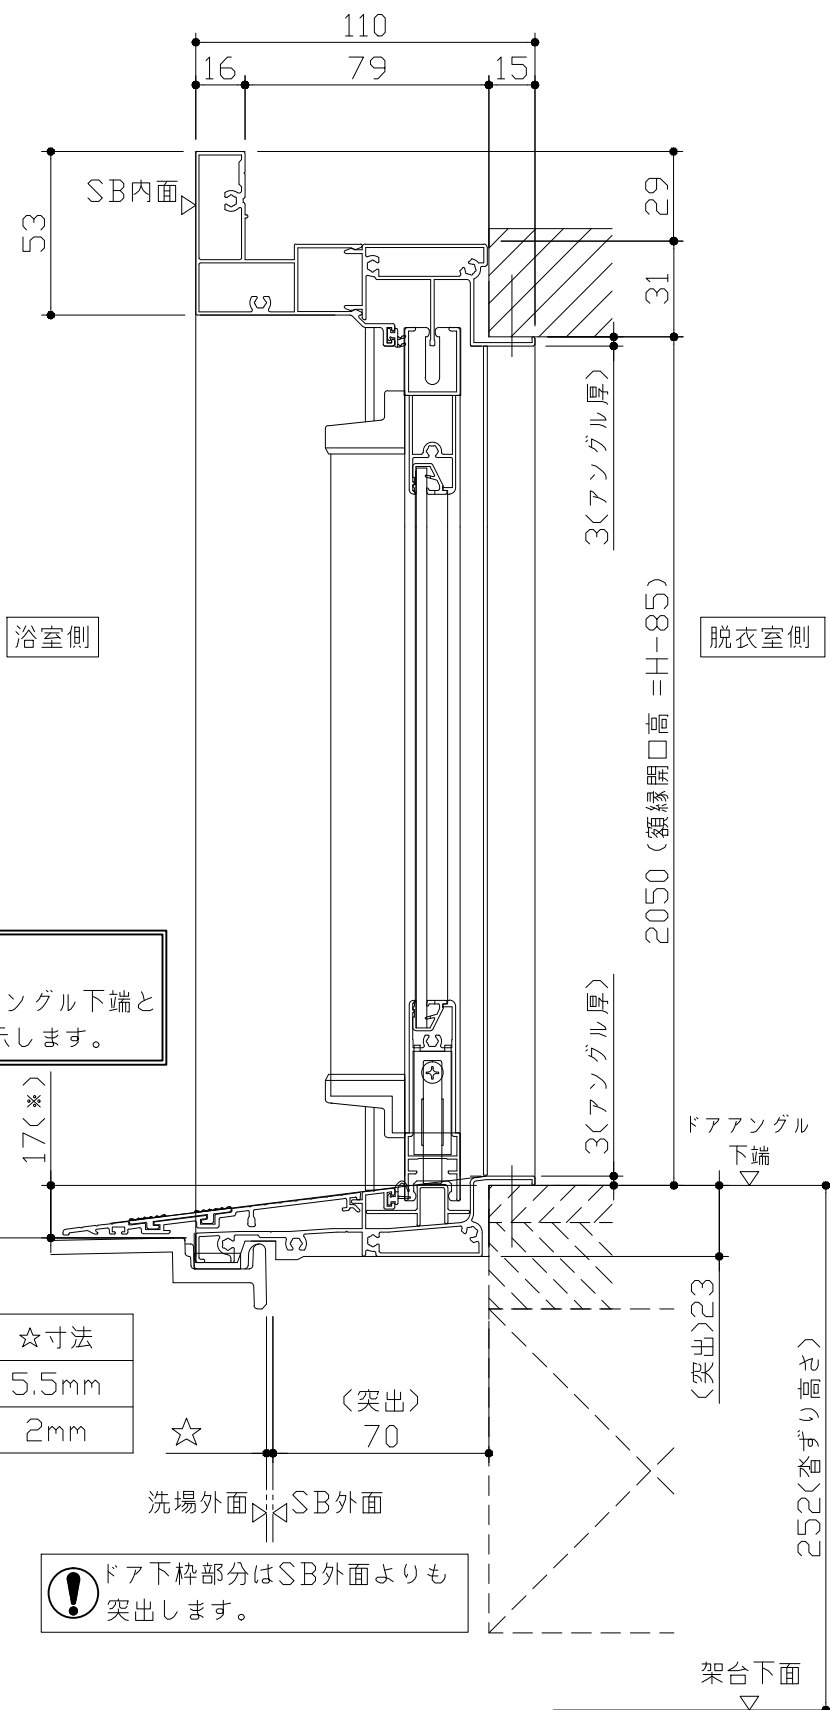



■ 留意事項
 * 印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm


⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

■ ドア横の管柱、間柱について
 ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 ・ 躯体〜ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

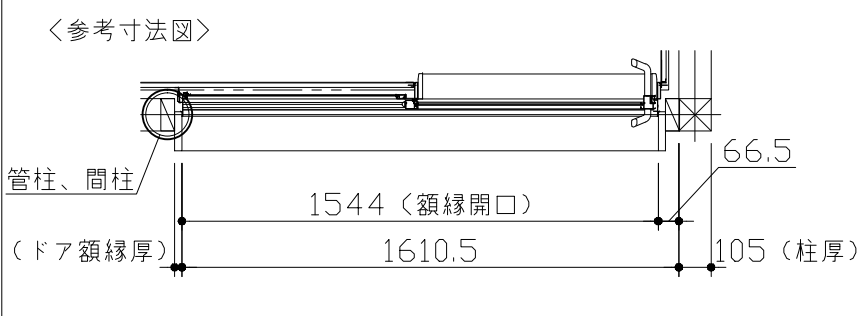

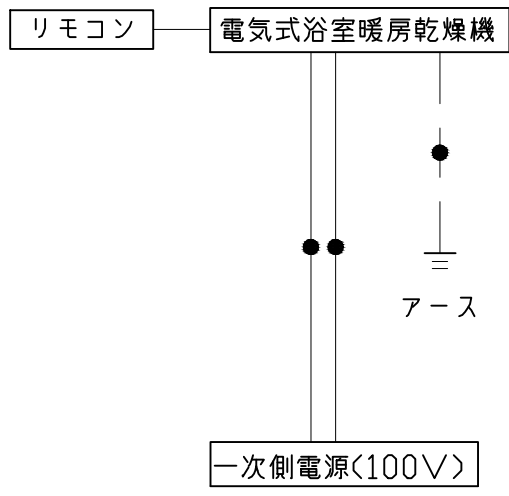

*浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

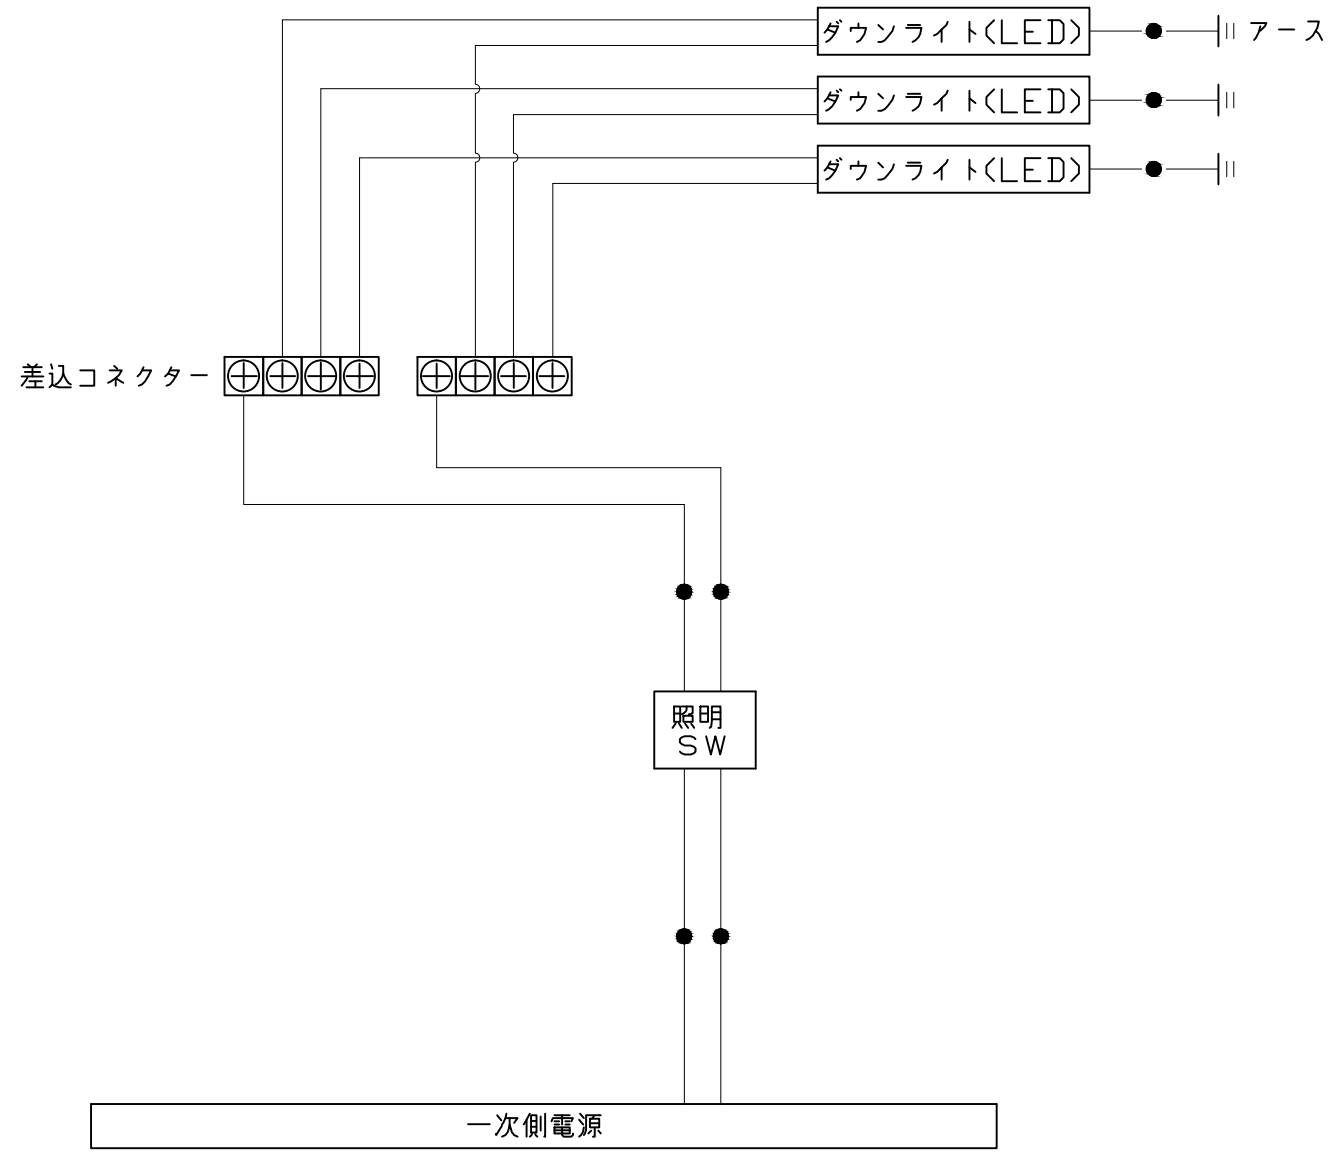


一次側電源から差し込みコネクタ及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。

浴槽	洗い場用水栓	照明
<p>浴槽の寸法図。平面図、側面図、および詳細図が示されています。平面図には長さ1460mm、幅750mm、底面長さ1370mm、底面幅551mm、排水口位置200mm、底面幅661mm、底面長さ828mm、排水口位置180mmが記載されています。側面図には高さ115mm、排水口位置285mm、排水口位置200mm、排水口位置335mm、排水口位置45mm、排水口径φ50、排水口位置438mm、排水口位置65mm、排水口位置480mmが記載されています。排水口位置は排水口位置とラベルされています。</p>	<p>洗い場用水栓の寸法図。平面図にはハンドル幅(43)、長さ273mm、ハンドル幅(43)、長さ187mm、長さ200mm、高さ65mmが記載されています。側面図には長さ200mm、高さ65mmが記載されています。詳細図にはP.J1/2、長さ(46)、高さ25mm、長さ(93)、長さ(131)が記載されています。</p>	<p>ダウンライト LED 4.1W (1灯あたり)</p> <p>照明の詳細図。天井開口φ75、パネル厚み25mm、パネル径φ85が示されています。</p>
換気機器	シャワーフックスライドバー	ミラー
<p>リモコンコード長さ：5m 外形：縦120mm×横116mm</p> <p style="text-align: right;">管工事</p> <p>換気機器の寸法図。平面図には長さ280mm（本体寸法）、幅372mm（グリル）、接続径φ100、天井厚み25mmが記載されています。側面図には長さ400mm（本体寸法）、長さ145mm（本体寸法）、長さ472mm（グリル）、天井厚み25mm、高さ72mm（排気）が記載されています。システムバス天井が示されています。</p>	<p>シャワーフックスライドバーの寸法図。平面図には長さ136mm、幅148mm、長さ52mmが記載されています。側面図には長さ1080mm、長さ72mm、長さ30mm、長さ40mm、長さ72mm、長さ30mm、長さ1020mm（ネジ取付ピッチ）、長さ40mmが記載されています。SB内寸が示されています。詳細図には長さ(115)、長さ40mmが記載されています。</p> <p>材質 パイプ部：ステンレス 台座部：ABS、POM等 フック部：ABS等</p> <p>取付部分詳細 パネル表面 皿タッピンネジ</p>	<p>枠：SUS304 t0.8 ミラー：表面防曇コートあり（ロングクリアミラー-A） 表面防曇コートなし（ロングミラー-A）</p> <p>ミラーの寸法図。側面図には長さ1000mm（鏡本体）、長さ969mm（取付穴ピッチ）、長さ9.5mm、長さ11mm、長さ5mm、長さ25.5mmが記載されています。鏡本体の幅は300mm、取付穴ピッチは41mm、鏡の幅は218mm、取付穴ピッチは41mmが示されています。取付金具が示されています。</p>


収納棚

本体：PMMA

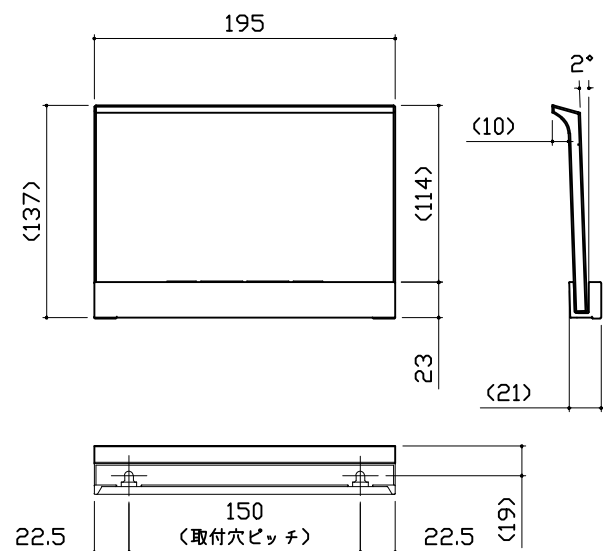


タオル掛け


本体：PMMA
ブラケット：ABS（クロムメッキ仕上げ）

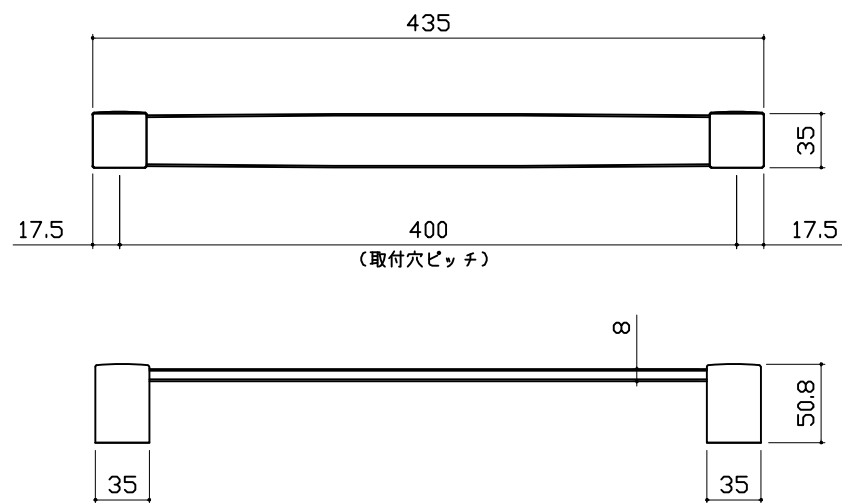


循環金具・フロアダプタ関連

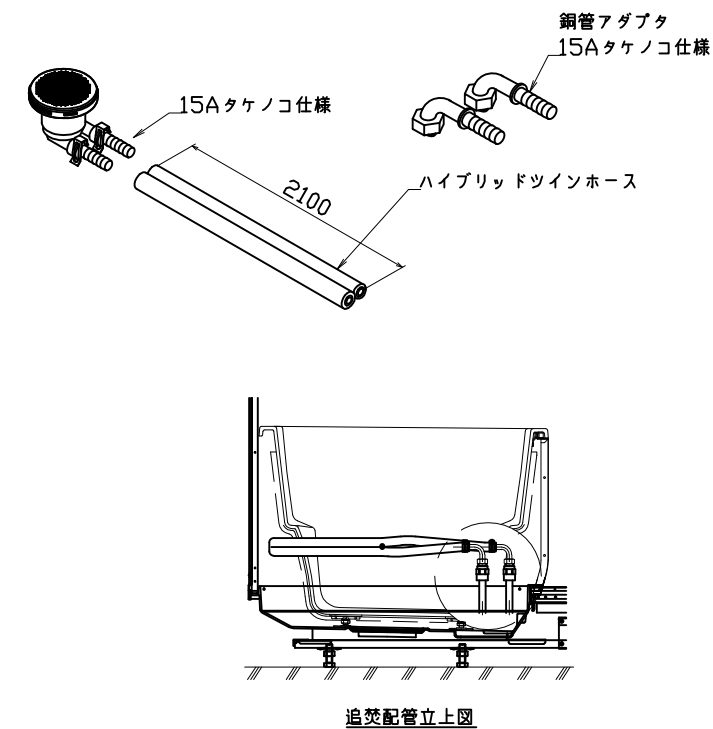


風呂蓋 707MDH-16XST

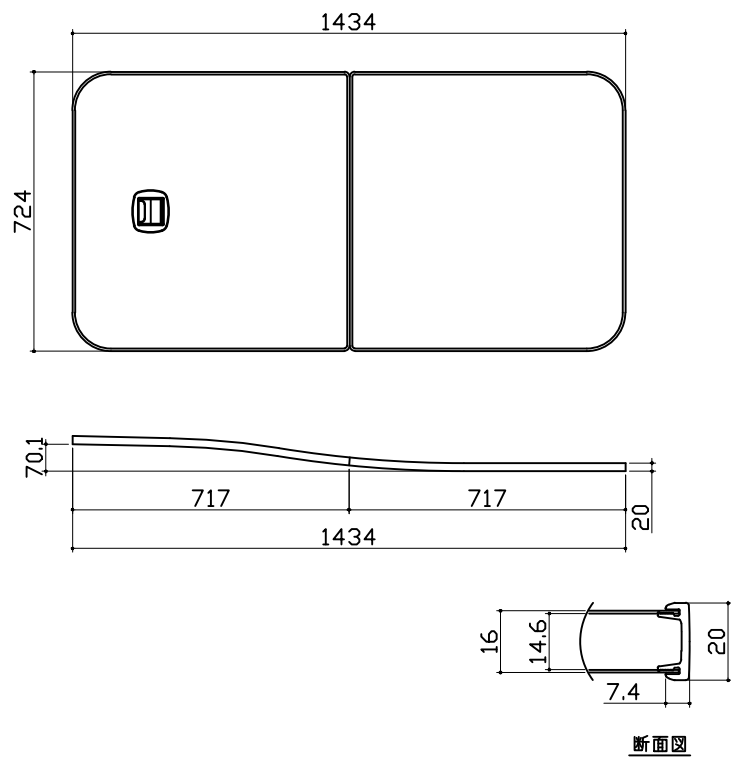

洗い場側排水トラップ

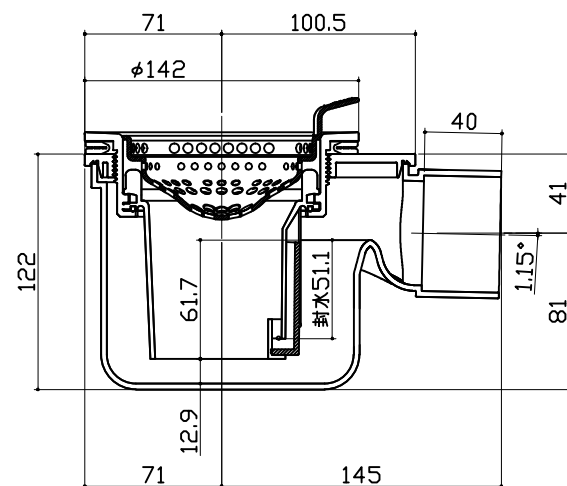


浴槽側排水トラップ

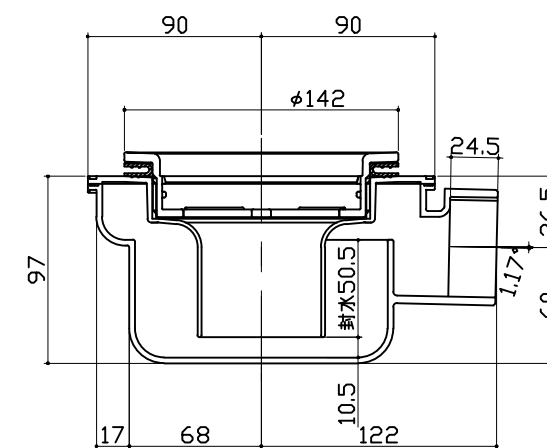

<p style="text-align: center;">パネル割図</p>	<p style="text-align: center;">ミラー</p>	<p style="text-align: center;">収納棚</p>
<p style="text-align: center;">シャワーフックスライドバー</p>	<p style="text-align: center;">ランドリーパイプ</p>	<p style="text-align: center;">タオル掛け</p> <p style="text-align: right; font-size: small;"> ■留意事項 ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。 </p>

風呂蓋収納

ハネK16AD 0799 <JAW

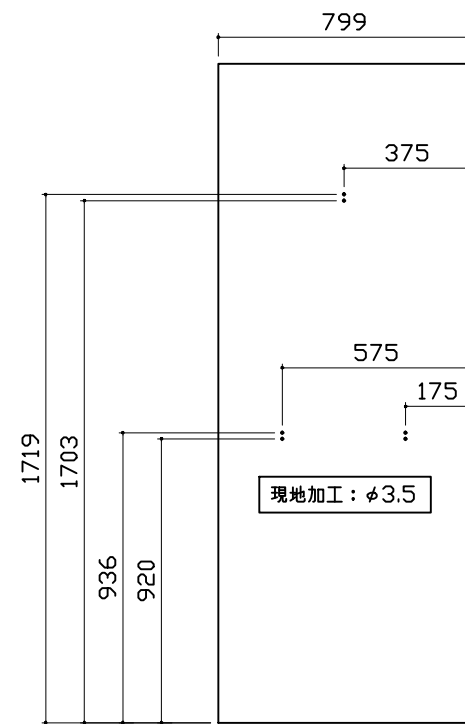

■留意事項
 タオルカケ・ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。
