

# システムバス 御見積書

御名前 群馬-高崎SR SB9 様

業者 様

商品名 RELAGE レラージュ

商品 御見積金額 **¥936,000 (税込 ¥1,029,600)**

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

**(参考) 別途 商品組付費 ¥129,000 (税込 ¥141,900)**

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。  
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

作成日 2021年9月30日  
プラン番号 7401A-2109-1063T  
現場番号 C2817740

タカスタンダード株式会社  
群馬支店 販売課  
群馬県高崎市緑町4丁目1番地6  
TEL 027-395-8001 / FAX 027-370-0007

高崎ショールーム  
TEL 027-395-8000 / FAX 027-363-1000

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		小笠原

## 備考

3枚引戸はディスプレイ用(透明ガラス)

御見積仕様 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

(システムバス)	
ユニットサイズ	1616(BL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームグレー
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	シュガーライトグレー
浴槽形状	スクエア浴槽(ベンチ付)
浴槽・風呂フタ	高断熱仕様
カウンター材質	アクリル人造大理石
カウンターカラー	シュガーライトグレー
エプロン材質/カラー	ステンレス / ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ブリックグレー
パネルカラー(周辺)	ブリックグレー
ガス種 / 周波数	13A / 50Hz

御確認事項

--	--

No.\*

御名前 群馬-高崎SR SB9

様

現場番号	C2817740	プラン番号	7401A-2109-1063T	作成日	2021/9/30
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 システムバス

御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	レラージュ 1616サイズ		1	684,000	684,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	3枚引戸<1400幅>(グレー)/樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1	+76,500	+76,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	洗い場	キーブクリーンフロア(ハイクラス・カームグレー)	1		
6	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
7	浴槽	キーブクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(シュガーライトグレー)	1		
8	浴槽追焚き穴	あり	1		
9	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ホワイト)	1		
10	浴槽形状	スクエア浴槽(ベンチ付)	1		
11	ヘルシージェット	なし	1		
12	浴槽ハンドグリップ	なし	1	-10,000	-10,000
13	ガス温水式床暖房	なし	1		
14	洗い場用水栓	棚付サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)KF9152H 水栓上部カウンター(ホワイト)	1	+26,000	+26,000
15	洗い場用水栓	エコシャワー(節水+手元止水+3Way):KF9152HLE/RE	1	+13,000	+13,000
16	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
17	カウンター	人大スクエアカウンター	1		
18	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー	1		
19	浴室パネル	ハイクラス(全面デザインハイクラス)(Kパネル)	1	+40,000	+40,000
20	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
21	天井	高光沢フラット天井	1		
22	換気機器	浴室暖房乾燥機(200V)	1	+83,000	+83,000
23	換気機器	ランドリーパイプメタルタイプ(1本)	1	+1,500	+1,500
24	換気機器開口	工場開口	1		
25	照明	ダウンライト照明(3灯)(白色)	1	-8,000	-8,000
26	天井照明開口	工場開口	1		
27	ミラー	ロングクリアミラー	1		
28	風呂フタ	断熱風呂フタ	1	+5,000	+5,000
29	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,500	-1,500
30	収納棚	クリアタイプB(3段)	1	+5,000	+5,000
31	風呂フタフック	風呂フタフック(固定式)(ホワイト)	1	+4,000	+4,000

御名前 群馬-高崎SR SB9

様

現場番号	C2817740	プラン番号	7401A-2109-1063T	作成日	2021/9/30
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 システムバス

御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500
33	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
34	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			34		¥936,000
商品総合計			34		¥936,000

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

**(参考) 別途 商品組付費**


システムバス商品組付費

¥129,000 ( 税込 ¥141,900 )


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格 &lt; 税率10% &gt; を表示しています。

パース

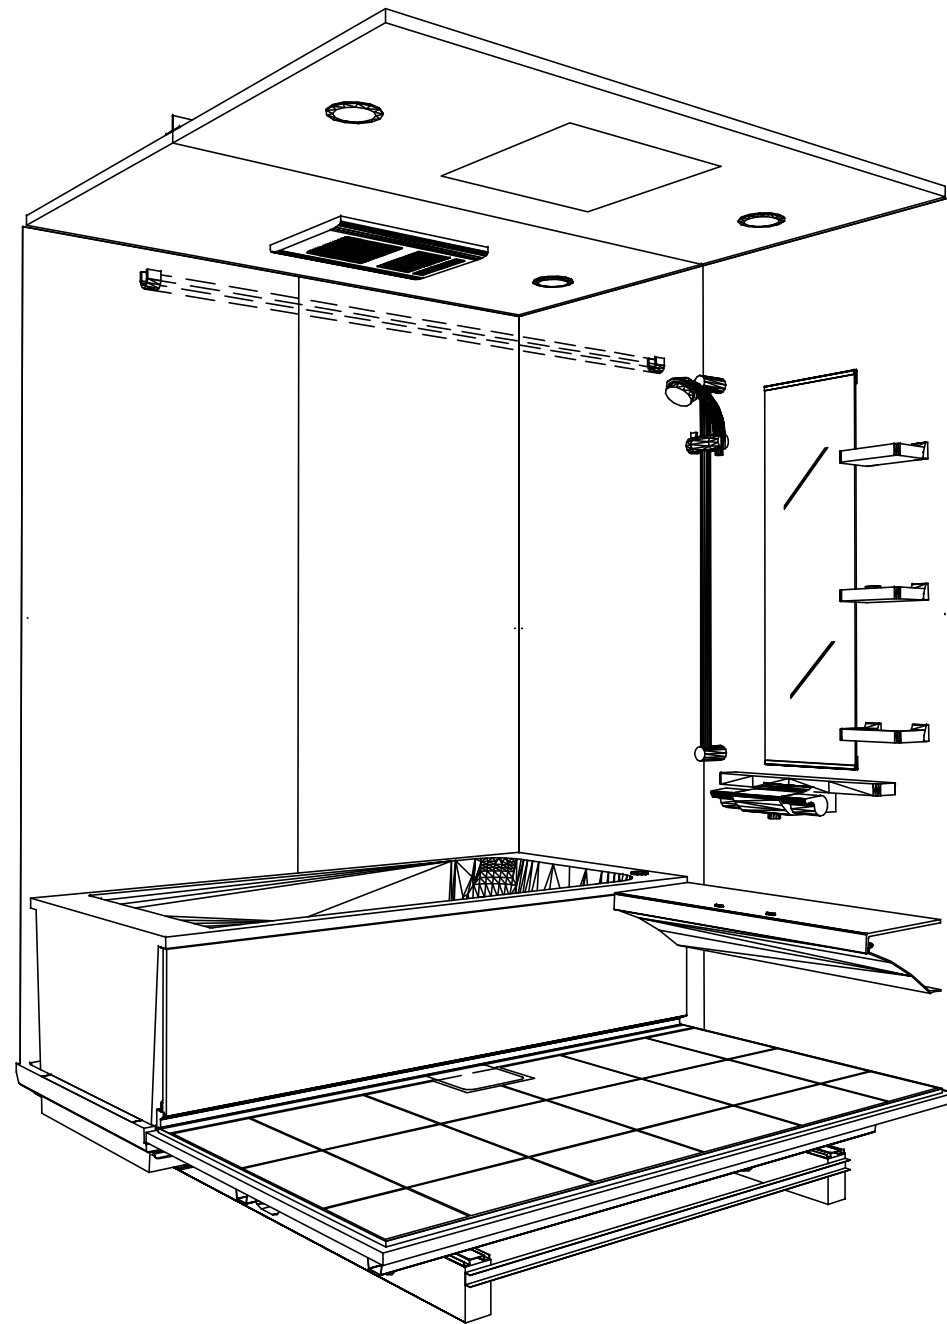

鳥瞰図

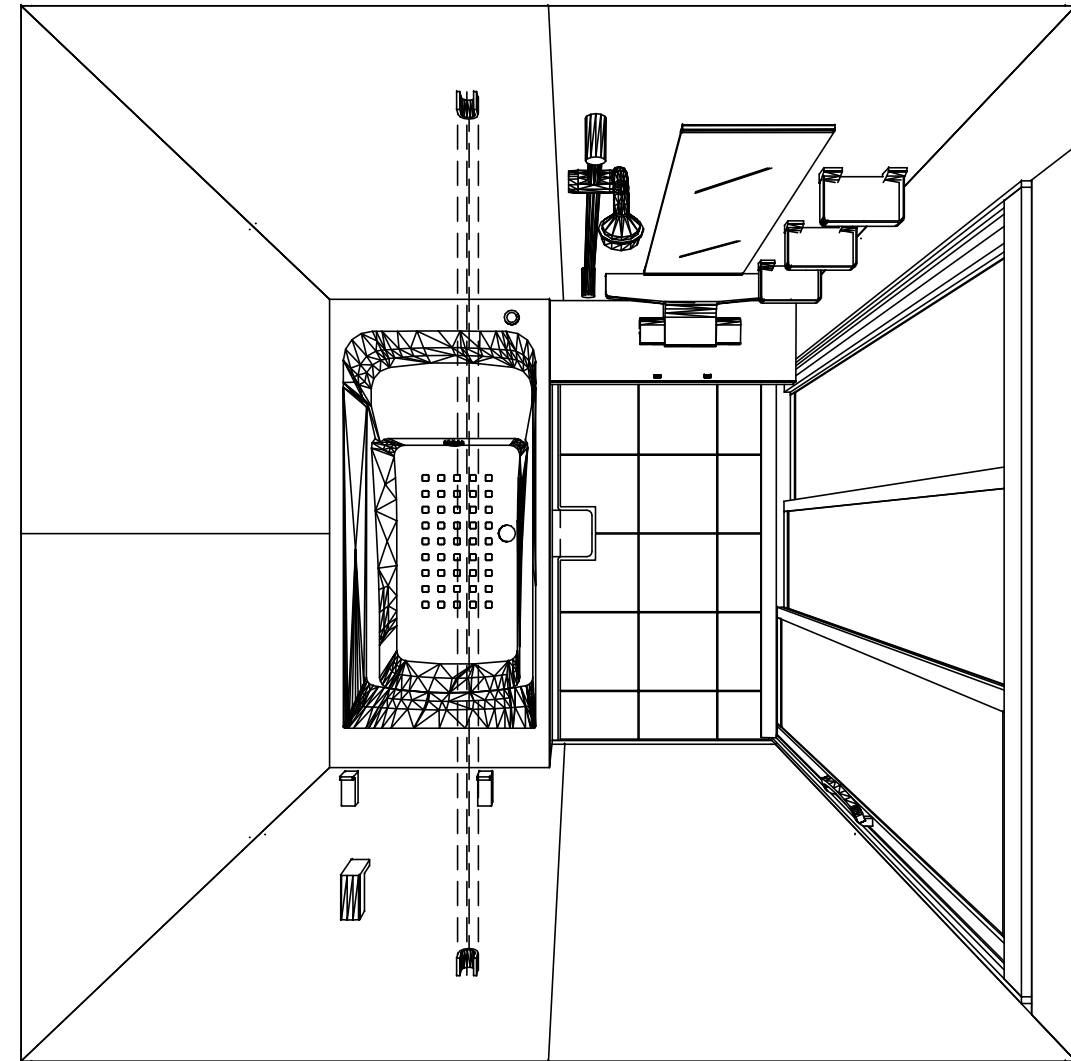

1616

キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>

高光沢フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、200Vタイプ(常時換気対応)



このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

**Takara standard**  
タカラスタANDARD株式会社


現場名称： 群馬-高崎SR SB9様邸  
現場番号： C2817740  
群馬支店 販売課

RELAGE レラージュ  
プラン番号： 7401A-2109-1063T  
担当営業：


姿図  
作成日： 2021年9月30日  
担当アドバイザー：

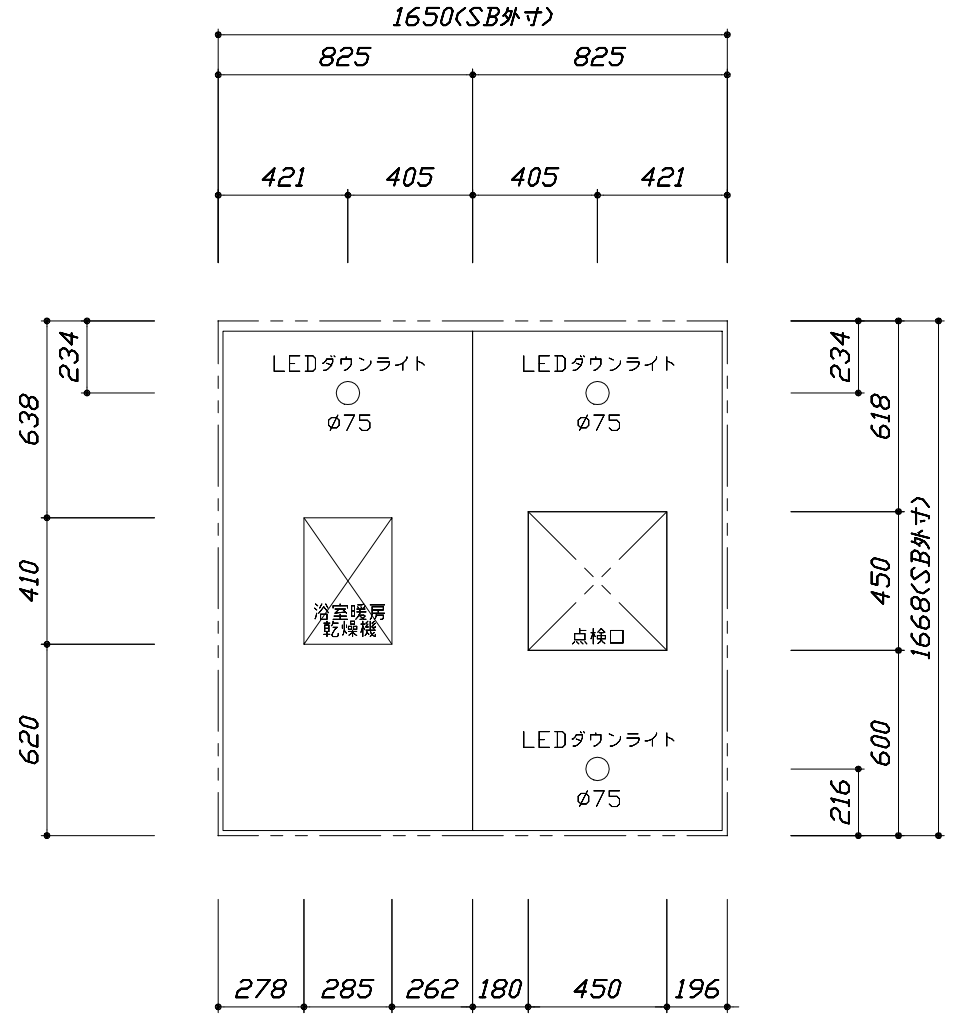

< 天井伏図 >

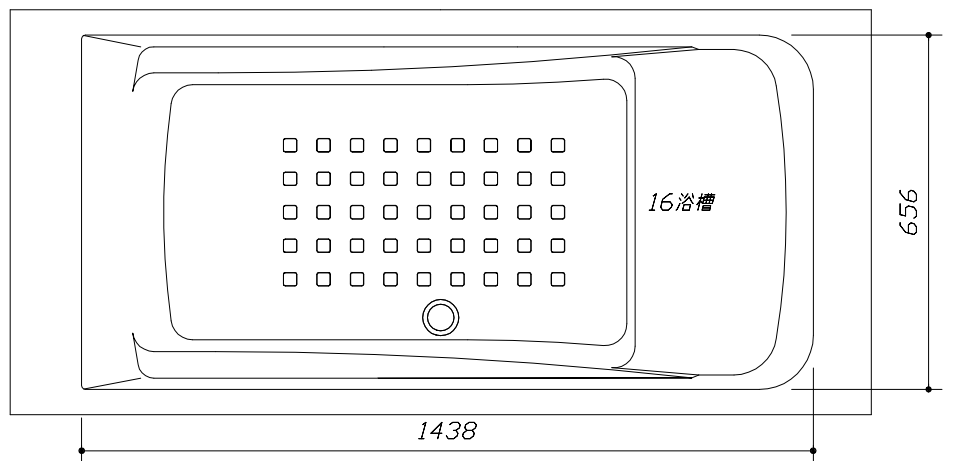

< 浴槽詳細図 >

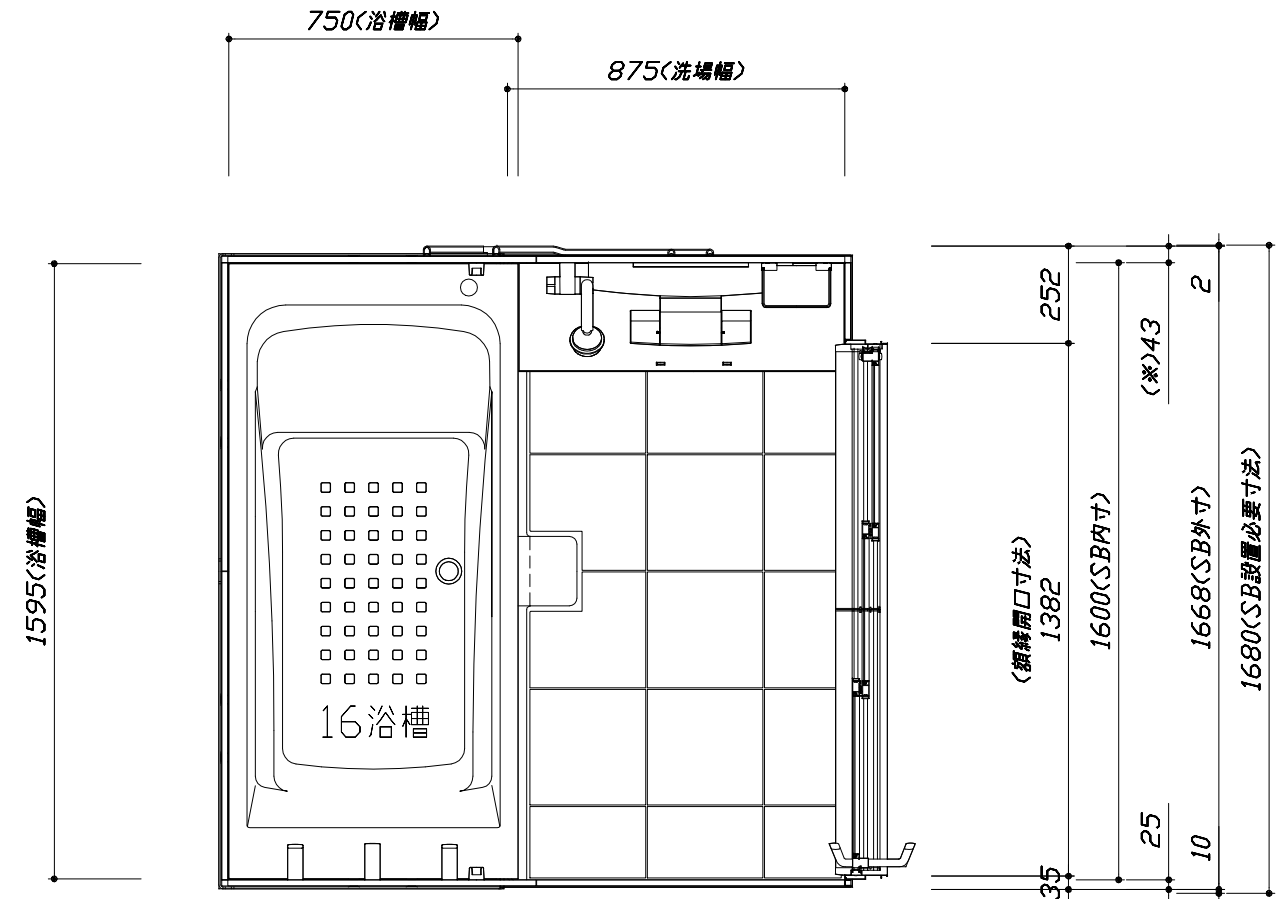

< 平面図 >

Takara standard  
 タカラスタンダード株式会社



現場名称： 群馬-高崎SR SB9様邸  
 現場番号： C2817740  
 群馬支店 販売課

RELAGE レラージュ  
 プラン番号： 7401A-2109-1063T  
 担当営業：

施工図1 縮尺：1:25,20  
 作成日：2021年9月30日  
 担当アドバイザー：


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

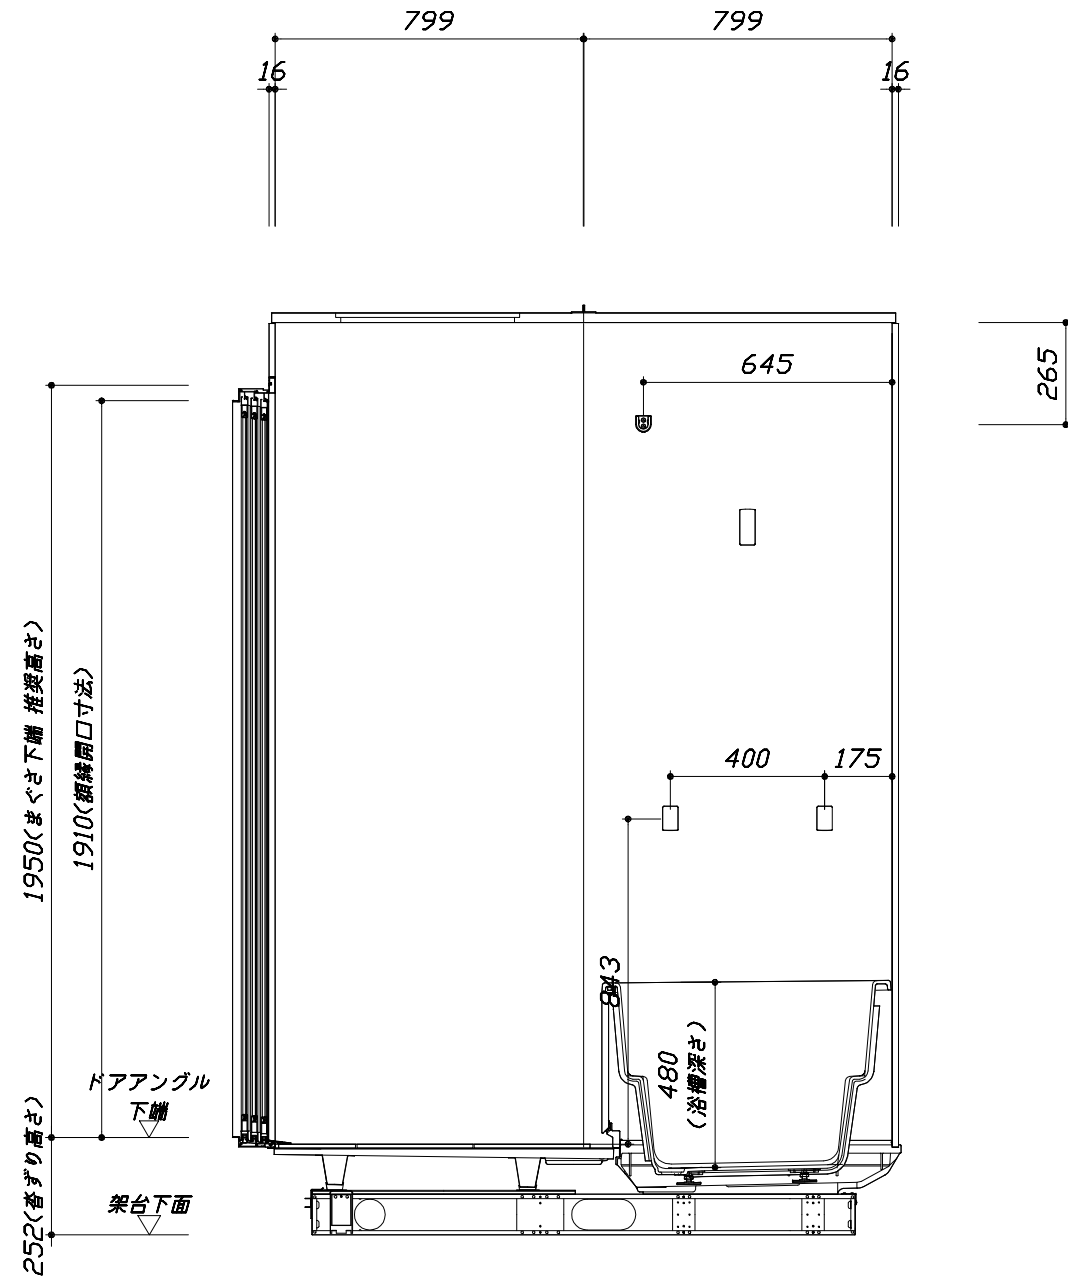

<カウンター対面図>



■土間コン仕上げ寸法  
 ドアアングル下端より  
 265mm下がり  
 (クリア寸法含む)

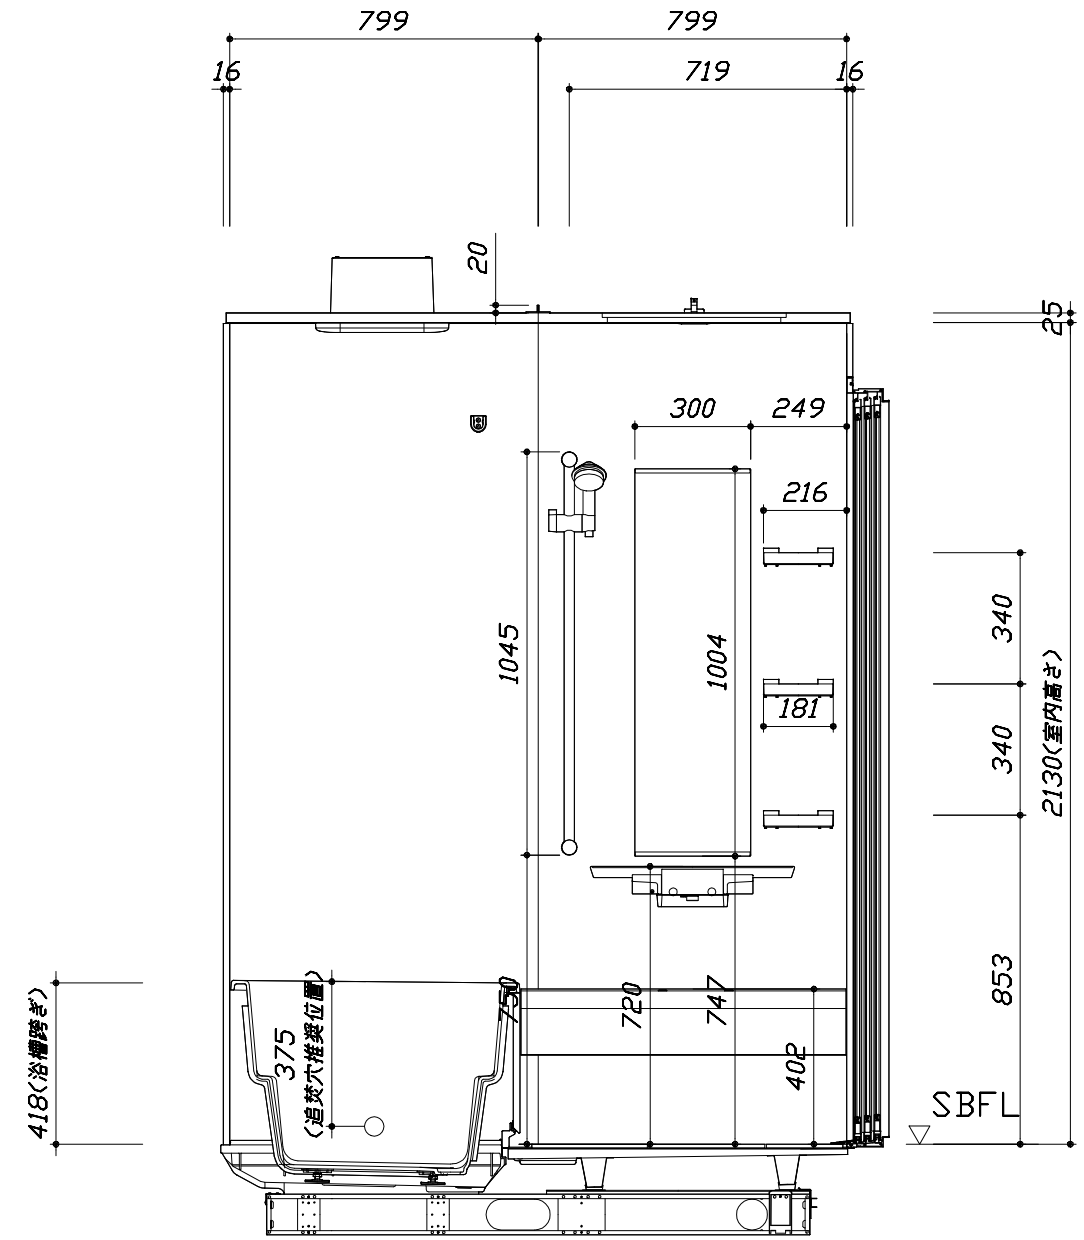

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法をご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

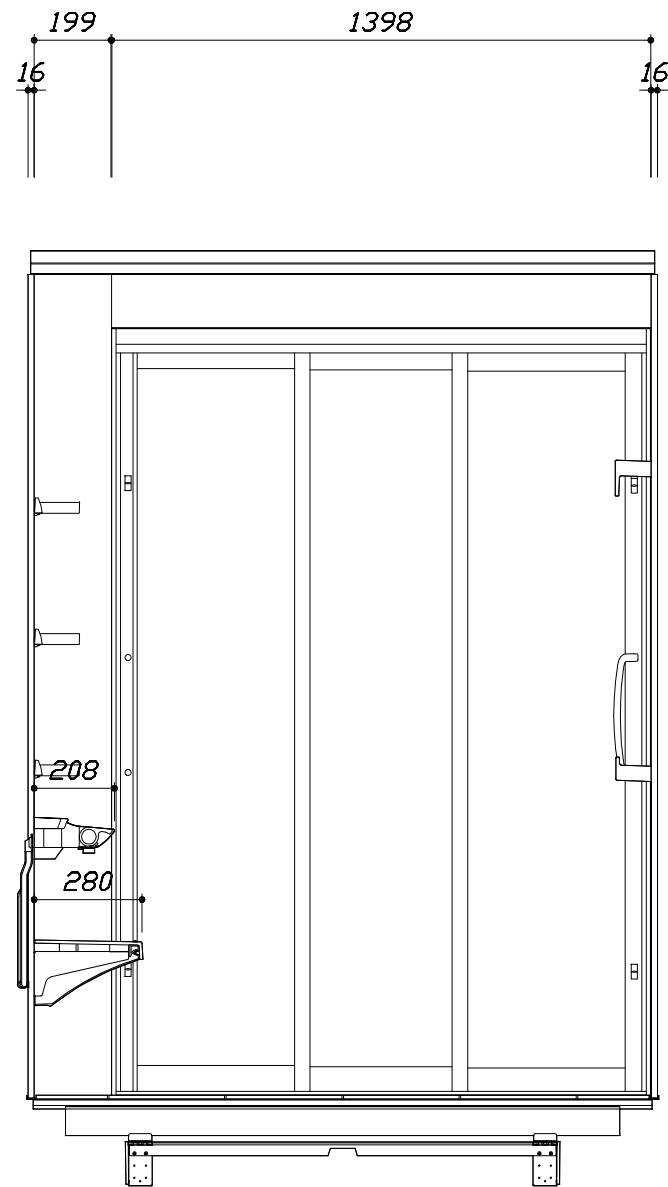

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法  
ドアアングル下端より  
265mm下がり  
(クリア寸法含む)

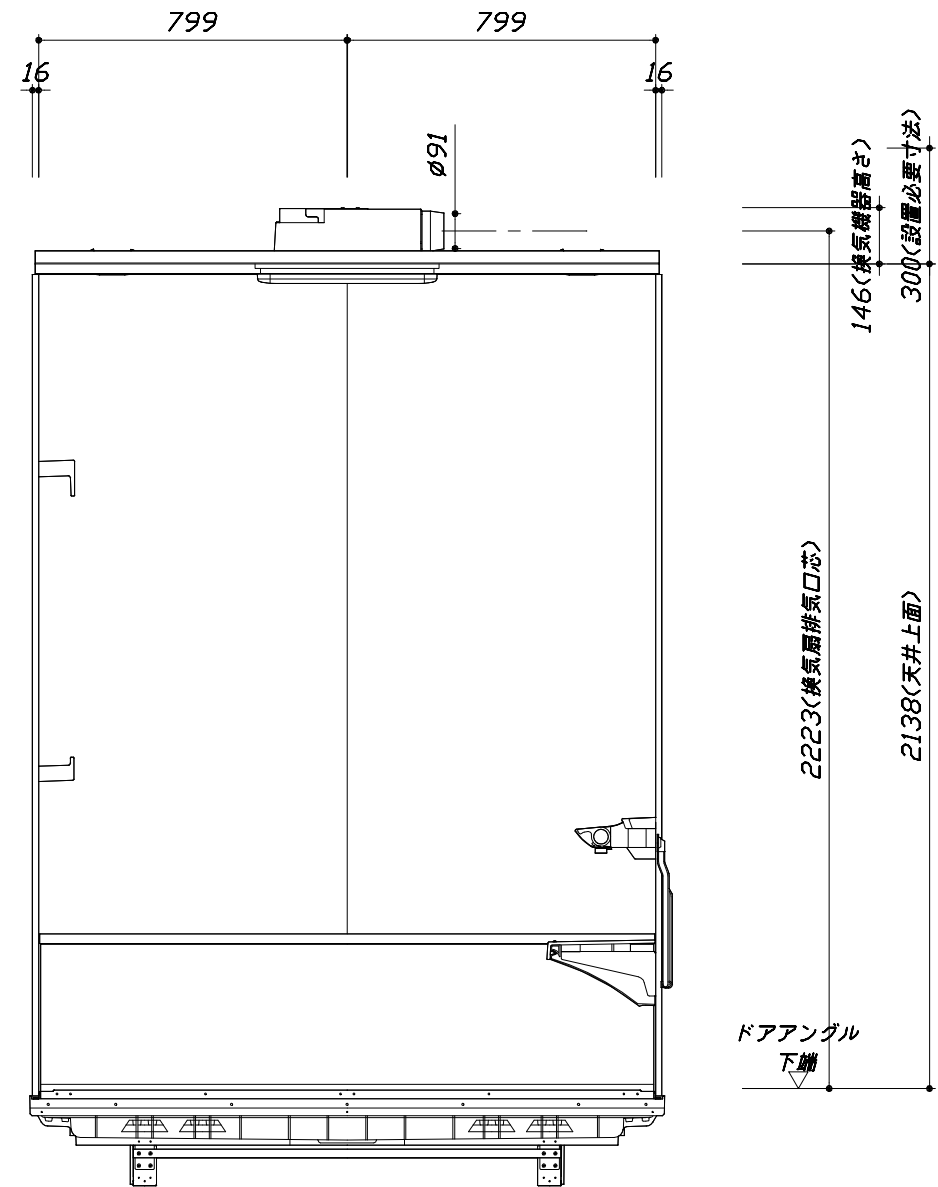

< 浴槽側面図 >

Takara standard  
タカスタンダード株式会社

現場名称： 群馬-高崎SR SB9様邸  
現場番号： C2817740  
群馬支店 販売課

RELAGE レラージュ  
プラン番号： 7401A-2109-1063T  
担当営業：

施工図3 縮尺： 1:20  
作成日： 2021年9月30日  
担当アドバイザー：

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	BL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 裏面保温材・高断熱仕様(発泡ウレタン)
浴槽形状	スクエア浴槽(ベンチ付)(310リットル) 追い焚き穴：あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂(FRP)
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材(発泡ポリエチレン)
カウンター	スクエアカウンター：アクリル人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	高光沢パネリッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ3枚引戸(アルミ框/樹脂ガラス/ﾀﾞｲﾈｰ型換気口)
窓1	－
窓2	－
窓枠1	－
窓枠2	－
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂、浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	300kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ロングクリアミラー くもり止め加工
収納棚	クリアタイプB：AS樹脂製(3段)
タオル掛け	－
洗場側水栓	サーモスタット(KVK KF9152HRE)(樹脂ホース：メタル調)
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
スライドバー	シャワーフックスライドバー(ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ-TN-1020)
照明	LEDダウンライト(LED 12.3W白色)(3灯)
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(200V・最大消費電力2230W)(ﾀﾞｲｱﾞｸﾞ ﾉ98)(常時換気対応品)
フロタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－


本体カラー

浴槽	GN：シュガーライトグレー
カウンター	GN：シュガーライトグレー
パネル(カウンター面)	CI：ブリックグレー
パネル(周辺・3面)	CI：ブリックグレー
水栓上部カウンター	W：ホワイト
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	HG：カームグレー
ドア	G：グレー
収納棚	クリアタイプB
タオル掛け	－
ランドリーセット	M：メタル



# 基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。  
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。  
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。  
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

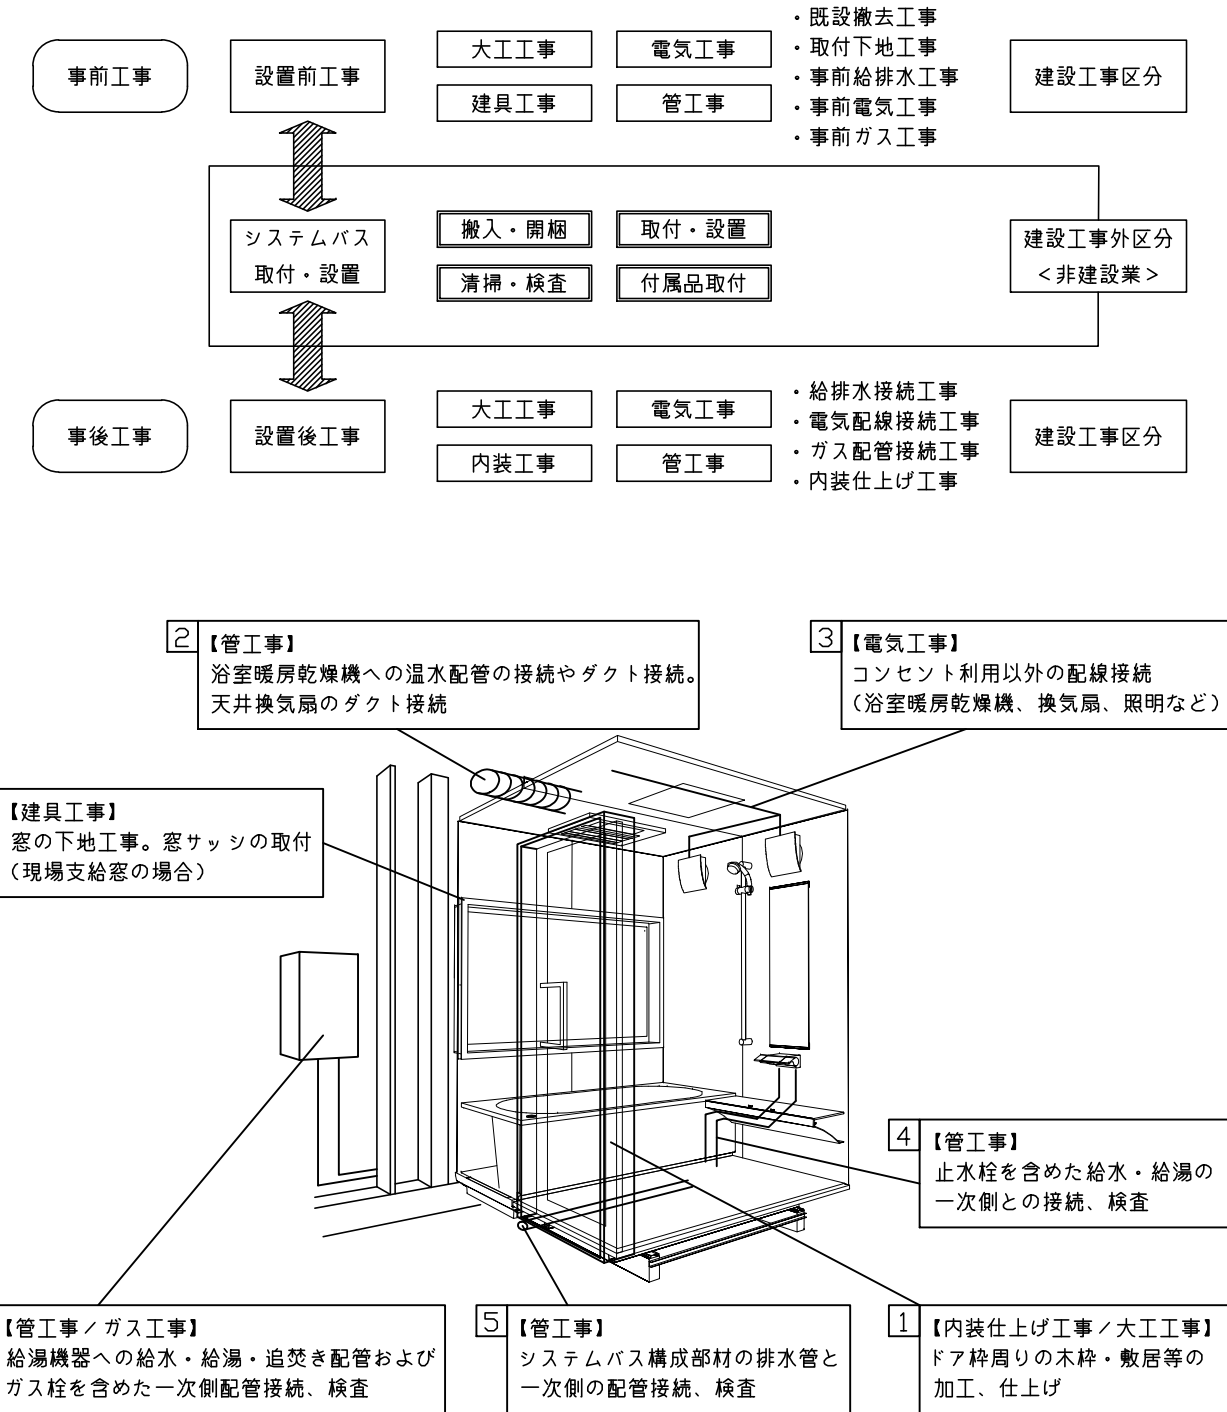

## ■システムバス 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事					建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置		
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
電気	給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事			
			浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事		
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置								□	洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置								□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置								□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置【注記 1】								□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付【注記 1】								□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付【注記 1】								□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付【注記 1】							□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付							□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付								□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付【注記 1】								□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付								□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付【注記 1】								□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付【注記 1】								□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填								□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
試運転・完成検査【注記 2】								□	完成後の試運転、性能確認検査			
設置後工事	1 2 3 4 5 6	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
		管	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付					○	○		建築の外装仕上げ工事	
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事					○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
		電気 他	建築側排水配管との接続工事【注記 3】					○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
給湯機器本体工事（試運転・確認）					○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）				
1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○	○						床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事		
		浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事		
		浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする  
 ※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する  
 ※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

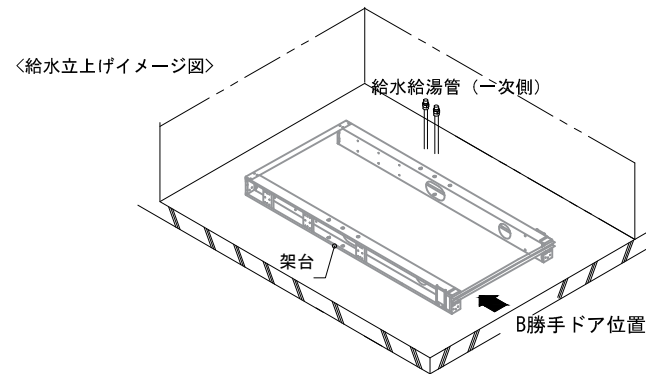




■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置

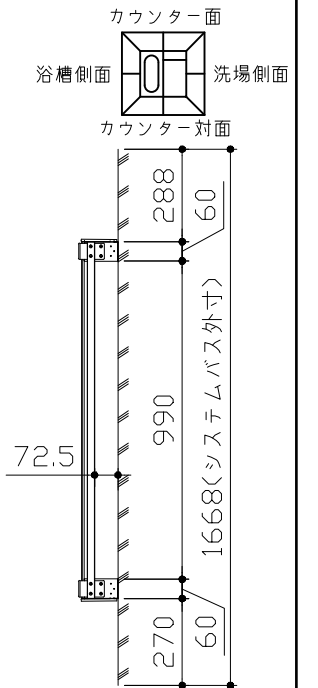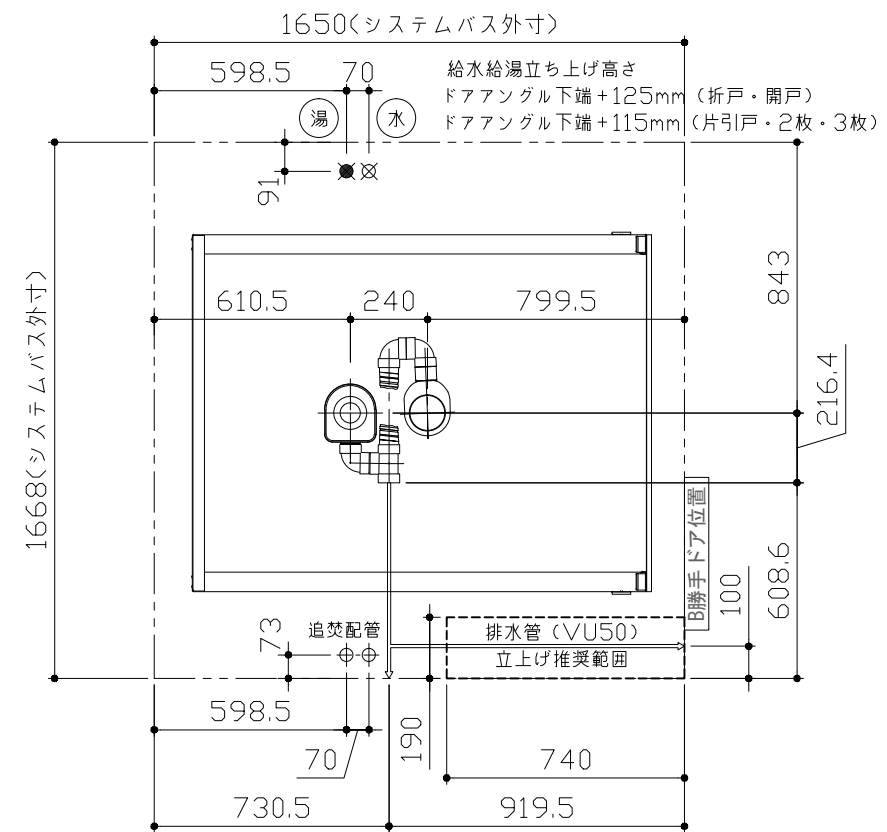

■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアンクル下端より265mm下がりで打設してください。

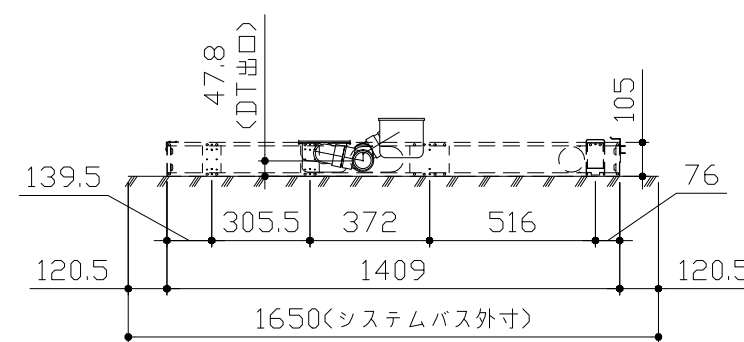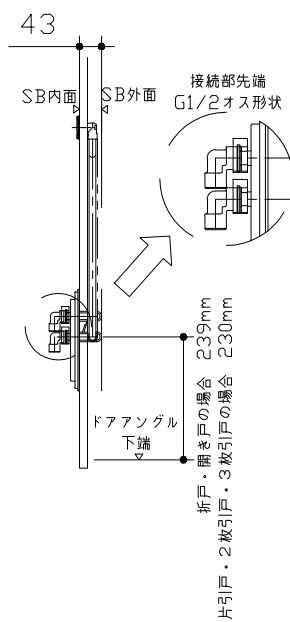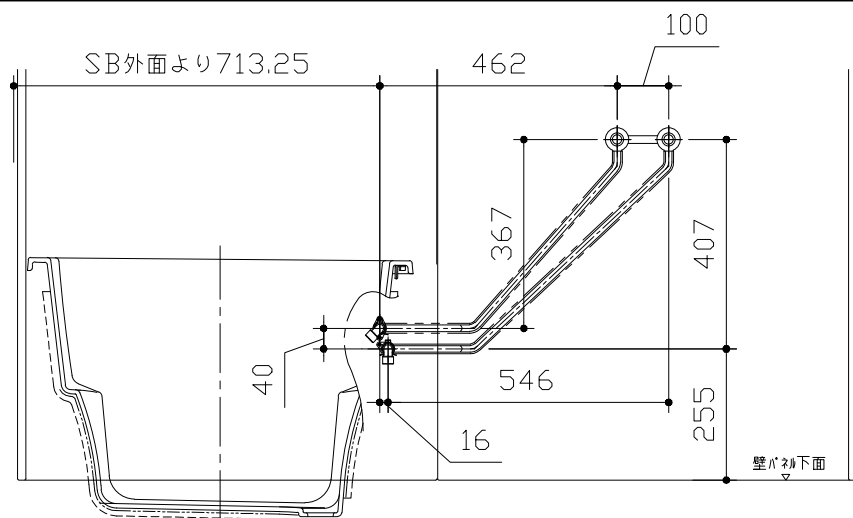

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。  
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

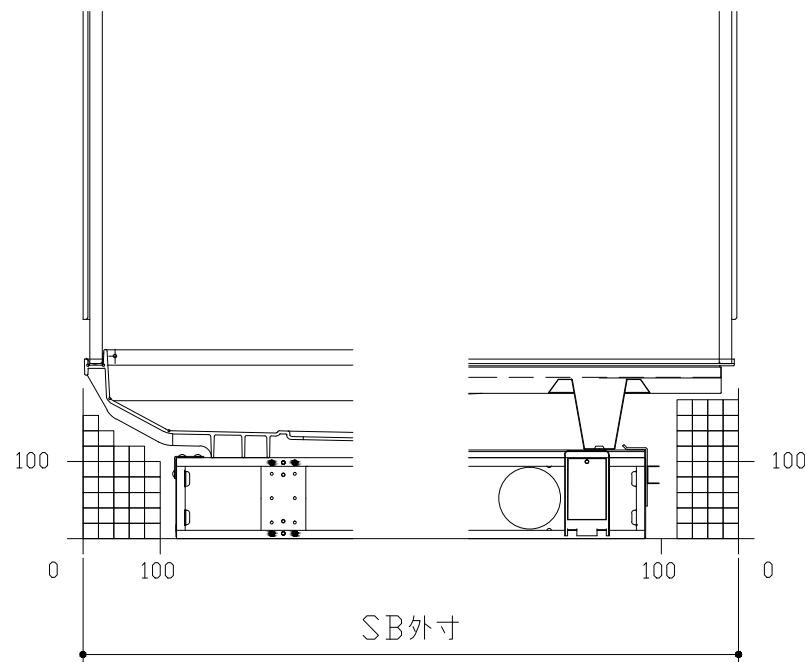


A矢視

B矢視

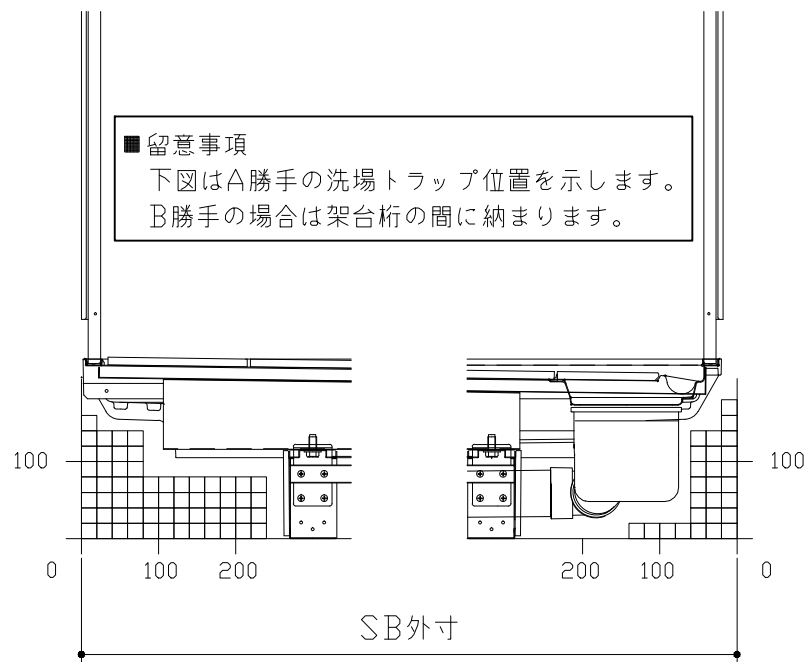

C矢視

D矢視



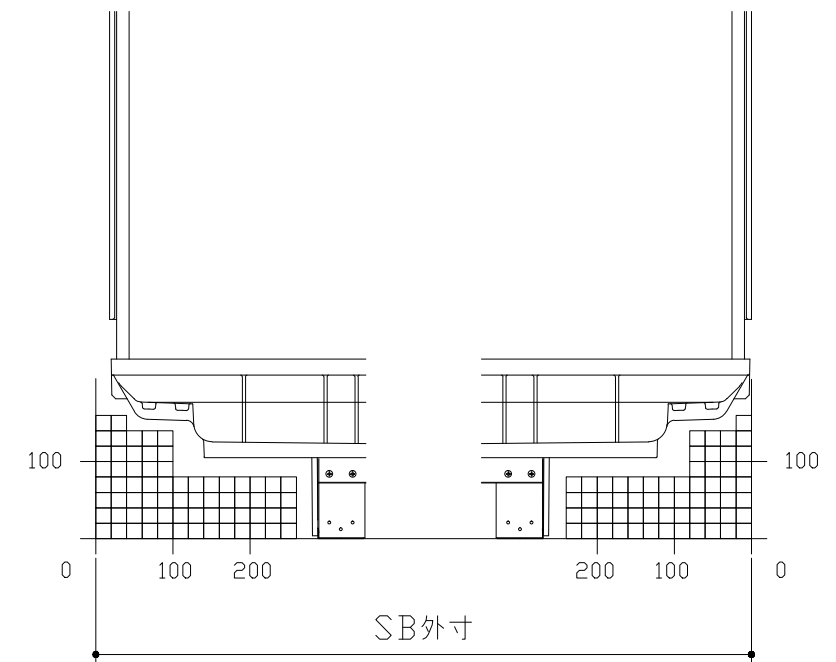


E矢視

F矢視

# キープクリーンドア : 3枚引戸・タテ型換気口

有効開口寸法813mm

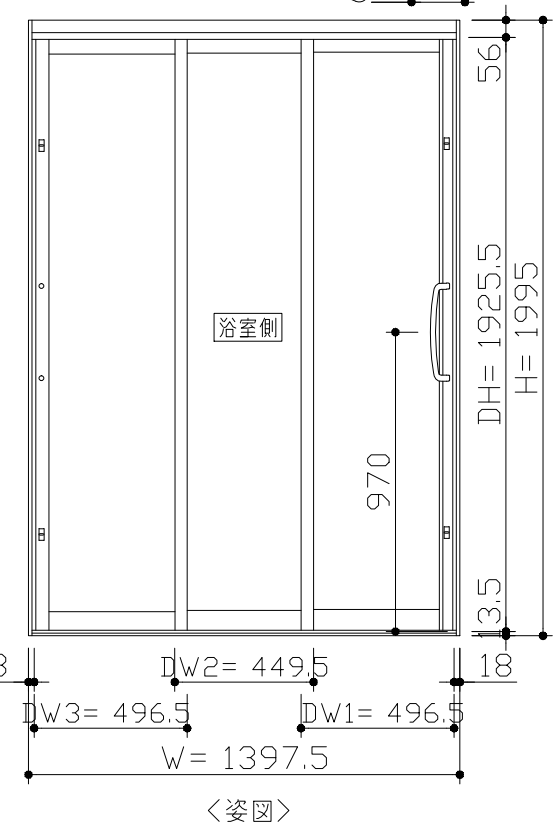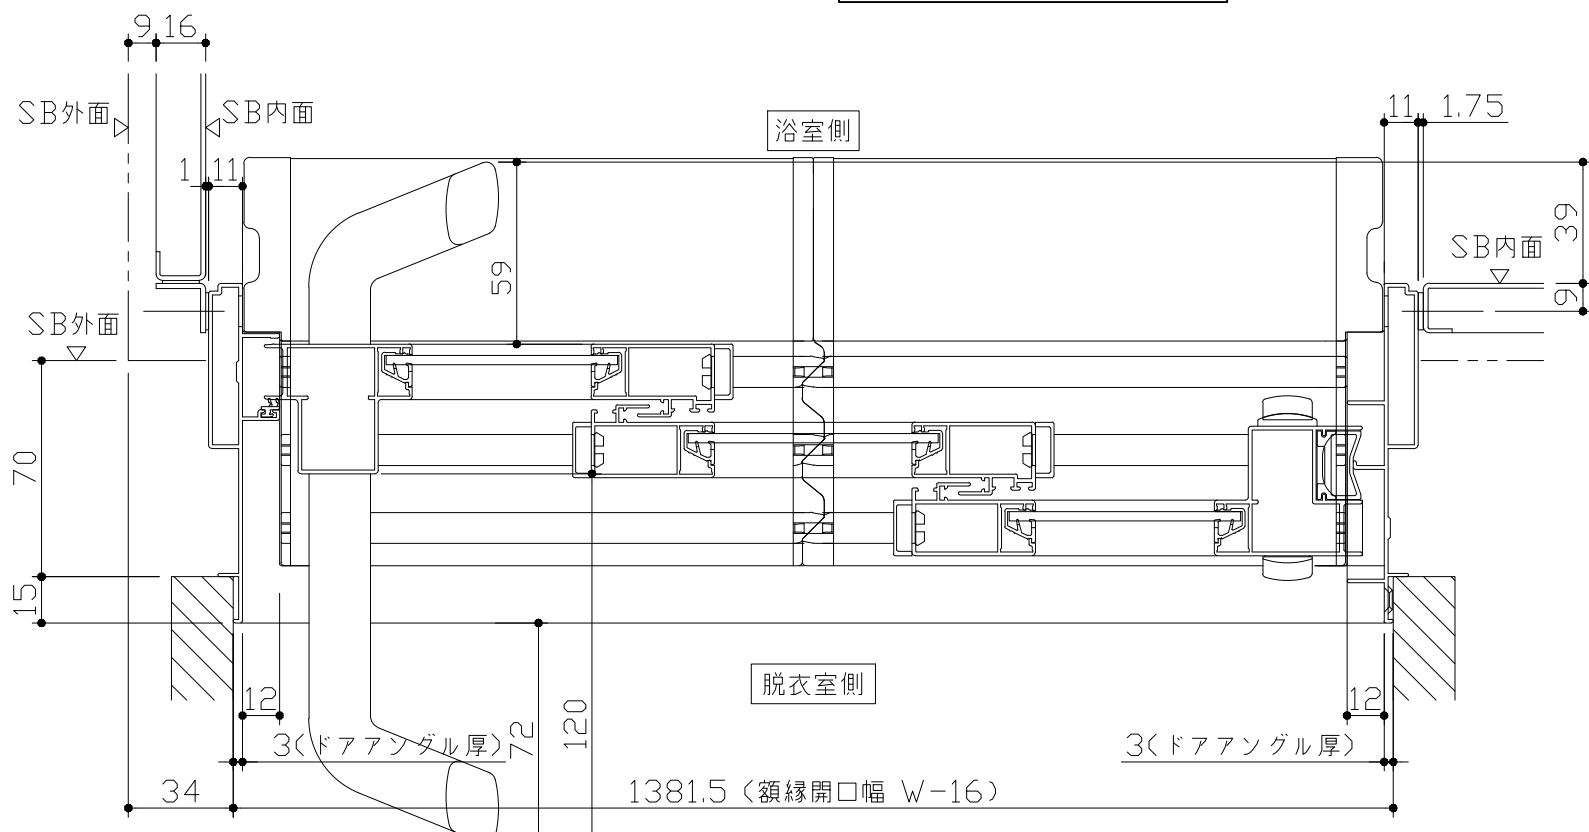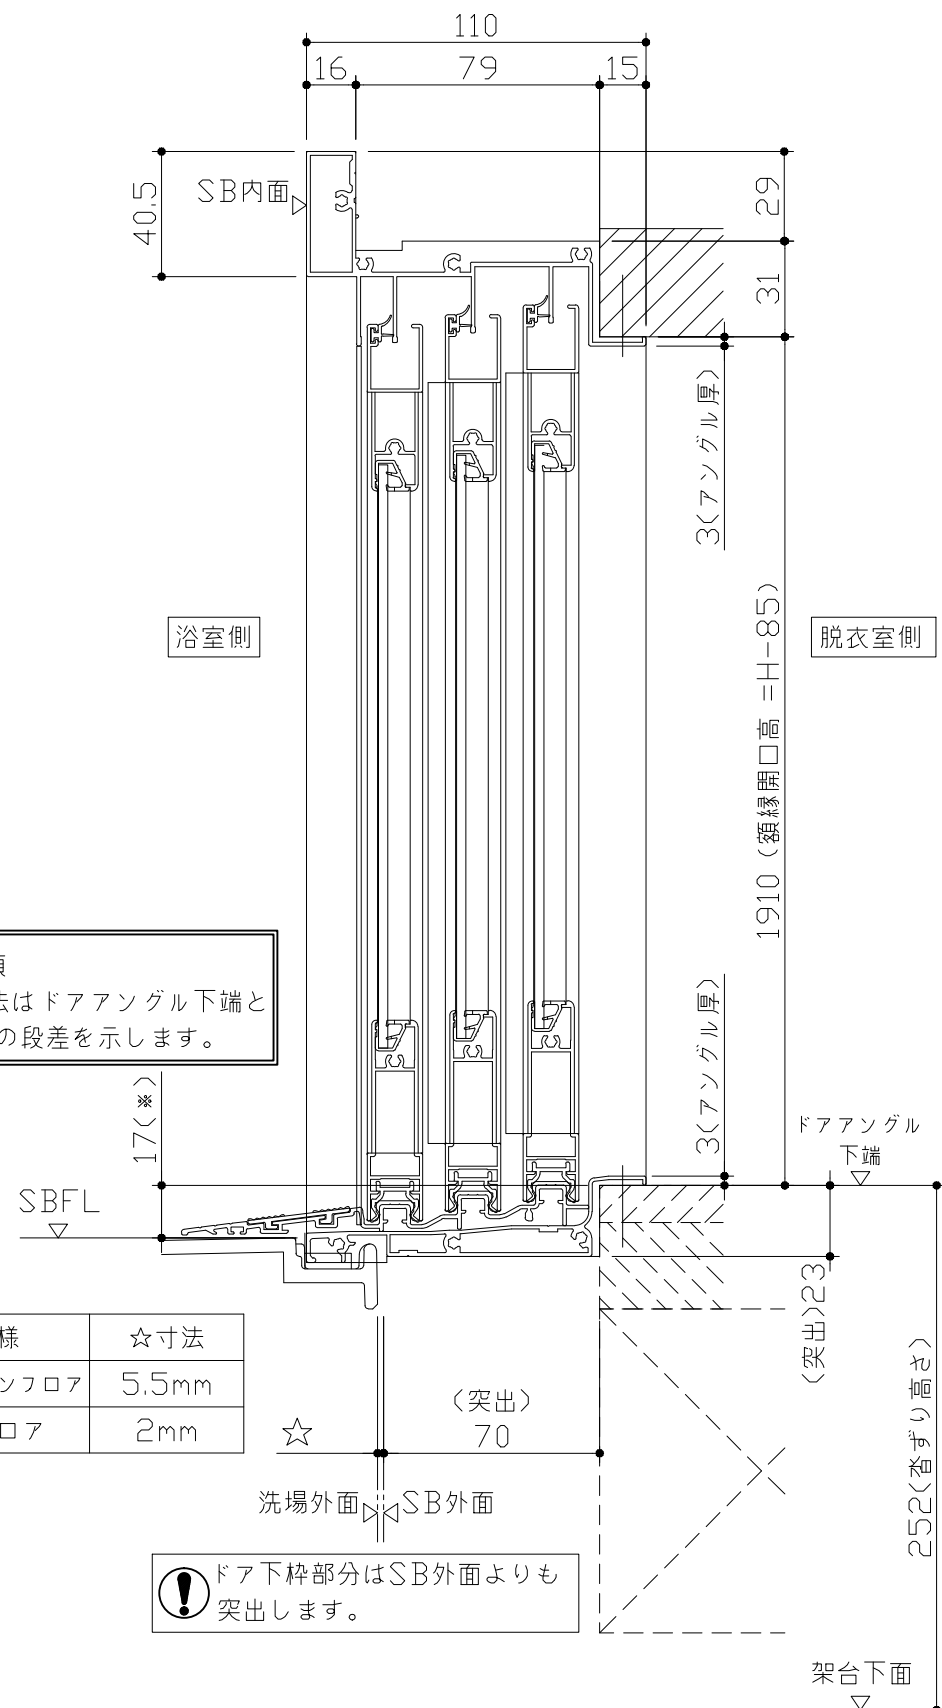


■ 留意事項  
 ※印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

■ ドア横の管柱、間柱について  
 ・ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。  
 ・躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

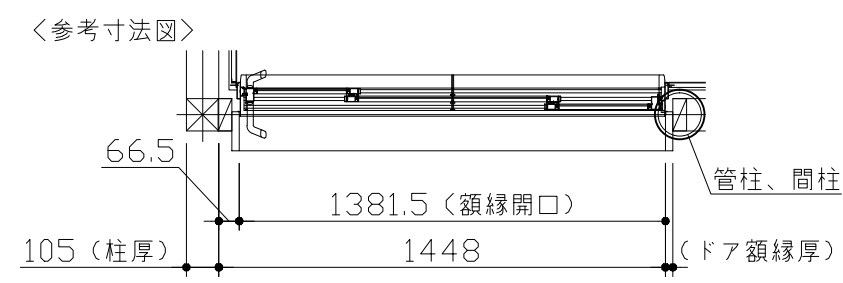


**Takara standard**  
 タカラストANDARD株式会社

現場名称： 群馬-高崎SR SB9様邸  
 現場番号： C2817740  
 群馬支店 販売課

RELAGE レラージュ  
 プラン番号： 7401A-2109-1063T  
 担当営業：

ドア取合詳細図  
 作成日： 2021年9月30日  
 担当アドバイザー：

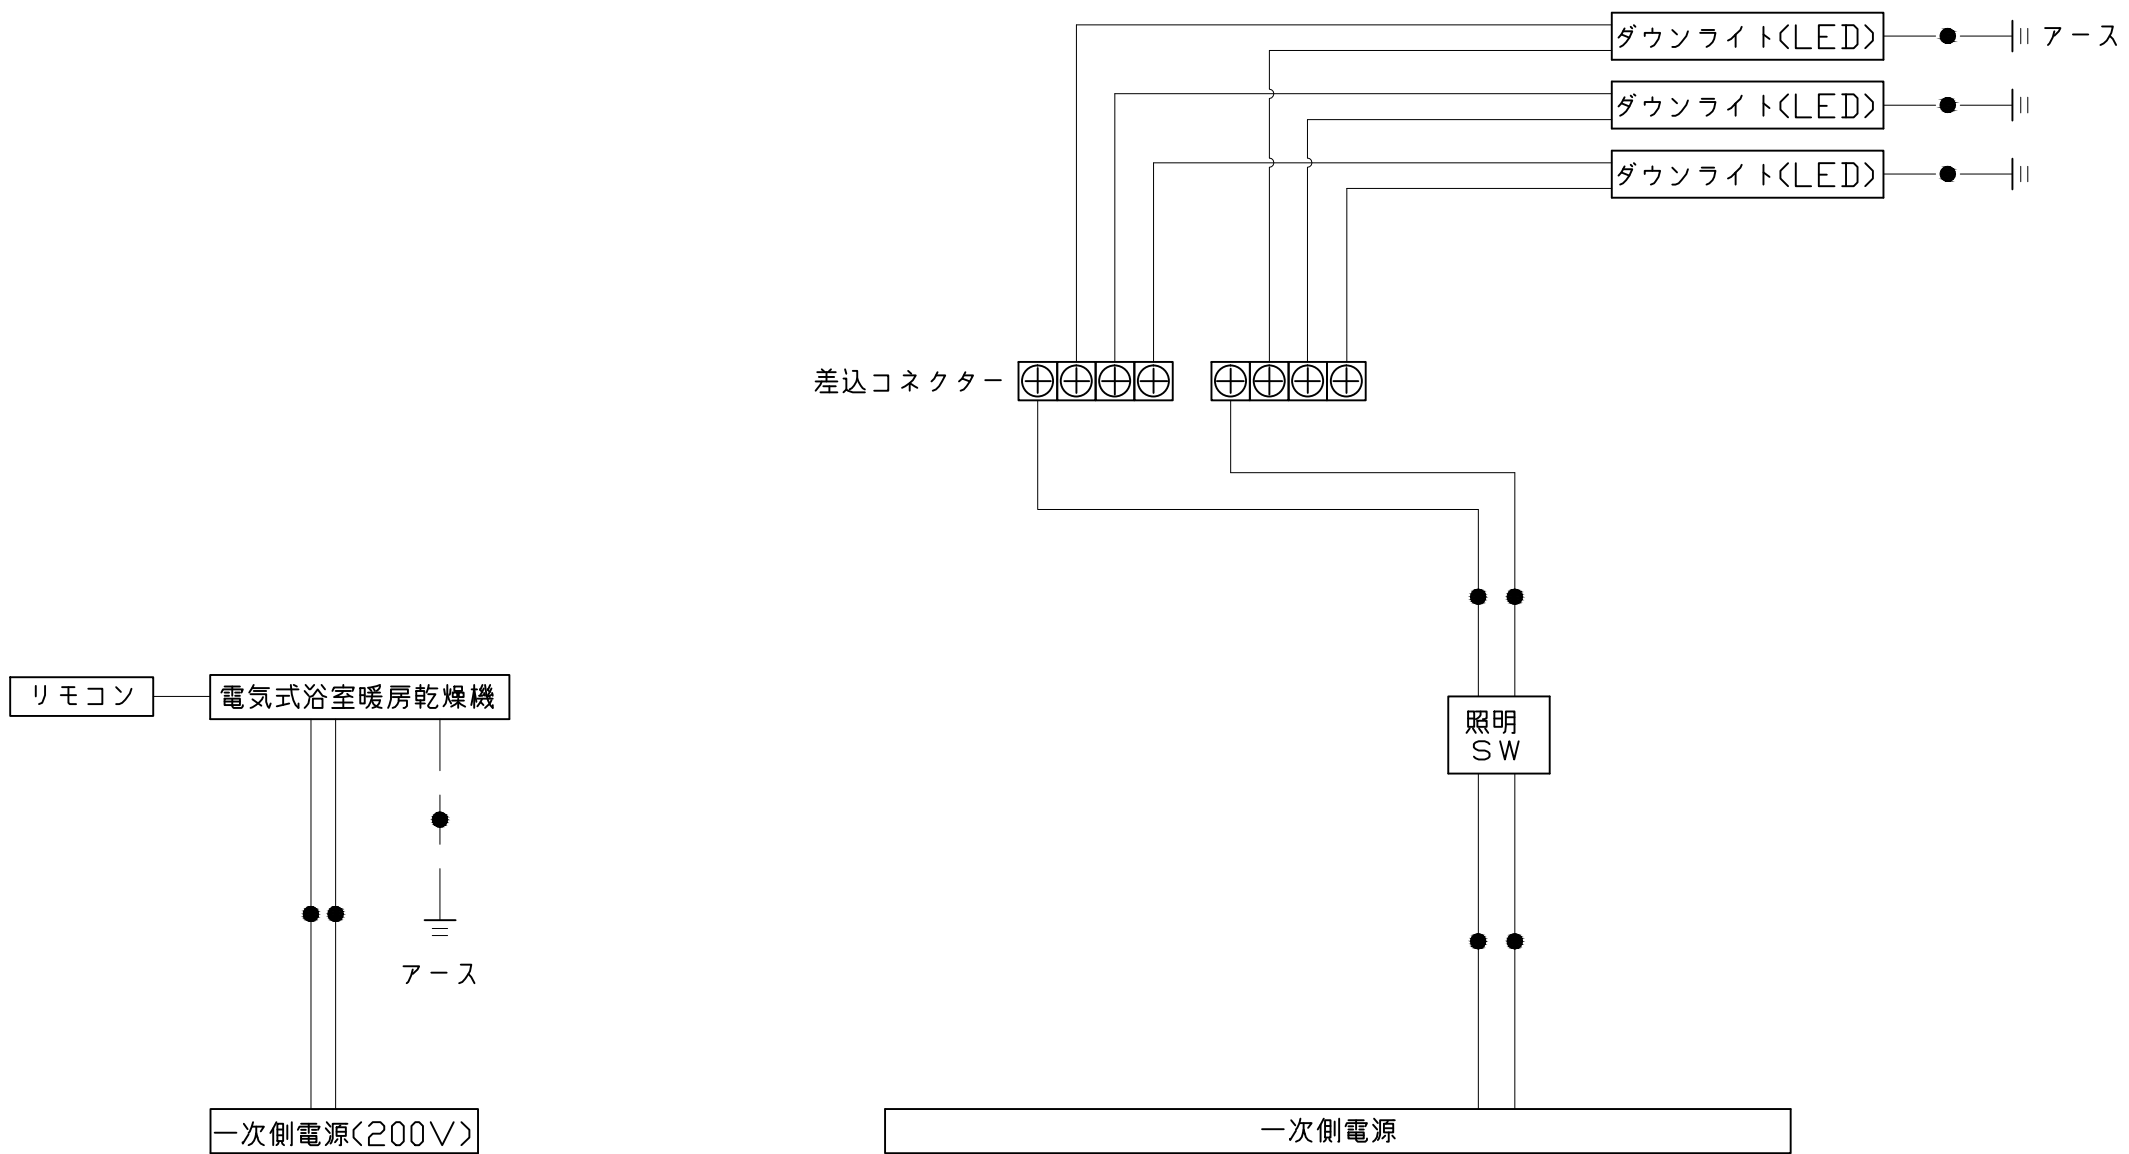



\*浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

一次側電源から差し込みコネクタ及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。


浴槽

洗い場用水栓

照明

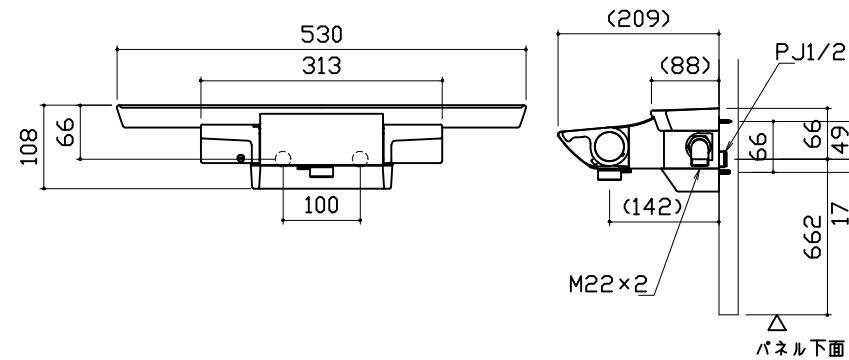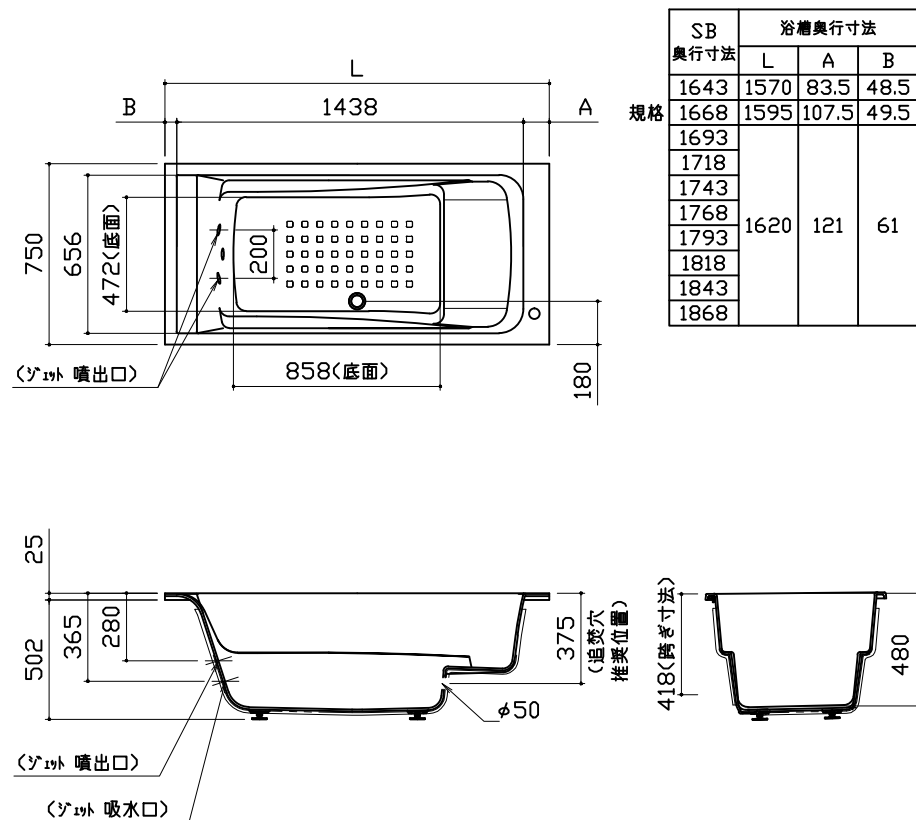



ダウンライト  
LED 4.1W (1灯あたり)

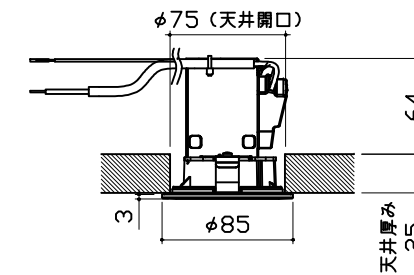


換気機器

シャワーフックスライダー

ミラー

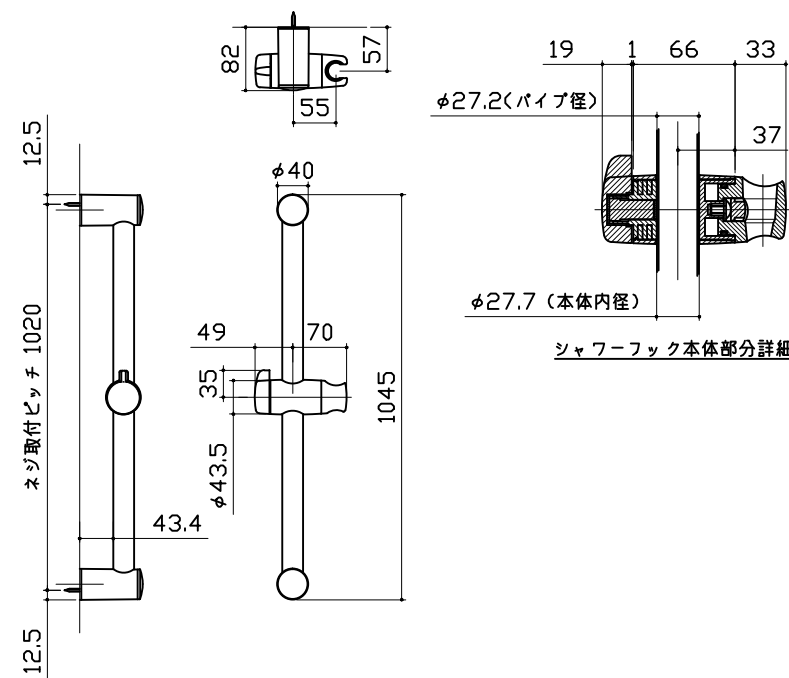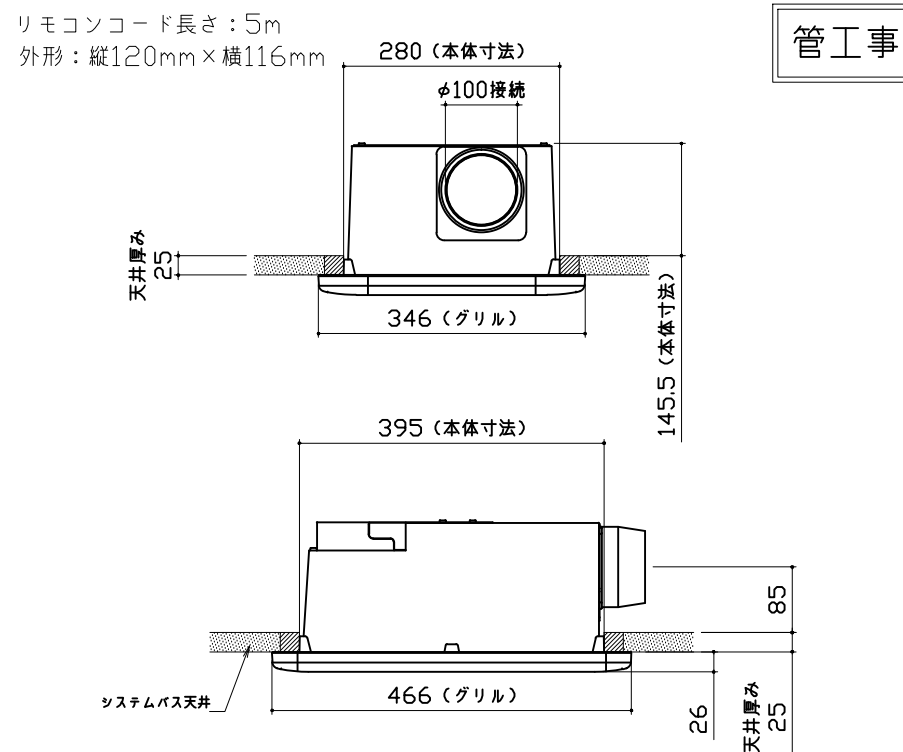


枠：SUS304 t0.8  
ミラー：表面防曇コートあり (ロングクリアミラー-A)  
表面防曇コートなし (ロングミラー-A)


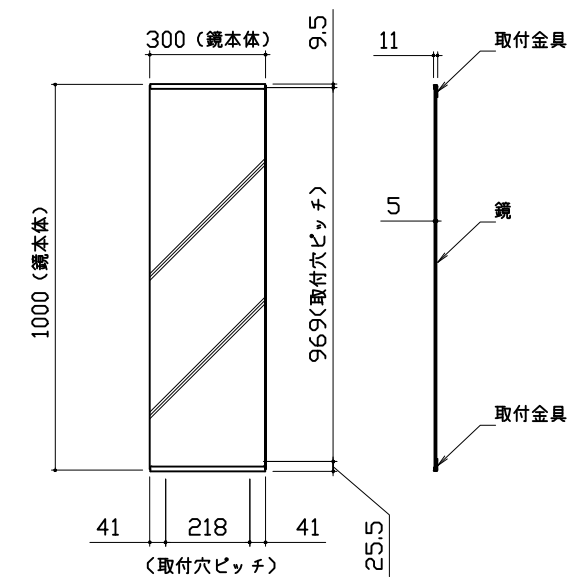


収納棚

本体：AS


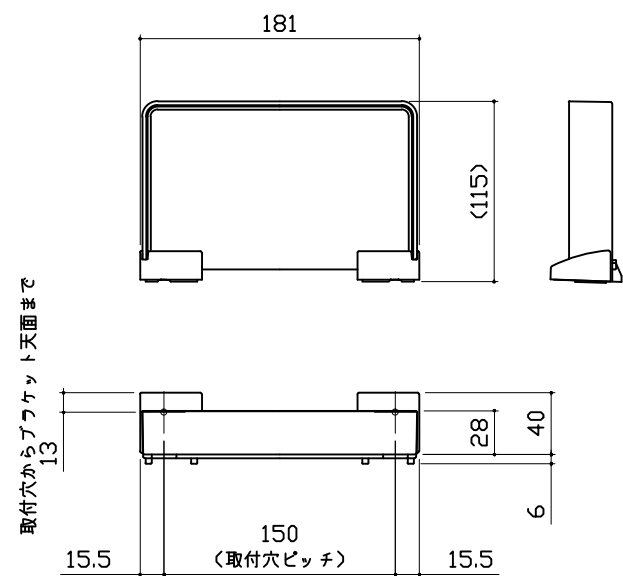


循環金具・フロアダプタ関連

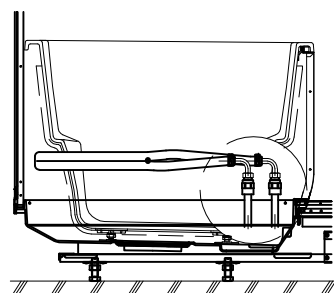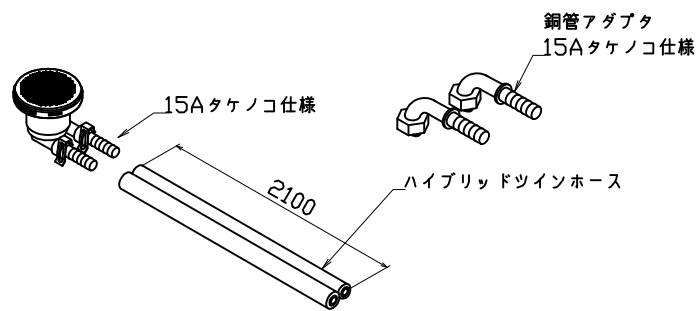


追焚配管立上図

風呂蓋 7079MVAH-16XST

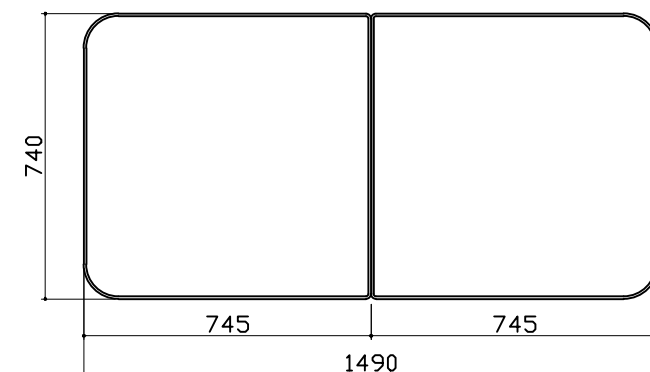


断面図

洗い場側排水トラップ

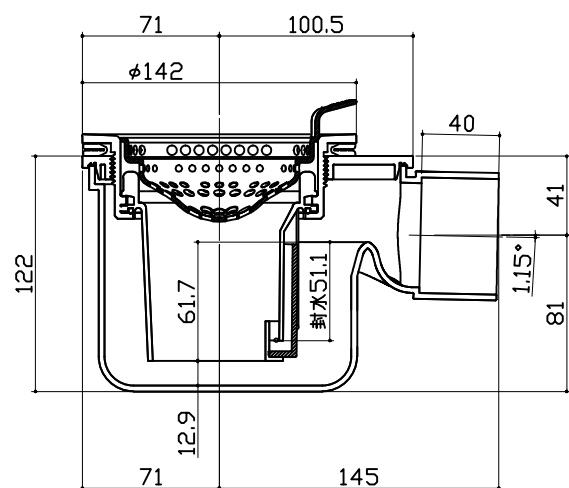

浴槽側排水トラップ

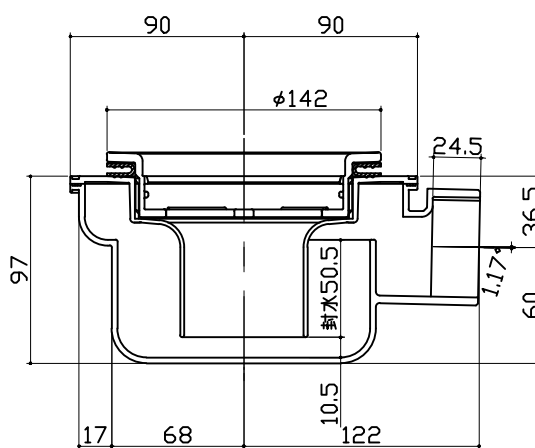

パネル割図	ミラー	収納棚
<p>パネル割図</p> <p>ハネK16C2J 0799 R&lt;CI ハネK16C1N 0799 L&lt;CI ハネK16NW 0799 &lt;CI ハネK16NW 0799 &lt;CI ハネK16AD 0799 &lt;CI ハネK16A 0799 &lt;CI ハネK18FD 0199 &lt;CI BL勝手</p>	<p>ミラー</p> <p>ハネK16C2J 0799 R&lt;CI 799 509 291 1749 780 現地加工：φ3.5</p>	<p>収納棚</p> <p>ハネK16C2J 0799 R&lt;CI 799 1540 1200 860 200 50 現地加工：φ3.5</p>
シャワーフックスライドバー	ランドリーパイプ	風呂蓋収納
<p>ハネK16C2J 0799 R&lt;CI 799 80 1790 770 現地加工：φ3.5</p>	<p>ハネK16C1N 0799 L&lt;CI 799 645 250 266 現地加工：φ3.5</p> <p>ハネK16AD 0799 &lt;CI 799 645 266 250 現地加工：φ3.5</p>	<p>ハネK16AD 0799 &lt;CI 799 1662 1646 851 835 375 575 175 現地加工：φ3.5</p> <p>■留意事項 タオルカケ・ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。</p>
