

システムバス 御見積書

御名前 群馬-高崎SR SB7 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランスパ

作成日 2025年6月12日
プラン番号 7401A-2505-0725T
現場番号 C2817648

タカラスタンダード株式会社
◆高崎営業所
群馬県高崎市緑町4丁目1番地6
TEL 027-395-8001 / FAX 027-370-0007

◆高崎ショールーム
TEL 027-395-8000 / FAX 027-363-1000

商品
御見積金額 **¥1,505,600** (税込 ¥1,656,160)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥186,000** (税込 ¥204,600)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616(BR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	サンディグレー
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	クリスタルパールホワイト
浴槽形状	ラウンド浴槽
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ダークグレー / ブラック
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	ステンレス / ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ジオマーブルアイボリー
パネルカラー(周辺)	パールホワイト
ガス種 / 周波数	13A / 50Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
SB7		飯野

◆ 備考

★風呂フタフック(固定式)なし

--	--

No.*

御名前 群馬-高崎SR SB7

様

現場番号	C2817648	プラン番号	7401A-2505-0725T	作成日	2025/6/12
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	769,000	769,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	開き戸<800幅>(ホワイト)ノ強化ガラス(透明)(20サイズ)	1	+47,500	+47,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドアオプション部材	ドア外タオル掛け(開き戸専用)/ブラケット:樹脂(白)	1	+5,000	+5,000
6	ドア位置変更	B勝手・移動なし・周辺ハイクラス・800幅ドア	1		
7	洗い場	キーブクリーンフロア(プレミアムクラス・サンディグレー)	1	+29,000	+29,000
8	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
9	浴槽	キーブクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(クリスタルパールホワイト)	1		
10	浴槽追焚き穴	あり	1		
11	エプロン	カラスステンレス(保温材あり)(ホワイト)	1		
12	浴槽形状	人大ラウンド浴槽	1		
13	ヘルシージェット	なし	1		
14	肩包み湯(ジェットバス機能付)	あり クッションピロー:チャコールグレー	1	+199,000	+199,000
15	うるぽか湯	なし	1		
16	オートウォッシュ	なし	1		
17	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
18	浴槽パン	あり	1		
19	洗い場用水栓	タッチ水栓:樹脂製ホース(メタル調)FTB230K 水栓上部カウンター(ダークグレー)	1	+91,000	+91,000
20	洗い場用水栓	ウルトラファインバブルシャワー hadamo:KVK FTB230KUFH	1	+21,000	+21,000
21	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
22	カウンター	人造大理石カウンター	1		
23	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
24	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザイン 周辺ハイクラス)(Kパネル)	1	+55,000	+55,000
25	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
26	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
27	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ブラック	1	+52,500	+52,500
28	換気機器	ランドリーパイプなし	1	-2,800	-2,800
29	換気機器開口	工場開口	1		
30	照明	ストレートライン照明(調光・調色機能付・ラグジュアリーミラー対応用)	1	+91,000	+91,000
31	天井照明開口	工場開口	1		

御名前 群馬-高崎SR SB7 様

現場番号	C2817648	プラン番号	7401A-2505-0725T	作成日	2025/6/12
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	ミラー	ラグジュアリーミラー(全幅タイプ)	1	+117,000	+117,000
33	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
34	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
35	収納棚	収納棚なし	1		
36	どこでもラック	タオルハンガーL(チャコールグレー)	1	+2,800	+2,800
37	どこでもラック	風呂フタフック(ホワイト)	1	+2,100	+2,100
38	風呂フタフック	風呂フタフック(固定式)(ホワイト)	1	+4,000	+4,000
	風呂フタフック	風呂フタフック(固定式)(ホワイト)なし	1	-4,000	-4,000
39	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
40	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
41	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			42		¥1,505,600

商品総合計	42	¥1,505,600
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥186,000 (税込 ¥204,600)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

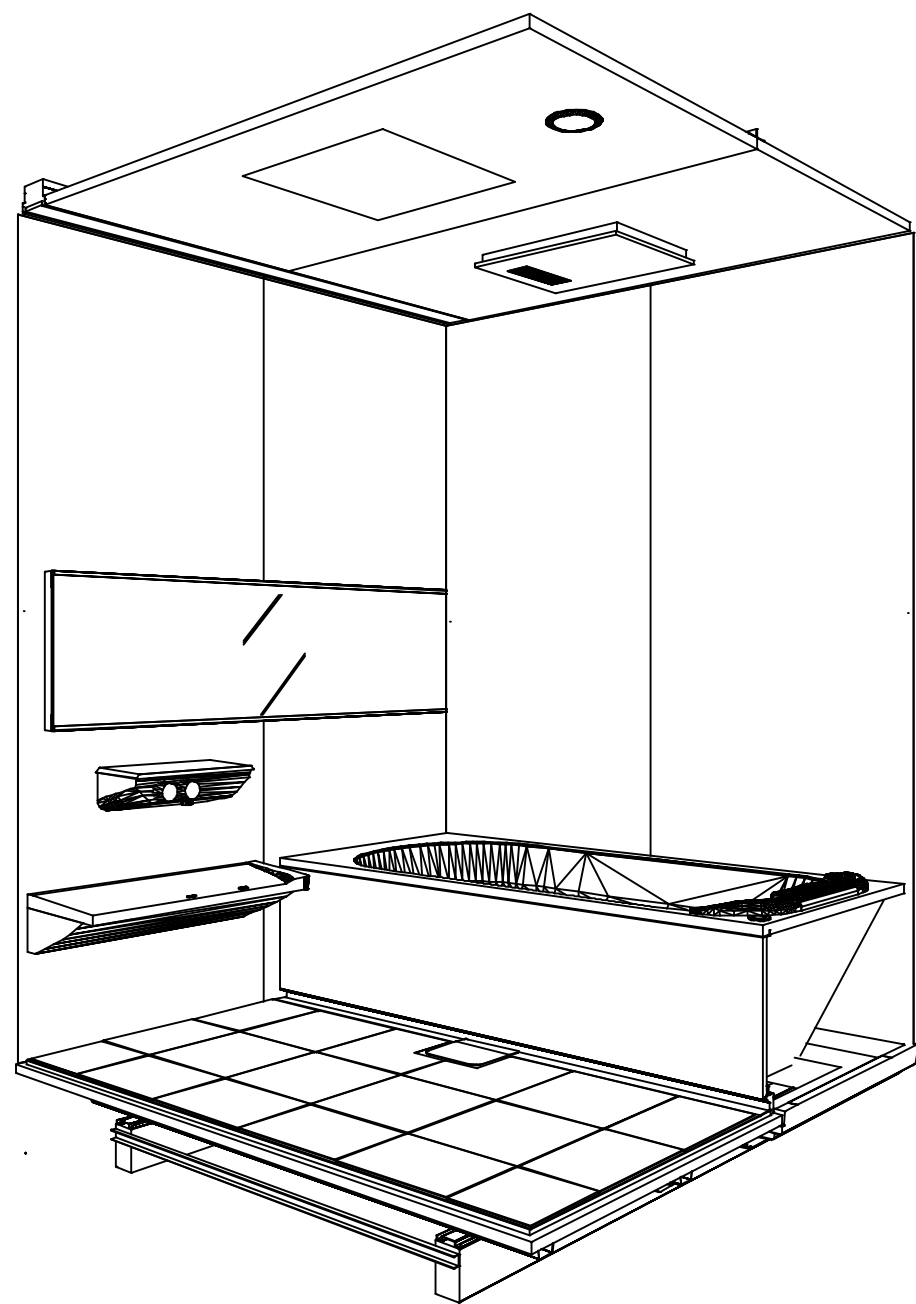

鳥瞰図

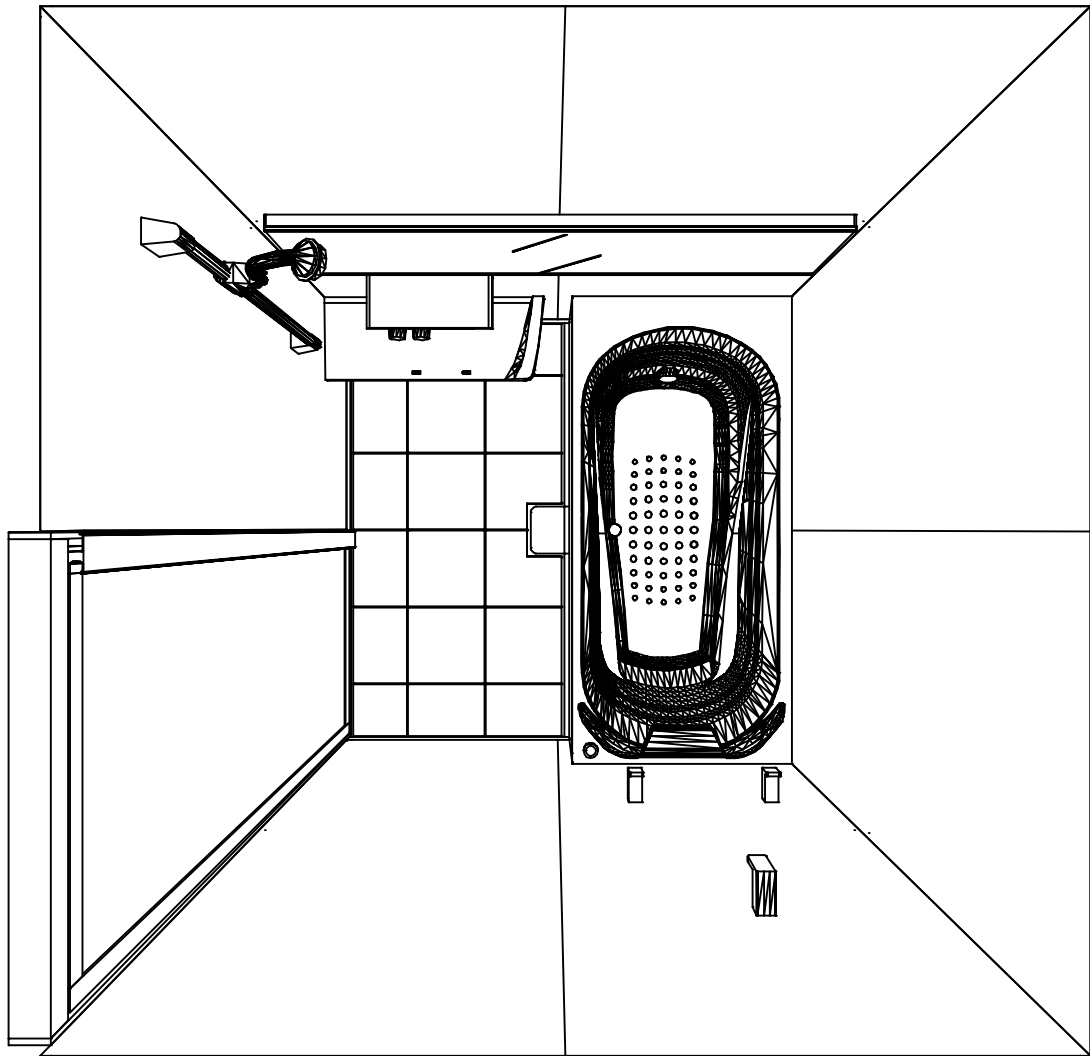

1616

フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

カウンター面


洗場側面

浴槽側面


カウンター対面

■ 留意事項


* 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

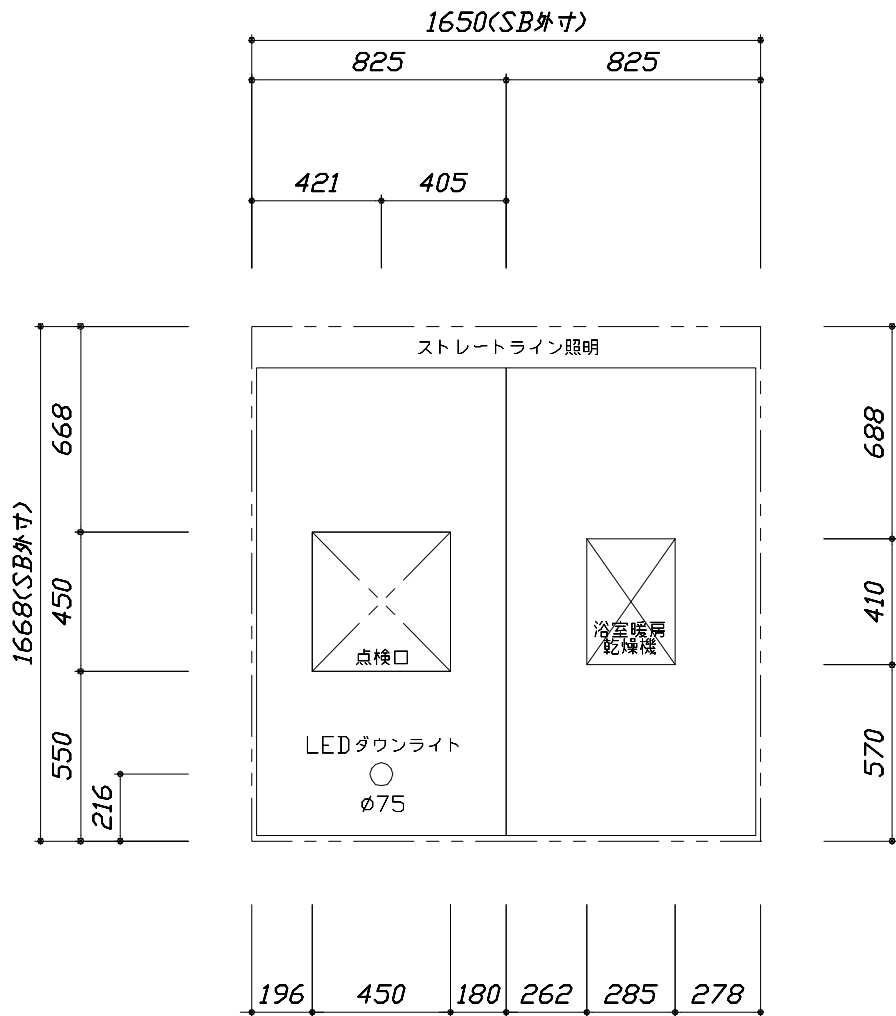

<天井伏図>

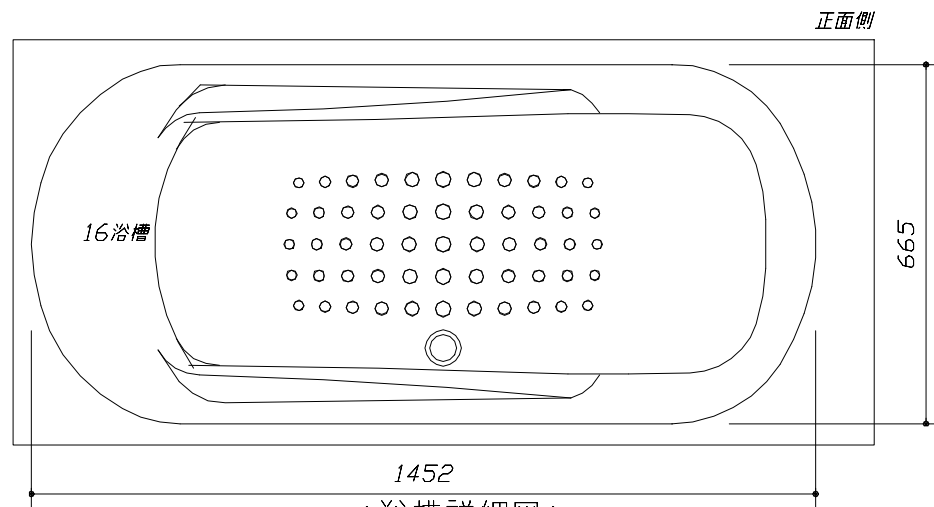



<浴槽詳細図>

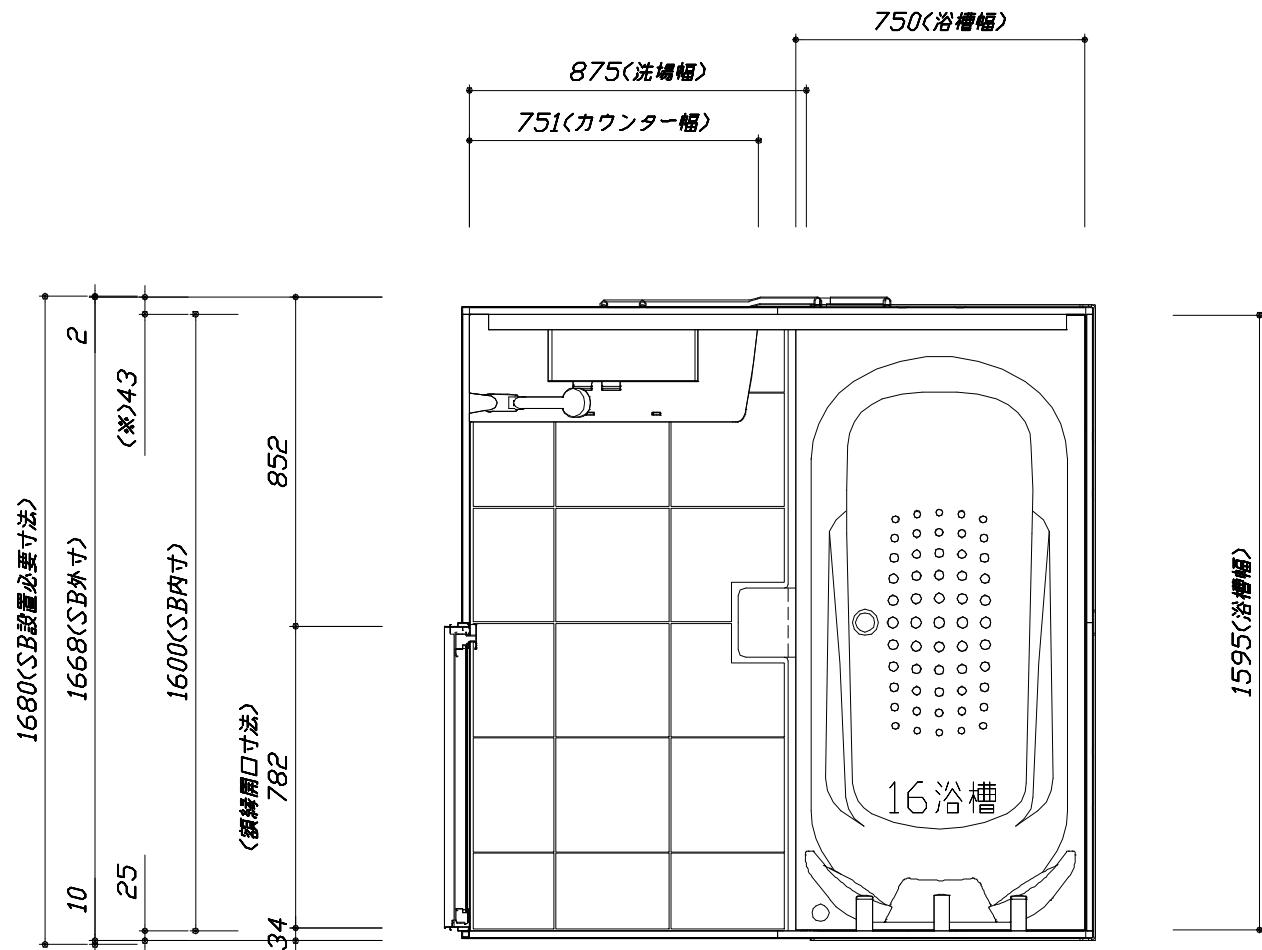

<平面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドファングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

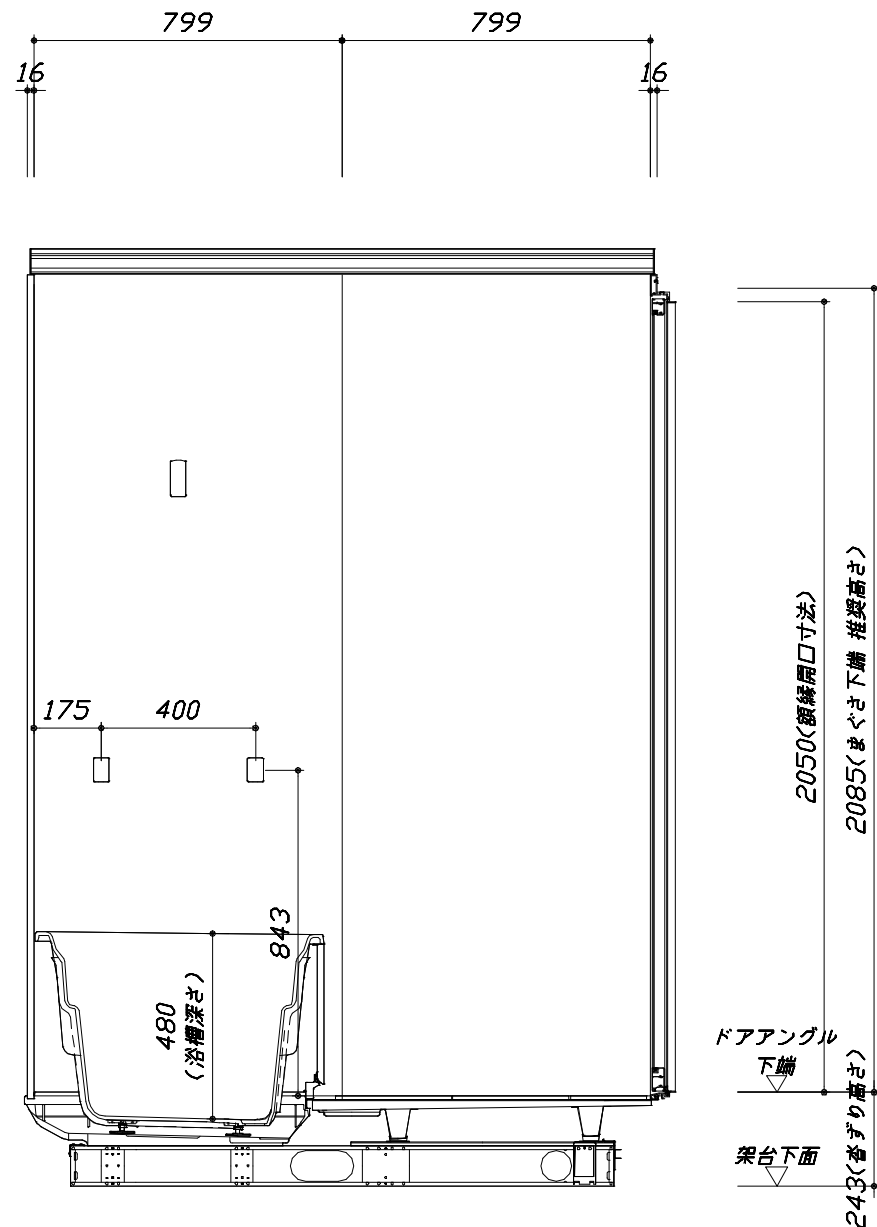

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

＜カウンタ－対面図＞

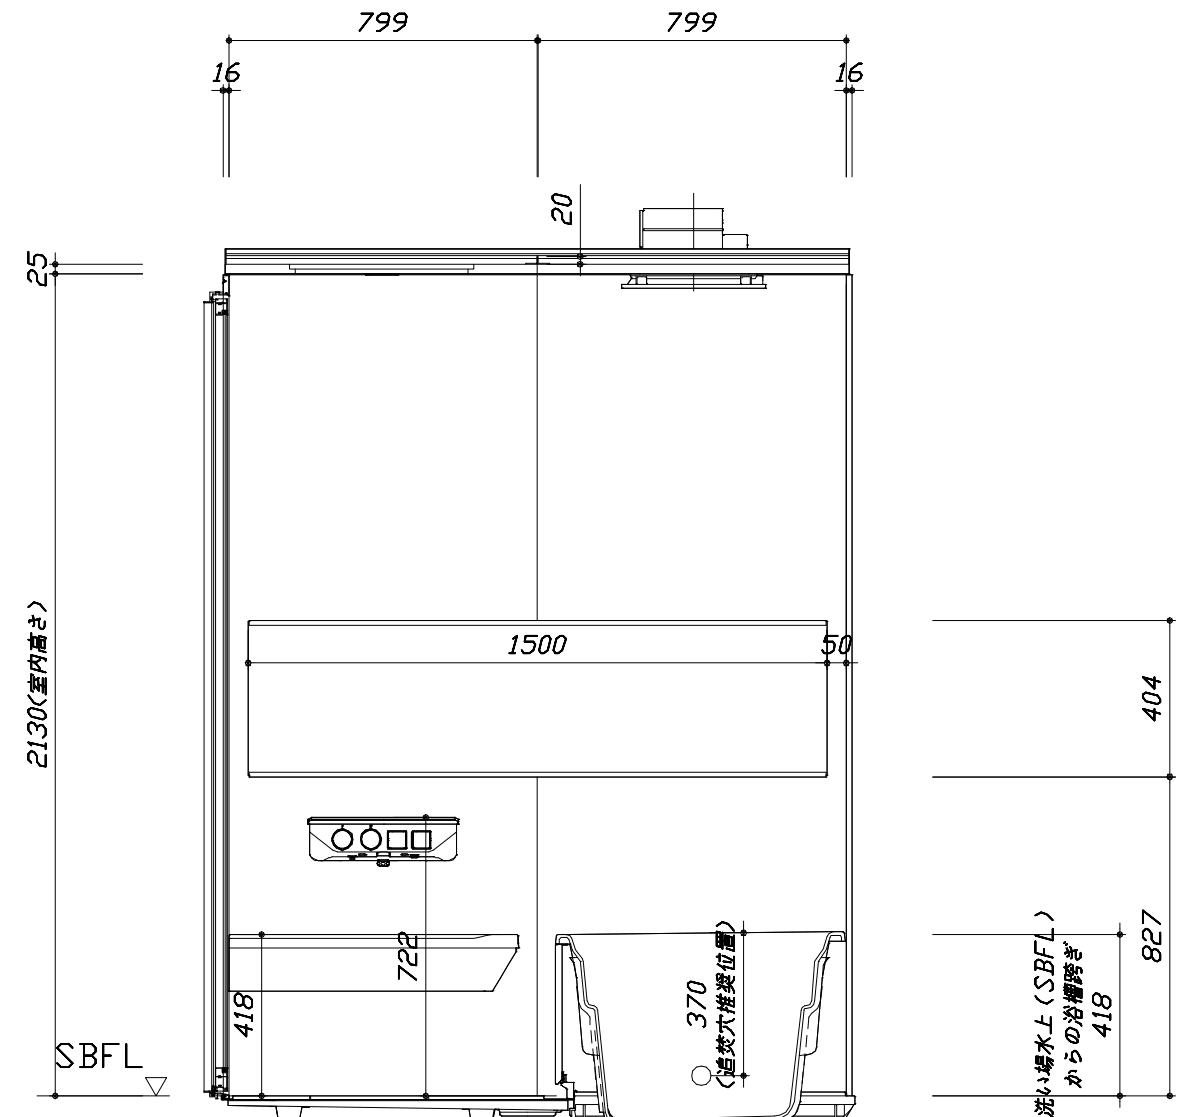


＜カウンタ一面図＞

 タカラストANDARD株式会社	現場名称： 群馬-高崎SR SB7様邸	GRANSPA グランspa	施工図2	縮 尺： 1:20
	現場番号： C2817648	プラン番号： 7401A-2505-0725T	作成日： 2025年6月12日	
	高崎営業所	担当営業： SB7	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

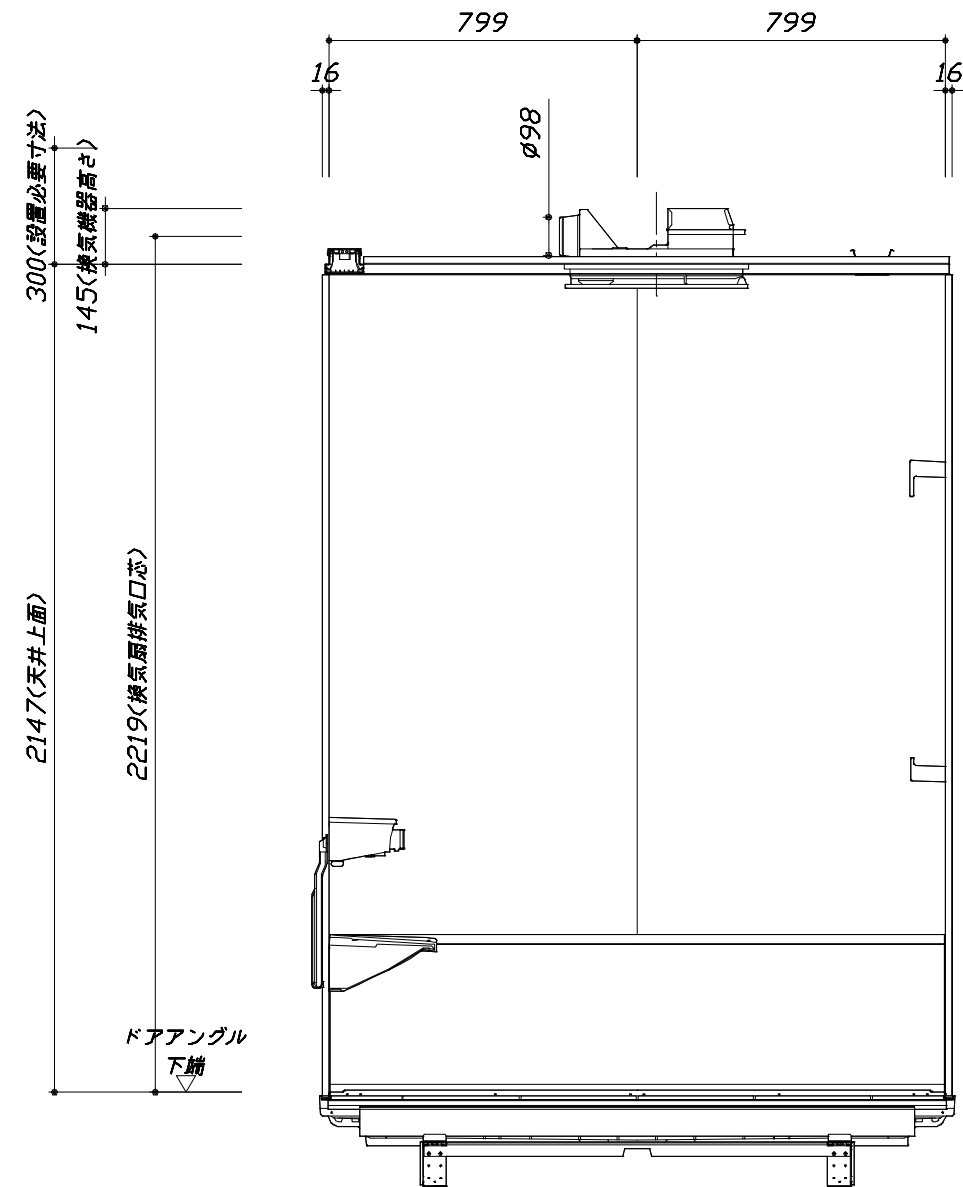

■土間コン仕上り寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

< 浴槽側面図 >

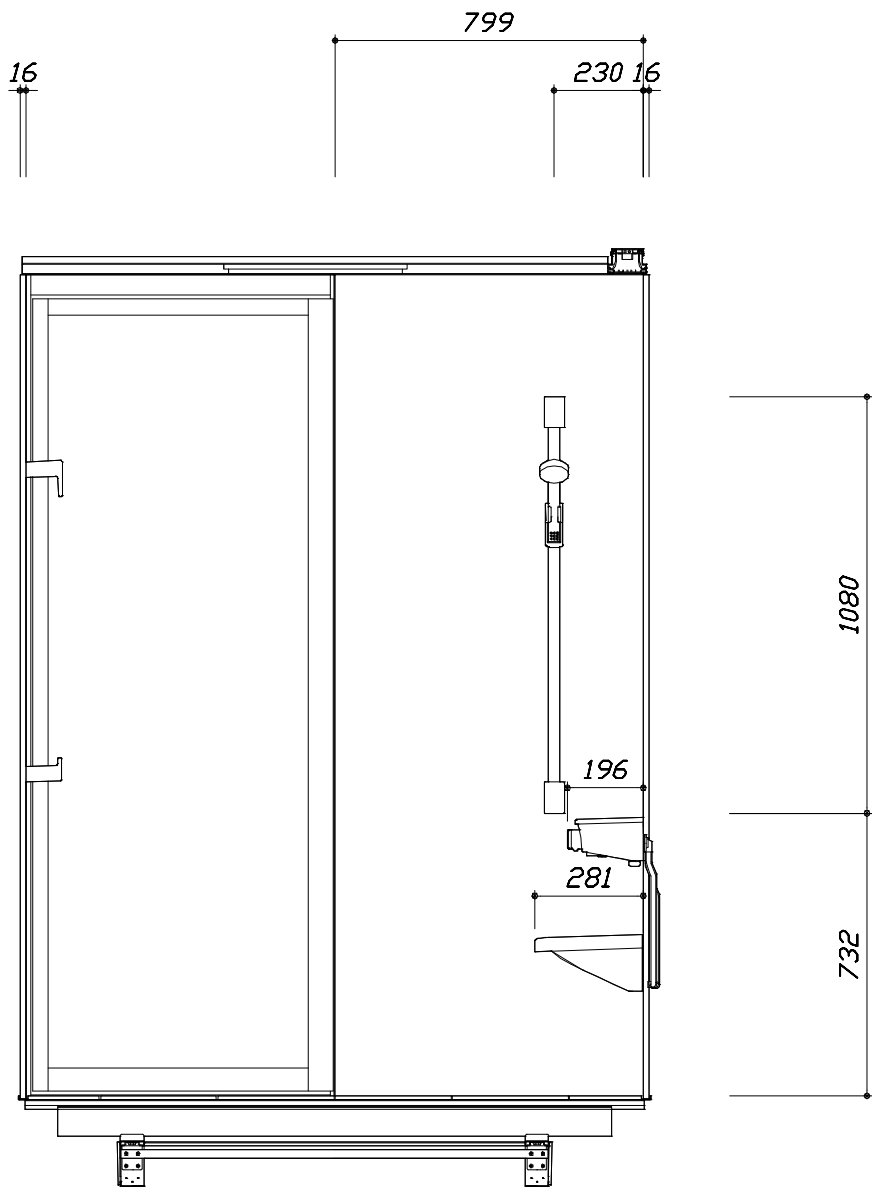

< 洗場側面図 >

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	BR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ラウンド浴槽（305リットル） 追い焚き穴:あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	人造大理石カウンター：人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア:20高さ開き戸(アルミ框/飛散防止フィルム付強化ガラス/ﾀﾅﾔ型換気口/ドア外ﾀﾞﾙ掛け付)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	洗い場：ＡＢＳ樹脂， 浴槽：ＡＳＡ樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	300kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ラグジュアリーミラー くもり止め加工（13W）
収納棚	－
タオル掛け	－
洗場側水栓	プッシュ式・サーモスタット(KVK FTB230KUFH)（樹脂ホース:ﾀﾞﾙ調）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ-T1020S MH）
照明	ストレーライン照明（LED 23.7W調光・調色機能付）
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V・最大消費電力1250W) (ﾀﾞﾙ外径φ98)（常時換気対応品）ブラック
フロフタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	WN：クリスタルパールホワイト
カウンター	KA：ダークグレー
ﾊﾟﾅﾙ(ｶｳﾝﾀｰ面)	JDS：ジオマーブルアイボリー
ﾊﾟﾅﾙ(周辺・3面)	VW：パールホワイト
水栓上部ｶｳﾝﾀｰ	KA：ダークグレー
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	XG：サンディグレー
ドア / 天井	W：ホワイト / B：チャコールブラック
収納棚	－
タオル掛け	－
ﾗﾝﾄﾞﾘｰセット	－

Takara standard タカラストانダード株式会社	現場名称： 群馬－高崎SR SB7様邸	GRANSPA グランspa	仕様表	
	現場番号： C2817648	プラン番号： 7401A-2505-0725T	作成日： 2025年6月12日	
	高崎営業所	担当営業：SB7	担当アドバイザー：	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
			架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置						□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置						□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置						□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】						□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】						□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】						□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付						□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】						□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付						□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】						□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】						□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填						□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】						□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事
		管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
			浴室用電源配線、接続工事					○		浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○		浴室全体の電気器具、配線接続工事

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。




■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

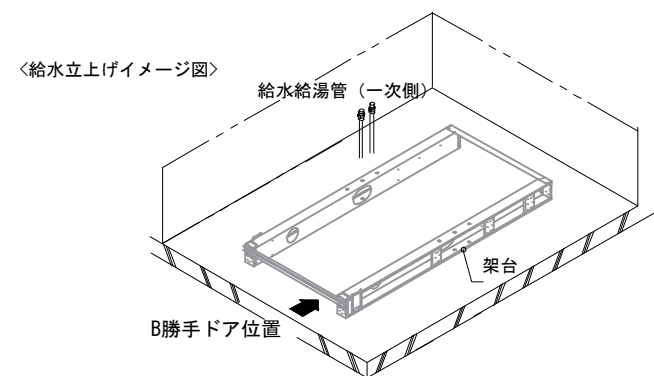




■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

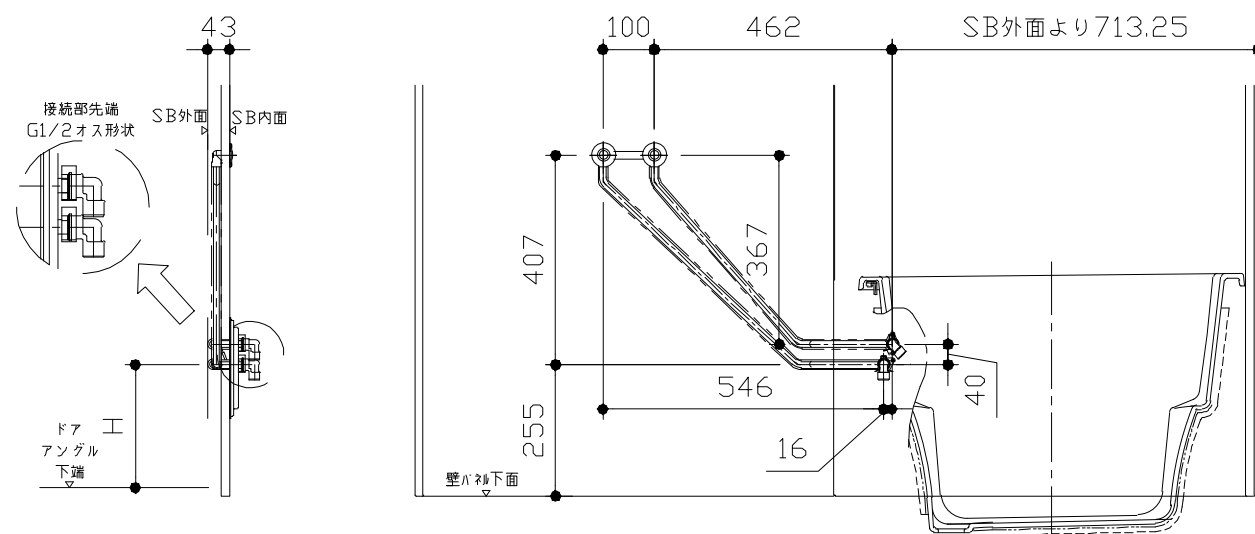

ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230



＜給水給湯管取合詳細図＞

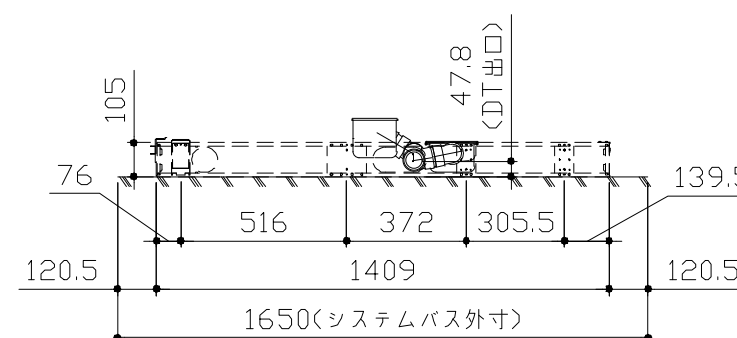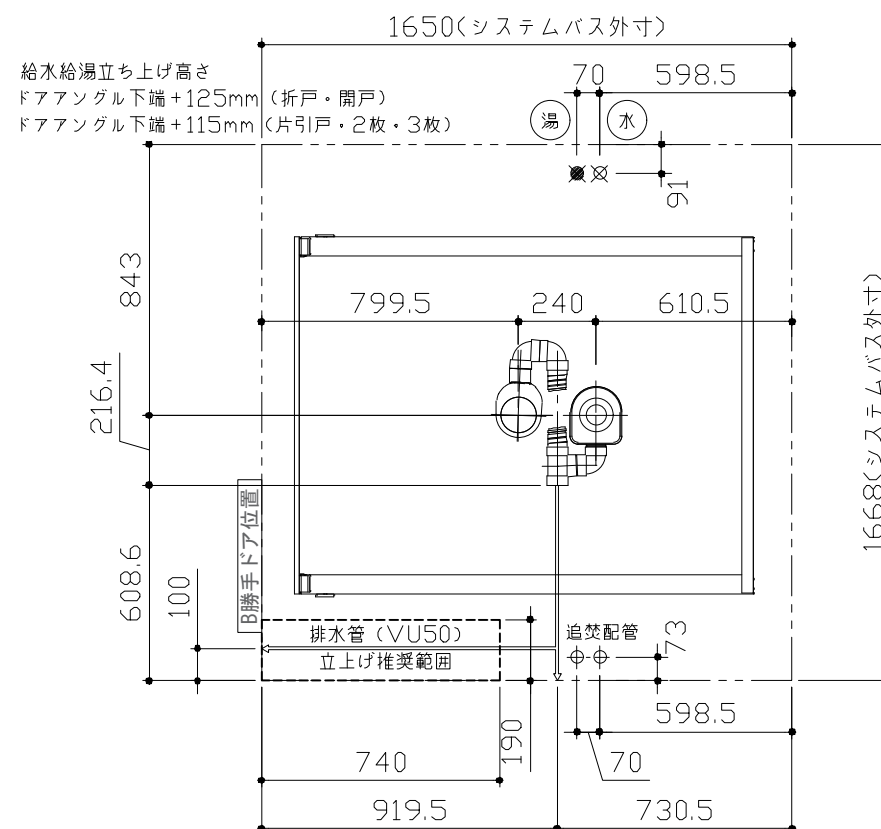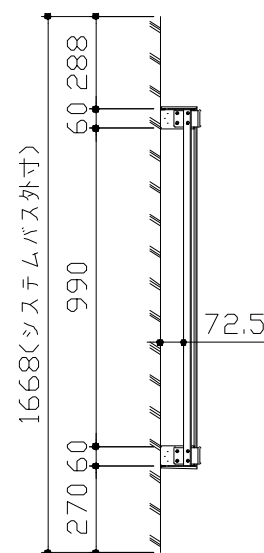

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置




■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

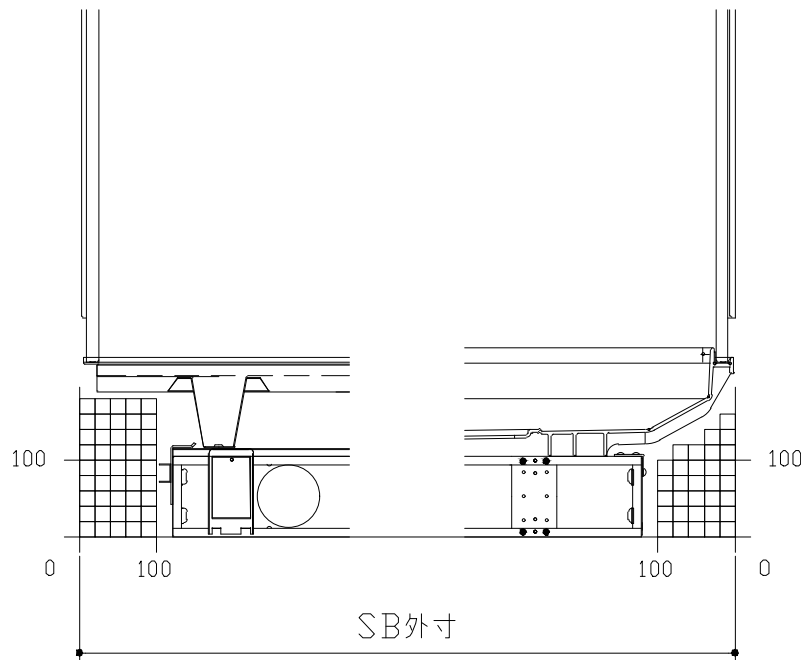


B矢視

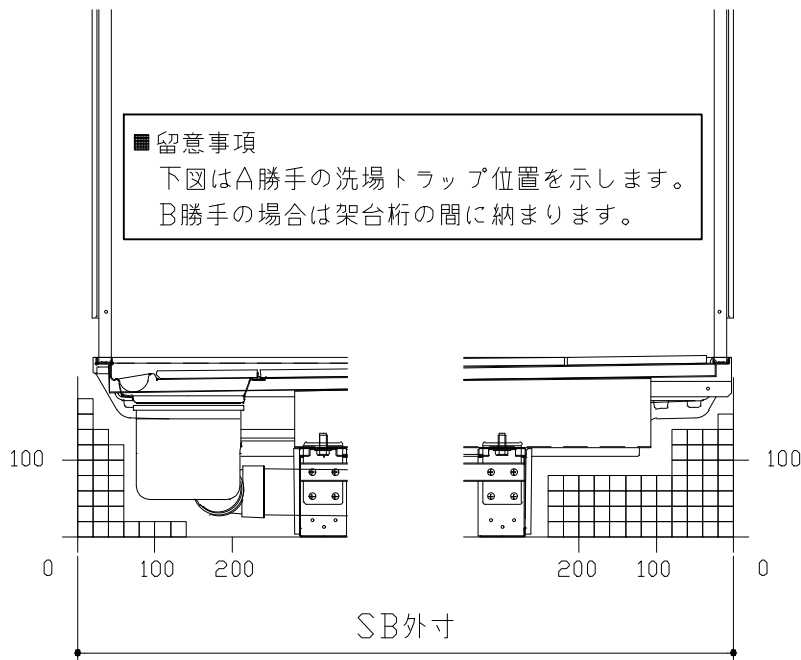


D矢視

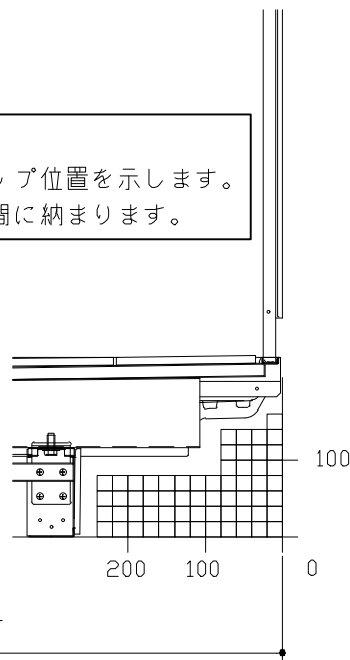

C矢視

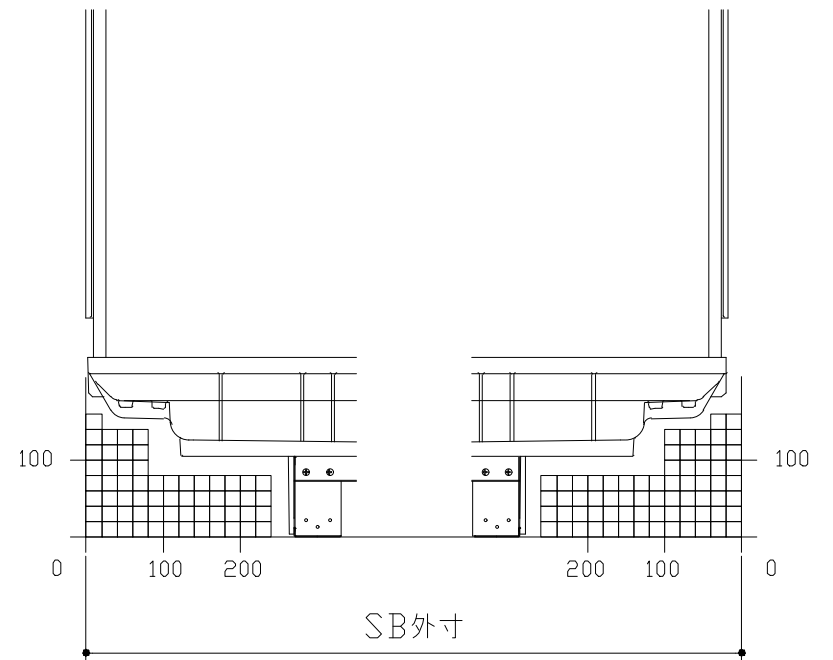

F矢視


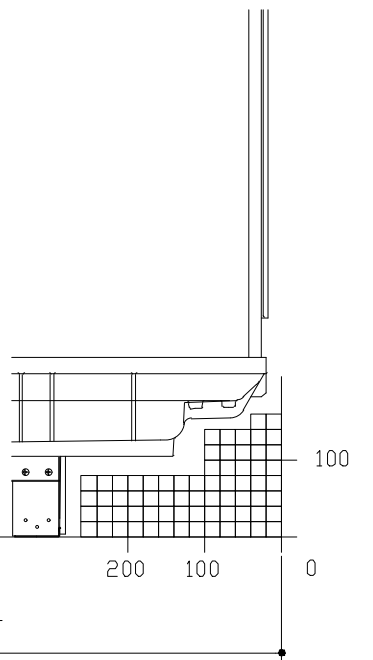


E矢視

■留意事項
下図はA勝手の洗場トラップ位置を示します。
B勝手の場合は架台桁の間に納まります。


キープクリーンドア：開き戸・タテ型換気口

有効開口寸法720mm

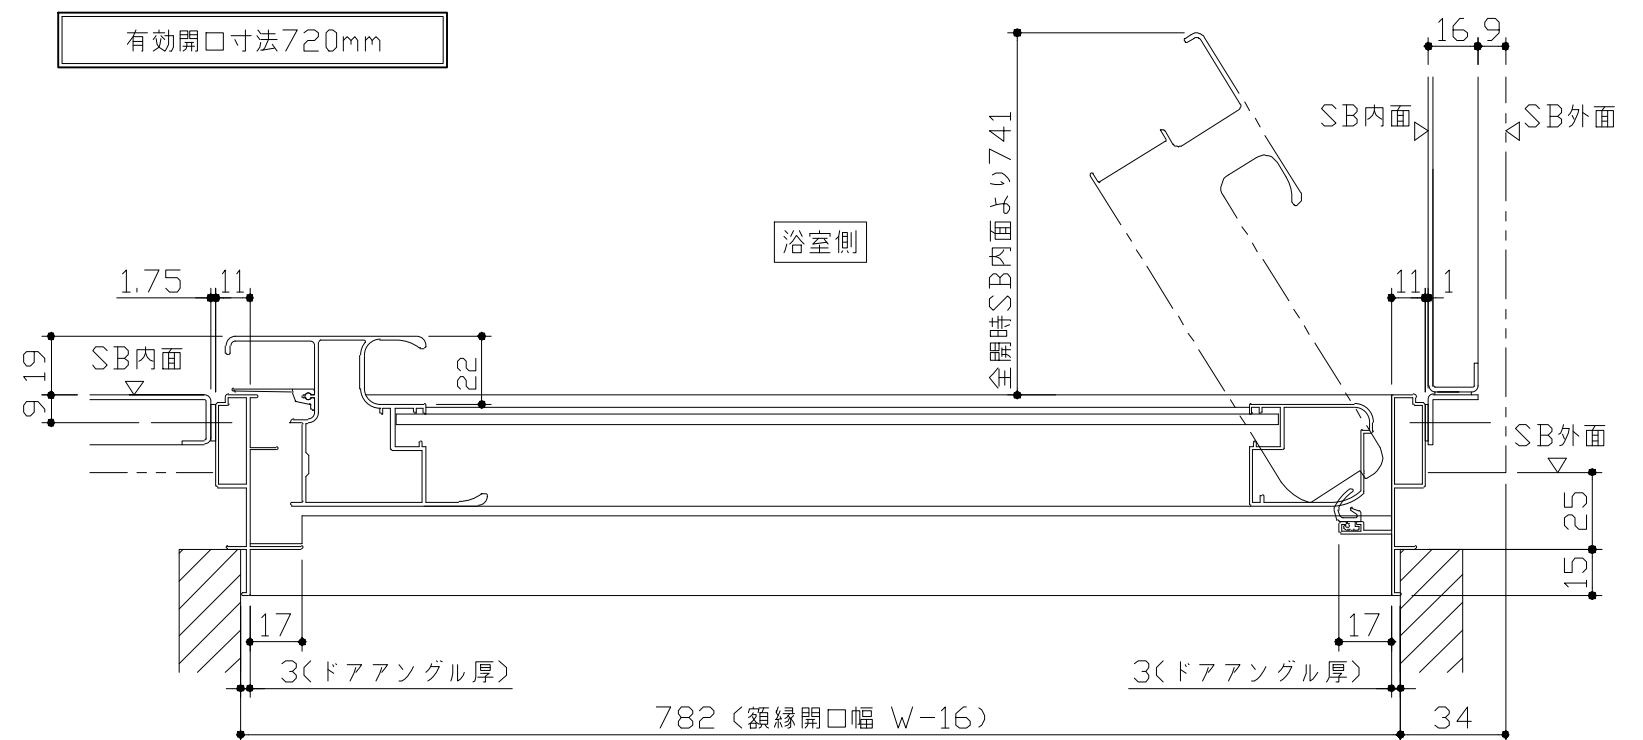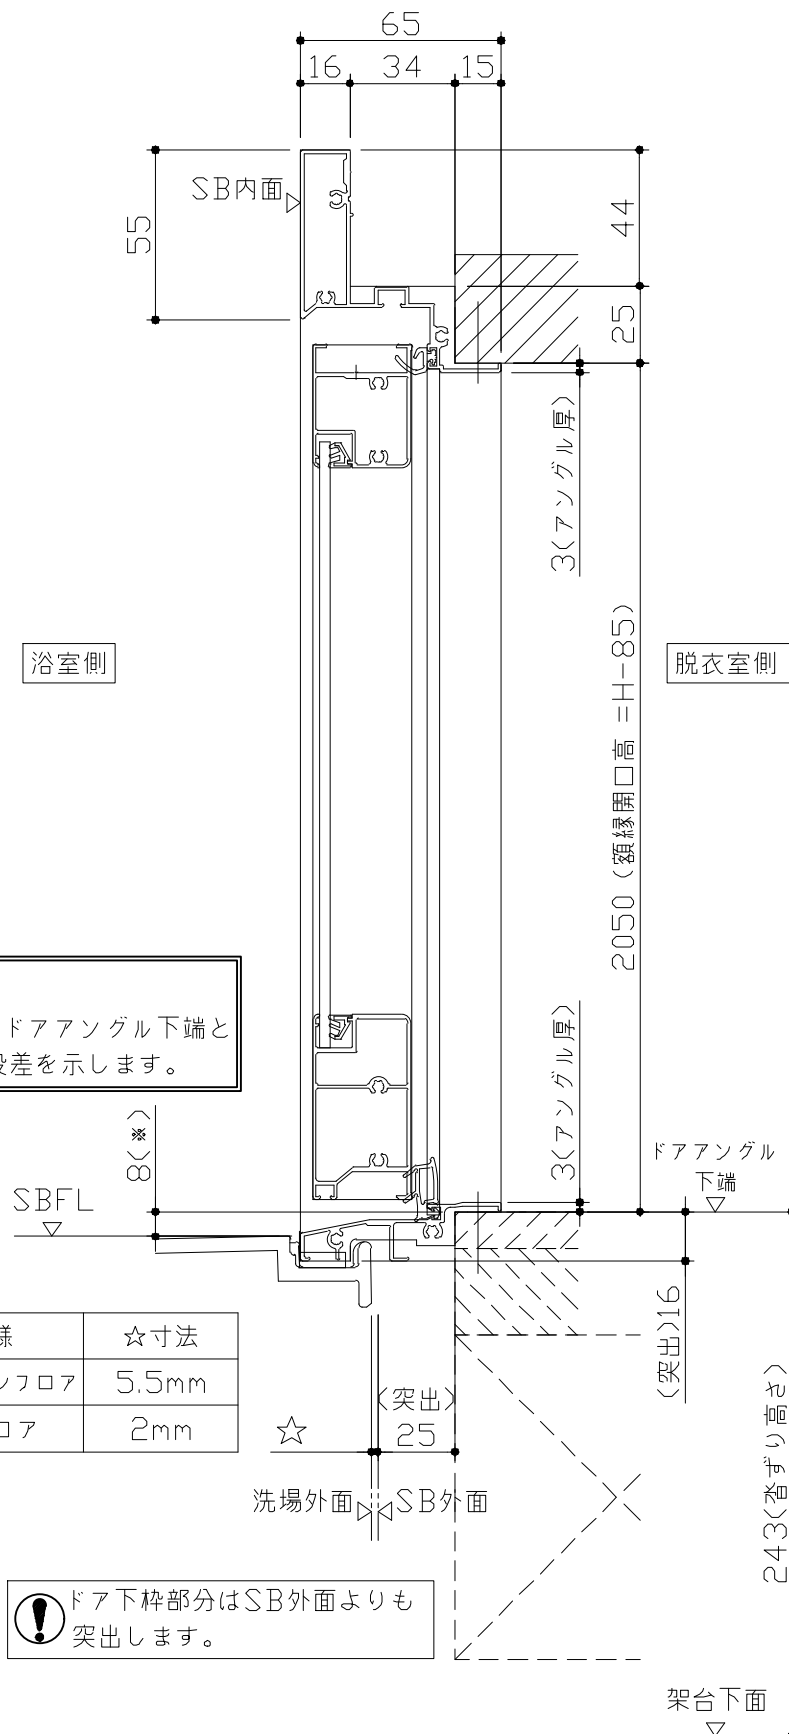


ドア開き角度65°以上でタオル掛けと干渉の恐れがあります。

■ ドアの開閉について
 ドアの開閉スペースにご注意ください。
 ユニットサイズや収納棚やカウンターなどの
 アクセサリーにより出入りに支障を感じる
 場合があります。

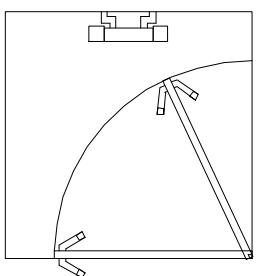

■ ドア横の管柱、間柱について
 ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体
 状況によって異なる場合があります。

＜参考寸法図＞



浴室側


＜姿図＞

Takara standard
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 群馬－高崎SR SB7様邸
 現場番号： C2817648
 高崎営業所


GRANSPA グランspa
 プラン番号： 7401A-2505-0725T
 担当営業： SB7

ドア取合詳細図
 作成日： 2025年6月12日
 担当アドバイザー：

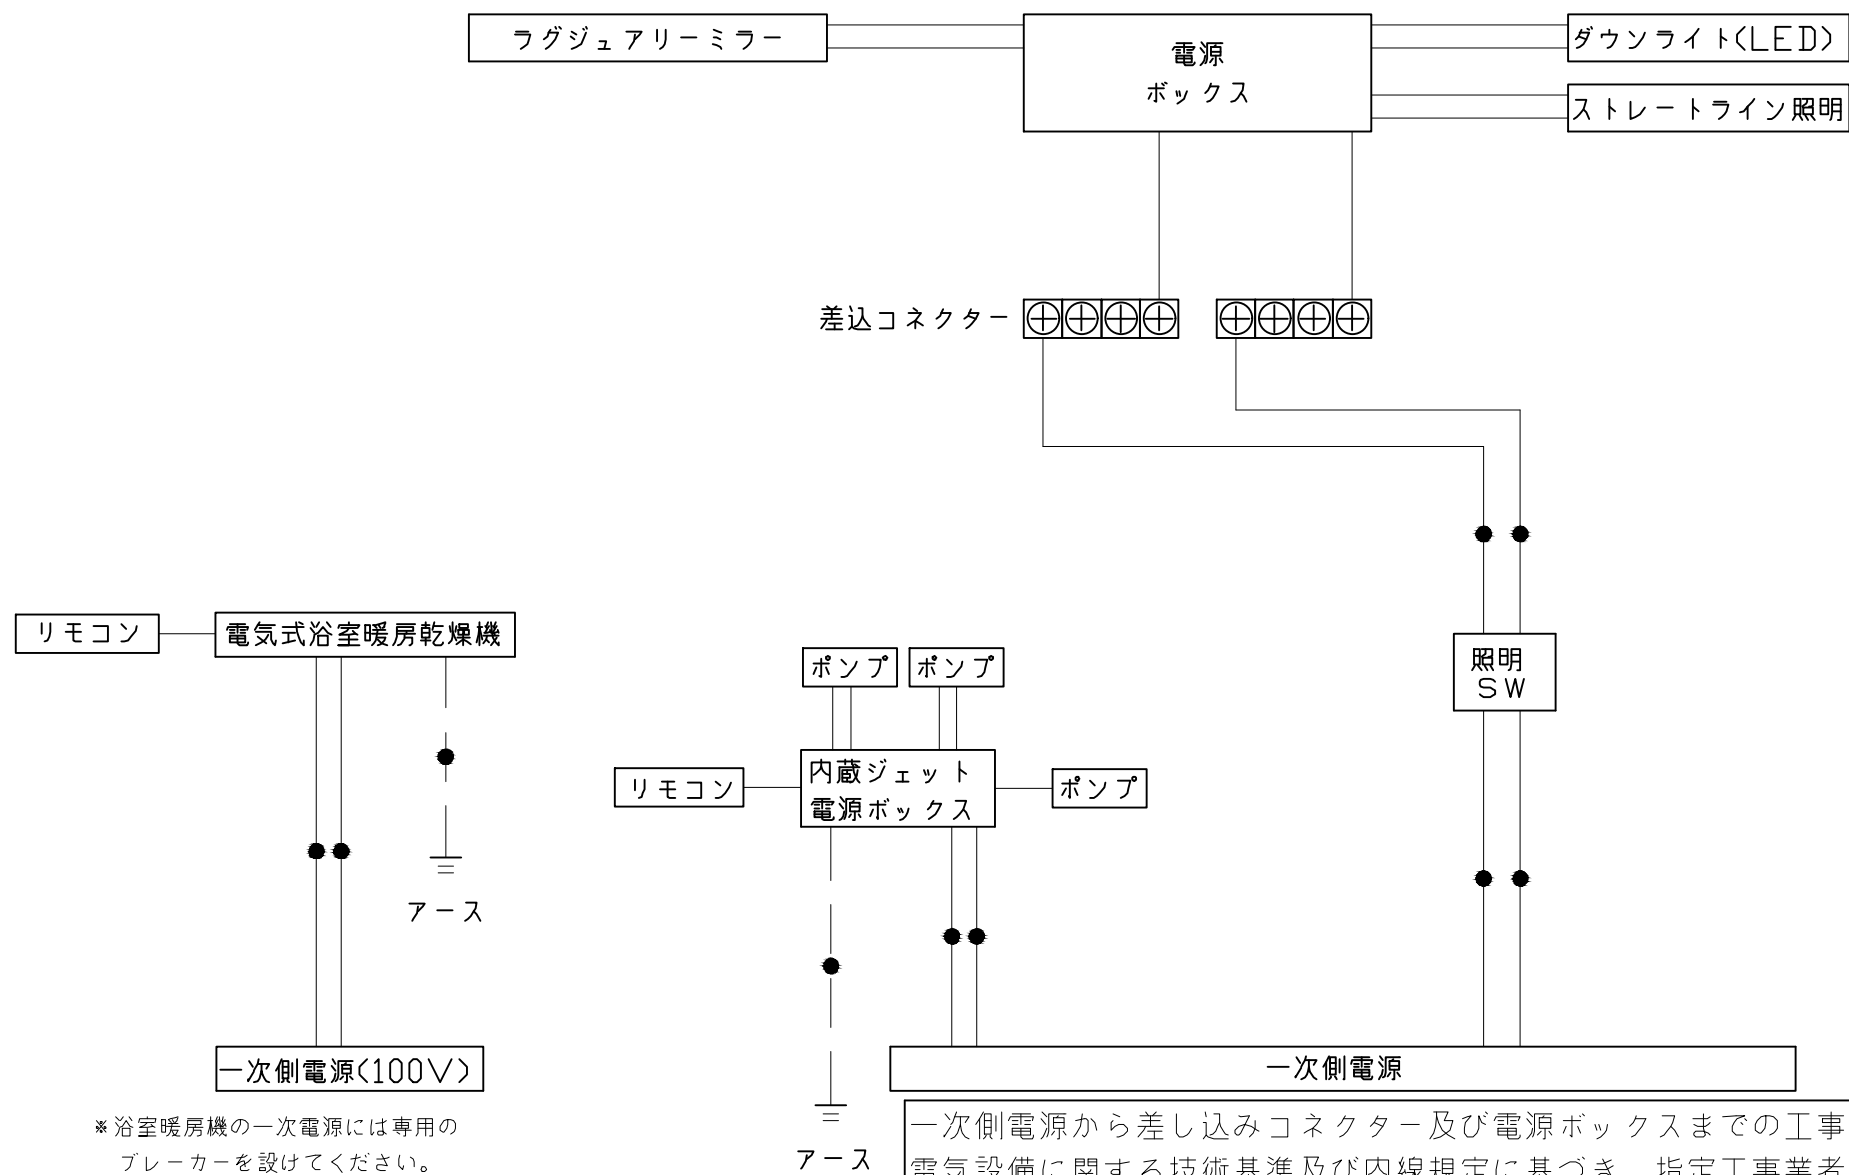


アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

浴槽

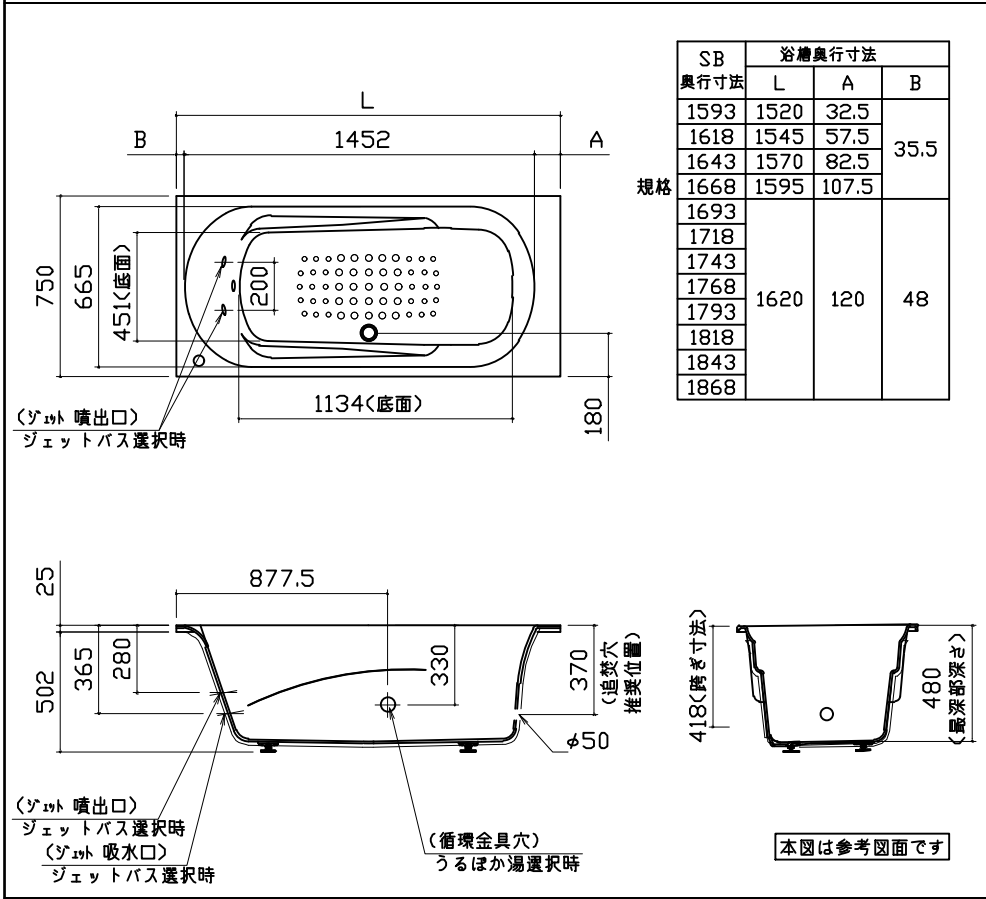

洗い場用水栓

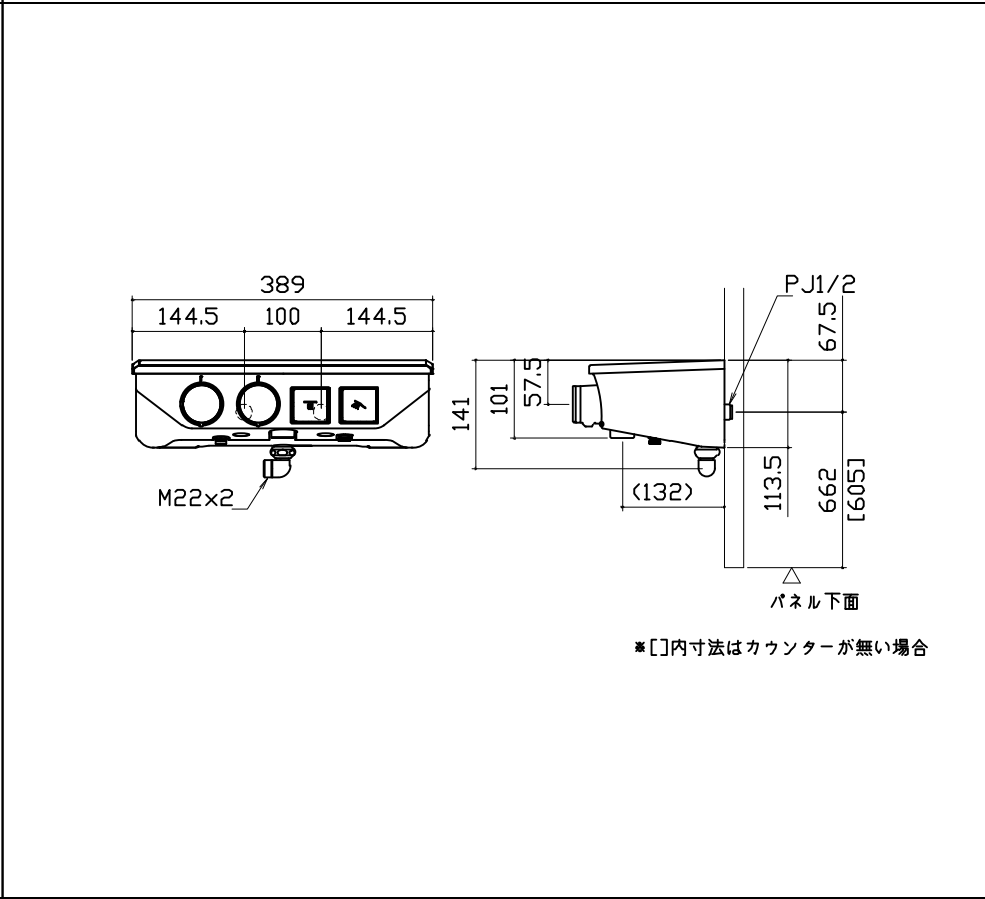

照明

ストレーツライン照明
LED 23.7W (ダウンライト1灯含む)


天井厚み 25 40 100 1618 100

ダウンライト


φ75 (天井開口)

天井厚み 25 63.6 5.7 φ90

換氣機器

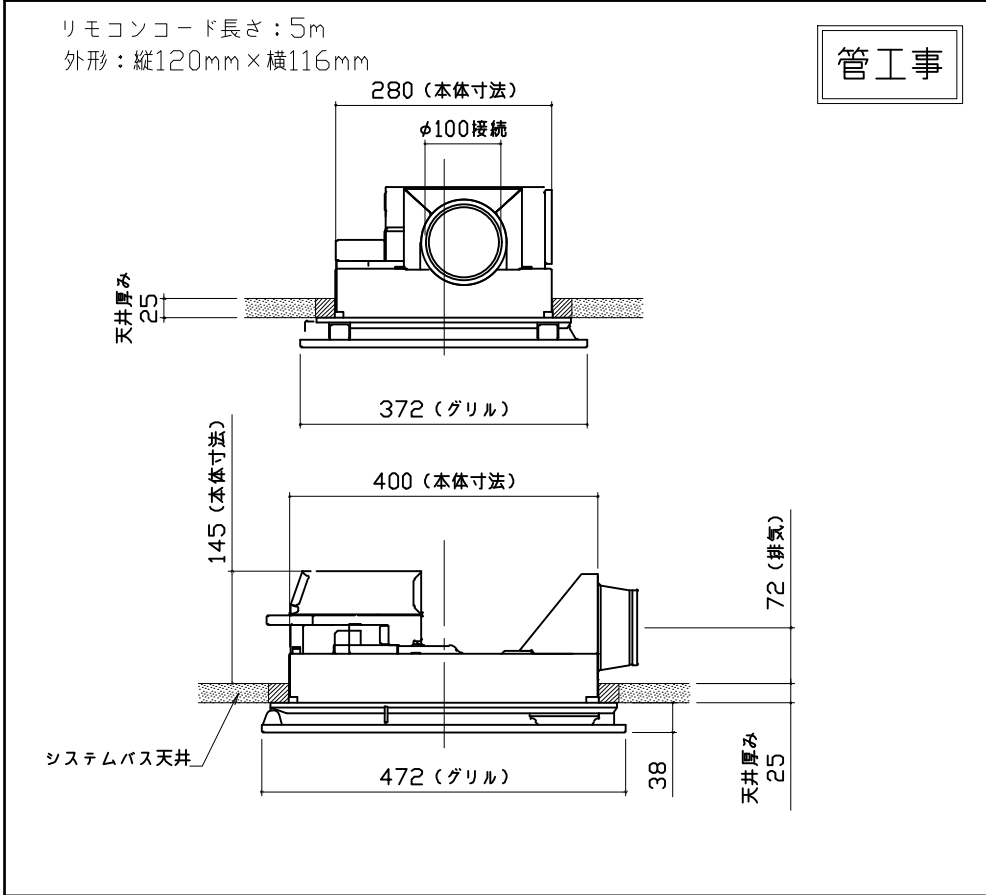

シャーフックスライドバー







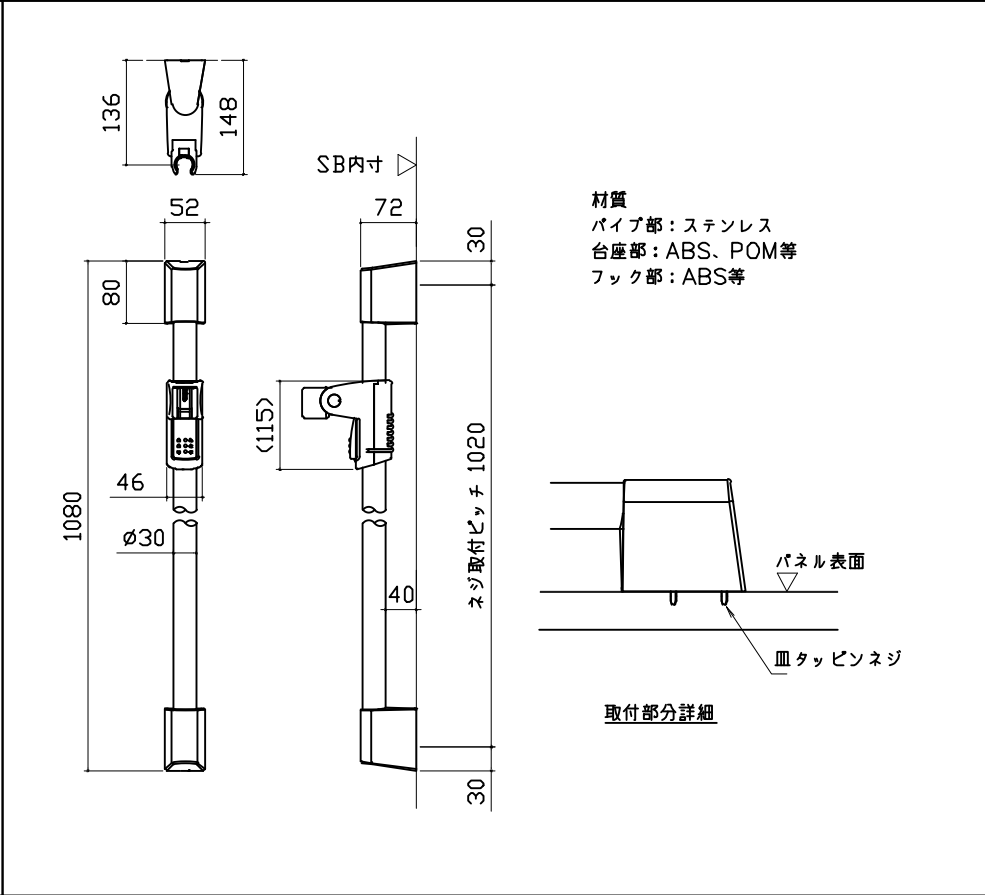


ミラー

枠: SUS304 t0.8, PMMA
 ミラー: 表面防曇コートあり
 LED: 13W

The drawing shows a side view of the mirror unit with the following dimensions:

- Overall width: 1500 (鏡本体)
- Overall height: 400 (鏡本体)
- Top flange height: 14.5
- Main mirror height: 359
- Bottom flange height: 30.5 (鏡)
- Horizontal spacing from left edge to first mounting hole: 79
- Spacing between mounting holes: 470
- Distance between the two main mirror sections: 401.5
- Spacing between mounting holes: 470
- Distance from last mounting hole to right edge: 79
- Mounting hole pitch: (取付穴ピッチ)
- Overall depth: 41

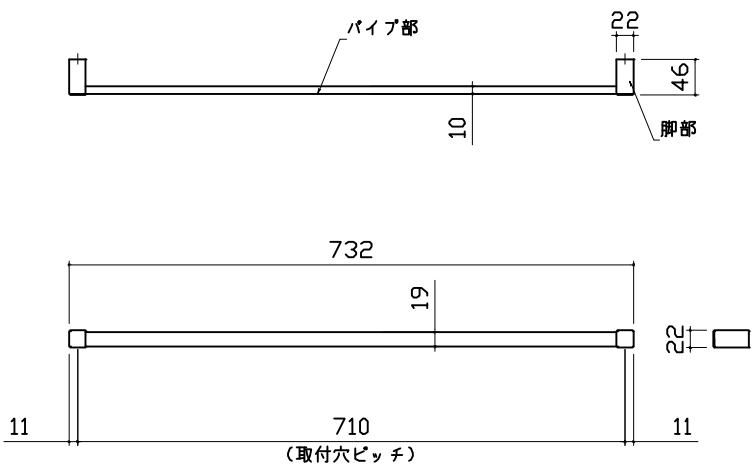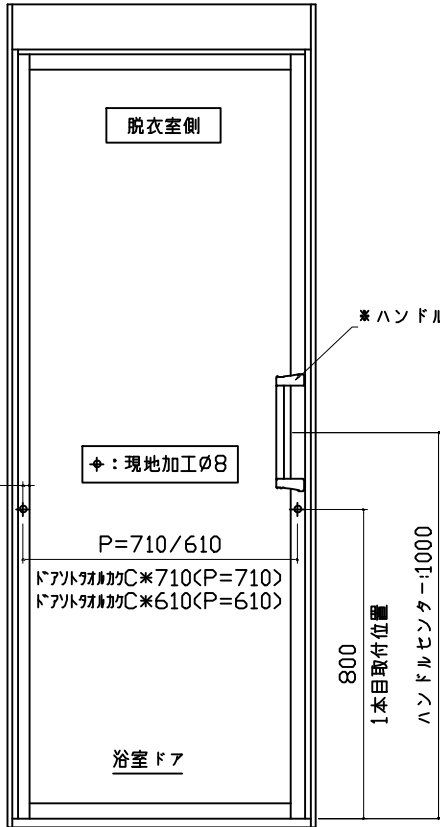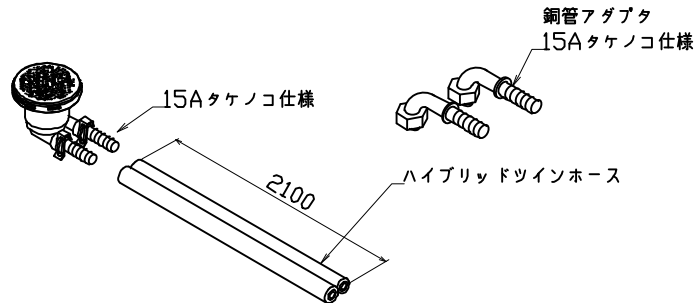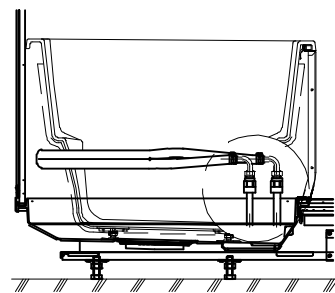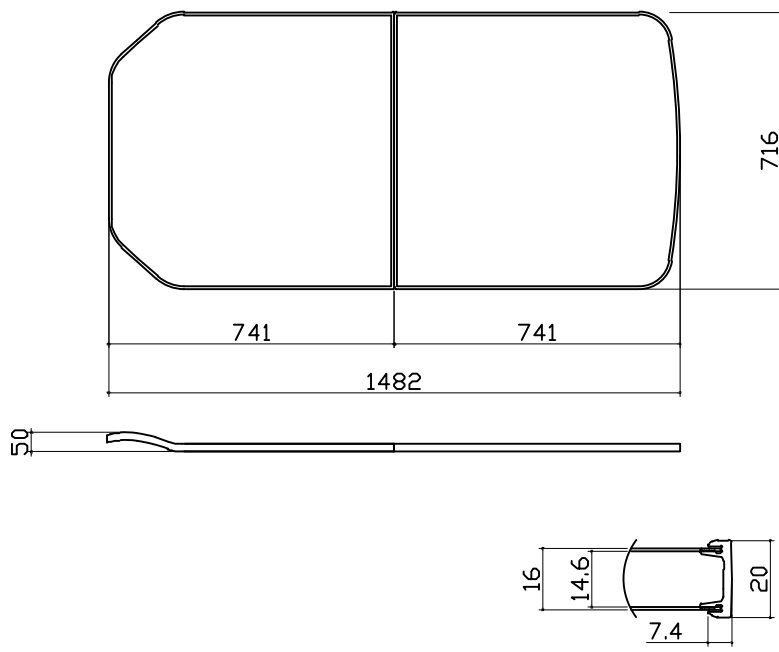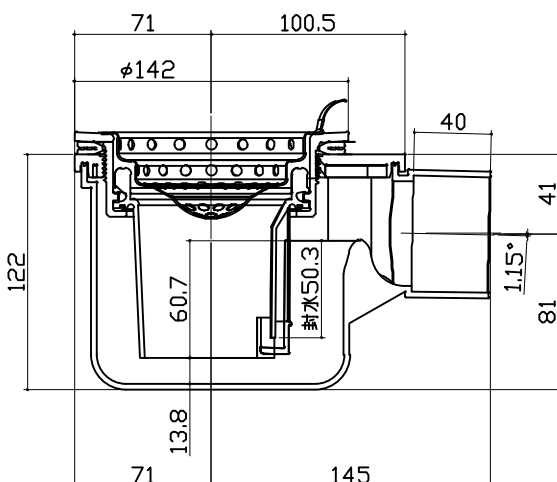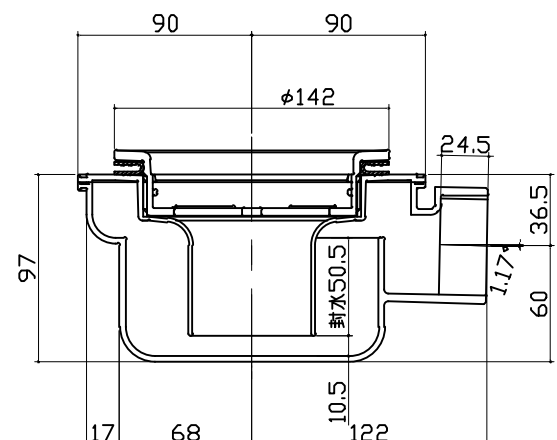ドア外タオル掛け		ドア外タオル掛け 設置位置		循環金具・フロアダプタ関連	
パイプ部材質：ステンレス（ヘアライン仕上げ） 脚部材質：ABS  パイプ部 脚部 732 19 710 （取付穴ピッチ） 11 11 22 46 10 22		 脱衣室側 ※ ハンドル ◆：現地加工φ8 P=710/610 ドア外タオル掛けC※710（P=710） ドア外タオル掛けC※610（P=610） 浴室ドア 800 1本目取付位置 ハンドルセンター：1000 ※ドア端によりハンドルが無い仕様があります。 ドア吊元枠内側より 15（ハンドル無仕様の場合） 13.5（ハンドル有仕様の場合）		 銅管アダプタ 15Aタケノコ仕様 15Aタケノコ仕様 ハイブリッドツインホース 2100  追焚配管立上図	
風呂蓋 フロアMDVH-16KT		洗い場側排水トラップ		浴槽側排水トラップ	
 716 741 741 1482 50 16 14.6 7.4 20 断面図		 71 100.5 φ142 40 41 1.15° 81 122 60.7 排水50.3 13.8 71 145		 90 90 φ142 24.5 36.5 1.17 60 97 17 68 10.5 122 排水50.5	
Takara standard タカスタンダード株式会社		現場名称： 群馬－高崎SR SB7様邸 現場番号： C2817648 高崎営業所		GRANSPA グランspa プラン番号： 7401A-2505-0725T 担当営業：SB7	
				部材詳細図	2/3
				作成日： 2025年6月12日	
				担当アドバイザー：	

肩包み湯①

リモコン（浴室内設置）

ポンプ（浴槽に組み付け）

電源ボックス（天井上設置）

リモコンケーブル

電動弁ケーブル（2本）

ポンプ電源ケーブル

272

150

120.5

2カ所噴流ジェットポンプ仕様	
ポンプ品番	HJPN-100K
電源電圧	AC100V
周波数	50/60 Hz共通
流量	36 L/min
消費電力	130W
振動	定格運転時にて15μ以下
常用使用最高水温	45℃

※ 朝日興業製

肩包み湯②

現地組付け部材

クッションビロー（浴槽に組付け）
本体：発泡PE

肩湯セットK（浴槽に組付け）
本体：SAS

肩包み湯③

【工事範囲】
当施工事範囲

1. 電源ボックスの取付
2. ポンプ電源ケーブルの配線及びポンプユニットと電源ボックスの接続
3. 電動弁ケーブルの配線及び電動弁と電源ボックスの接続
4. リモコンケーブルの配線、電源ボックス及びリモコンの接続
5. リモコンの取付

電気工事業者様 工事範囲

1. 電源ボックスへ一次側100Vの接続
2. アース工事
3. 電源回路に漏電遮断機の設置

■ 留意事項
(1) ポンプユニットは、工場で浴槽に組み付けられています。

電気工事

ポンプユニット

電気工事

アース線

一次側100V

電源ボックス

ポンプ電源ケーブル（5m）

電動弁ケーブル（5m）

タカフ

リモコンケーブル（5m）

リモコン

ポンプ電源ケーブル（現場でポンプと接続）

電動弁ケーブル（現場で電動弁と接続）

ポンプユニット（工場で組み付け）

Takara standard

タカラスタンダード株式会社

現場名称： 群馬－高崎SR SB7様邸

現場番号： C2817648

高崎営業所

GRANSPA グランspa

プラン番号： 7401A-2505-0725T

担当営業：SB7

部材詳細図

3/3

作成日： 2025年6月12日

担当アドバイザー：

パネル割図		ミラー		シャワーフックスライドバー	
ハネK16C2B 0799 L<JDS ハネK16C1G 0799 R<JDS ハネK16A 0799 <VW ハネK16NW 0799 <VW ハネK16NW 0799 <VW ハネK16AD 0799 <VW ハネK16A 0799 <VW BR勝手		ハネK16C2B 0799 L<JDS ハネK16C1G 0799 R<JDS ※：現地加工φ18 ・：現地加工φ3.5		ハネK16A 0799 <VW	
風呂蓋収納					
ハネK16AD 0799 <VW ■留意事項 タオルカケ・ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。					
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 群馬－高崎SR SB7様邸	GRANSPA グランspa	穴開け指示図	1/1
現場番号： C2817648		高崎営業所	プラン番号： 7401A-2505-0725T	作成日： 2025年6月12日	
			担当営業：SB7	担当アドバイザー：	
