

システムバス 御見積書

御名前 北陸-敦賀SR SB2 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランspa

作成日 2025年8月9日
プラン番号 1610F-2506-0026T
現場番号 C3491320

タカラスタANDARD株式会社
◆敦賀営業所
福井県敦賀市古田刈66号1210番地
TEL 0770-22-9661 / FAX 0770-25-5330

◆敦賀ショールーム
TEL 0770-25-8988 / FAX 0770-25-8033

商品
御見積金額 ￥1,483,700 (税込 ￥1,632,070)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥212,500 (税込 ￥233,750)
《参考》別途 現場配送費 ￥8,000 (税込 ￥8,800)

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616 (AR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	チェッポビアンコ
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	クリスタルパールホワイト
浴槽形状	ラウンド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ダークグレー / ブラック
浴槽前カウンターカラー	ー
エブロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ジオマーブルアイボリー
パネルカラー(周辺)	パールホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 60Hz

◆ 御確認事項

☆御見積りの商品は受注生産品の為、納期は約3週間程度いただきます。
☆納入後、訪問による取扱説明が必要な場合は別途費用¥20,000にて承ります。
☆商品の仕様・価格等は予告なく変更する事があります。ご購入の際には、弊社支店
営業所等へお問い合わせ、またはカタログにてよく御確認下さるようお願い致します。
★この御見積書の仕様は2025年8月25日より受注開始となります。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
SB2	1616	2022.9

◆ 備考

--	--

No.*

御名前 北陸-敦賀SR SB2

様

現場番号	C3491320	プラン番号	1610F-2506-0026T	作成日	2025/8/9
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	769,000	769,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・周辺ハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・チェッポビアンコ)	1	+29,000	+29,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(クリスタルパールホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
11	浴槽形状	人大ラウンド浴槽(ベンチ付)	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	あり クッションピロー:チャコールグレー	1	+199,000	+199,000
14	うるぽか湯	なし	1		
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
17	浴槽パン	あり	1		
18	洗い場用水栓	タッチ水栓:樹脂製ホース(メタル調)FTB230K 水栓上部カウンター(ダークグレー)	1	+91,000	+91,000
19	洗い場用水栓	ウルトラファインバブルシャワー hadamo:KVK FTB230KUFH	1	+21,000	+21,000
20	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
21	カウンター	人造大理石カウンター	1		
22	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
23	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザイン 周辺ハイクラス)(Kパネル)	1	+55,000	+55,000
24	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
25	窓枠フリー	窓枠フリー(樹脂タイプ)L1512 B<ブラック色>	1	+21,000	+21,000
26	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
27	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ブラック	1	+52,500	+52,500
28	換気機器	ランドリーパイプメタルタイプ(1本)	1	+1,500	+1,500
29	換気機器開口	工場開口	1		
30	照明	ストレートライン照明(調光・調色機能付・ラグジュアリーミラー対応用)	1	+91,000	+91,000
31	天井照明開口	工場開口	1		

御名前 北陸-敦賀SR SB2 様

現場番号	C3491320	プラン番号	1610F-2506-0026T	作成日	2025/8/9
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	ミラー	ラグジュアリーミラー(全幅タイプ)	1	+117,000	+117,000
33	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
34	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
35	収納棚	収納棚なし	1		
36	どこでもラック	タオルハンガーL(チャコールグレー)	1	+2,800	+2,800
37	どこでもラック	小物置きL(チャコールグレー)	1	+3,400	+3,400
38	風呂フタフック	風呂フタフック(固定式)(ホワイト)	1	+4,000	+4,000
39	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
40	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
41	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			41		¥1,483,700

商品総合計	41	¥1,483,700
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費

¥212,500 (税込 ¥233,750)


《参考》別途 現場配送費

¥8,000 (税込 ¥8,800)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

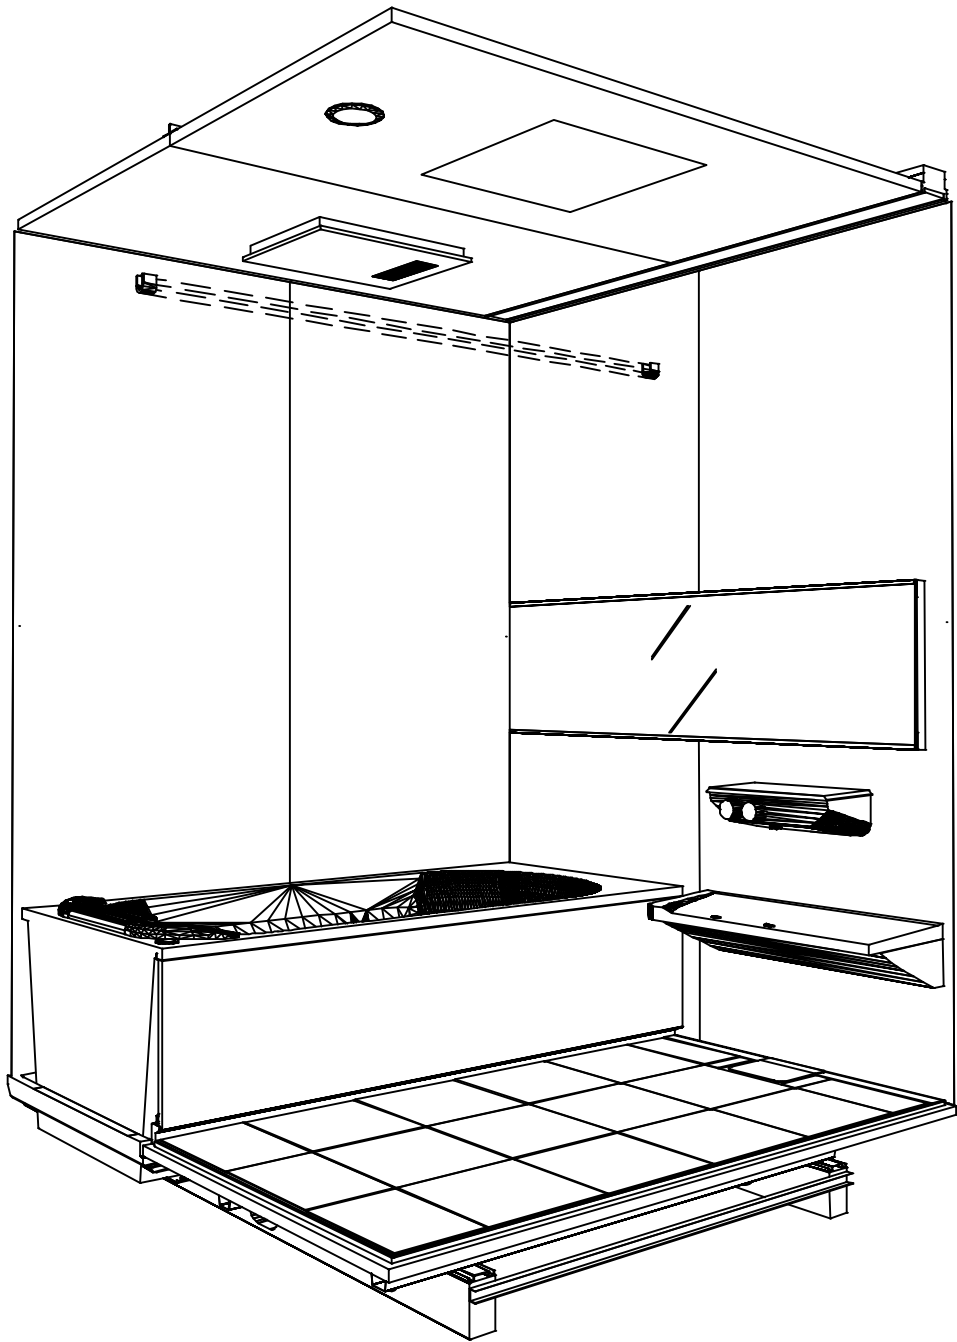

鳥瞰図

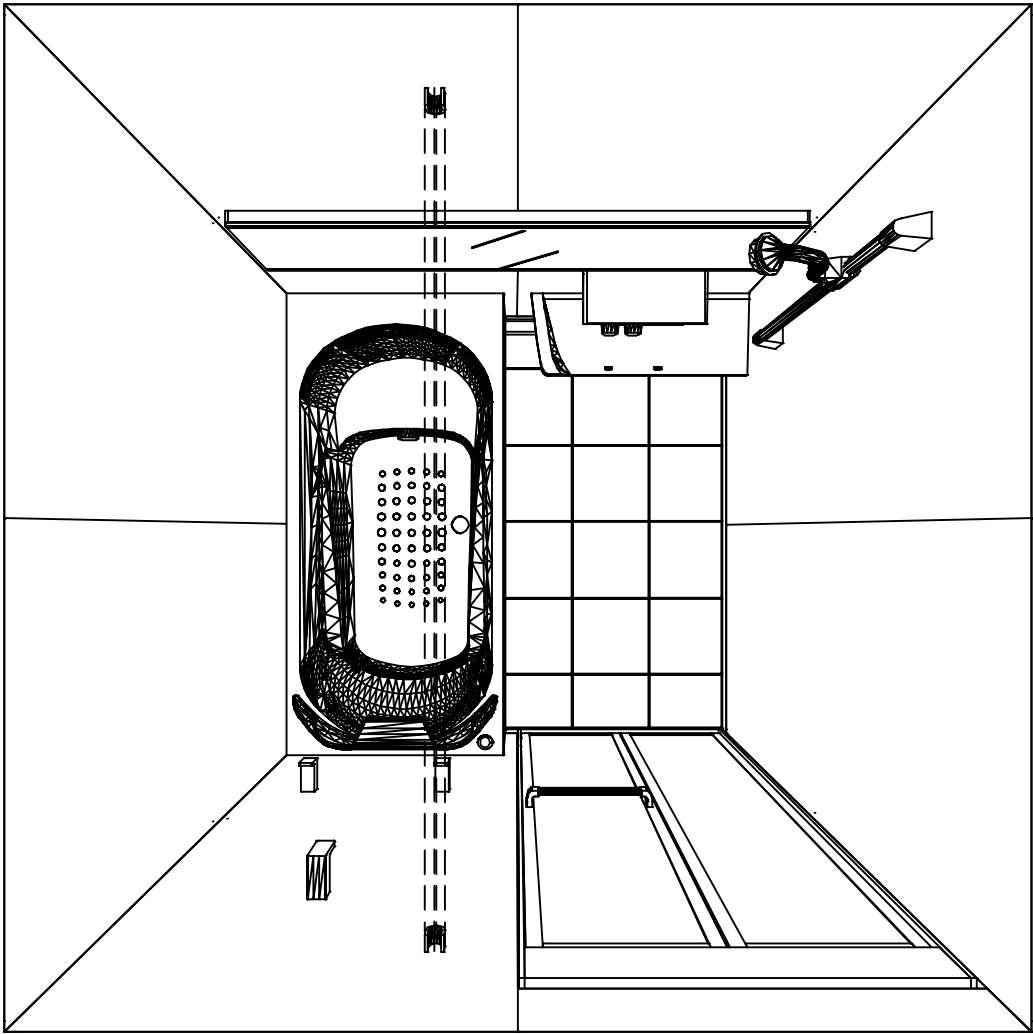

1616

フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： 北陸-敦賀SR SB2様邸	GRANSPA グランspa	姿図	
現場番号： C3491320	プラン番号： 1610F-2506-0026T	作成日： 2025年8月9日	
敦賀営業所	担当営業 : SB2	担当アドバイザー： 1616	

カウンター面


浴槽側面

洗場側面


カウンター対面

■ 留意事項



* 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

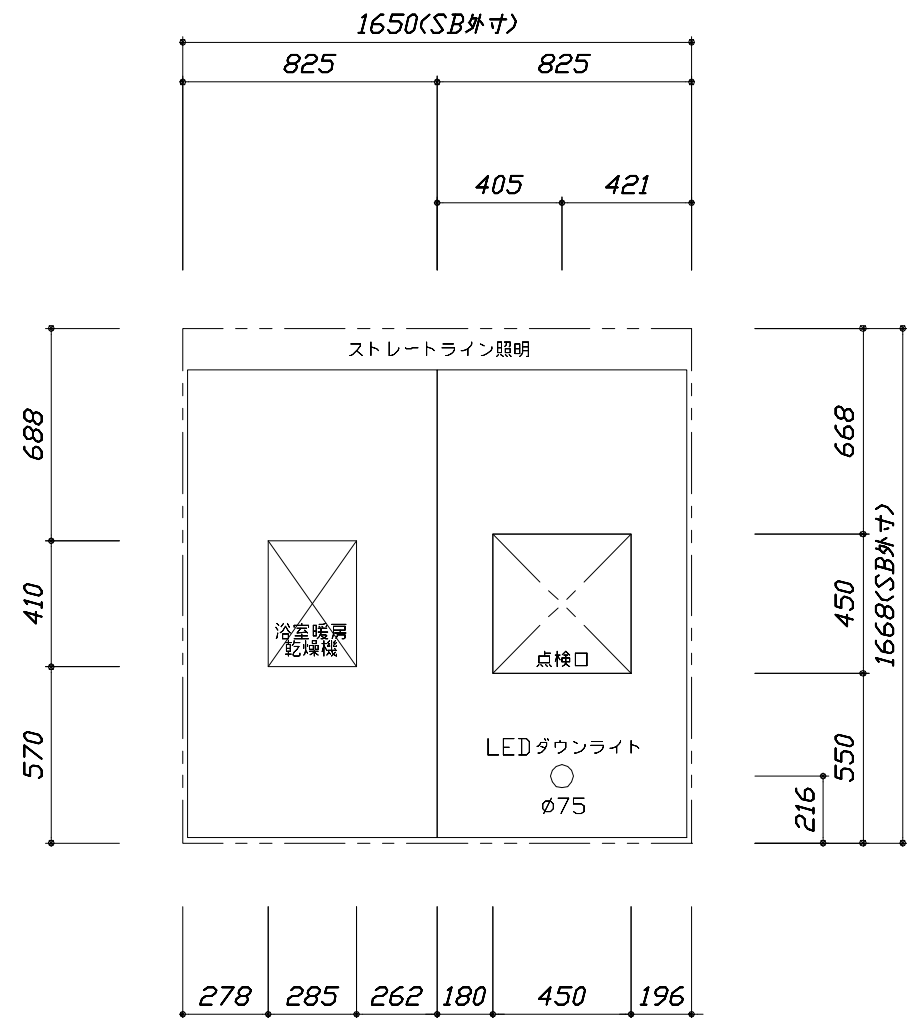

<天井伏図>

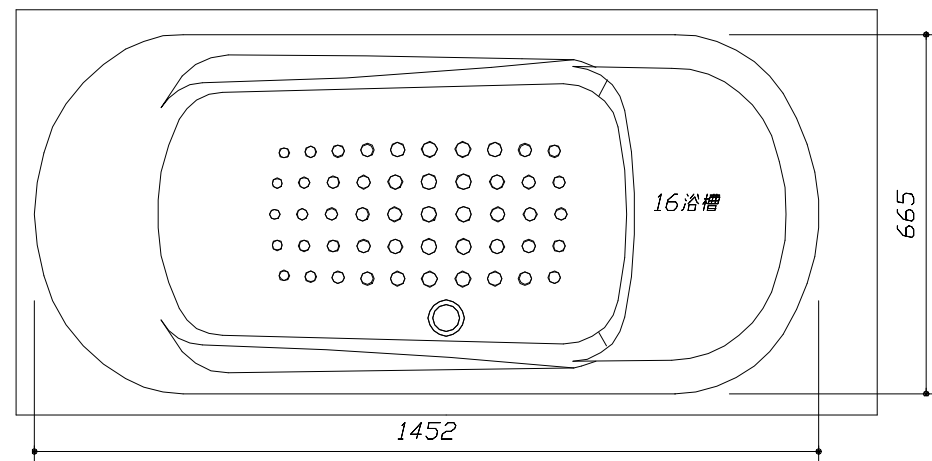





<浴槽詳細図>

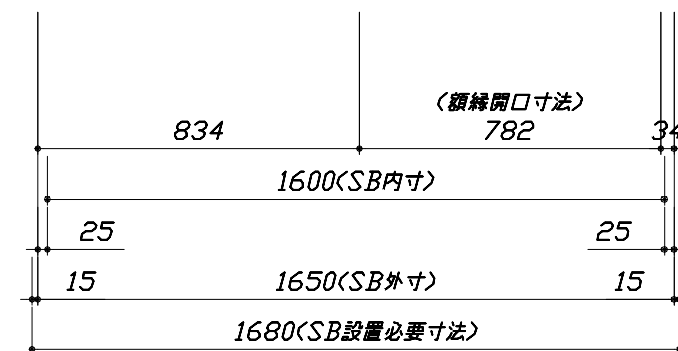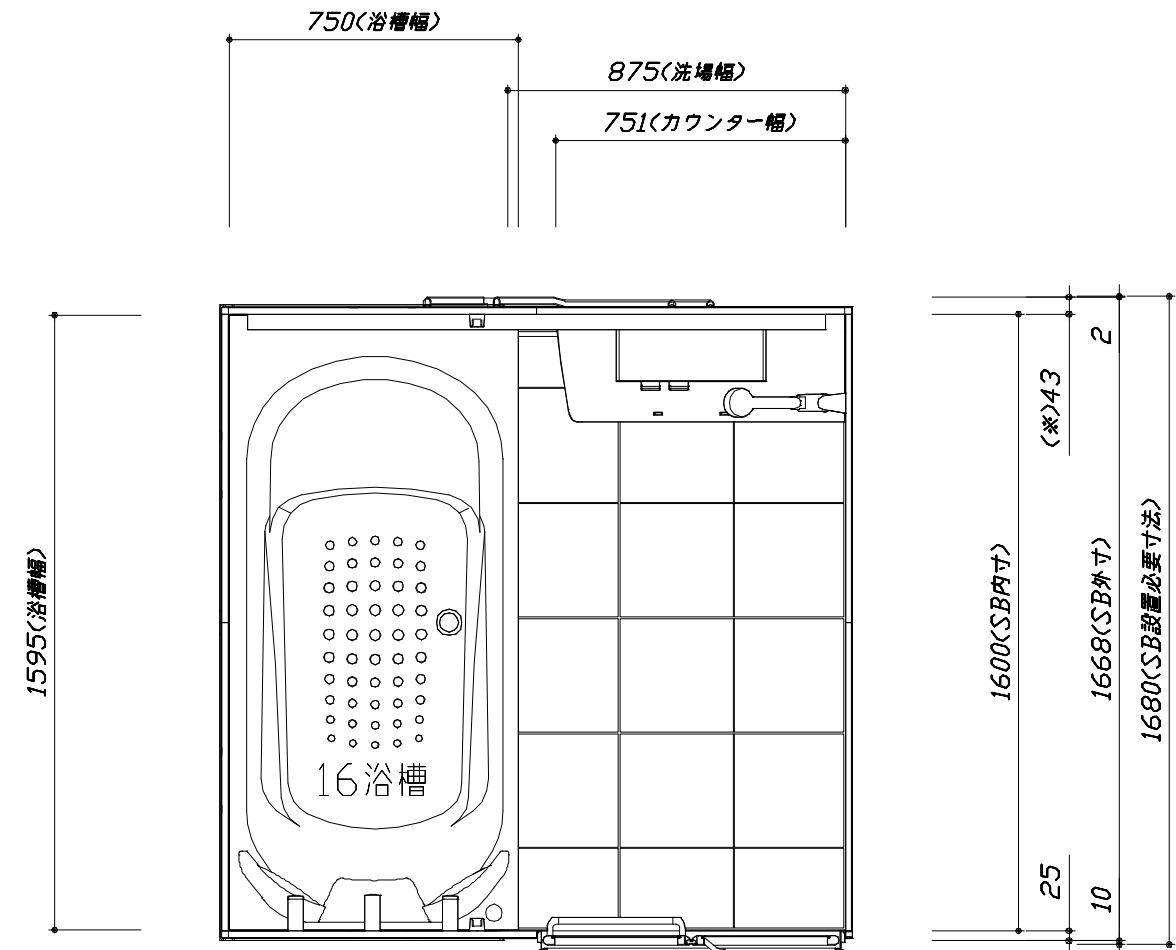

<平面図>

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

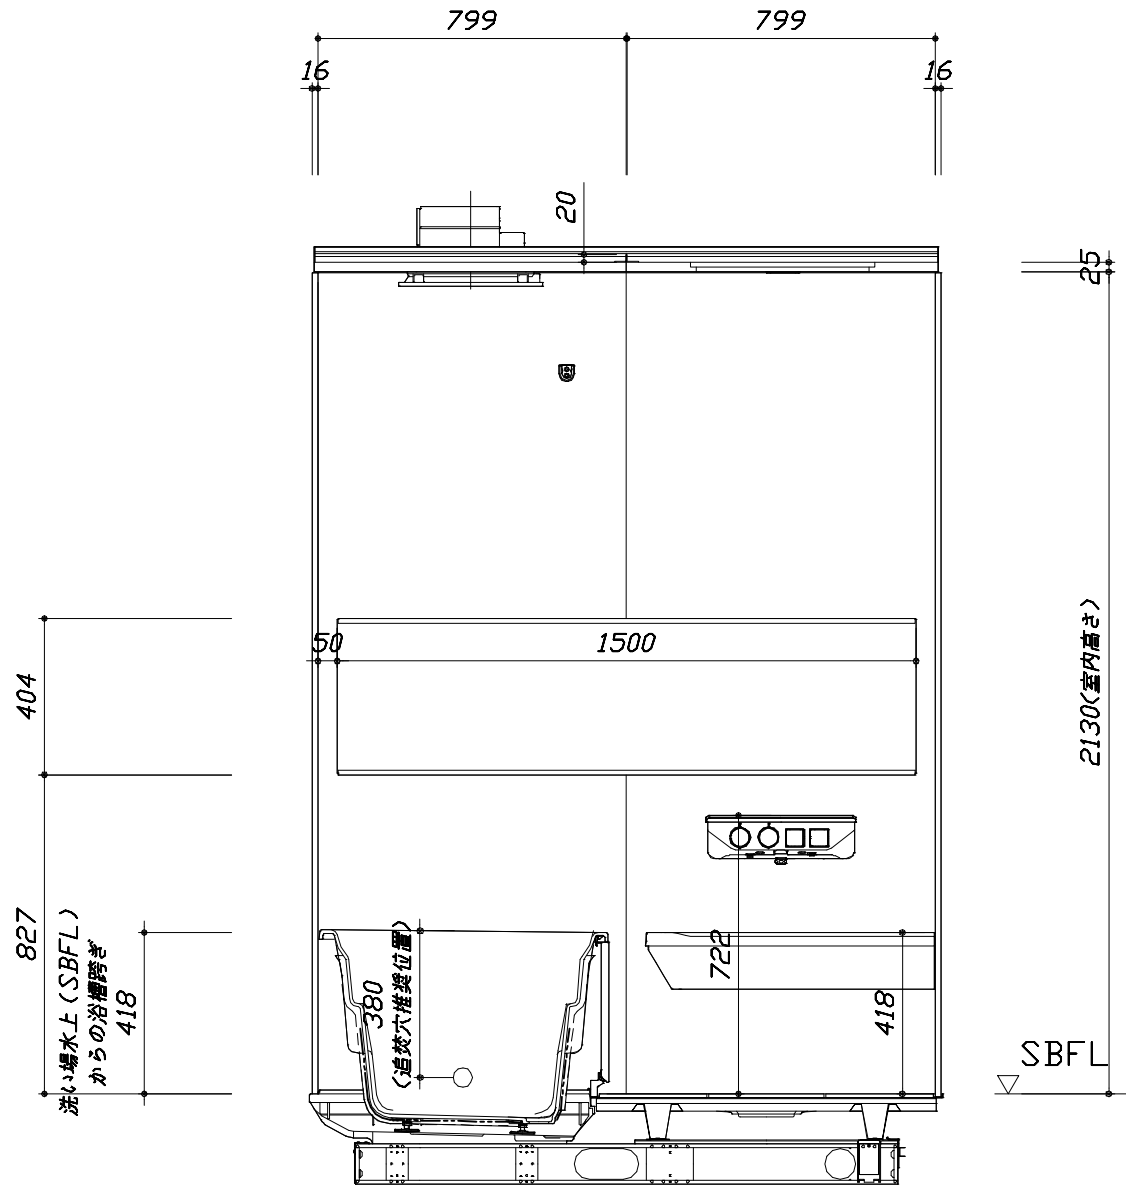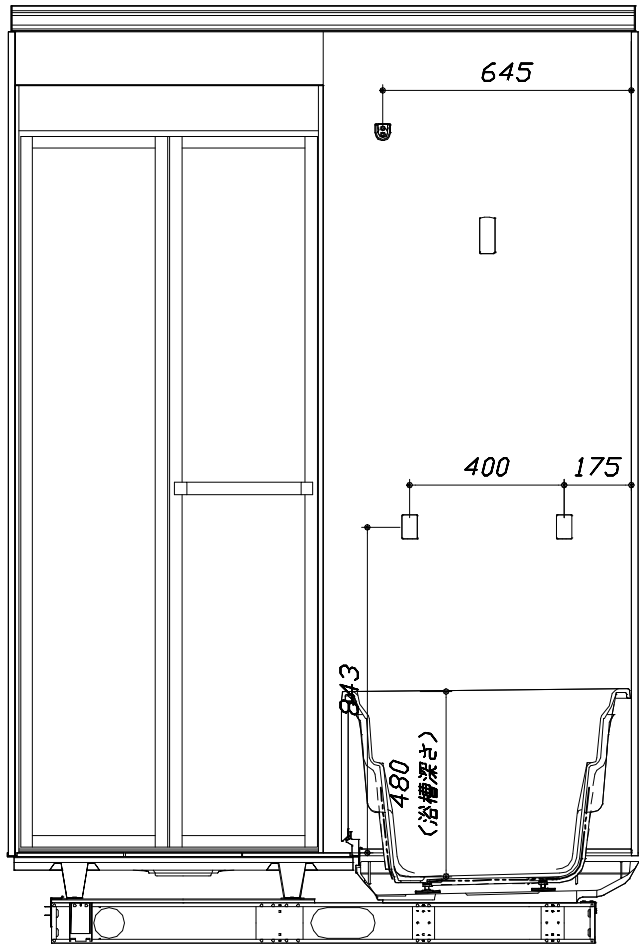



■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

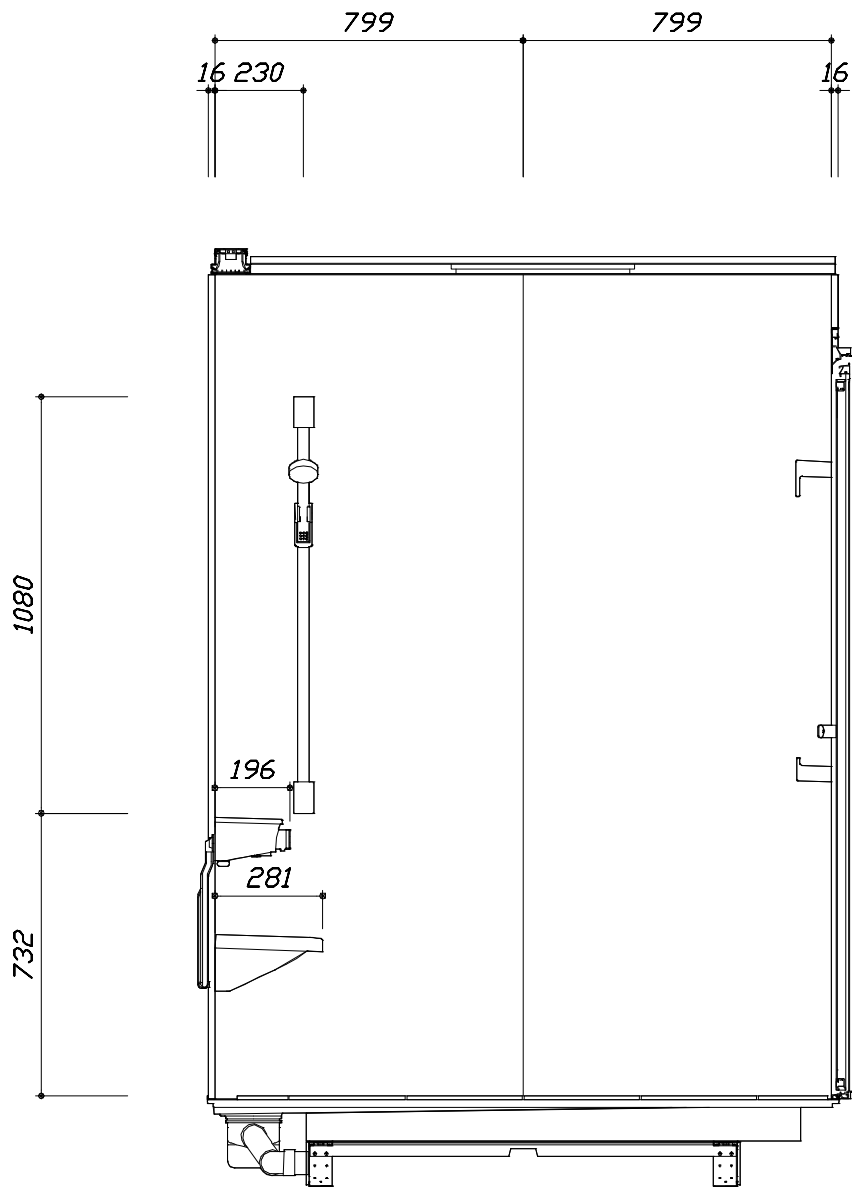

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

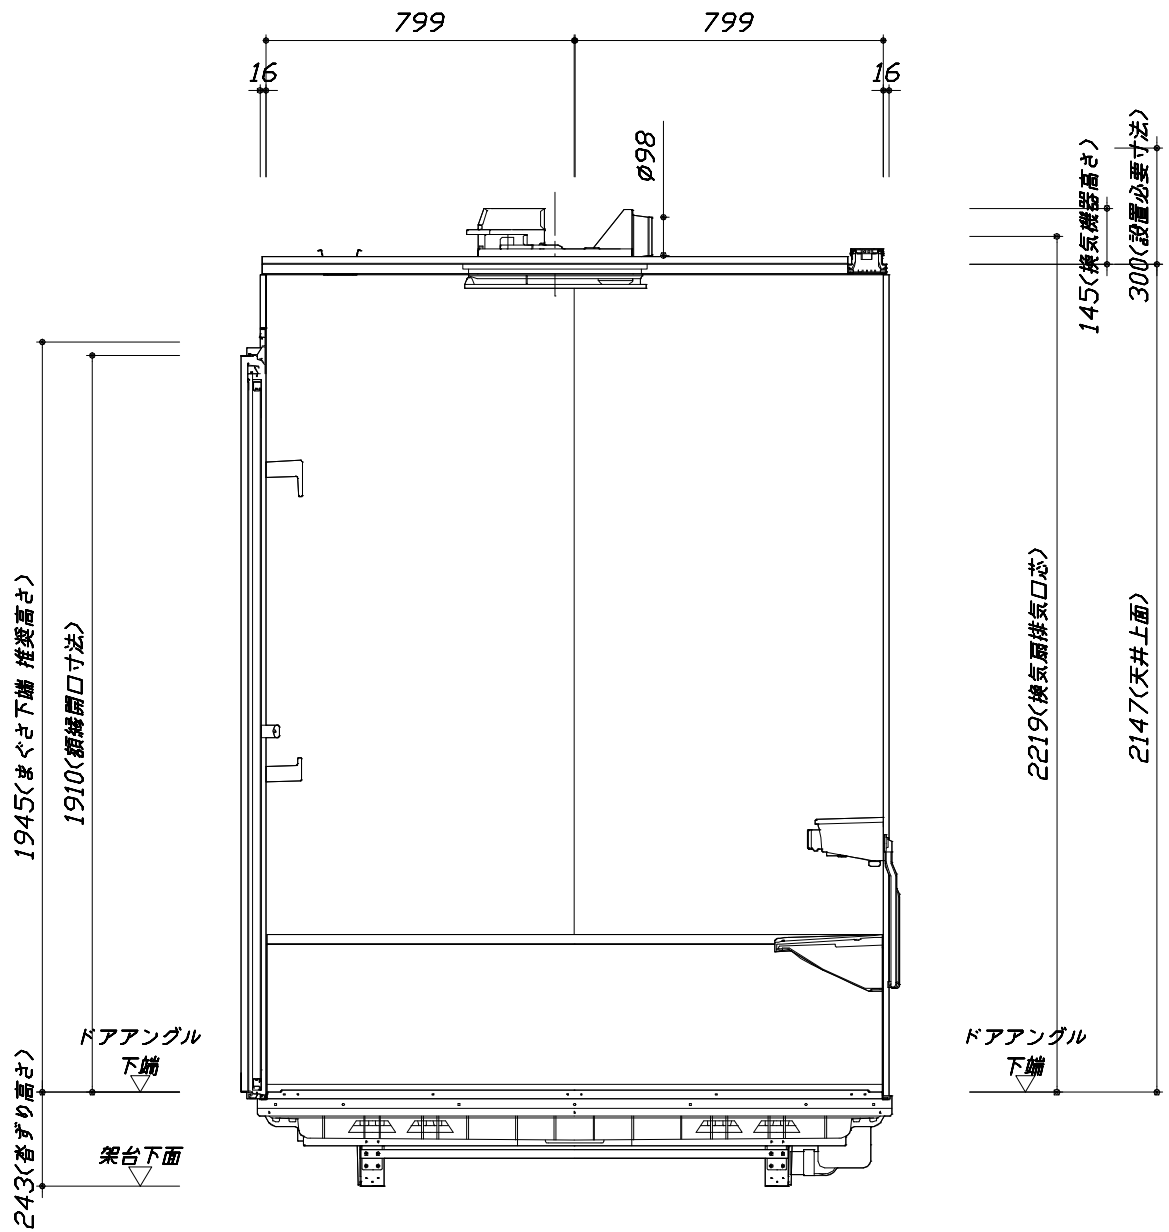

< 浴槽側面図 >

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北陸-敦賀SR SB2様邸
現場番号： C3491320
敦賀営業所

GRANSPA グランspa
プラン番号： 1610F-2506-0026T
担当営業： SB2

施工図3
縮 尺： 1:20
作成日： 2025年8月9日
担当アドバイザー： 1616

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	AR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ラウンド浴槽(ベンチ付)（285リットル） 追い焚き穴：あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	人造大理石カウンター：人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓 1	ー
窓 2	ー
窓枠 1	ABS樹脂 B：ブラック
窓枠 2	ー
排水トラップ	洗い場：A B S 樹脂, 浴槽：A S A 樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	300kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ラグジュアリーミラー くもり止め加工（13W）
収納棚	ー
タオル掛け	ー
洗場側水栓	プッシュ式・サーモスタット(KVK FTB230KUFH)（樹脂ホース：メタル調）
浴槽側水栓	ー
兼用水栓	ー
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（スライドバー-T1020S MH）
照明	ストレーライン照明（LED 22.7W調光・調色機能付）
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V・最大消費電力1250W)（ダクト外径φ98）（常時換気対応品）ブラック
フロフタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	ー
ハンドバー②	ー
ハンドバー③	ー
ハンドバー④	ー
ハンドバー⑤	ー
ハンドバー⑥	ー
ハンドバー⑦	ー

本体カラー

浴槽	WN：クリスタルパールホワイト
カウンター	KA：ダークグレー
パネル(カウンター面)	JDS：ジオマーブルアイボリー
パネル(周辺・3面)	VW：パールホワイト
水栓上部カウンター	KA：ダークグレー
浴槽エプロン	K：ブラック
洗場	XW：チェッポビアンコ
ドア / 天井	W：ホワイト / B：チャコールブラック
収納棚	ー
タオル掛け	ー
ランドリーセット	M：メタル

Takara standard タカラストانダード株式会社	現場名称： 北陸－敦賀SR SB2様邸	GRANSPA グランspa	仕様表	
	現場番号： C3491320	プラン番号： 1610F-2506-0026T	作成日： 2025年8月9日	
	敦賀営業所	担当営業：SB2	担当アドバイザー：1616	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分			参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』								
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事	
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
			浴室用電源配線、接続工事					○		浴室機器の事後電気工事	
浴室天井裏の電源、スイッチ工事							○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。
- 貫通スリーブを使用する場合は45度エルボなどを接続し、バンドなどで固定してください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

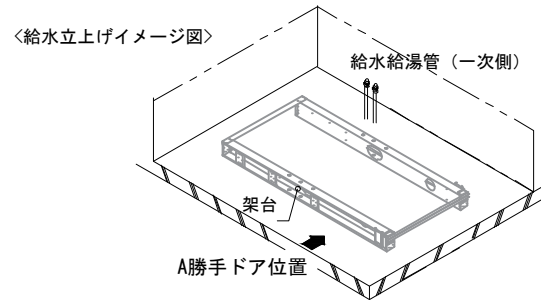

■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。



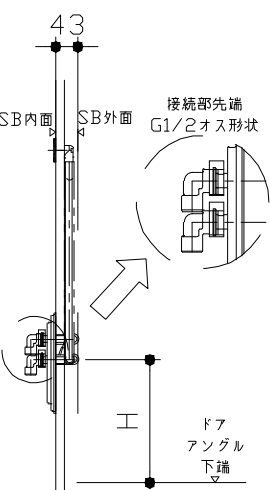
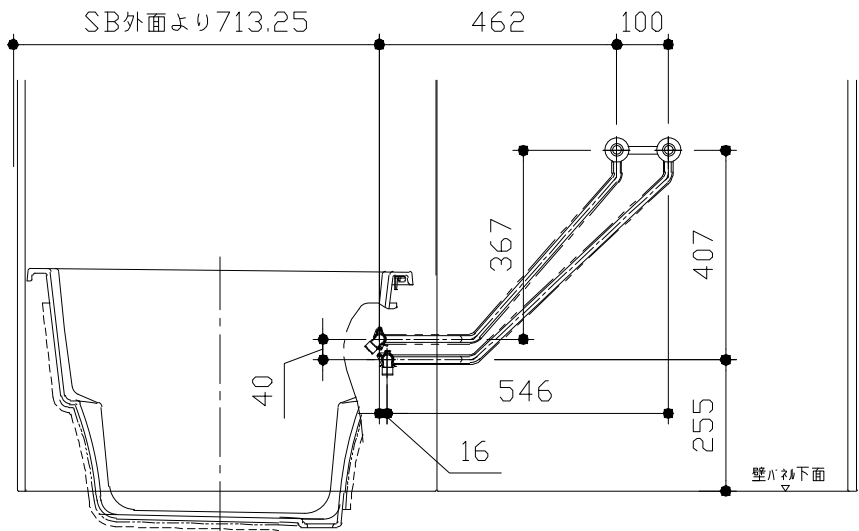


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230

＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置

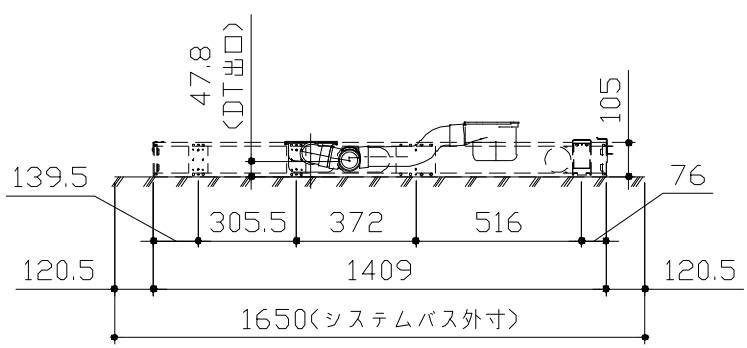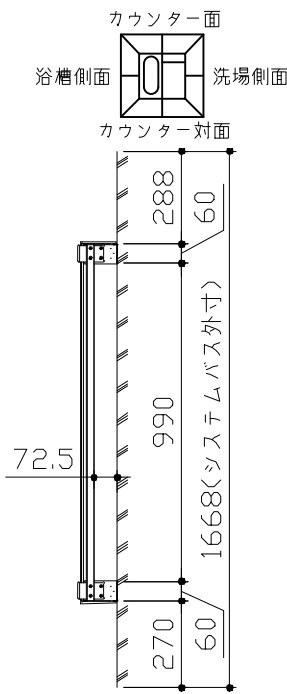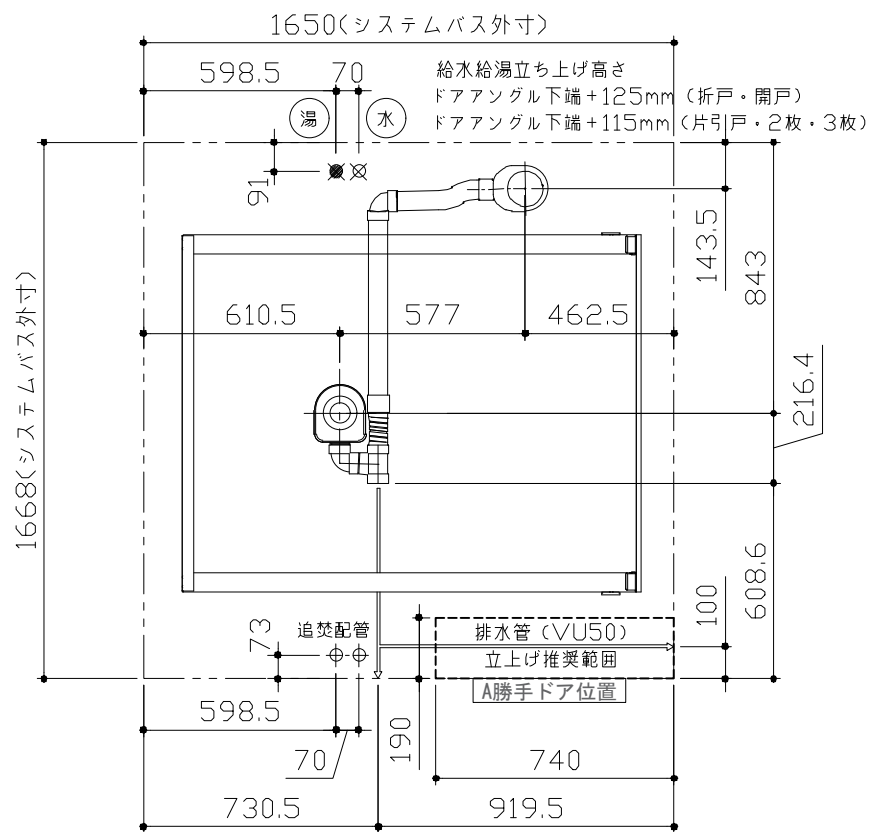

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞


■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。




A矢視

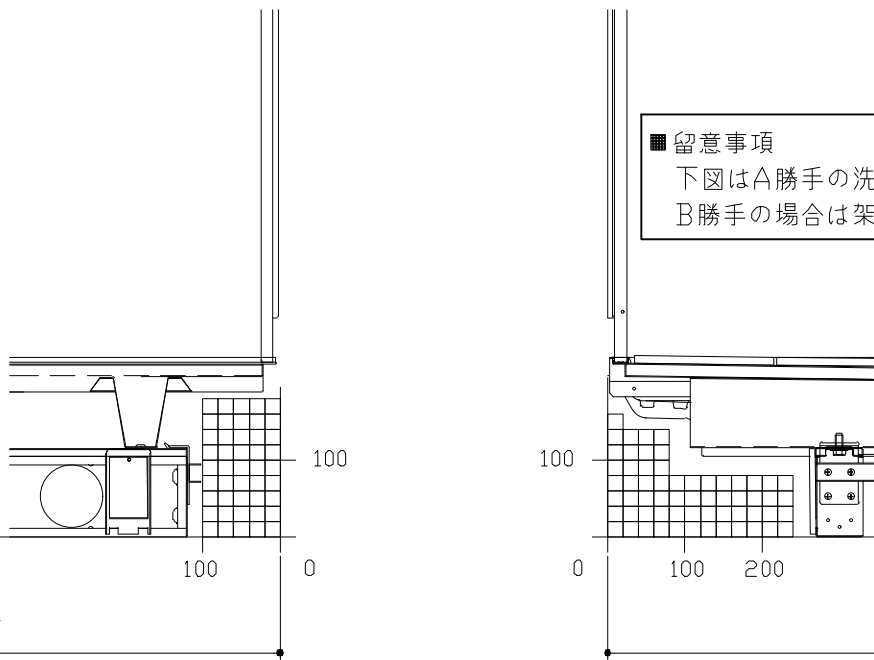


B矢視

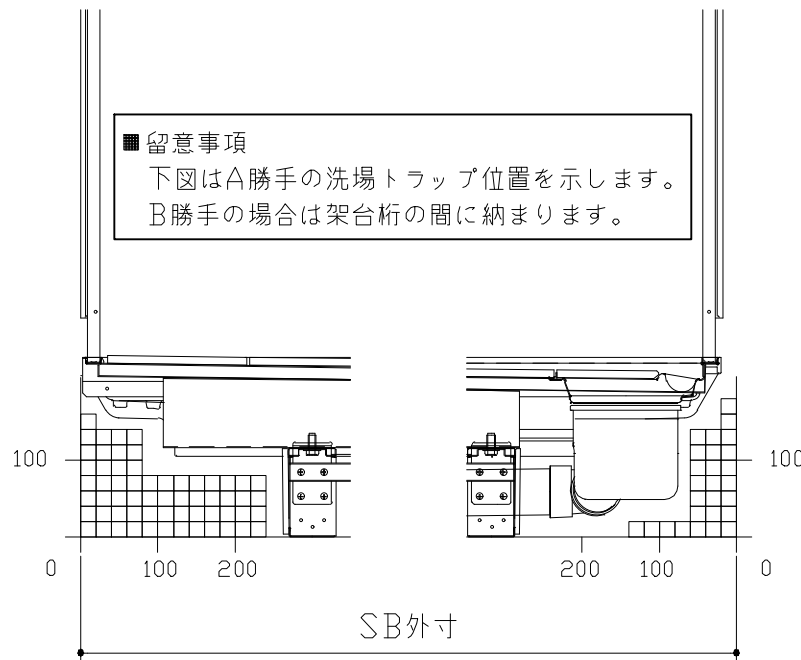


C矢視

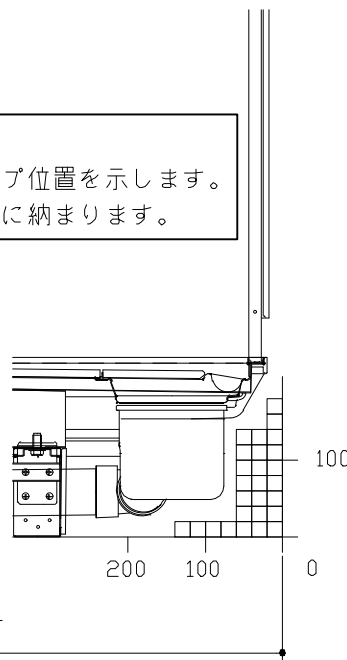

D矢視


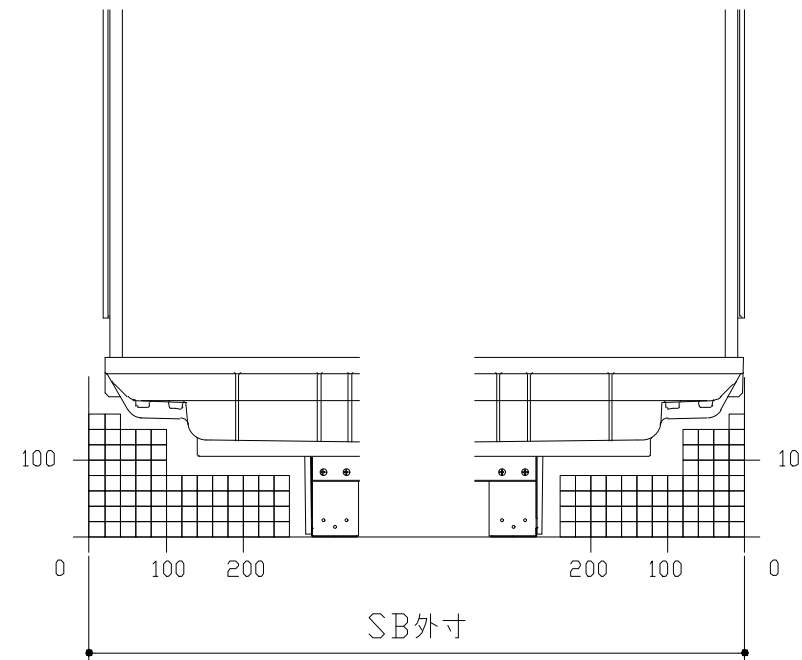


E矢視

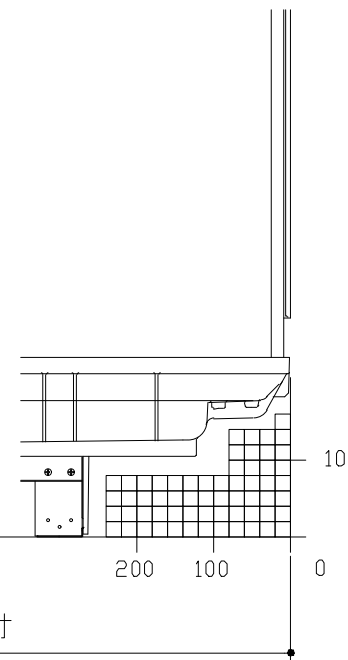

F矢視


キープクリーンドア：折戸・上部換気口

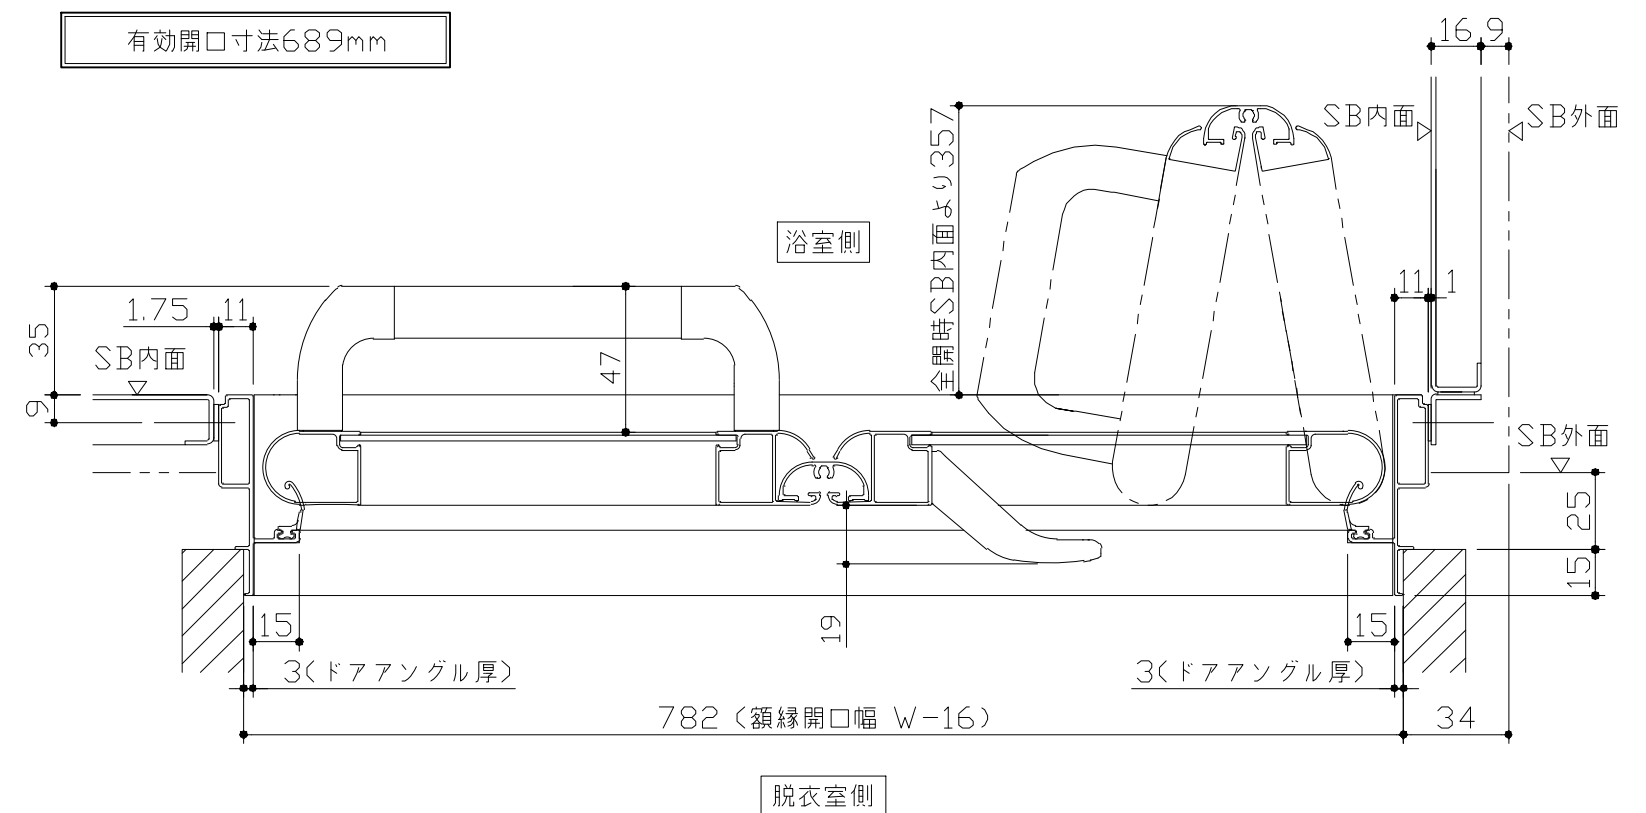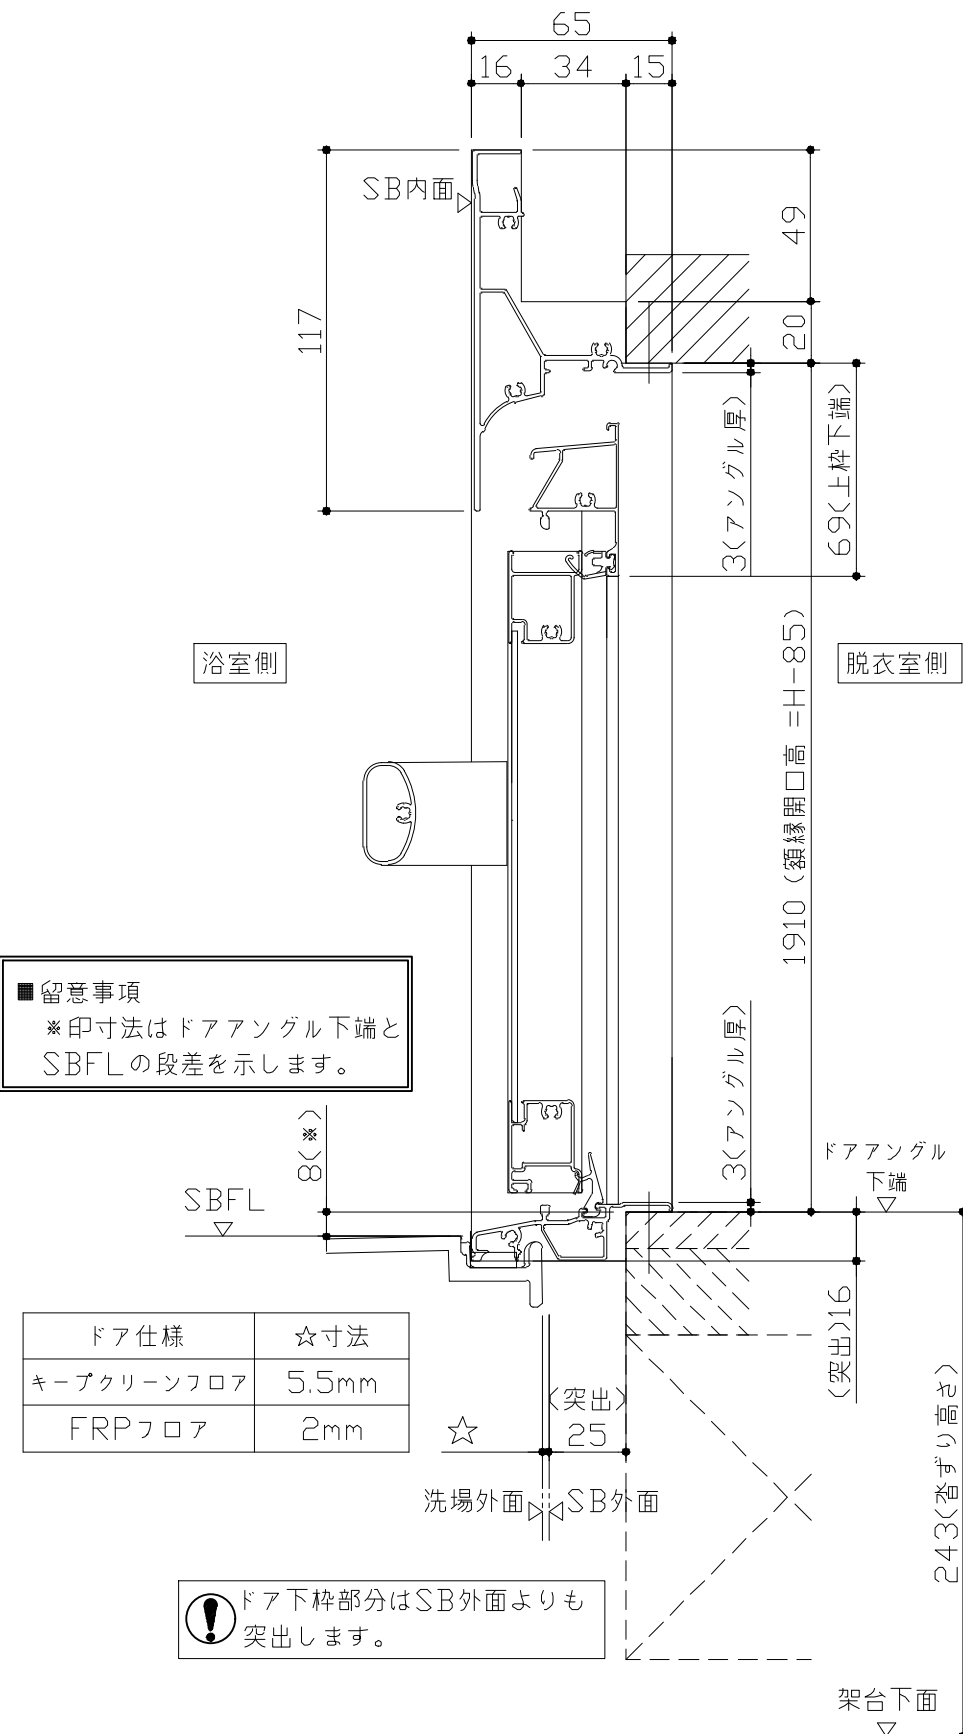

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



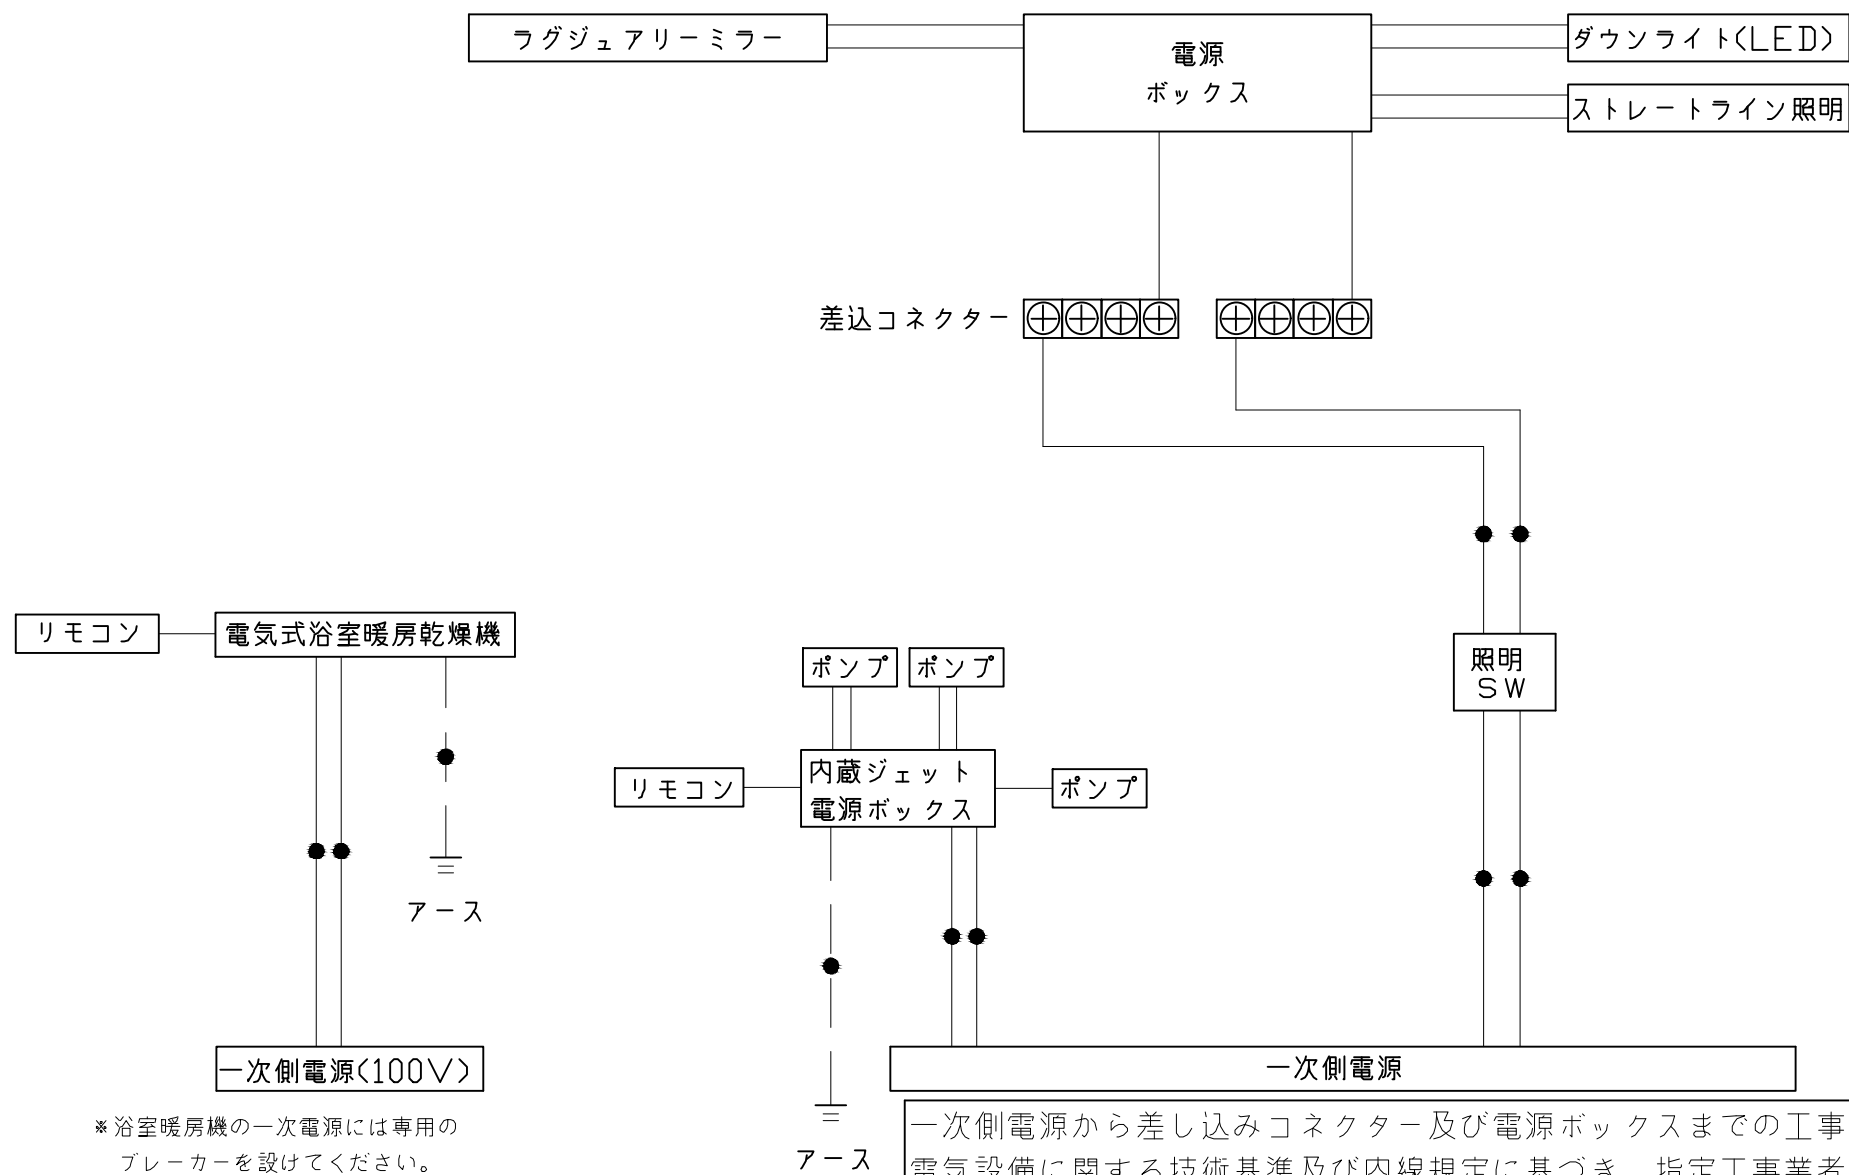

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

浴槽

規格	SB 奥行寸法	浴槽奥行寸法		
		L	C	D
	1593	1520	32.5	35.5
	1618	1545	57.5	
	1643	1570	82.5	
	1668	1595	107.5	
	1693	1620	120	48
	1718			
	1743			
	1768			
	1793			
	1818			
	1843			
	1868			

洗い場用水栓

※[]内寸法はカウンターが無い場合

照明

ストレーツライン照明
LED 23.7W (ダツソライツ1灯含む)

換気機器

リモコンコード長さ: 5m
外形: 縦120mm×横116mm




シャワーフックスライドバー

材質
パイプ部: ステンレス
台座部: ABS、POM等
フック部: ABS等

ミラー

枠: SUS304 t0.8、PMMA
ミラー: 表面防曇コートあり
LED: 13W

窓枠フリー ※[]寸法はそれ以下に現地加工することができます。 ※末尾 E：フクビ化学工業製 NW/NG/NB：キョーセー製 材質：窓枠本体/カバー AESコートABS …L1512(E/NG/NB) AASコートABS …L1512(NW) コーナーピース部 ABS …(E/NW/NG/NB共通)		循環金具・フロアダプタ関連		風呂蓋 7079MDVH-16KT																	
洗い場側排水トラップ		浴槽側排水トラップ		肩包み湯① リモコン (浴室に設置) ポンプ (浴槽に組み付け) 電源ボックス (天井上設置) <table><tr><th colspan="2">2カ所噴流ジェットポンプ仕様</th></tr><tr><td>ポンプ品番</td><td>HJPN-100K</td></tr><tr><td>電源電圧</td><td>AC100V</td></tr><tr><td>周波数</td><td>50/60 Hz共通</td></tr><tr><td>流量</td><td>36 L/min</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>130W</td></tr><tr><td>振動</td><td>定格運転時にて15μ以下</td></tr><tr><td>常用使用最高水温</td><td>45℃</td></tr></table> ※朝日興業製		2カ所噴流ジェットポンプ仕様		ポンプ品番	HJPN-100K	電源電圧	AC100V	周波数	50/60 Hz共通	流量	36 L/min	消費電力	130W	振動	定格運転時にて15μ以下	常用使用最高水温	45℃
2カ所噴流ジェットポンプ仕様																					
ポンプ品番	HJPN-100K																				
電源電圧	AC100V																				
周波数	50/60 Hz共通																				
流量	36 L/min																				
消費電力	130W																				
振動	定格運転時にて15μ以下																				
常用使用最高水温	45℃																				
Takara standard タカスタンダード株式会社		現場名称：北陸-敦賀SR SB2様邸 現場番号：C3491320 敦賀営業所		GRANSPA グランspa プラン番号：1610F-2506-0026T 担当営業：SB2		部材詳細図 2/3 作成日：2025年8月9日 担当アドバイザー：1616															

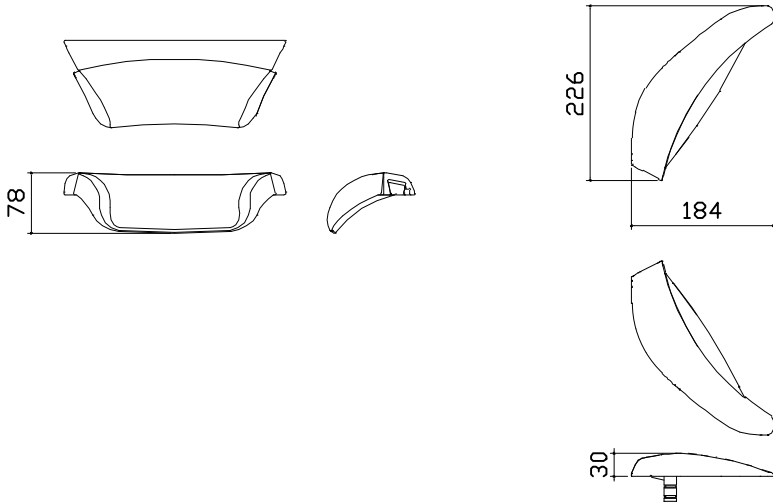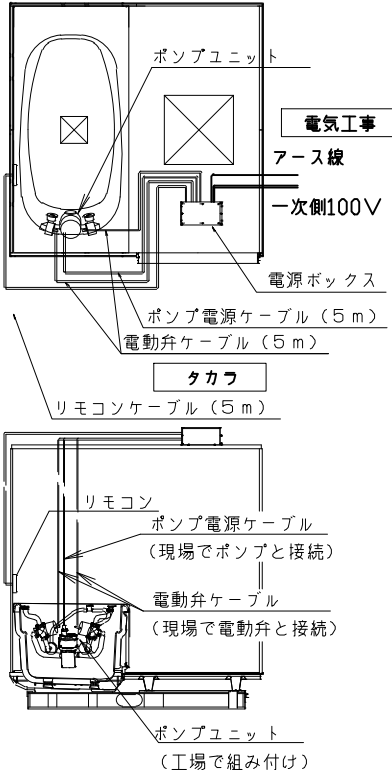肩包み湯②		肩包み湯③			
現地組付け部材 クッションビロー（浴槽に組付け） 本体：発泡PE 		肩湯セットK（浴槽に組付け） 本体：SAS 		【工事範囲】 当社工事範囲 1. 電源ボックスの取付 2. ポンプ電源ケーブルの配線及びポンプユニットと電源ボックスの接続 3. 電動弁ケーブルの配線及び電動弁と電源ボックスの接続 4. リモコンケーブルの配線、電源ボックス及びリモコンの接続 5. リモコンの取付 電気工事業者様 工事範囲 1. 電源ボックスへ一次側100Vの接続 2. アース工事 3. 電源回路に漏電遮断機の設置 ■ 留意事項 (1) ポンプユニットは、工場で浴槽に組み付けられています。 電気工事 	
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 北陸－敦賀SR SB2様邸		GRANSPA グランspa	
		現場番号： C3491320		プラン番号： 1610F-2506-0026T	
		敦賀営業所		担当営業：SB2	
				担当アドバイザー： 1616	
				部材詳細図	3/3
				作成日： 2025年8月9日	

パネル割図		ミラー	シャワーフックスライドバー		
ハネK16C2B 0799 R<JDS ハネK16C1G 0799 L<JDS ハネK16NW 0799 <VW ハネK16NW 0799 <VW ハネK16A 0799 <VW ハネK16A 0799 <VW ハネK16AD 0799 <VW AR勝手		ハネK16C2B 0799 R<JDS ハネK16C1G 0799 L<JDS ※：現地加工φ18 ・：現地加工φ3.5	ハネK16A 0799 <VW ※：現地加工φ3.5		
ランドリーパイプ		風呂蓋収納			
ハネK16C1G 0799 L<JDS ハネK16AD 0799 <VW 現地加工：φ3.5		ハネK16AD 0799 <VW 現地加工：φ3.5 ■留意事項 タオルカケ・ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。			
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 北陸－敦賀SR SB2様邸 現場番号： C3491320 敦賀営業所	GRANSPA グランspa プラン番号： 1610F-2506-0026T 担当営業：SB2	穴開け指示図 作成日： 2025年8月9日 担当アドバイザー： 1616	1/1
