

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 横浜-横浜SR SB44 様

業者 様

商品名 PREDECIA プレデンシア

商品
御見積金額 **¥2,133,200** (税込 ¥2,346,520)
()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

※ 商品御見積金額には商品組付費が含まれております。
※ 給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

作成日 2025年6月2日
プラン番号 2701A-2505-0772T
現場番号 C3421098

タカラスタンダード株式会社
◆横浜支店 販売課
神奈川県横浜市神奈川区富家町4番1
TEL 045-435-8033 / FAX 045-435-8051

◆横浜ショールーム
TEL 045-435-8039 / FAX 045-435-8055

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
	横浜SR	横浜SR

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616(AR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	チェッポビアンコ
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	プレシャスホワイト
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽
カウンター材質	クォーツストーン
カウンター/下カバーカラー	プランソルベ / ホワイト
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	ステンレス / ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ホワイトオニキス
パネルカラー(周辺)	パールホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 未定

◆ 御確認事項

◆ 備考

--	--

No.*

御名前 横浜-横浜SR SB44

様

現場番号	C3421098	プラン番号	2701A-2505-0772T	作成日	2025/6/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1616サイズ		1	1,227,000	1,227,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	開き戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1	+14,500	+14,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・周辺ハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キーブクリーンフロア(プレミアムクラス・チェッポビアンコ)	1	+29,000	+29,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(プレシヤスホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ホワイト)	1		
11	浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
16	洗い場用水栓	プッシュ式水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB280	1	+71,000	+71,000
17	洗い場用水栓	ヒロカルシャワー(手元止水):SB280LABHK	1		
18	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
19	カウンター	クォーツストーンカウンター(ラグジュアリーライトあり)	1	+89,000	+89,000
20	カウンター	クォーツストーンデュアルカウンター	1	+138,000	+138,000
21	浴槽前間接照明	ラグジュアリーライト	1	+13,500	+13,500
22	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
23	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザイン 周辺ハイクラス)(Kパネル)	1	+55,000	+55,000
24	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
25	天井	高光沢フラット天井	1		
26	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ホワイト	1	+45,500	+45,500
27	換気機器	ランドリーパイプなし	1	-2,800	-2,800
28	換気機器開口	工場開口	1		
29	照明	ストレートライン照明(調光・調色機能付・ラグジュアリーミラー/ライト対応用)	1	+91,000	+91,000
30	天井照明開口	工場開口	1		
31	ミラー	ラグジュアリーミラー(全幅タイプ)	1	+117,000	+117,000

御名前 横浜-横浜SR SB44 様

現場番号	C3421098	プラン番号	2701A-2505-0772T	作成日	2025/6/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
33	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-4,000	-4,000
34	収納棚	収納棚なし	1	-17,000	-17,000
35	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
36	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
37	トラップカバー	なし	1		
38	ブロック積用ボンド	2段用	1	+2,000	+2,000
システムバス合計			38		¥1,906,200


商品総合計	38	¥1,906,200
-------	----	------------

商品組付費			数量	金額
1	本体組付費		1	227,000
商品組付費合計				¥227,000


商品御見積金額	¥2,133,200
---------	------------

- ※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
- 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

パース

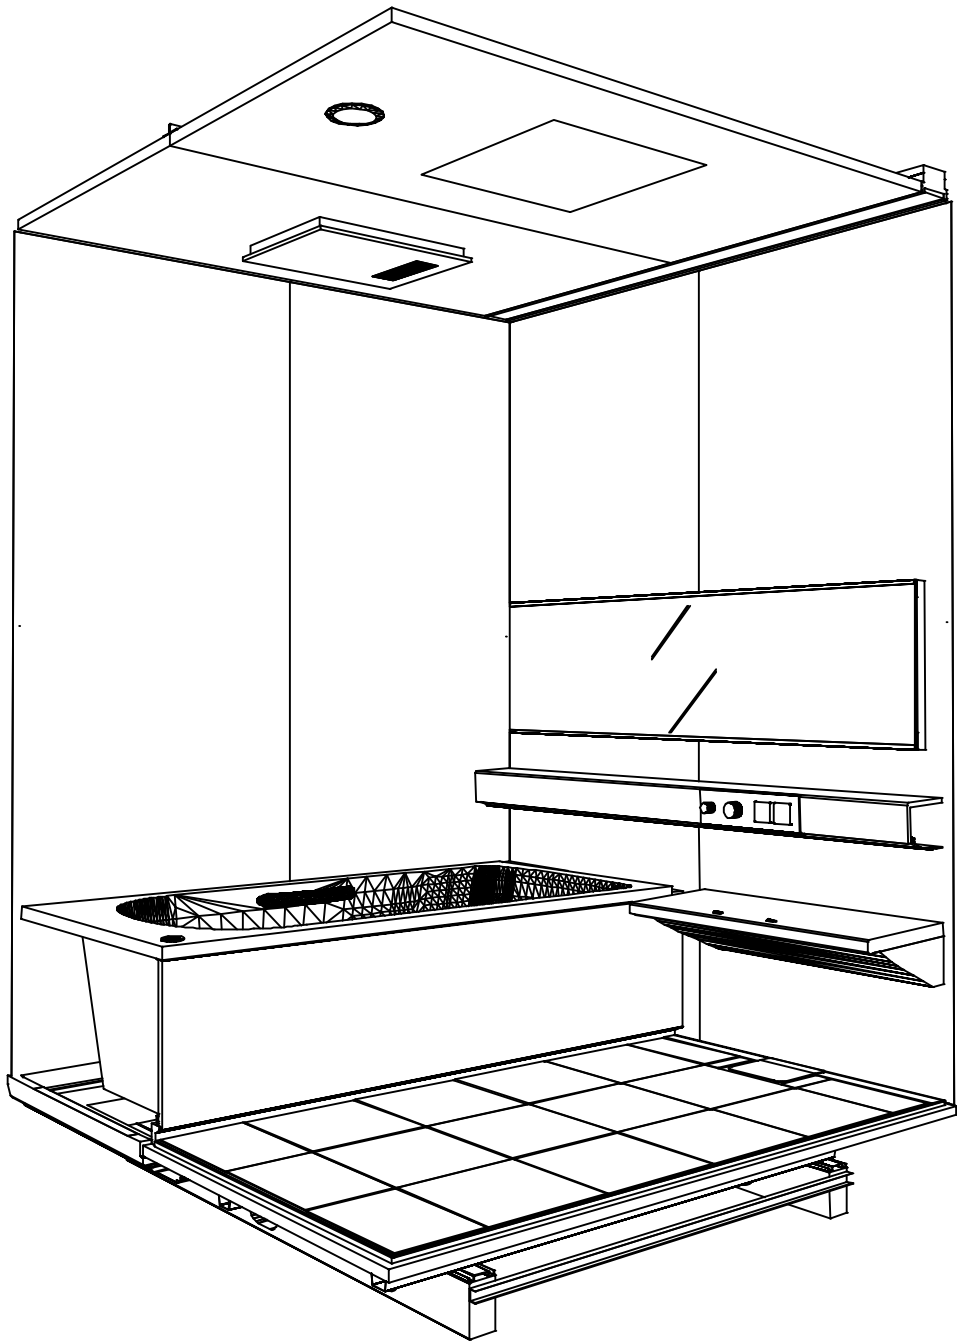

鳥瞰図

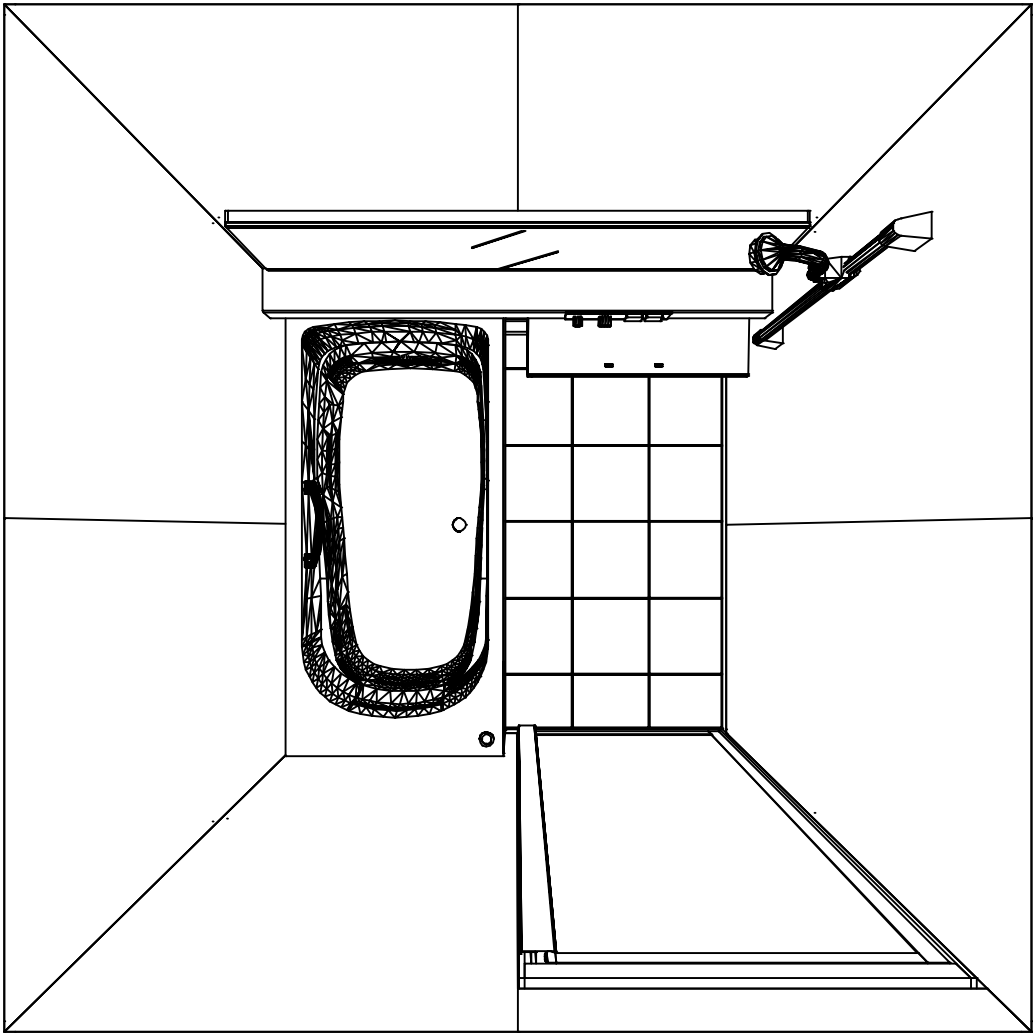

1616

高光沢フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： 横浜-横浜SR SB44様邸	PREDENCIA プレデンスIA	姿図	
現場番号： C3421098	プラン番号： 2701A-2505-0772T	作成日： 2025年6月2日	
横浜支店 販売課	担当営業 ：	担当アドバイザー： 横浜SR	

カウンター面


浴槽側面

洗場側面


カウンター対面

■ 留意事項



* 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

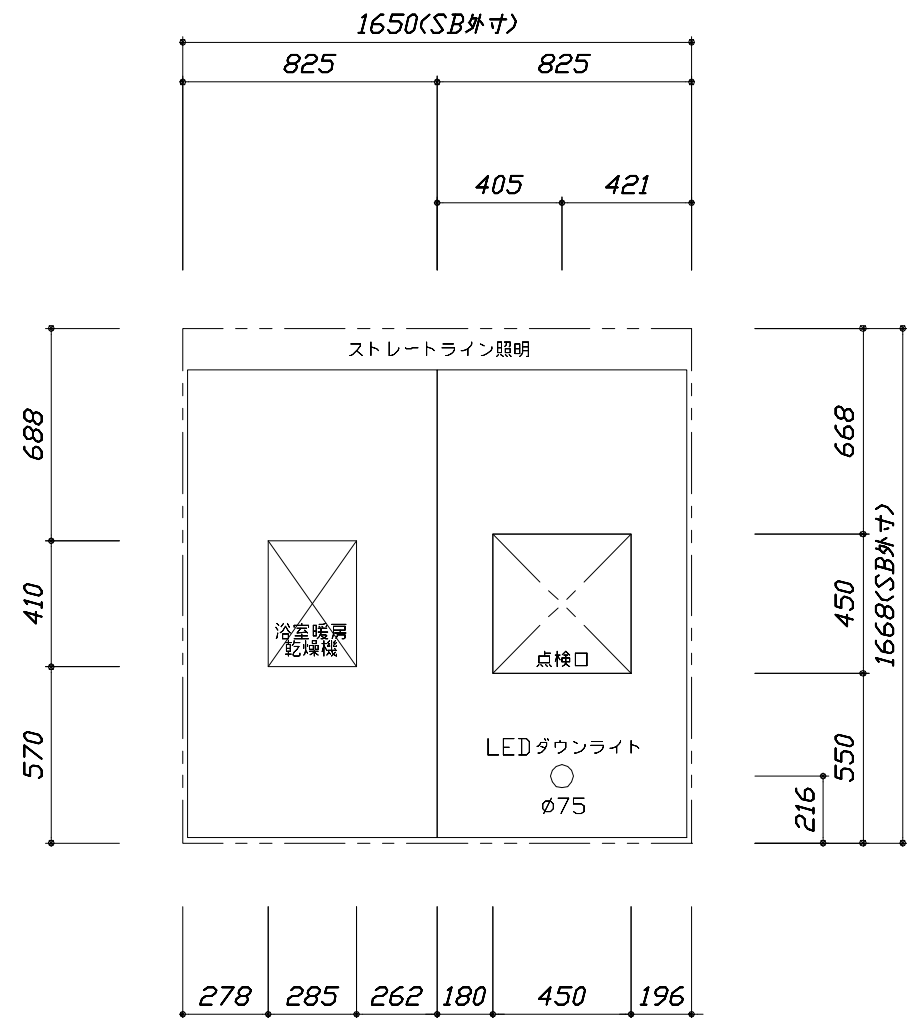

<天井伏図>

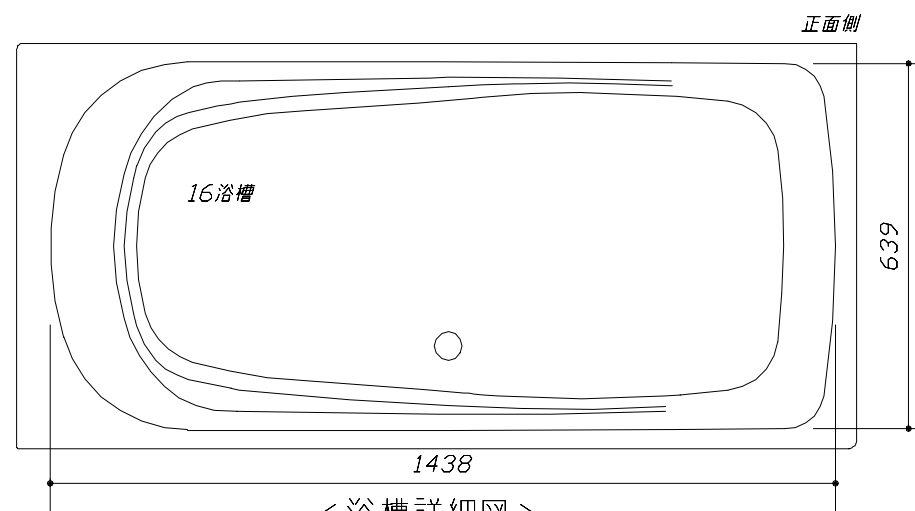



<浴槽詳細図>

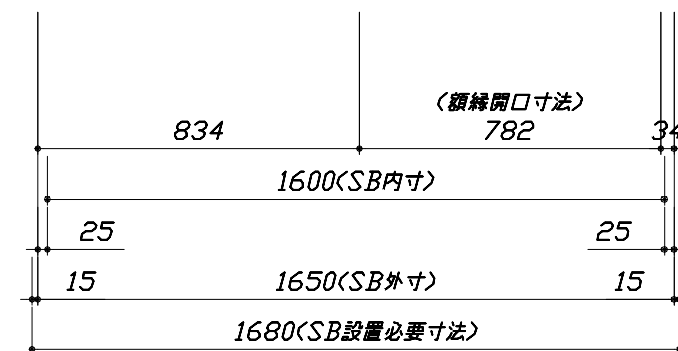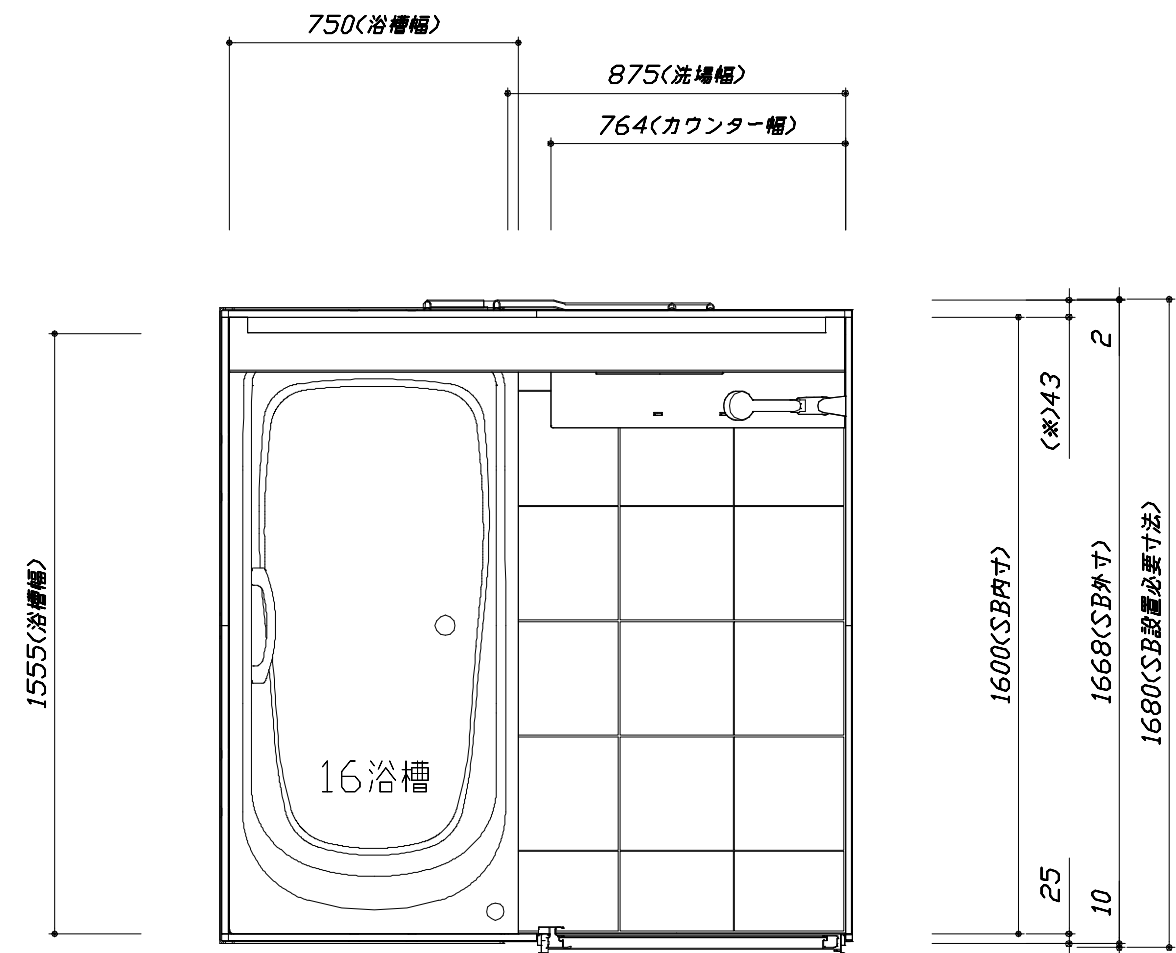

<平面図>

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

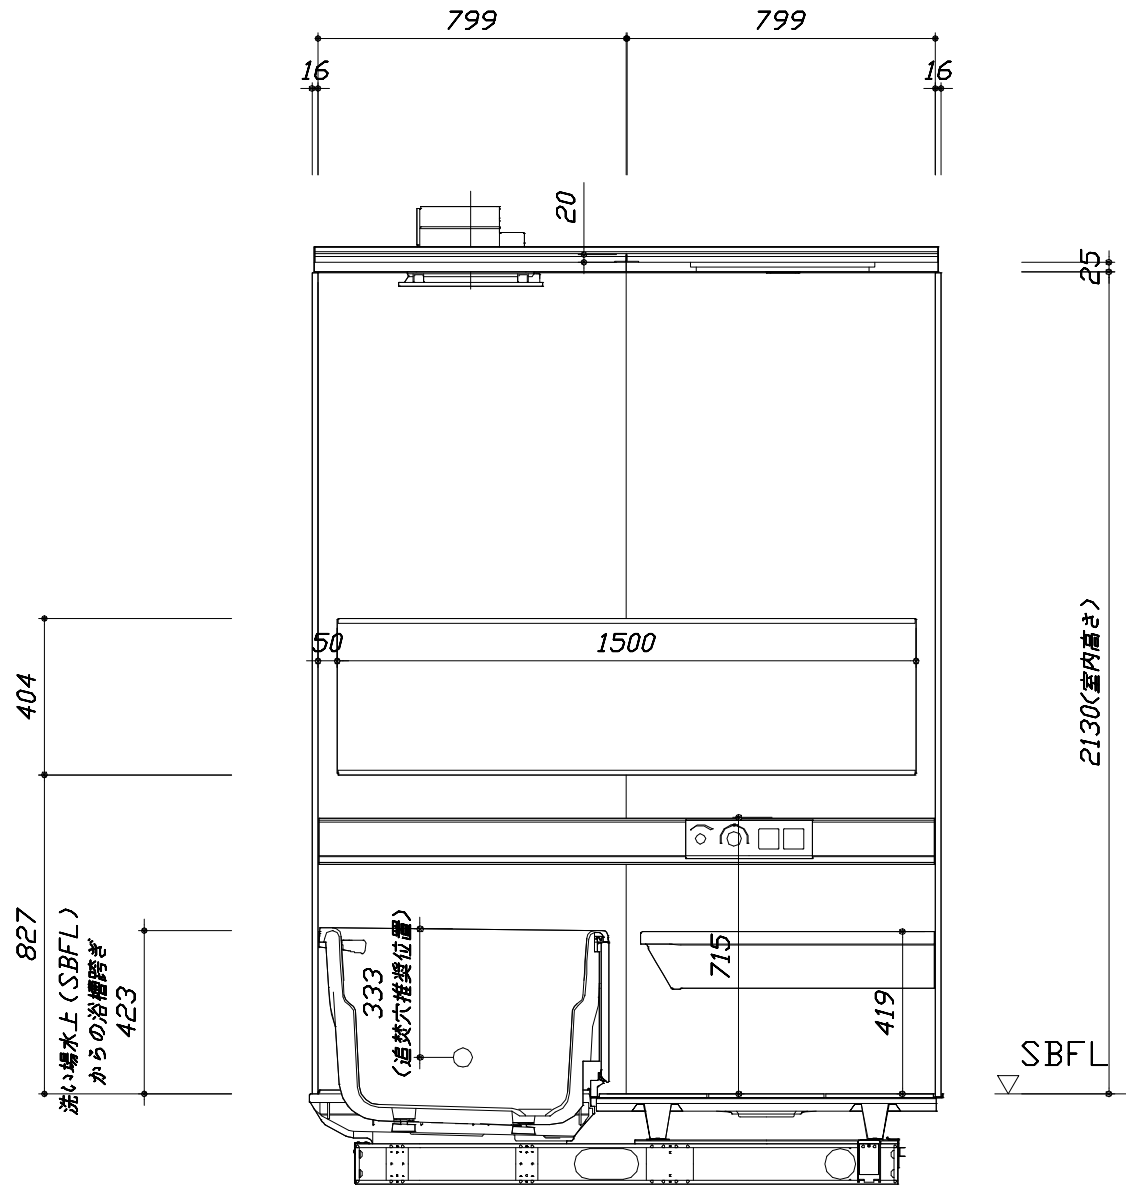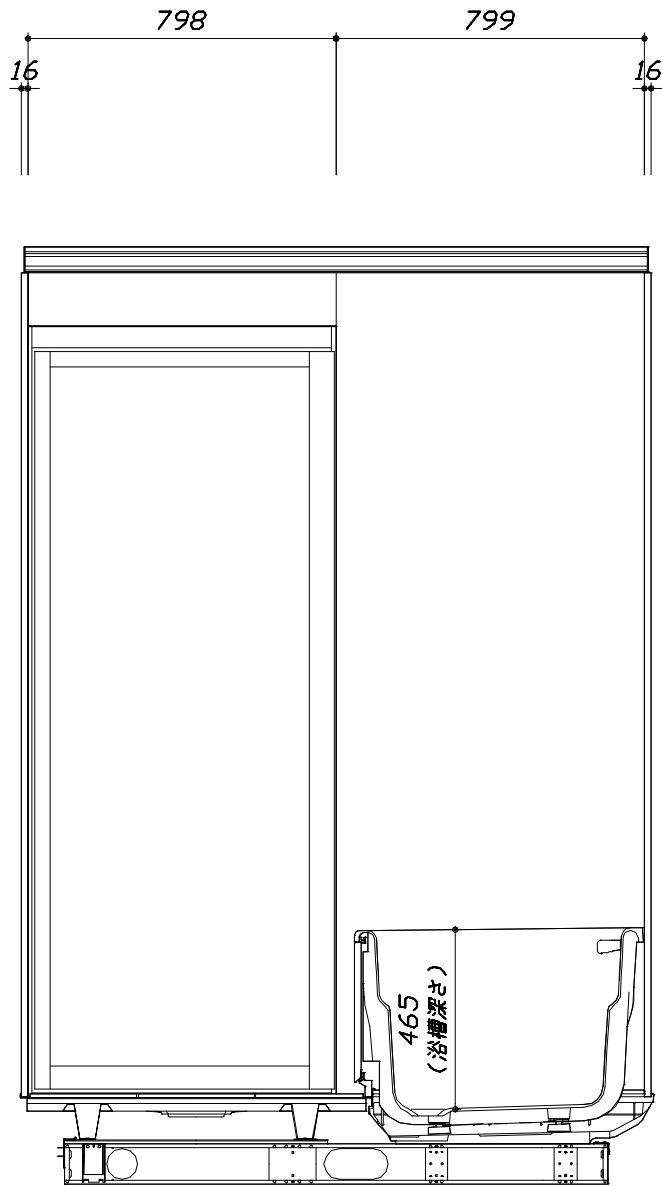



■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

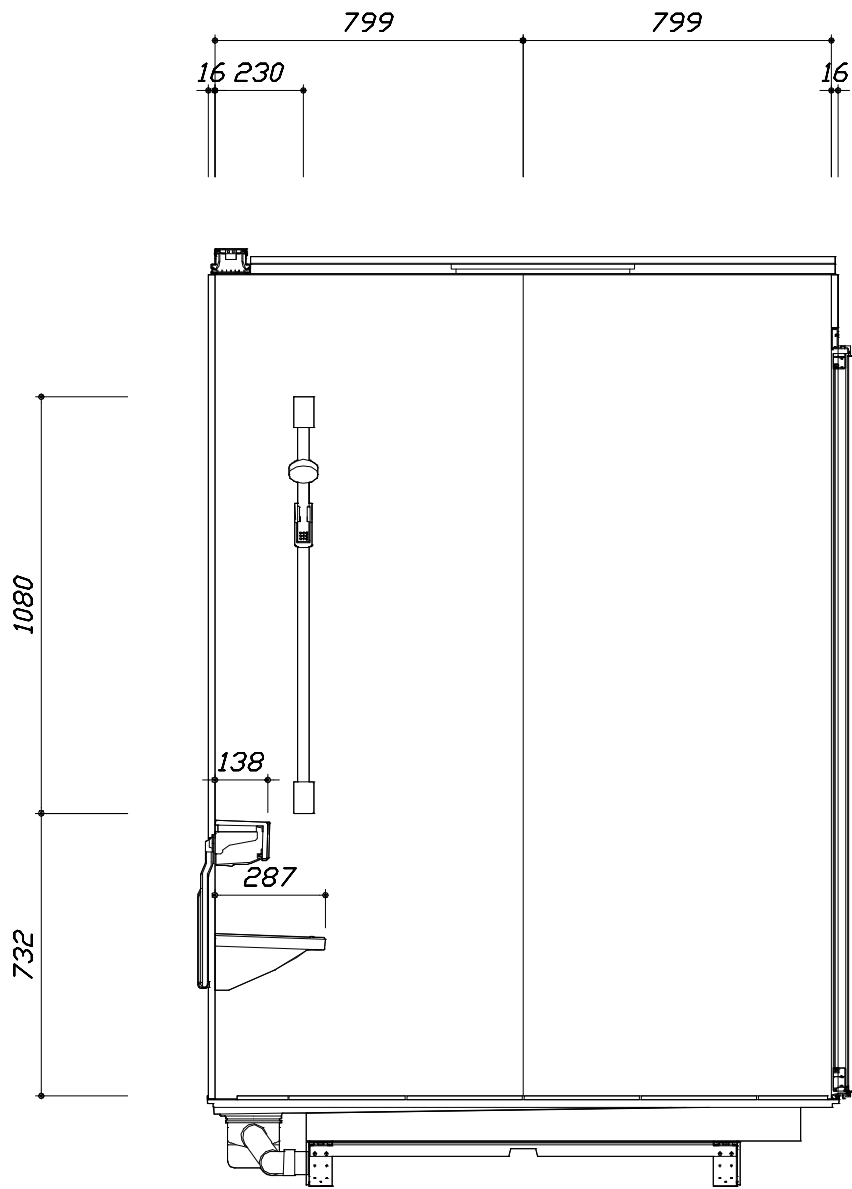

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

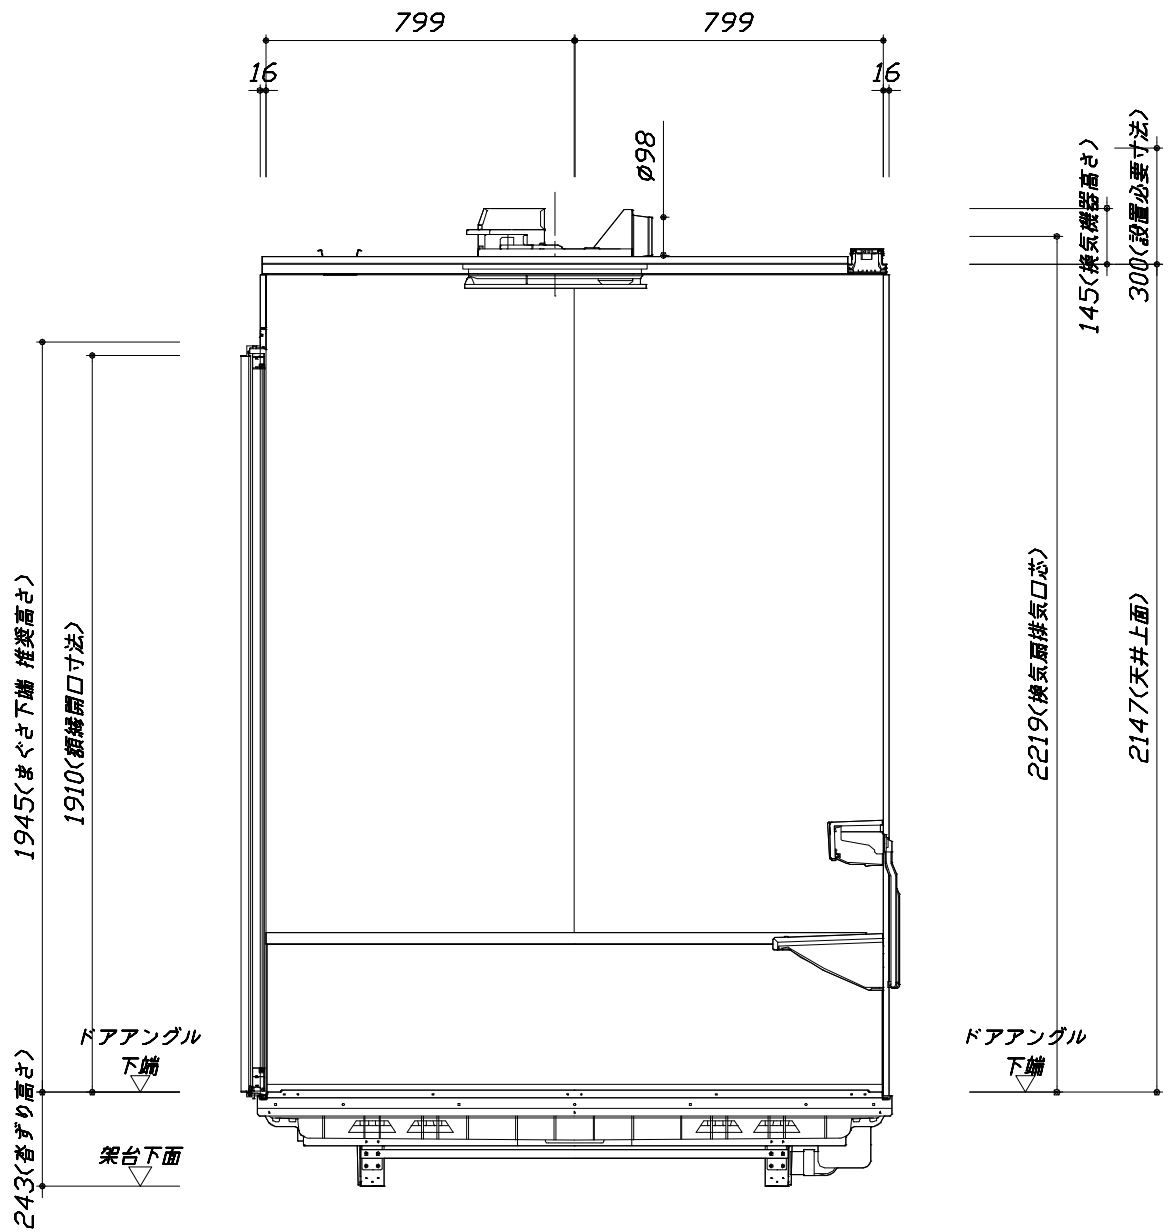

< 浴槽側面図 >

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	AR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	鋳物ホーロー 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽 グリップ付（325リットル）追い焚き穴：あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	クォーツストーンデュアルカウンター：クォーツストーン カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	高光沢パナソニック（内部発泡樹脂）換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ開き戸（アルミ框/樹脂ガラス/ﾀﾞｲﾔﾑｰﾀﾞｲﾔﾑ型換気口）
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂、 浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	410kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ラグジュアリーミラー くもり止め加工（13W）
収納棚	－
タオル掛け	－
洗場側水栓	プッシュ式・サーモスタット（SB280LABHK）（樹脂ホース：ﾏﾃﾞﾗﾙ調）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ-T1020S MH）
照明	ストレートライン照明（LED 23.7W調光・調色機能付）ラグジュアリーライト（3.4W）
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機（100V・最大消費電力1250W）（ﾀﾞｲﾔﾑｰﾀﾞｲﾔﾑ外径φ98）（常時換気対応品）ホワイト
フロフタ	保温風呂フタ（PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚）
給水給湯管	銅管（10A）
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	WP：プレシヤスホワイト
カウンター	H：ブランソルベ
パネﾙ(ｶｳﾝﾀｰ面)	JWX：ホワイトオニキス
パネﾙ(周辺・3面)	VW：パールホワイト
水栓上部ｶｳﾝﾀｰ	－
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	XW：チェッポビアンコ
ドア / 天井	W：ホワイト / HW：ホワイト
収納棚	－
タオル掛け	－
ﾗﾝﾄﾞﾘｰｾｯﾄ	－

Takara standard タカラストانダード株式会社	現場名称： 横浜－横浜SR SB44様邸	PREDENCIA プレデンシア	仕様表	
	現場番号： C3421098	プラン番号： 2701A-2505-0772T	作成日： 2025年6月2日	
	横浜支店 販売課	担当営業：	担当アドバイザー： 横浜SR	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
			設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○	
排気ダクトの敷設工事							○				浴室換気機器のダクト敷設工事
浴室換気機器と排気ダクト接続工事							○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
浴室換気機器の電気・アース接続工事								○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
ウェザーカバーの外壁取付							○	○			建築の外装仕上げ工事
4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事					○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
		建築側排水配管との接続工事 【注記 3】					○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
		給湯機器本体工事（試運転・確認）					○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
1 3	電気 他	内装仕上げ工事		○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
		浴室用電源配線、接続工事						○			浴室機器の事後電気工事
		浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事	

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。




■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

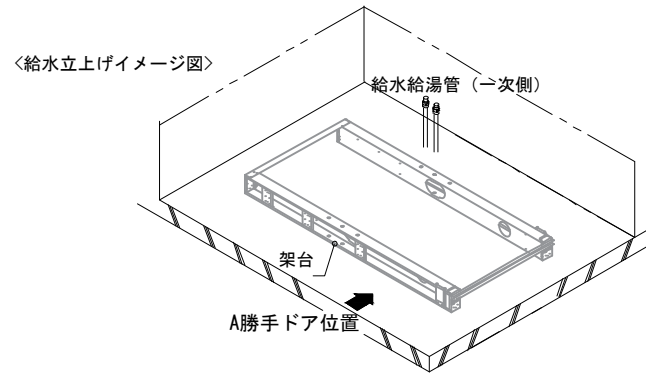

■ 土間コンクリート仕上げ寸法





ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

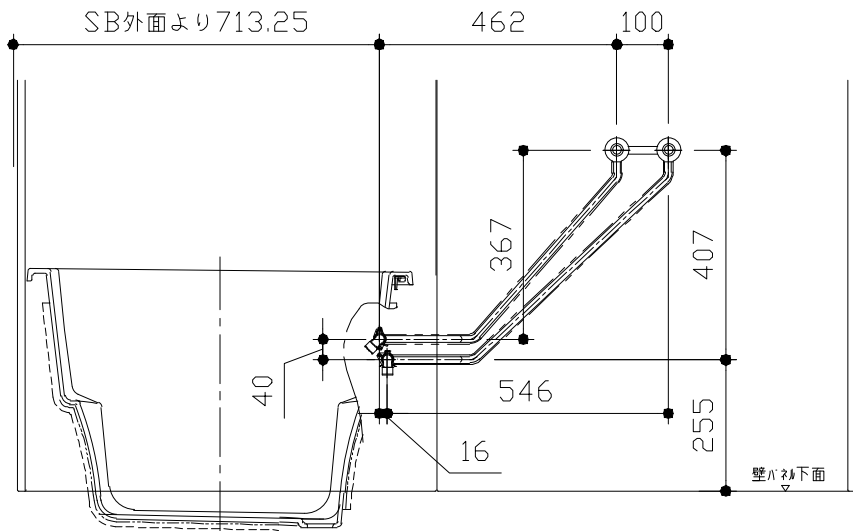

＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置

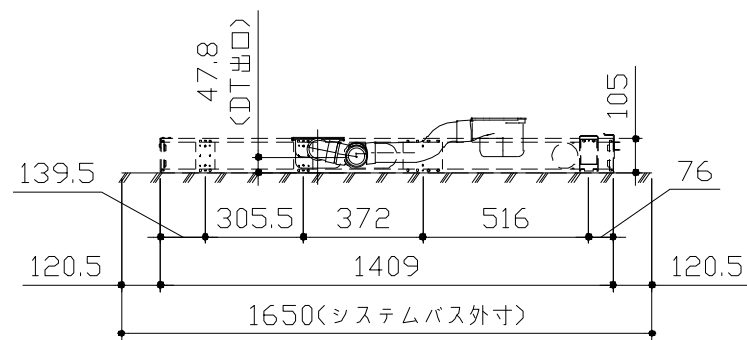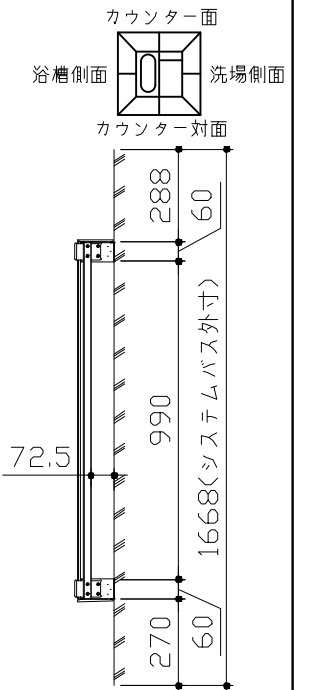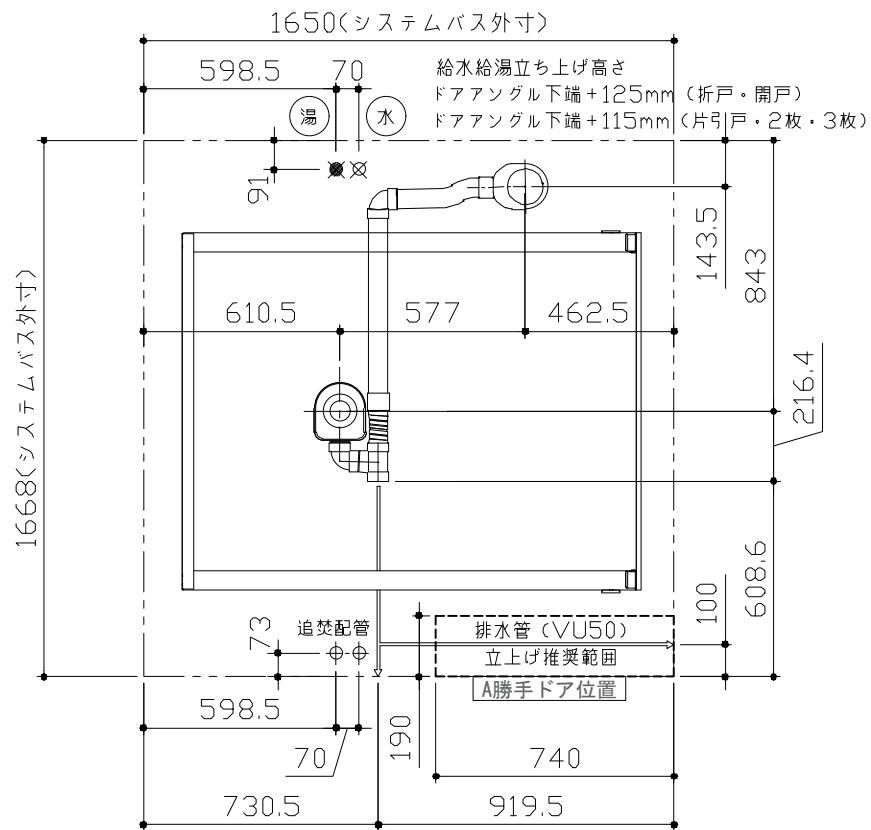

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230


■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。




A矢視

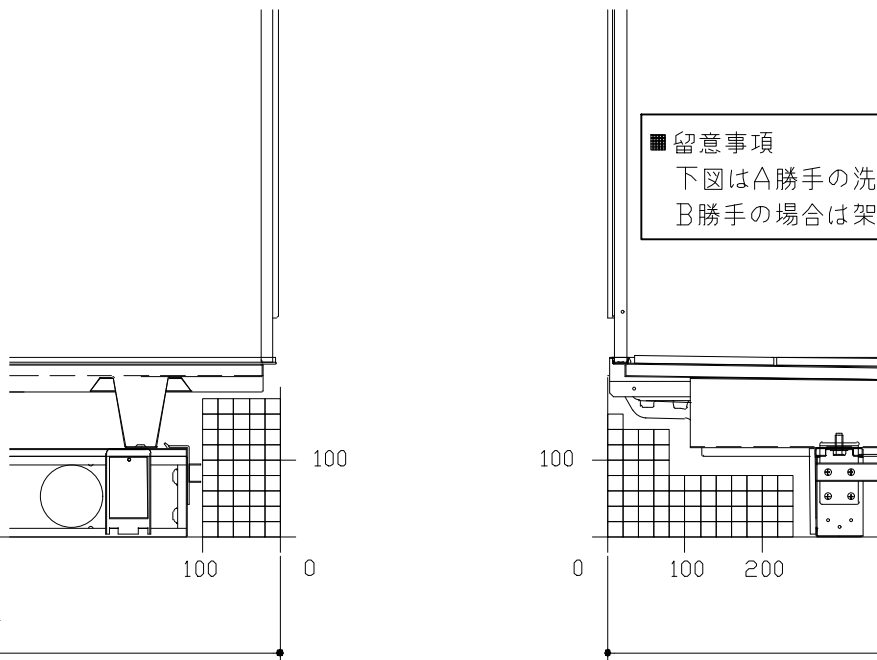


B矢視

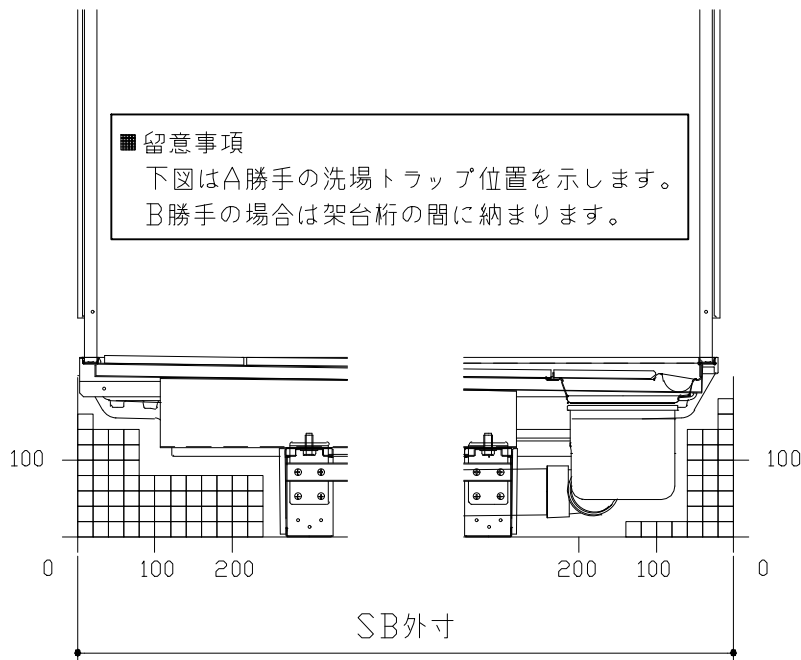


C矢視

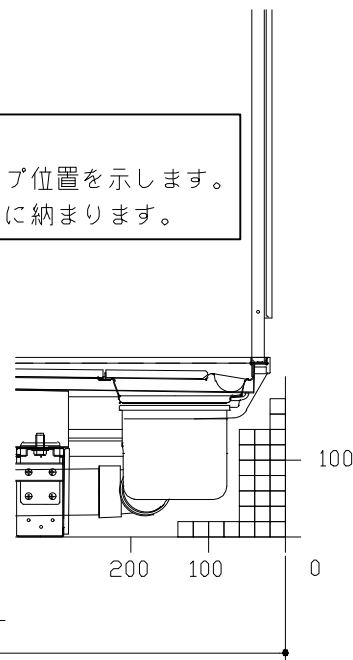

D矢視

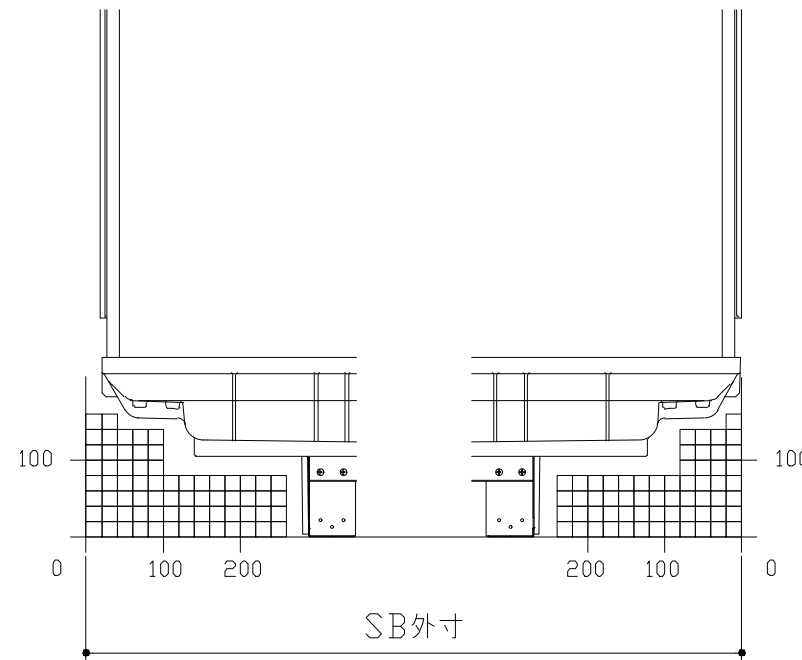


E矢視

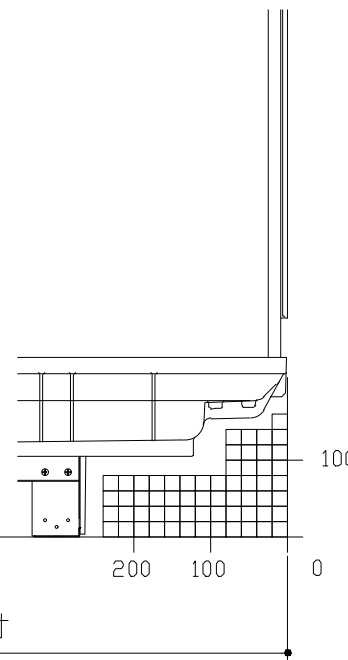


F矢視

キープクリーンドア：開き戸・タテ型換気口

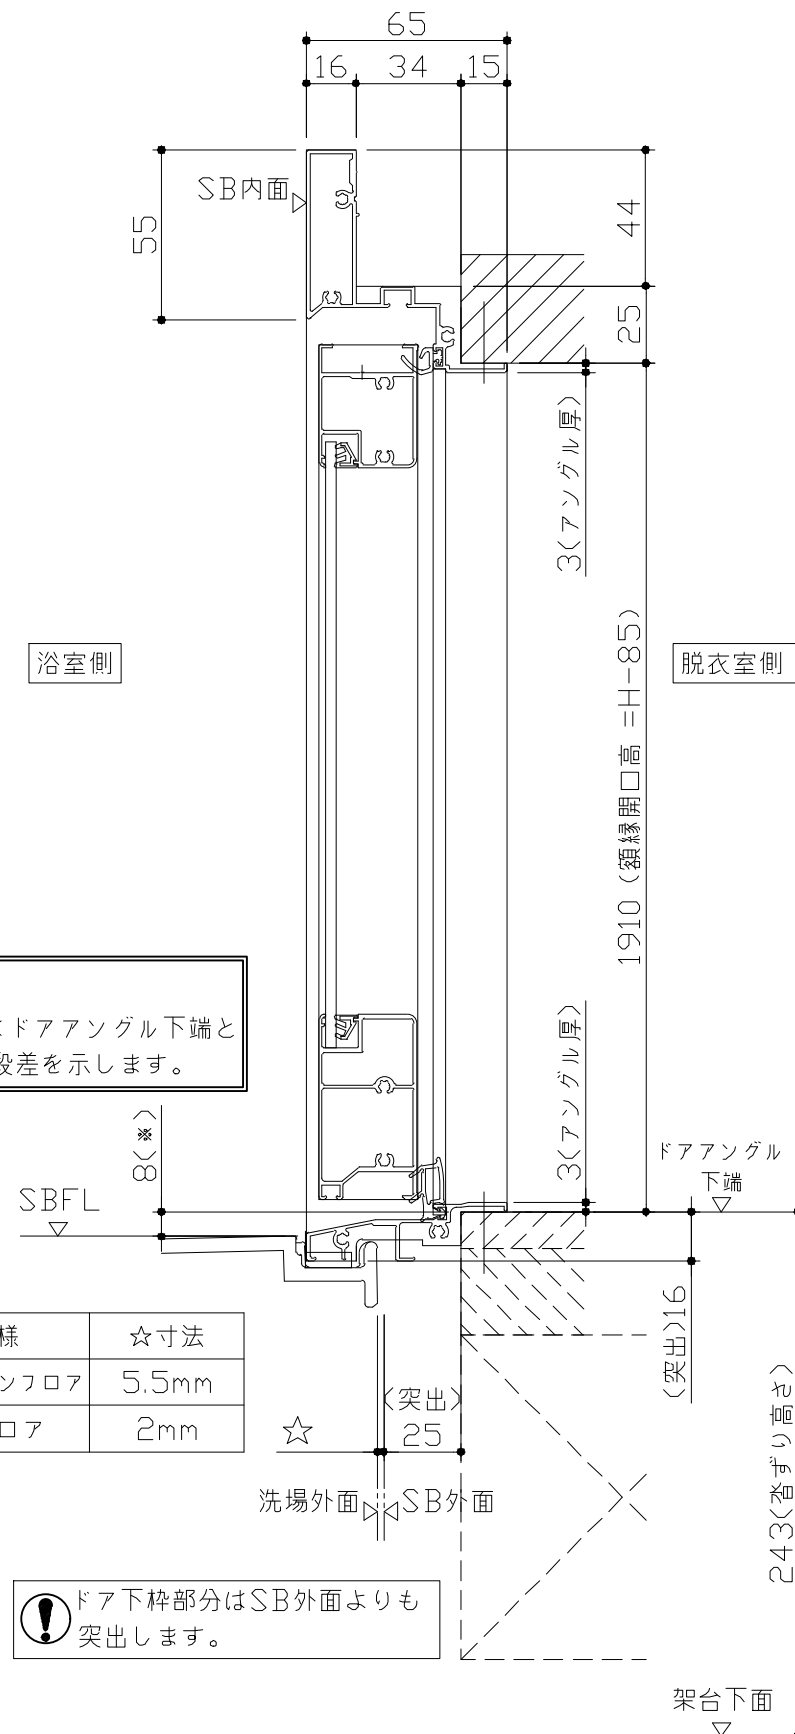


有効開口寸法720mm

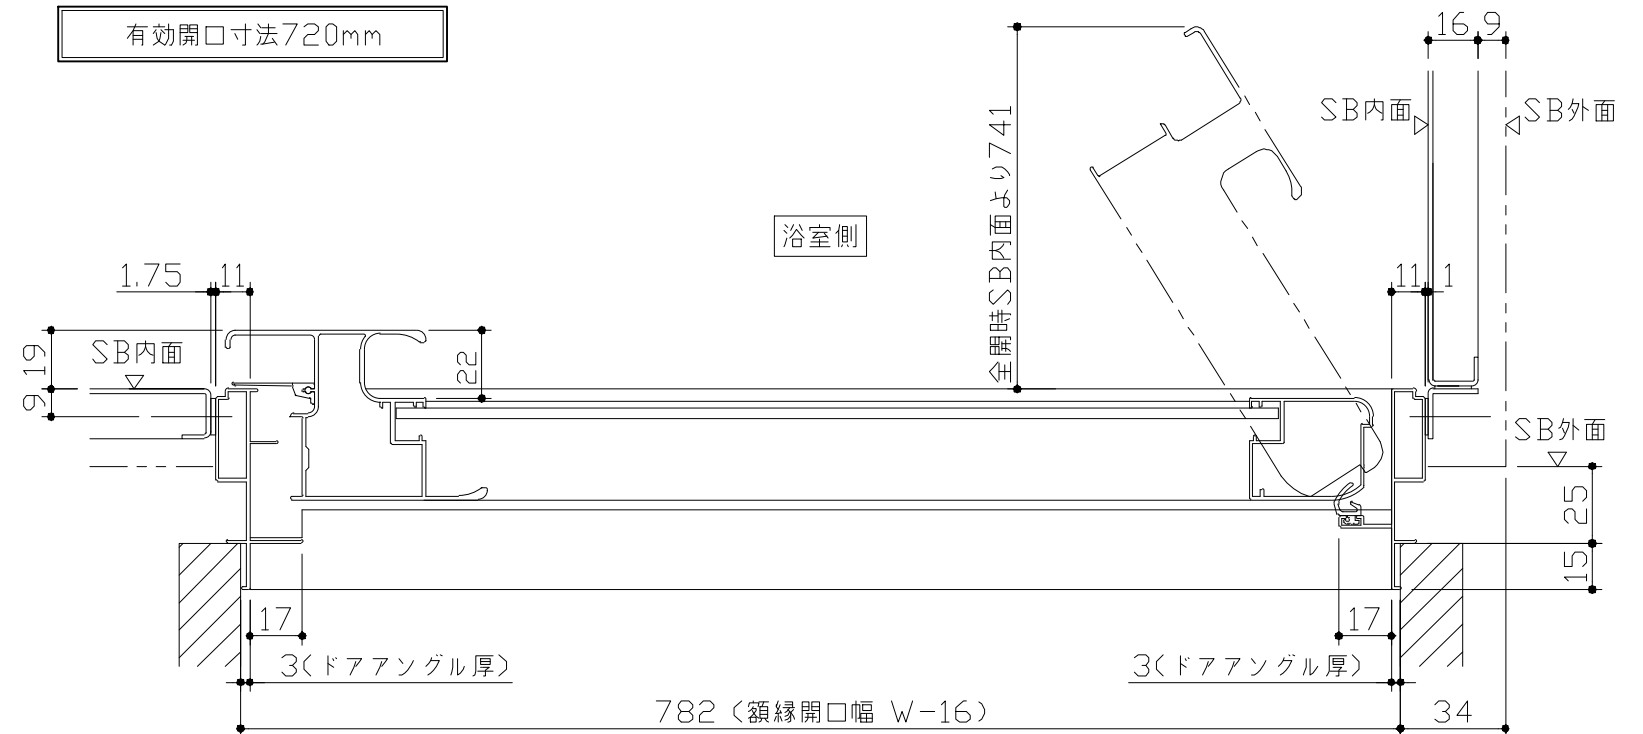

ドア開き角度65°以上でタオル掛けと干渉の恐れがあります。

■ ドアの開閉について


ドアの開閉スペースにご注意ください。
ユニットサイズや収納棚やカウンターなどの
アクセサリにより出入りに支障を感じる
場合があります。

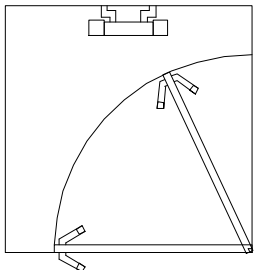

■ ドア横の管柱、間柱について

- ・ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- ・躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



浴室側

〈姿圖〉

Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： 横浜-横浜SR SB44様邸

現場番号： C3421098

横浜支店 販売課

P R E D E N C I A プレデンシア


プラン番号： 2701A-2505-0772T

担当営業：

ドア取合詳細図

作成日： 2025年6月2日

担当アドバイザー： 横浜SR

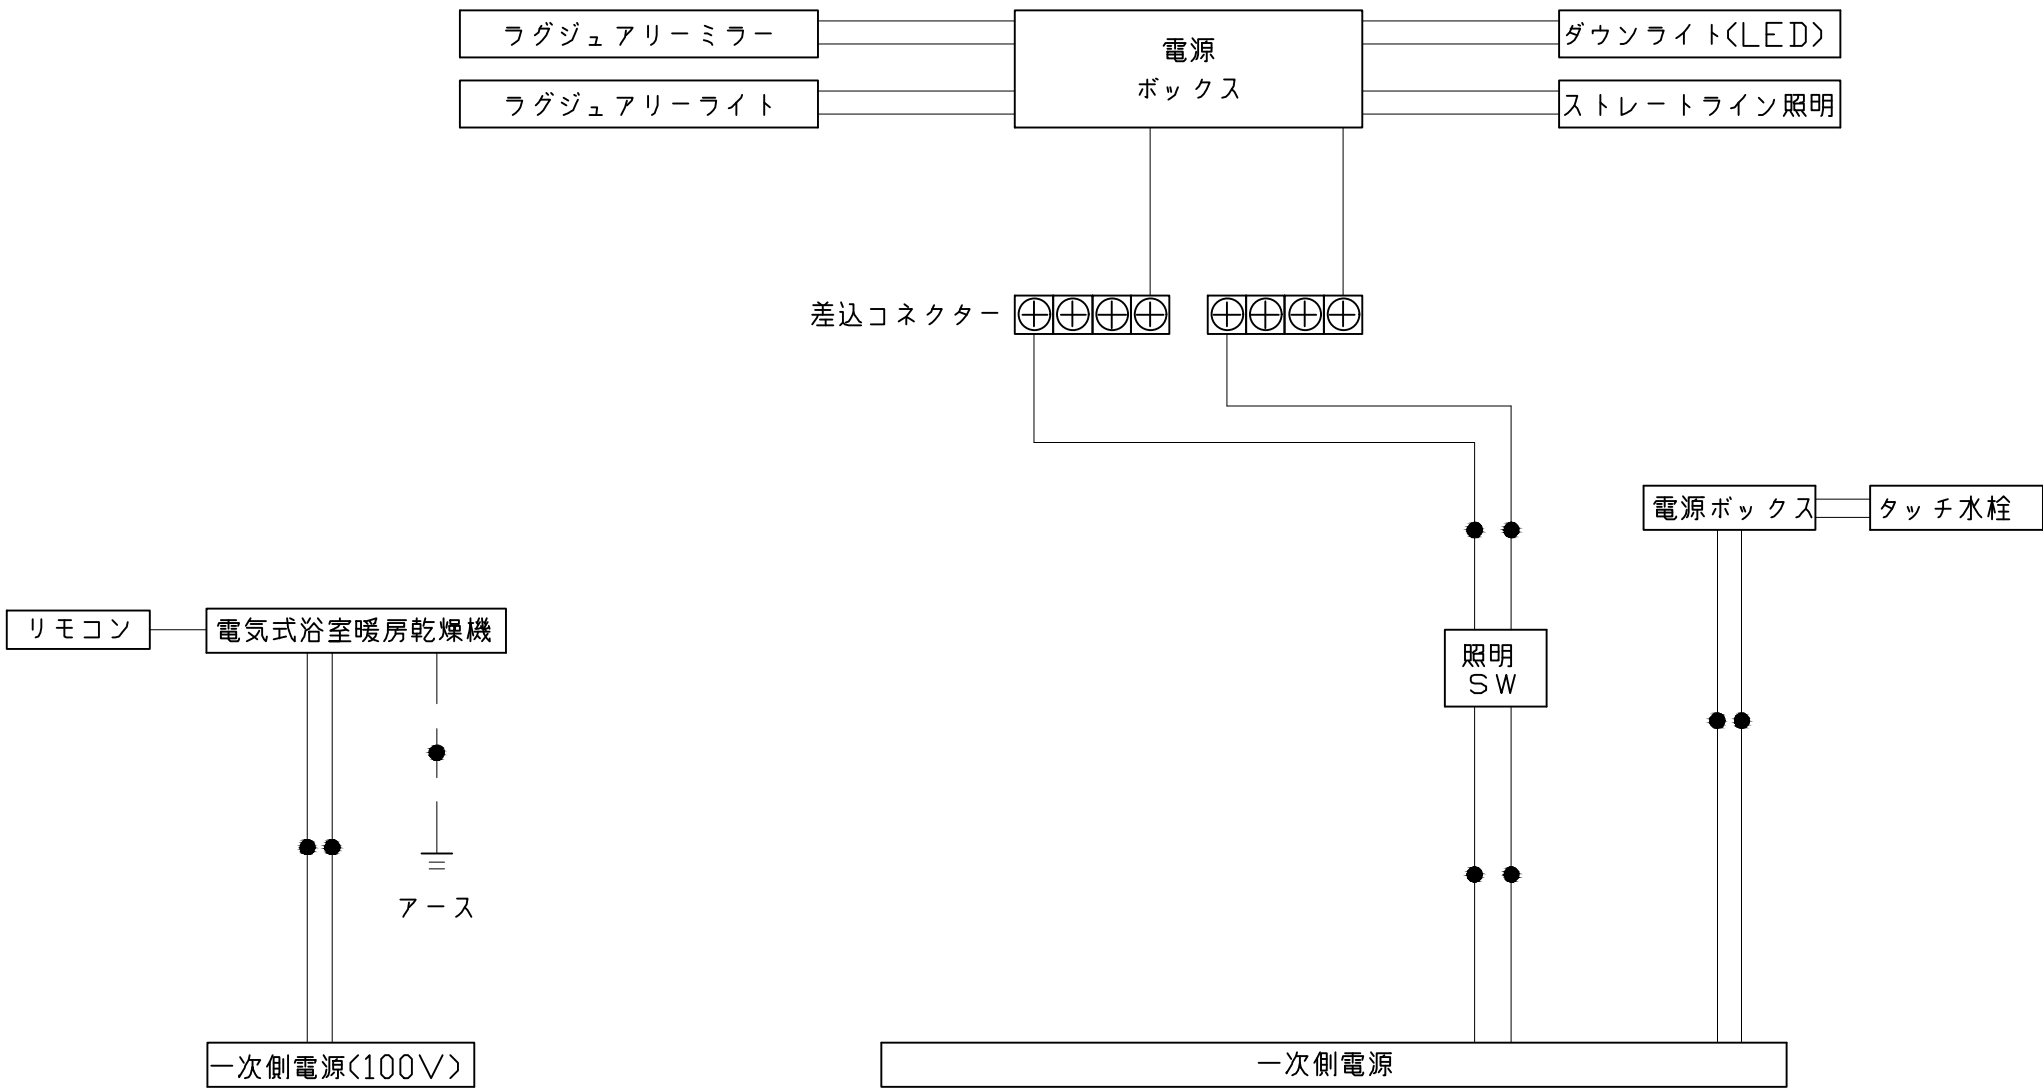

※浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。






一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。





アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

Takara standard タカラストانダード株式会社	現場名称： 横浜－横浜SR SB44様邸	PREDENCIA プレデンシア	電気配線図	
	現場番号： C3421098	プラン番号： 2701A-2505-0772T	作成日： 2025年6月2日	
	横浜支店 販売課	担当営業 ：	担当アドバイザー： 横浜SR	

Takara standard タカスタンダード株式会社	現場名称： 横浜－横浜SR SB44様邸	P R E D E N C I A プレデンシア	吊金具設置図	
	現場番号： C3421098	プラン番号： 2701A-2505-0772T	作成日： 2025年6月2日	
	横浜支店 販売課	担当営業：	担当アドバイザー： 横浜SR	

浴槽 (ジェット噴出口) ジェットバス選択時 (ジェット噴出口) ジェットバス選択時 (ジェット吸水口) ジェットバス選択時 (循環金具穴) うるほか湯選択時 本図は参考図面です	洗い場用水栓 壁パネル内面 (177) ハンドル前面 (136) カウンター前面 (2) PJ 1/2 (59) 62 6 カラン吐水面 G 1/2 シャワーホース接続面 (96) (92)	照明 ストレーライン照明 LED 23.7W (ダウンライト1灯含む) 天井厚み 25 100 1618 100 ダウンライト φ75 (天井開口) 天井厚み 25 63.6 5.7 φ90	
換気機器 リモコンコード長さ：5m 外形：縦120mm×横116mm 管工事 リモコンコード長さ：5m 外形：縦120mm×横116mm 280 (本体寸法) φ100接続 天井厚み 25 372 (グリル) 400 (本体寸法) 145 (本体寸法) システムバス天井 472 (グリル) 38 天井厚み 25 72 (排気)	ラグジュアリーライト LED 3.4 W 750 43.5 48.5 72	シャワーフックスライドバー 136 148 52 80 46 φ30 1080 (115) 72 30 1020 40 30 SB内寸 ネジ取付ピッチ 材質 パイプ部：ステンレス 台座部：ABS、POM等 フック部：ABS等 パネル表面 皿タッピンネジ 取付部分詳細	
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜－横浜SR SB44様邸 現場番号： C3421098 横浜支店 販売課	PREDENCIA プレデンシア プラン番号： 2701A-2505-0772T 担当営業：	部材詳細図 1/2 作成日： 2025年6月2日 担当アドバイザー： 横浜SR

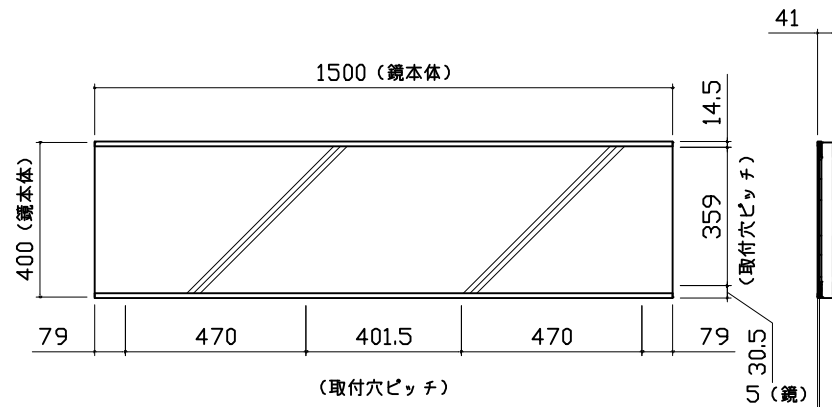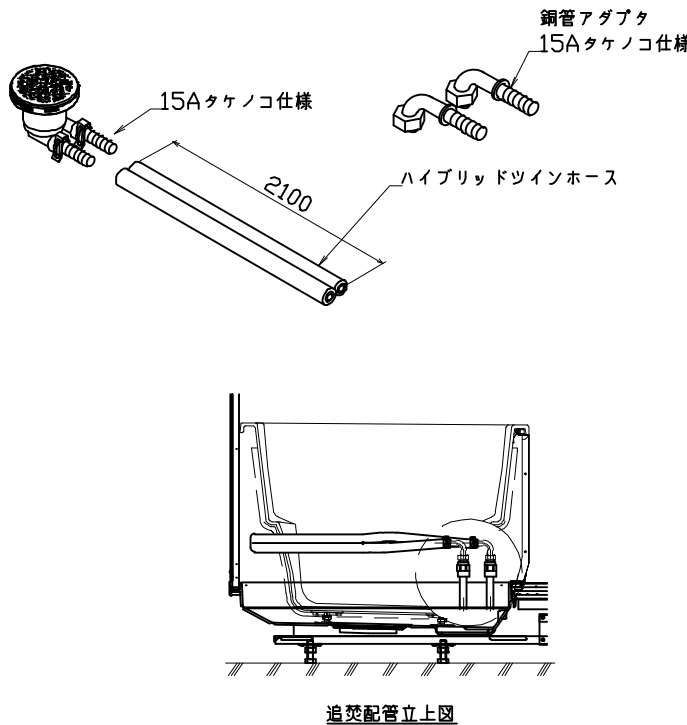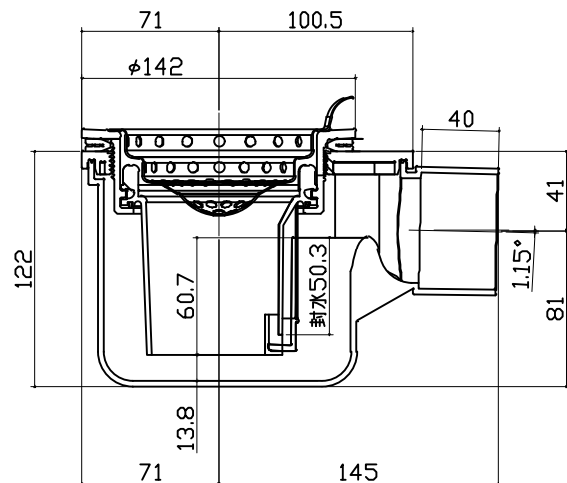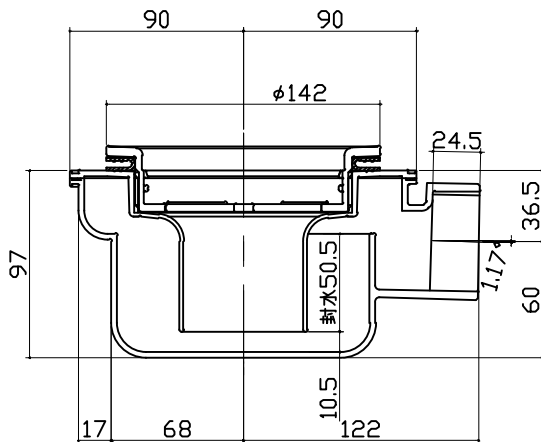ミラー 枠：SUS304 t0.8、PMMA ミラー：表面防曇コートあり LED：13W 		循環金具・フロアダプタ関連  追焚配管立上図		風呂蓋 7077MDH-16YK   断面図			
洗い場側排水トラップ 		浴槽側排水トラップ 					
Takara standard タカスタンダード株式会社		現場名称： 横浜ー横浜SR SB44様邸 現場番号： C3421098 横浜支店 販売課		PREDENCIA プレデンシア プラン番号： 2701A-2505-0772T 担当営業：		部材詳細図 2/2 作成日： 2025年6月2日 担当アドバイザー： 横浜SR	

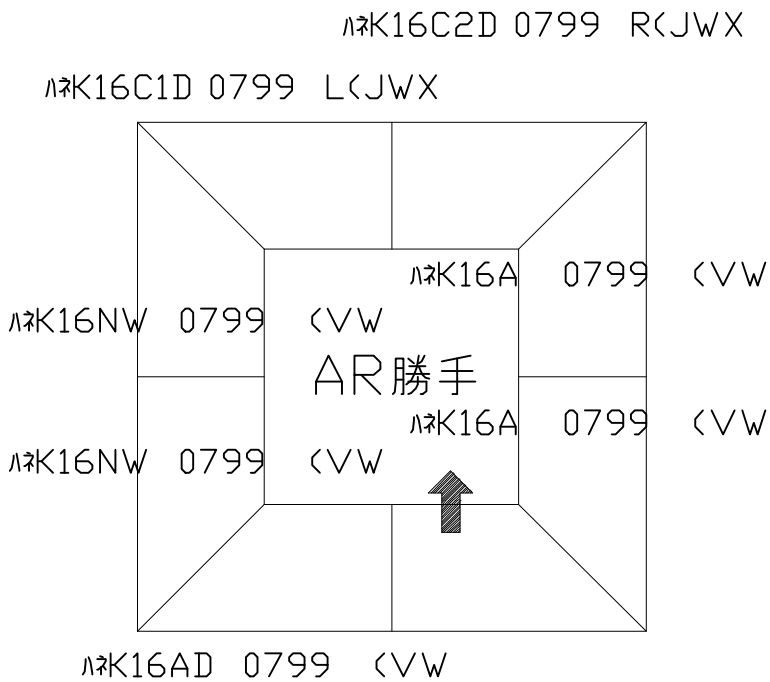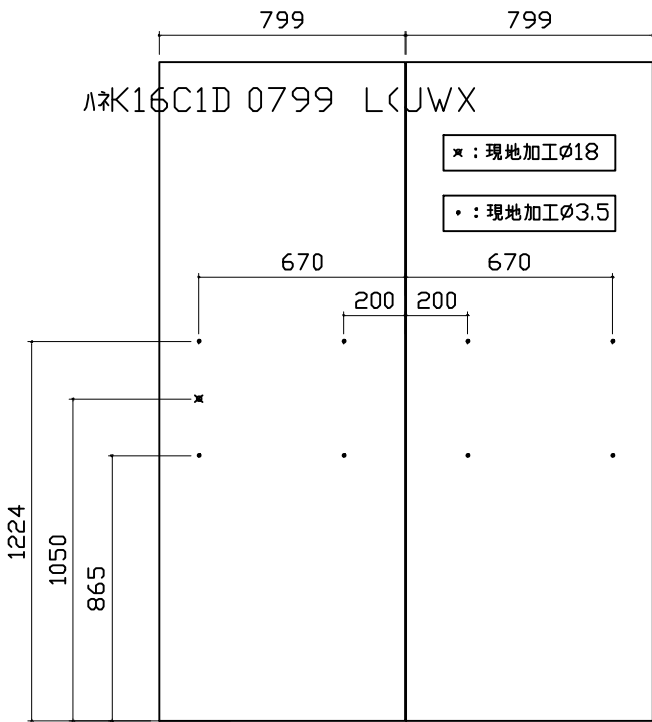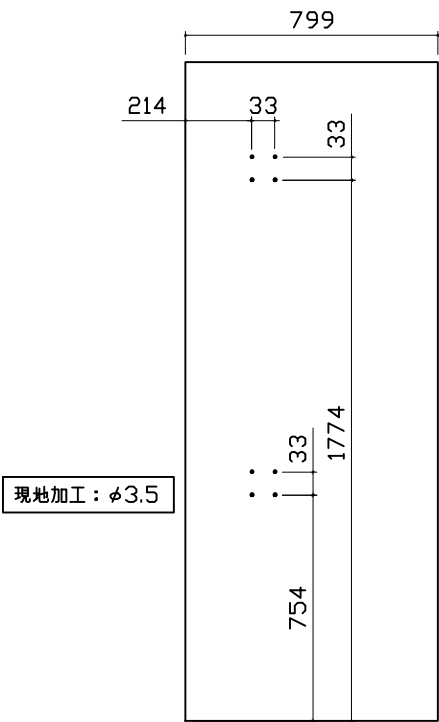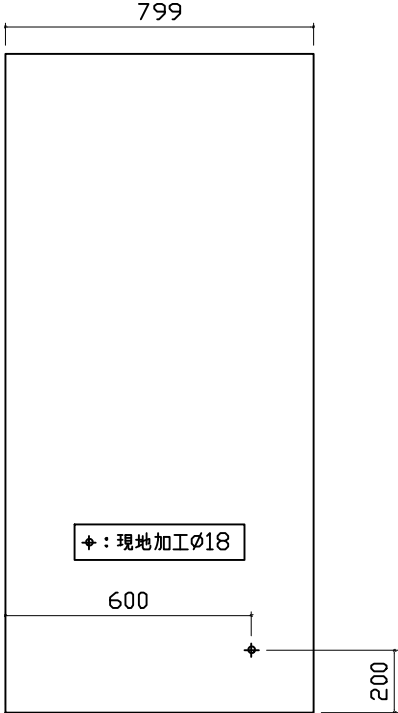パネル割図		ミラー	シャーフックスライドバー		
ハネK16C2D 0799 R<JWX ハネK16C1D 0799 L<JWX ハネK16NW 0799 <VW ハネK16NW 0799 <VW ハネK16A 0799 <VW ハネK16A 0799 <VW ハネK16AD 0799 <VW AR勝手 		ハネK16C2D 0799 R<JWX ハネK16C1D 0799 L<JWX ※：現地加工φ18 ・：現地加工φ3.5 	ハネK16A 0799 <VW ※：現地加工φ3.5 		
ラグジュアリーライト					
ハネK16C1D 0799 L<JWX ※：現地加工φ18 					
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜－横浜SR SB44様邸		PRE DENC I A プレデンシア		穴開け指示図
	現場番号： C3421098		プラン番号： 2701A-2505-0772T		作成日： 2025年6月2日
	横浜支店 販売課		担当営業：		担当アドバイザー： 横浜SR
					1/1
