

システムバス 御見積書

御名前 横浜-横浜SR SB34 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランスパ

作成日 2025年6月2日
プラン番号 2701A-2506-0042T
現場番号 C3420954

タカラスタンダード株式会社
◆横浜支店 販売課
神奈川県横浜市神奈川区富家町4番1
TEL 045-435-8033 / FAX 045-435-8051

◆横浜ショールーム
TEL 045-435-8039 / FAX 045-435-8055

商品
御見積金額 **¥1,455,300** (税込 **¥1,600,830**)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥218,000** (税込 **¥239,800**)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616(AR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	サンディグレー
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	クリスタルパールホワイト
浴槽形状	ラウンド浴槽
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ダークグレー / ブラック
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ジオマーブルアイボリー
パネルカラー(周辺)	パールホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 50Hz

◆ 御確認事項

◆ 備考

No.*

御名前 横浜-横浜SR SB34

様

現場番号	C3420954	プラン番号	2701A-2506-0042T	作成日	2025/6/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	769,000	769,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・周辺ハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・サンディグレイ)	1	+29,000	+29,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(クリスタルパールホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
11	浴槽形状	人大ラウンド浴槽	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	あり クッションピロー:チャコールグレイ	1	+199,000	+199,000
14	うるぽか湯	なし	1		
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
17	浴槽パン	あり	1		
18	洗い場用水栓	タッチ水栓:樹脂製ホース(メタル調)FTB230K 水栓上部カウンター(ダークグレイ)	1	+91,000	+91,000
19	洗い場用水栓	エコシャワー(節水+手元止水):KVK FTB230KAB	1	+6,500	+6,500
20	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
21	カウンター	人造大理石カウンター	1		
22	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
23	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザイン 周辺ハイクラス)(Kパネル)	1	+55,000	+55,000
24	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
25	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
26	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ブラック	1	+52,500	+52,500
27	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
28	換気機器開口	工場開口	1		
29	照明	ストレートライン照明(調光・調色機能付・ラグジュアリーミラー対応用)	1	+91,000	+91,000
30	天井照明開口	工場開口	1		
31	ミラー	ラグジュアリーミラー(全幅タイプ)	1	+117,000	+117,000

御名前 横浜-横浜SR SB34 様

現場番号	C3420954	プラン番号	2701A-2506-0042T	作成日	2025/6/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
33	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
34	収納棚	収納棚なし	1		
35	どこでもラック	タオルハンガーL(チャコールグレー)	1	+2,800	+2,800
36	風呂フタフック	風呂フタフック(固定式)(チャコールグレー)	1	+4,000	+4,000
37	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
38	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
39	トラップカバー	なし	1		
40	ブロック積用ボンド	2段用	1	+2,000	+2,000
システムバス合計			40		¥1,455,300

商品総合計	40	¥1,455,300
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥218,000 (税込 ¥239,800)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

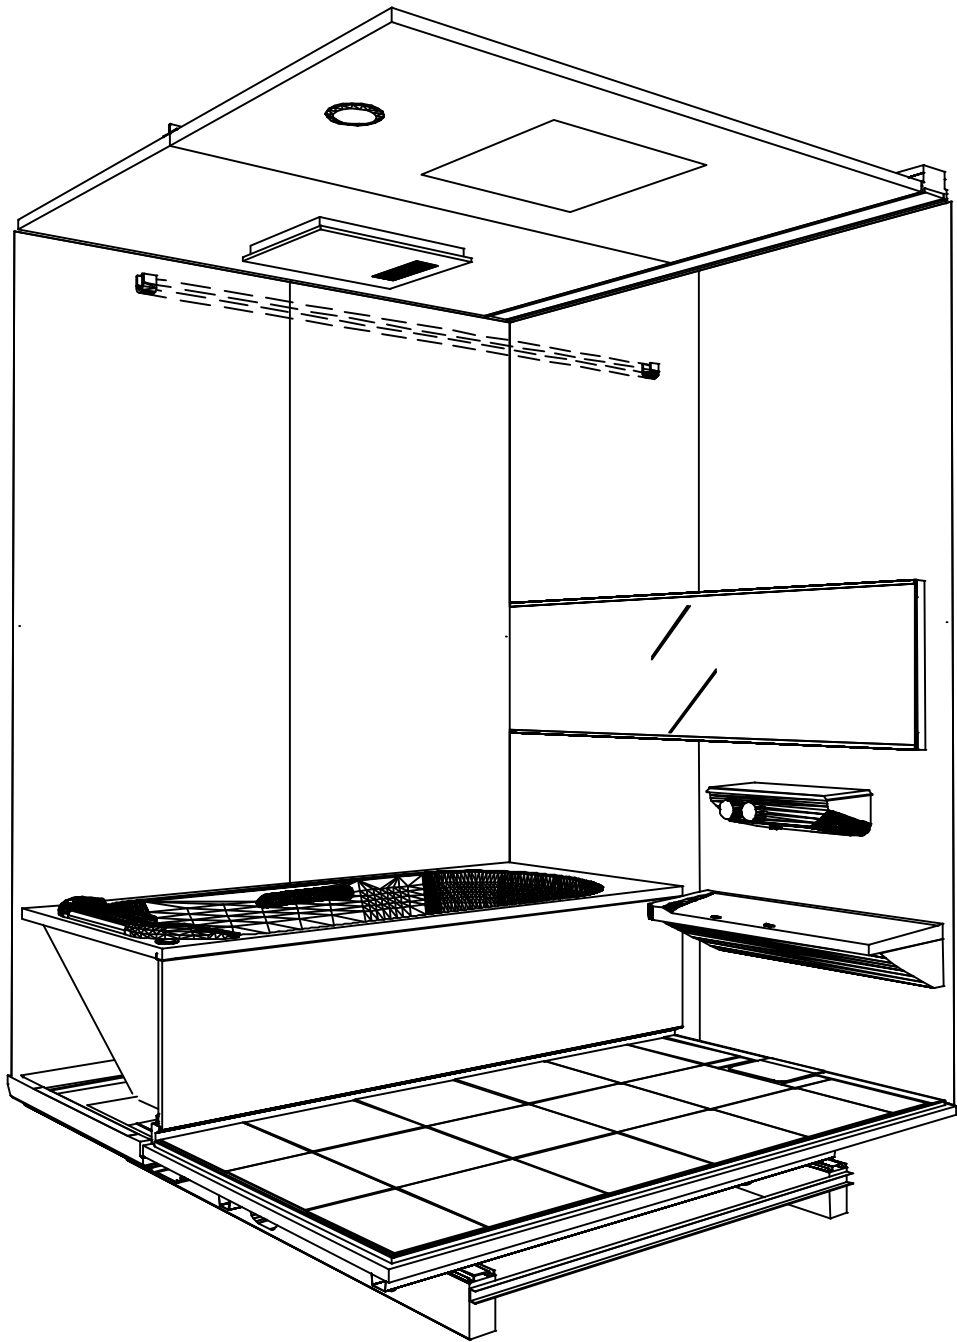

鳥瞰図

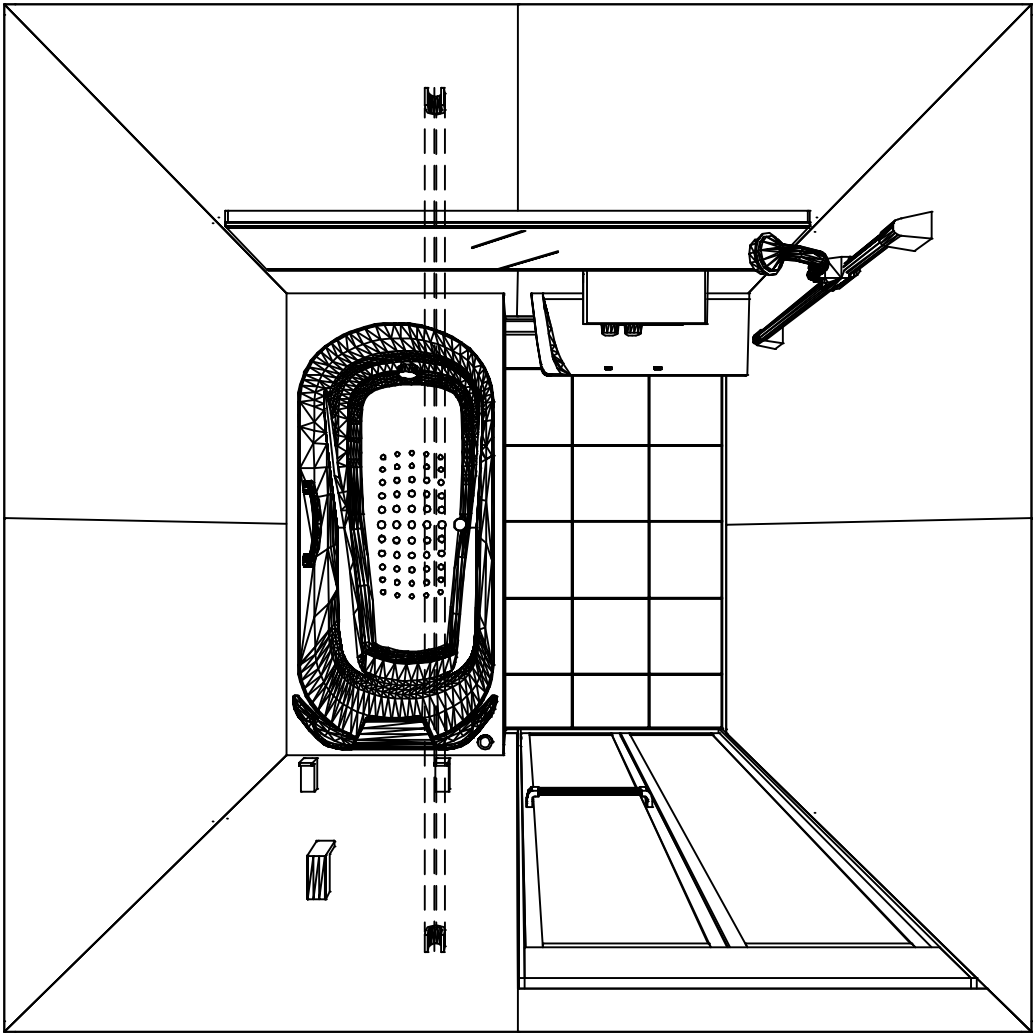

1616

フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

カウンター面


浴槽側面

洗場側面




カウンター対面

■ 留意事項

* 印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。

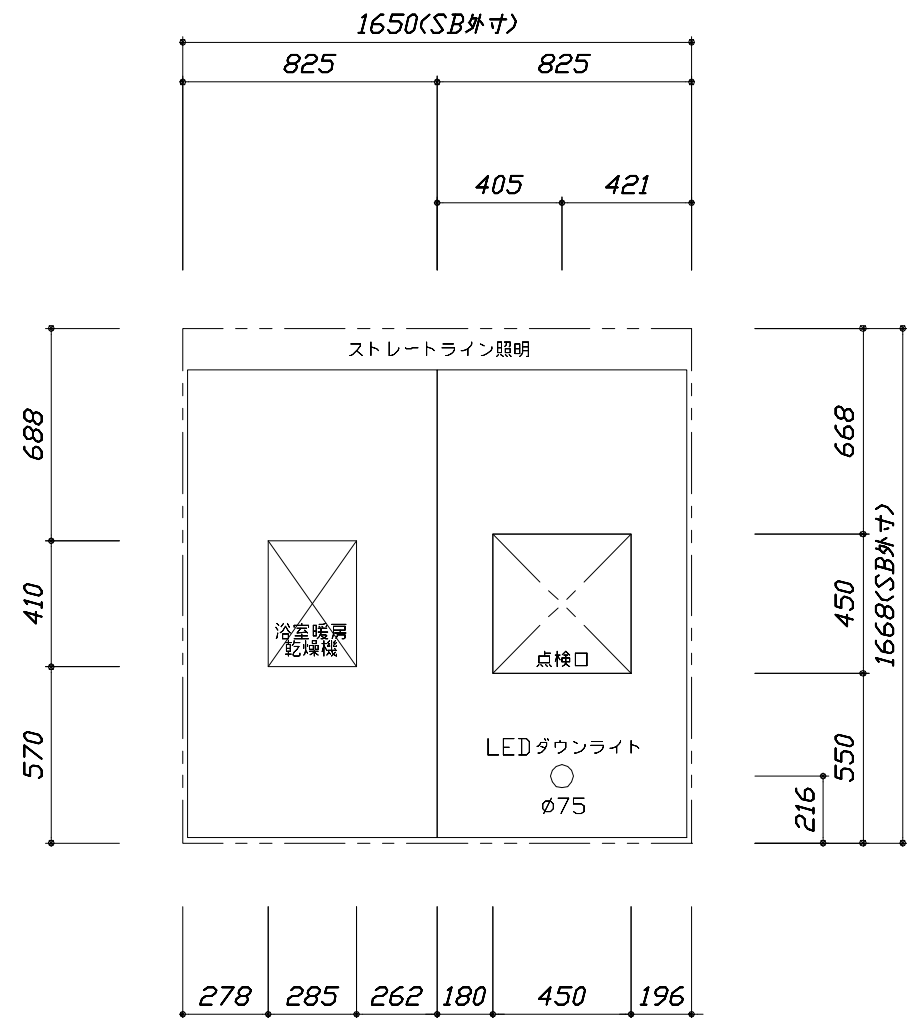




<天井伏図>

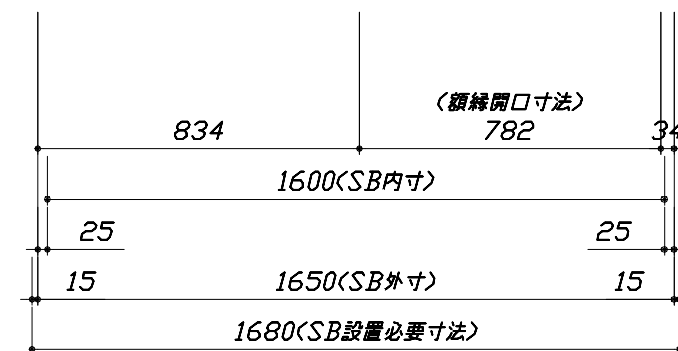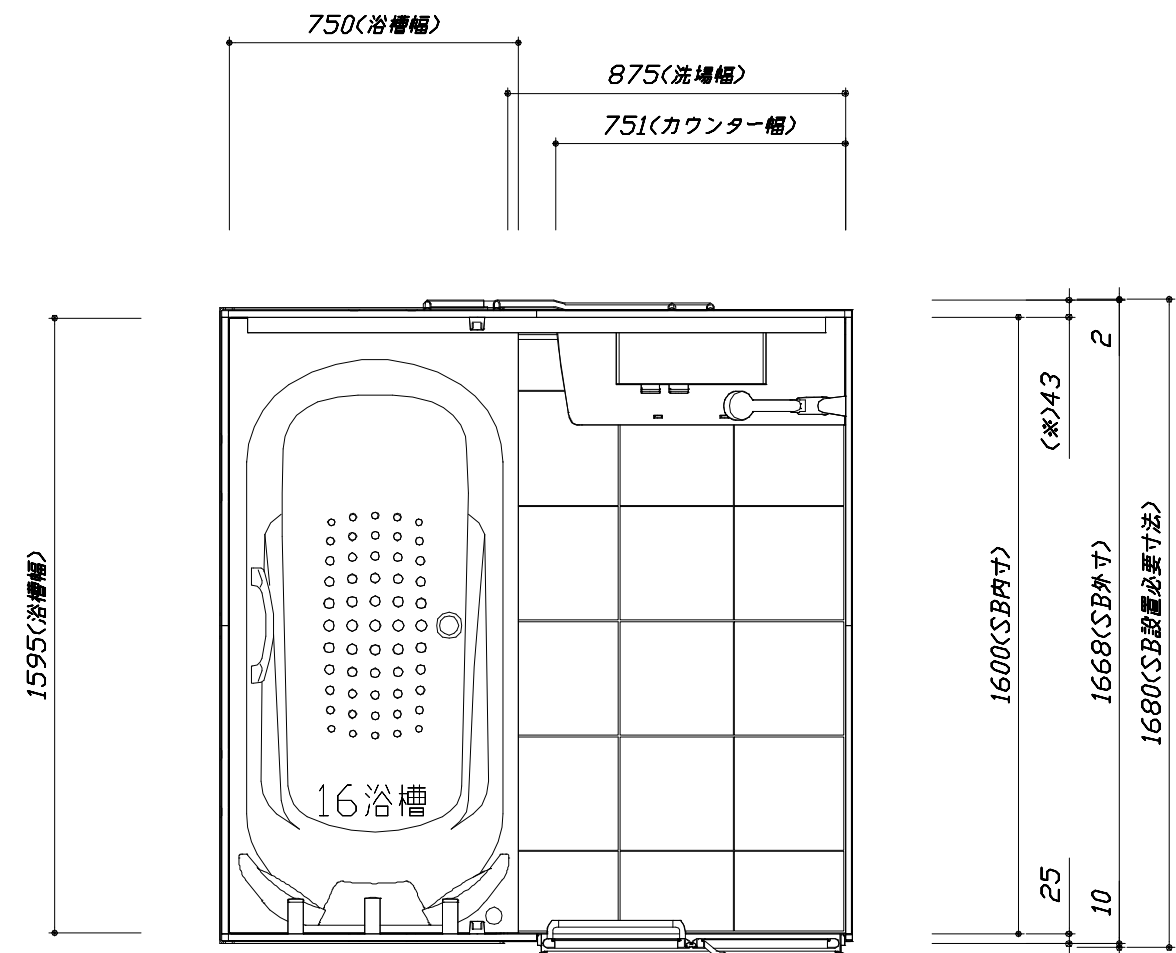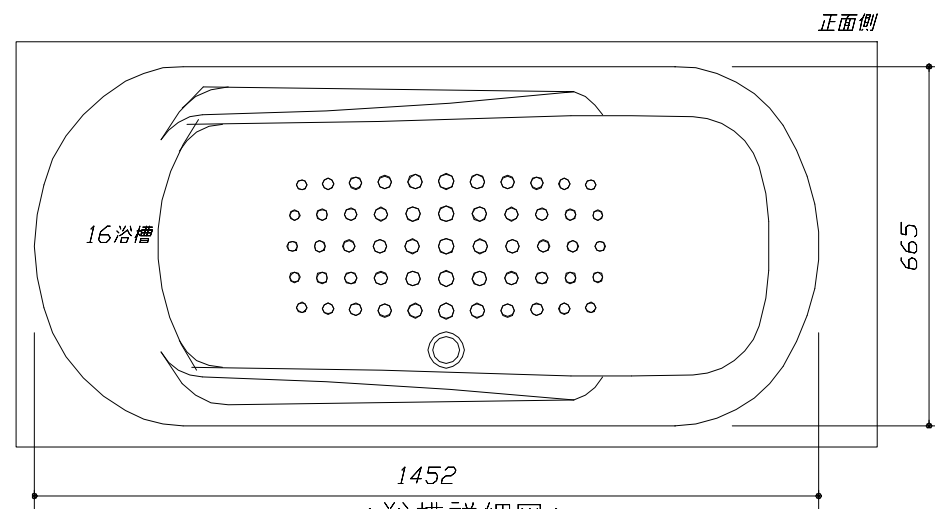

<平面図>



このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

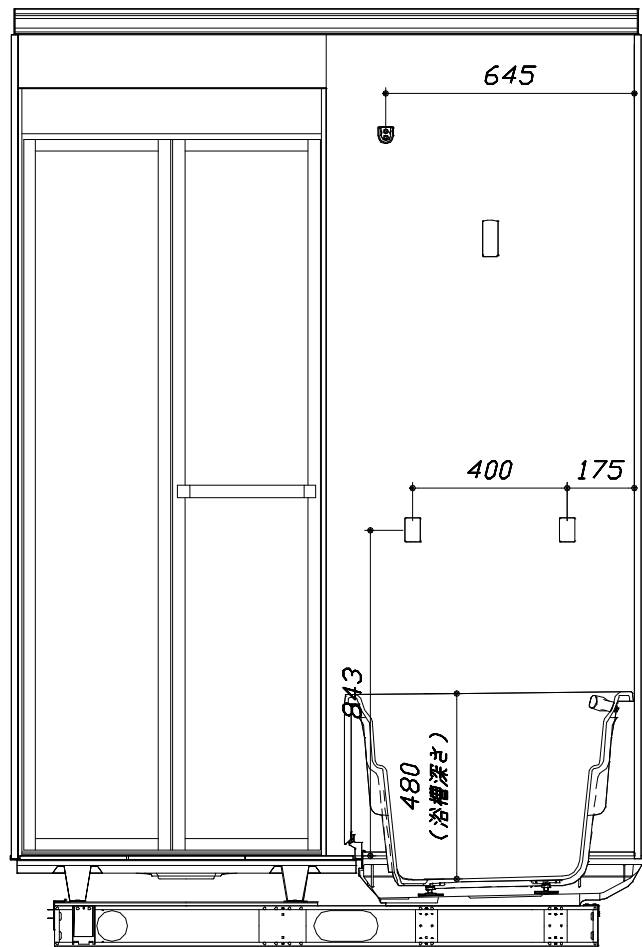

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

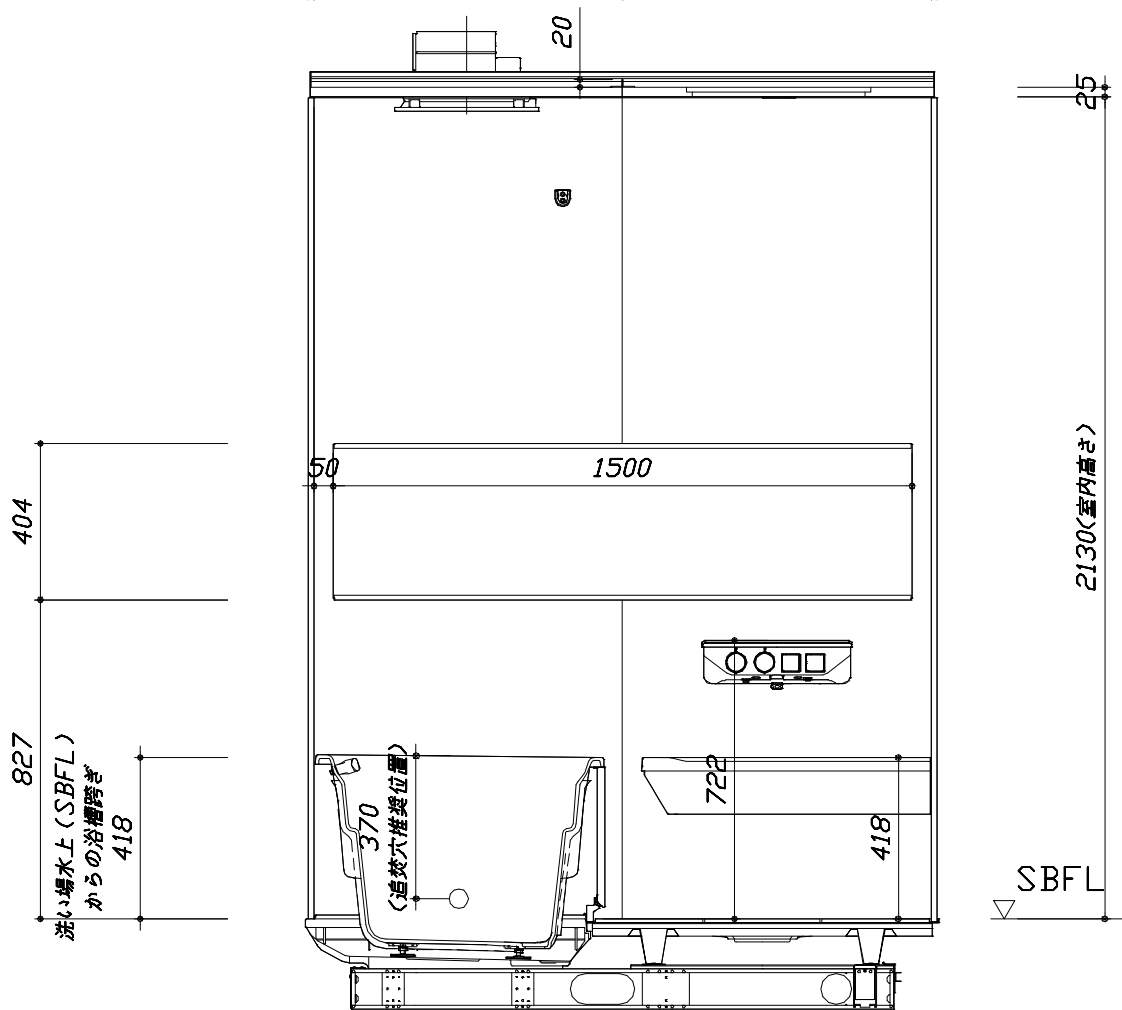

<カウンター面図>

Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： 横浜－横浜SR SB34様邸
現場番号： C3420954
横浜支店 販売課


GRANSPA グランspa
プラン番号： 2701A-2506-0042T
担当営業：横浜SR

施工図2 縮 尺： 1:20
作成日： 2025年6月2日
担当アドバイザー： 横浜SR

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

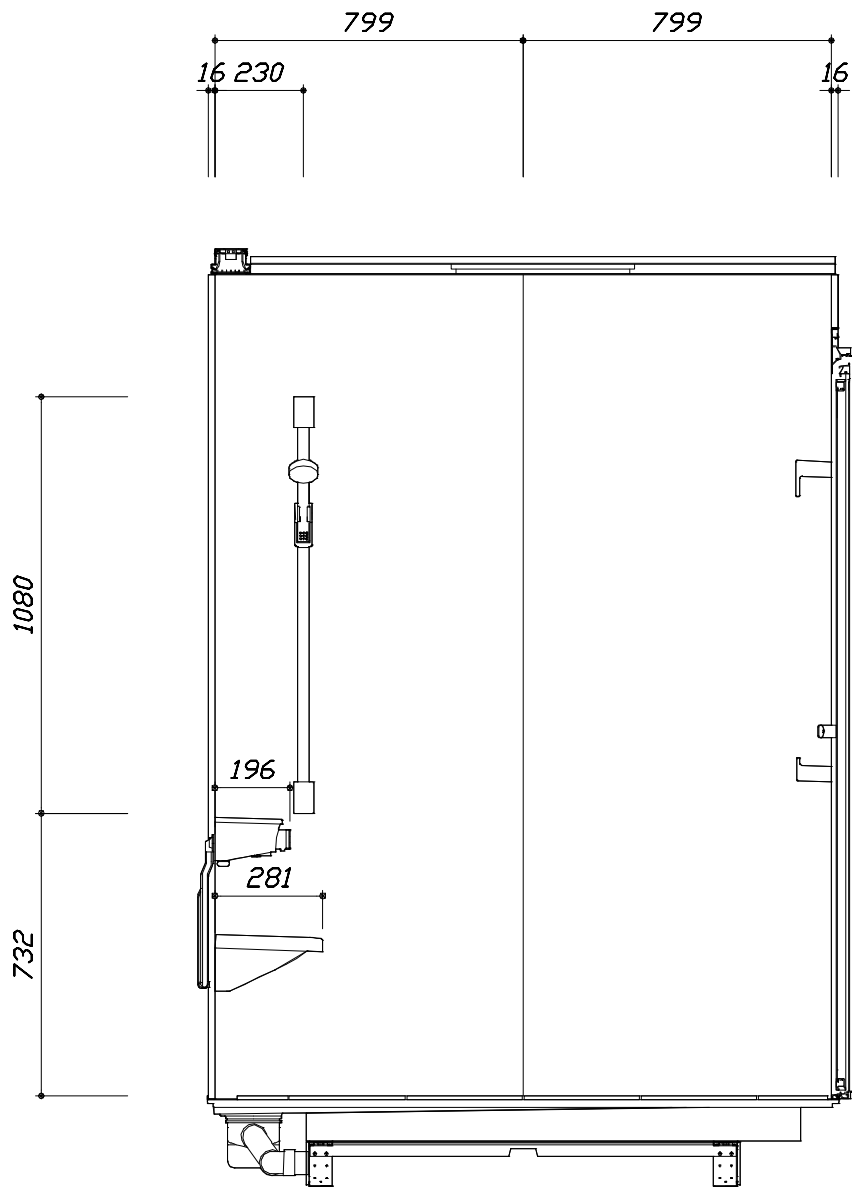

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

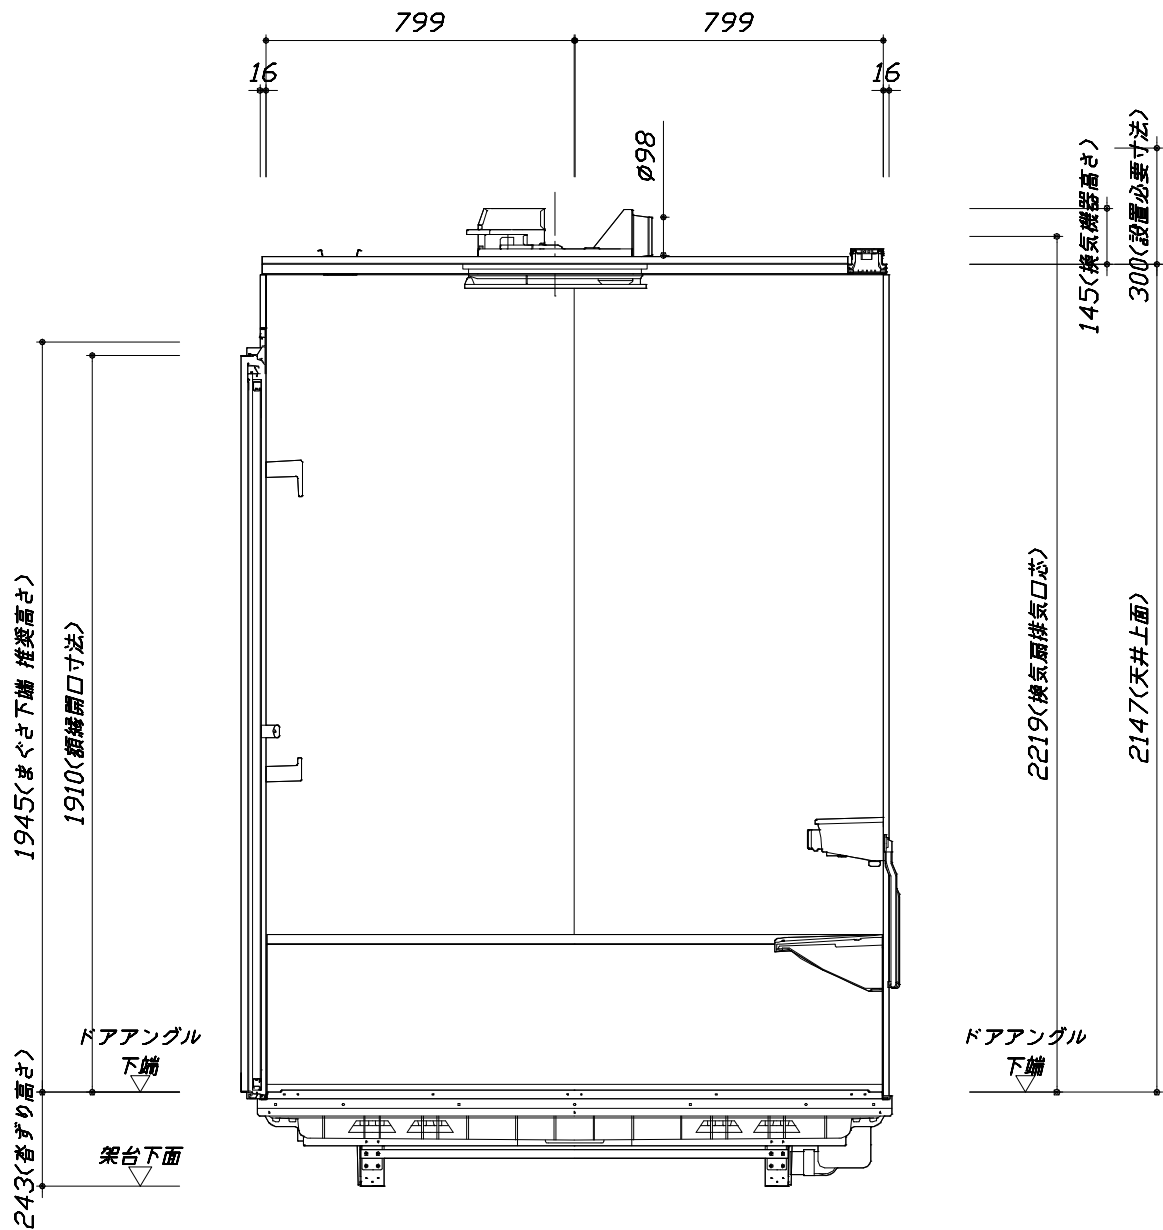

< 浴槽側面図 >

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 横浜ー横浜SR SB34様邸
現場番号： C3420954
横浜支店 販売課

GRANSPA グランspa
プラン番号： 2701A-2506-0042T
担当営業： 横浜SR

施工図3
縮 尺： 1:20
作成日： 2025年6月2日
担当アドバイザー： 横浜SR

縮尺：A3サイズ等倍

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分			参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』								
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査			
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事	
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
浴室用電源配線、接続工事							○		浴室機器の事後電気工事		
浴室天井裏の電源、スイッチ工事							○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		


※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する

※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。




■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

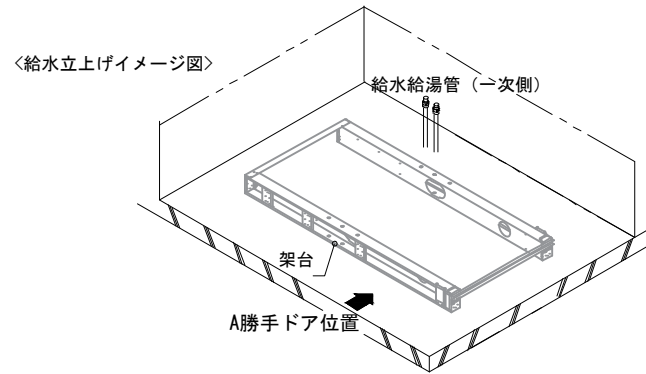

■ 土間コンクリート仕上げ寸法



ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

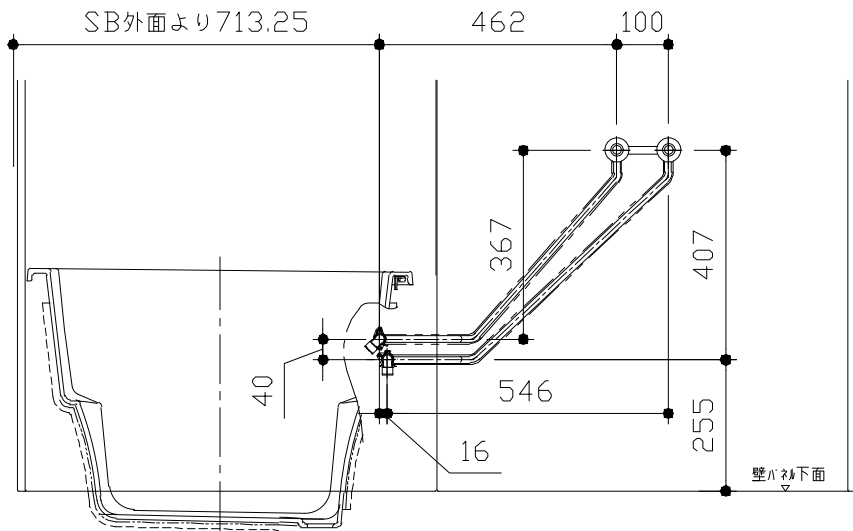




＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置

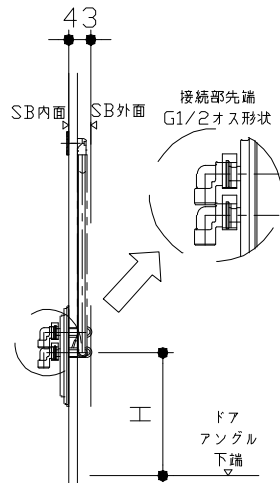

ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230

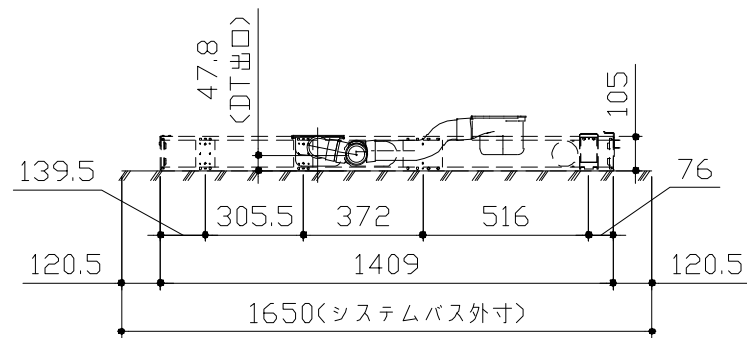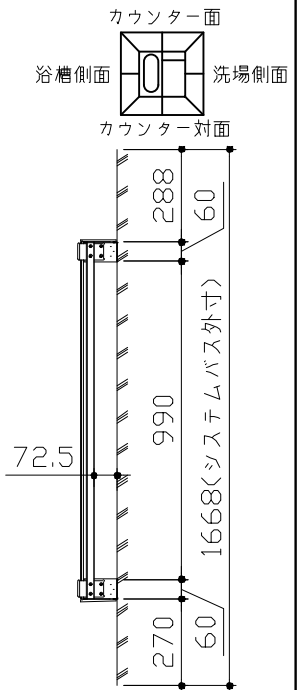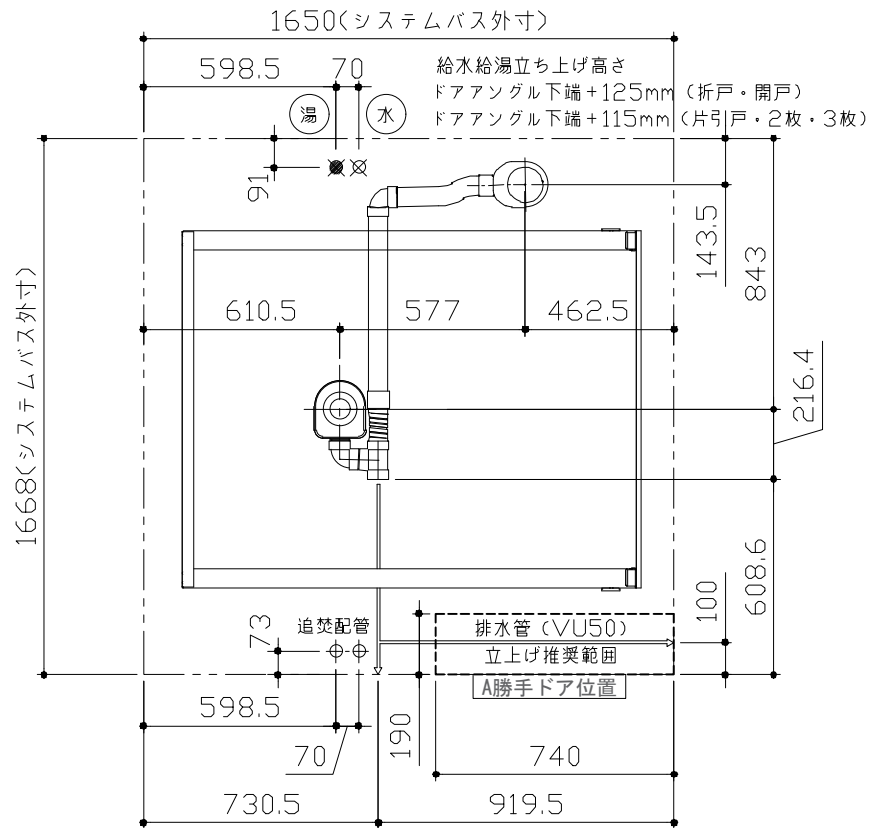

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

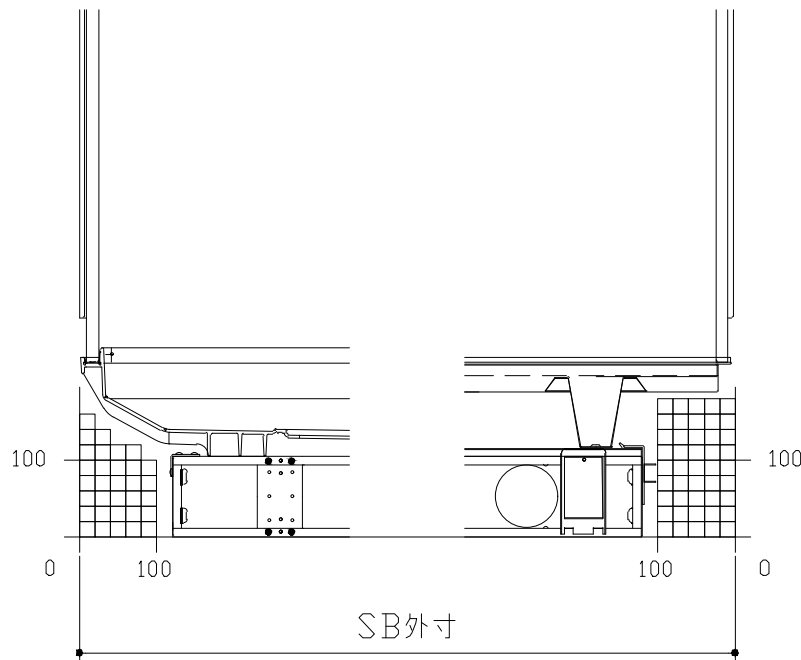


A矢視

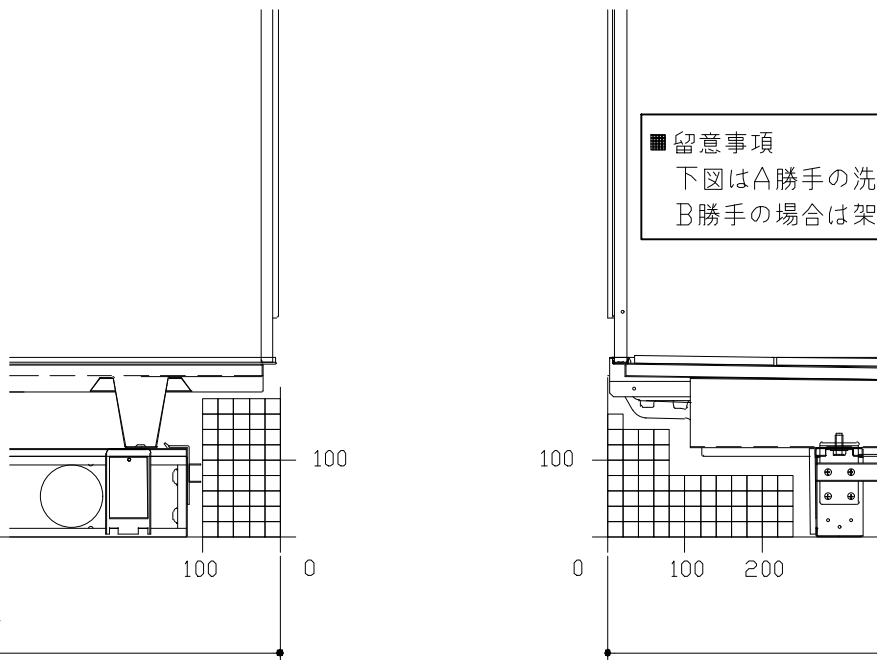


B矢視

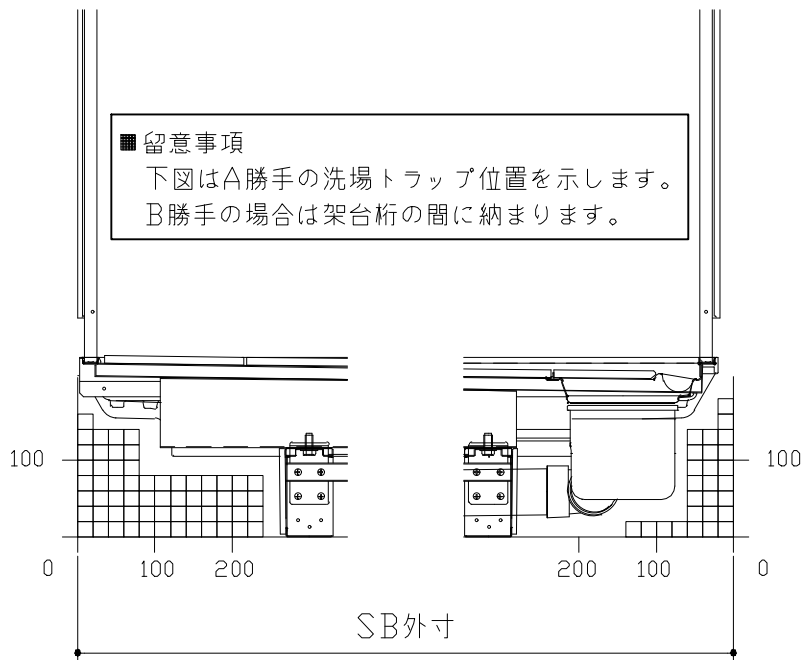


C矢視

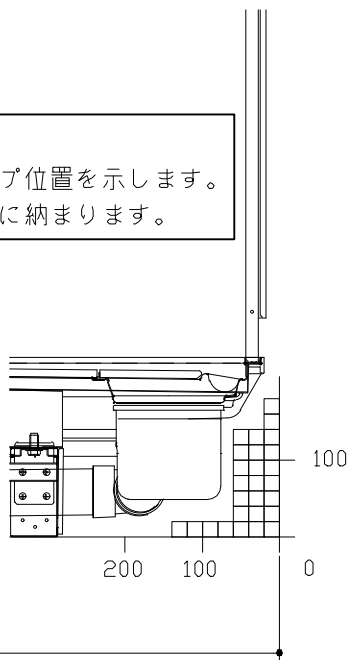

D矢視




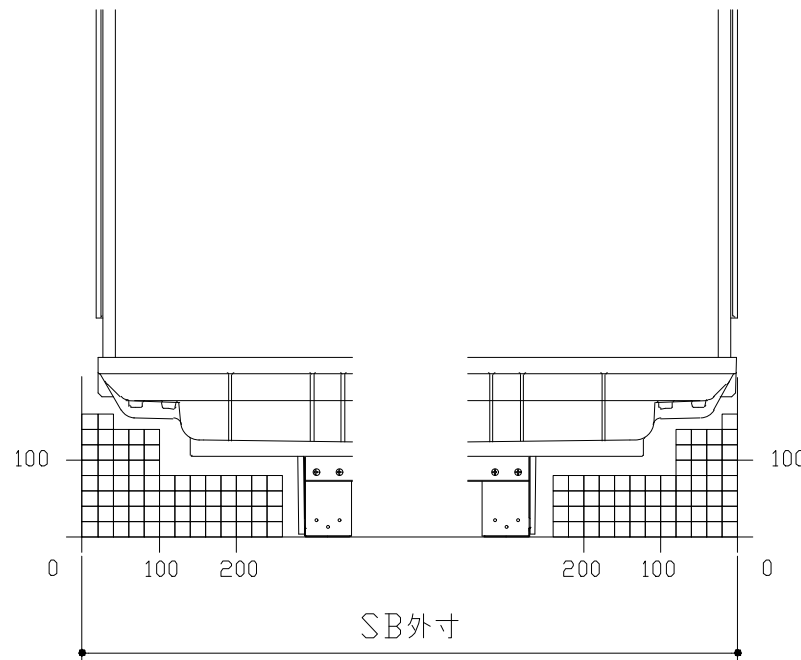



E矢視

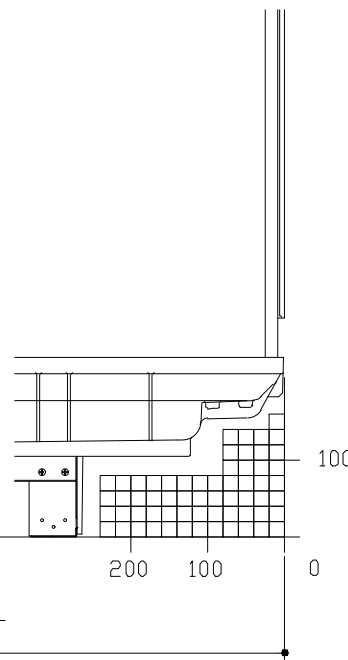







F矢視

キープクリーンドア：折戸・上部換気口

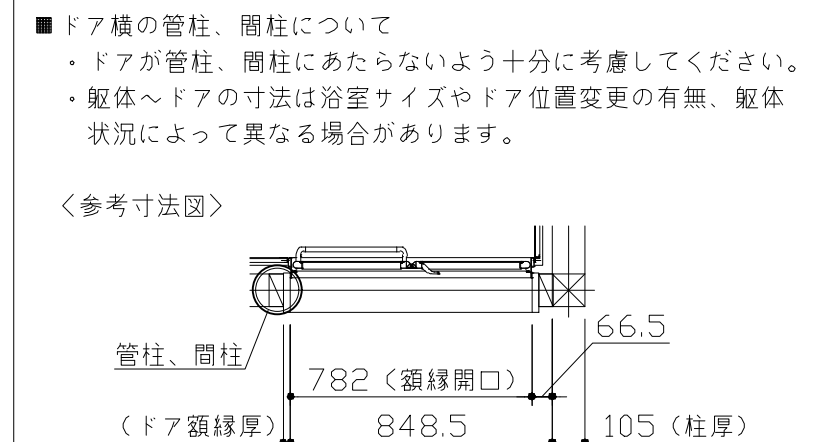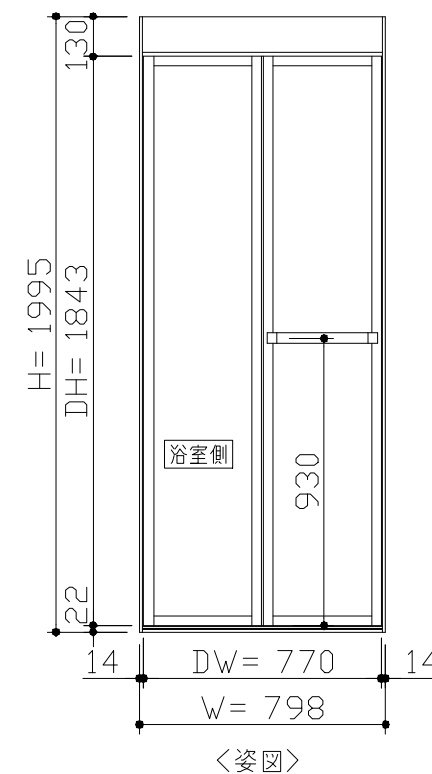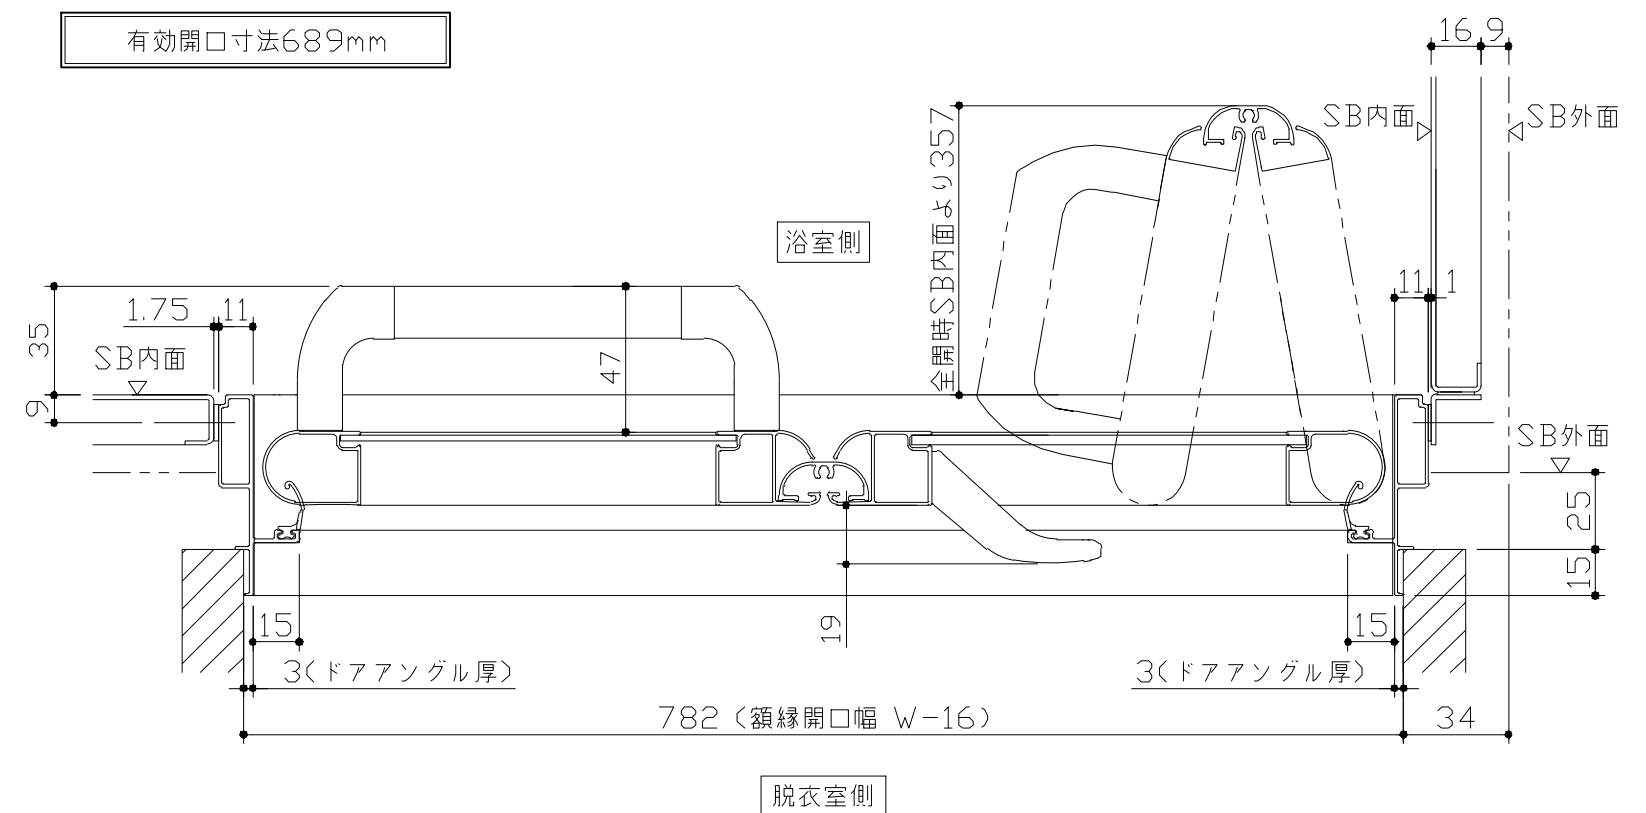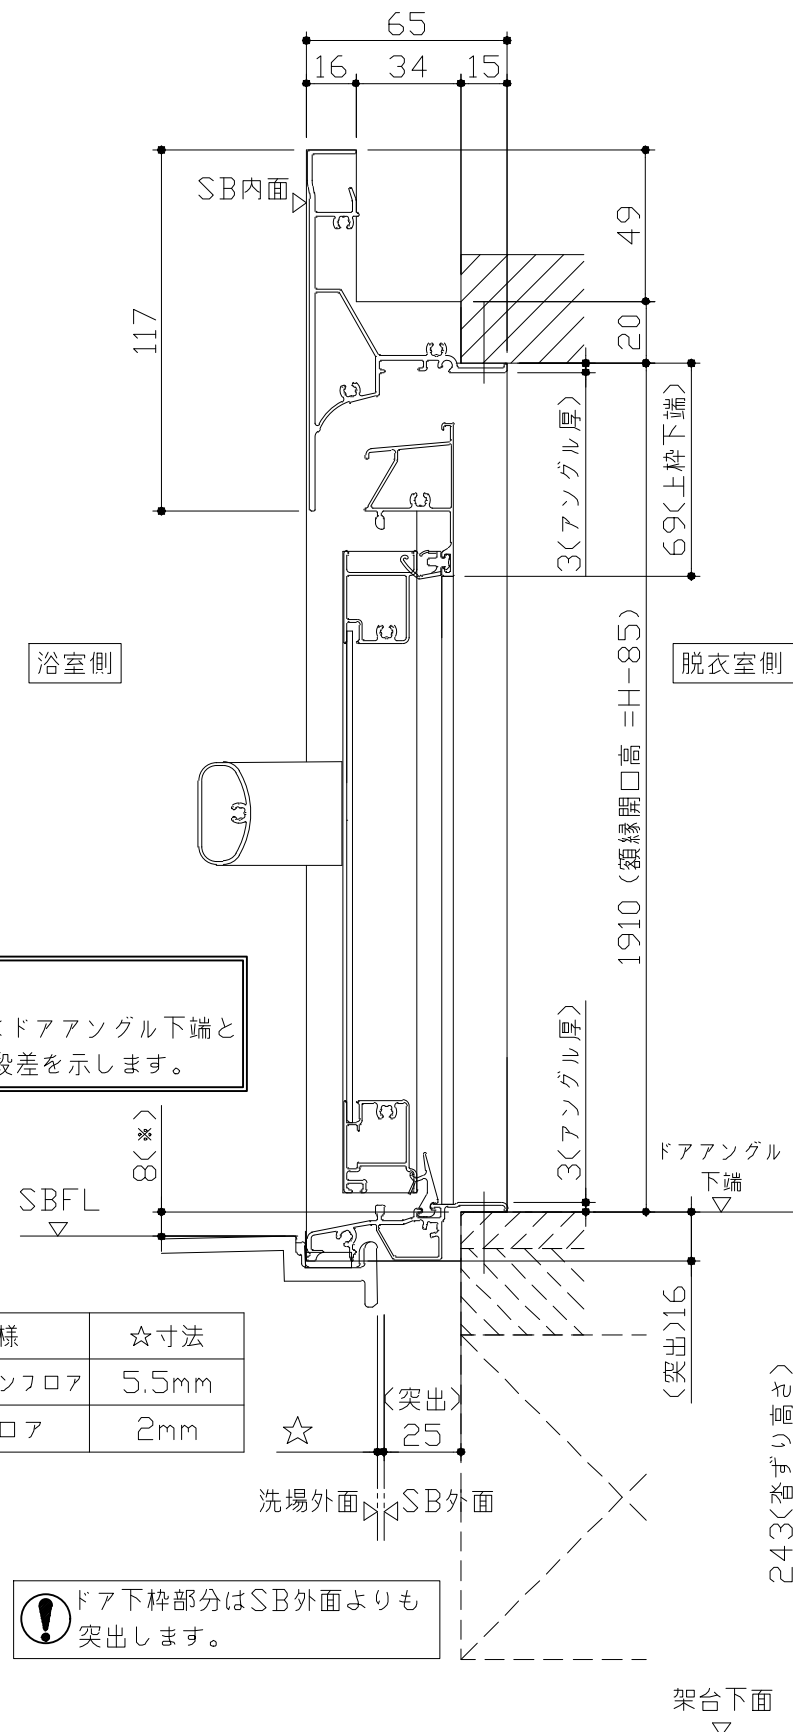

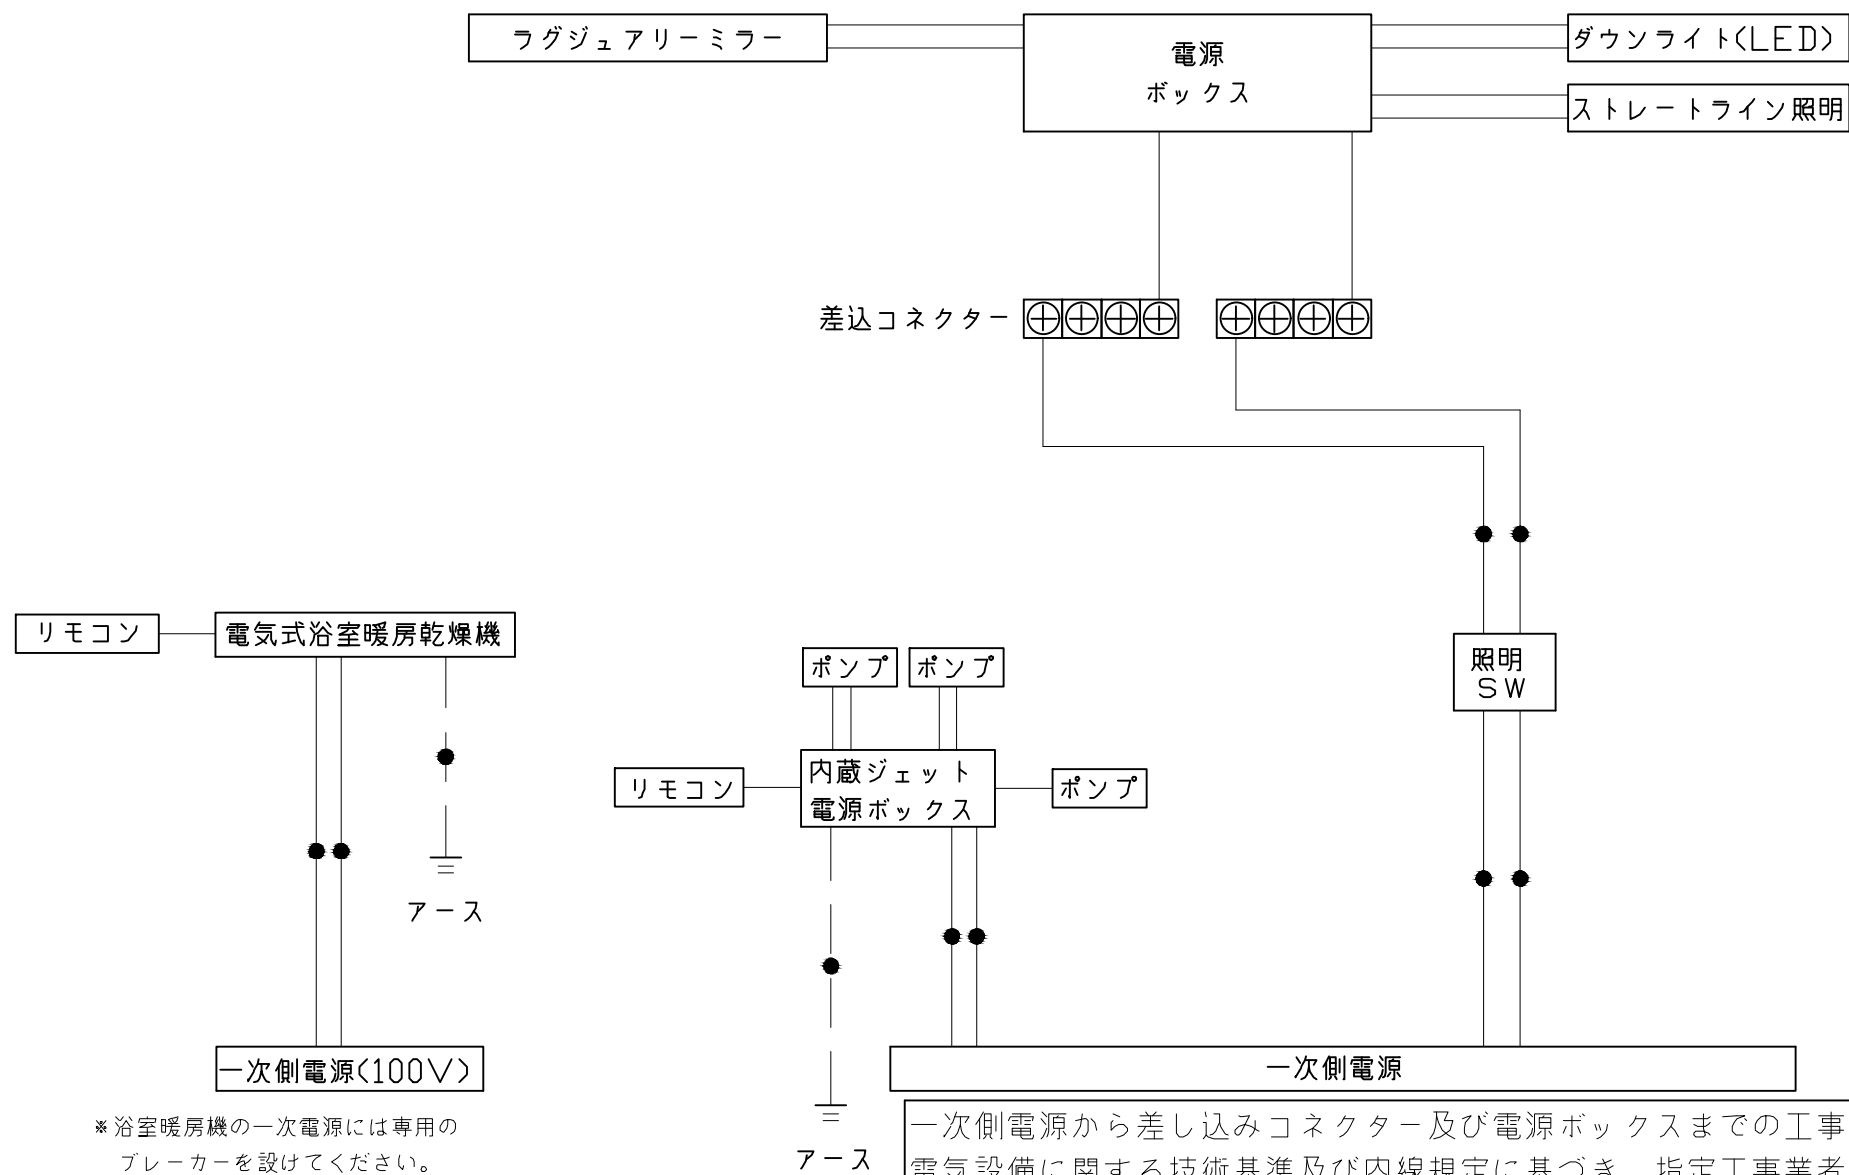

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

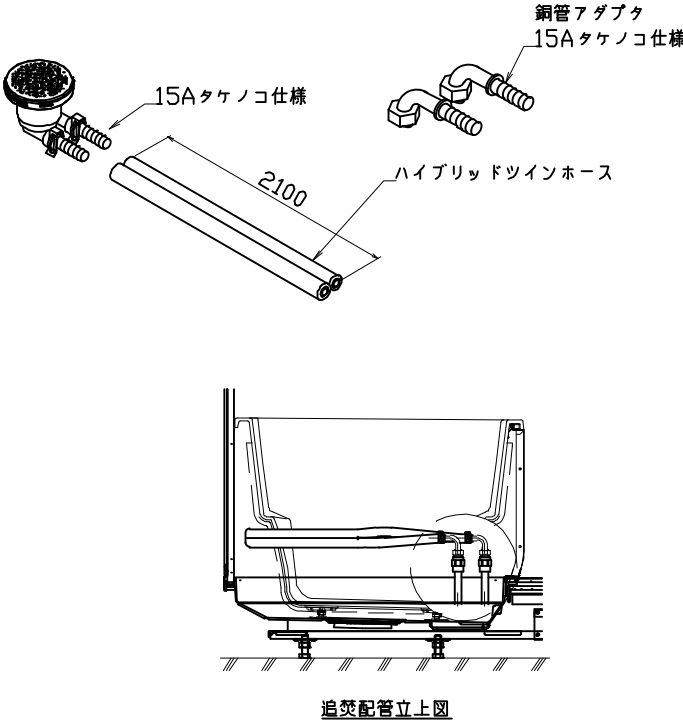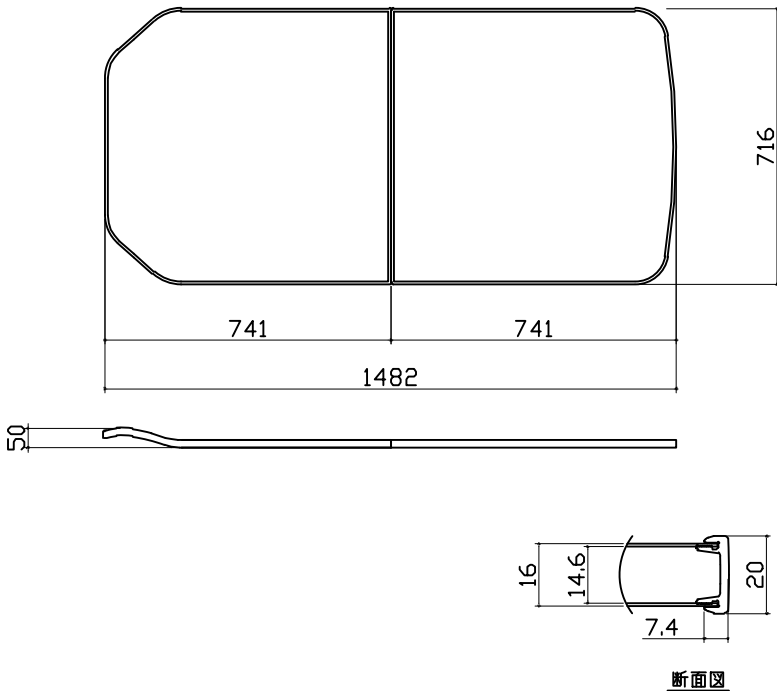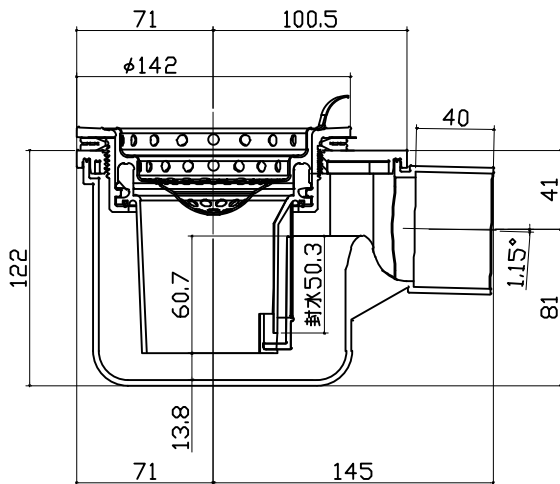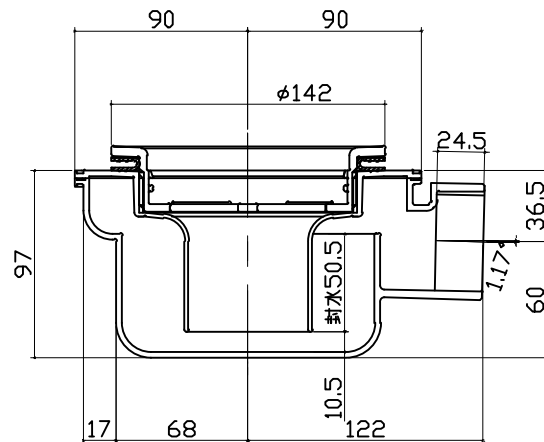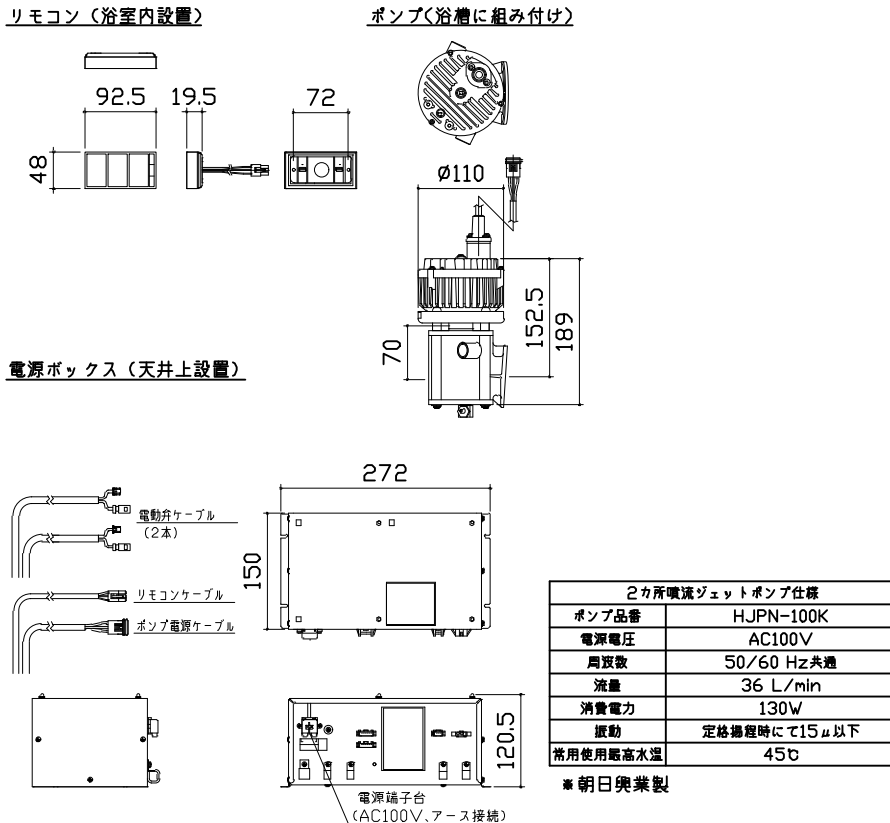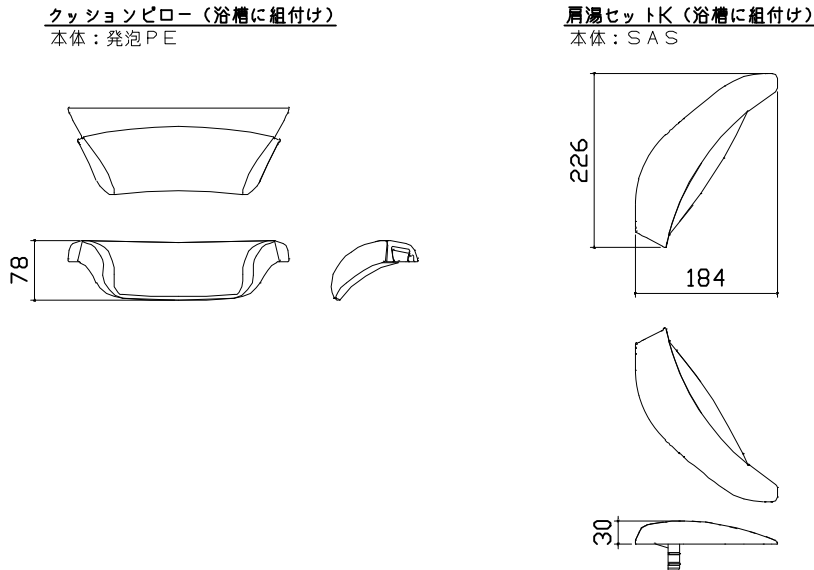循環金具・フロアダプタ関連		風呂蓋 7077MDVH-16KT		洗い場側排水トラップ	
					
浴槽側排水トラップ		肩包み湯①		肩包み湯②	
					
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 横浜－横浜SR SB34様邸 現場番号： C3420954 横浜支店 販売課		GRANSPA グランspa プラン番号： 2701A-2506-0042T 担当営業： 横浜SR	
				部材詳細図	2/3
				作成日： 2025年6月2日	
				担当アドバイザー： 横浜SR	

肩包み湯③			
【工事範囲】 当社工事範囲 1. 電源ボックスの取付 2. ポンプ電源ケーブルの配線及びポンプユニットと電源ボックスの接続 3. 電動弁ケーブルの配線及び電動弁と電源ボックスの接続 4. リモコンケーブルの配線、電源ボックス及びリモコンの接続 5. リモコンの取付 電気工事業者様 工事範囲 1. 電源ボックスへ一次側100Vの接続 2. アース工事 3. 電源回路に漏電遮断機の設置 ■留意事項 (1) ポンプユニットは、工場で浴槽に組み付けられています。 電気工事 ポンプユニット 電気工事 アース線 一次側100V 電源ボックス ポンプ電源ケーブル (5m) 電動弁ケーブル (5m) タカフ リモコンケーブル (5m) リモコン ポンプ電源ケーブル (現場でポンプと接続) 電動弁ケーブル (現場で電動弁と接続) ポンプユニット (工場で組み付け)			
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜－横浜SR SB34様邸	GRANSPA グランspa	部材詳細図 3/3
		現場番号： C3420954	作成日： 2025年6月2日
		横浜支店 販売課	担当営業：横浜SR
			担当アドバイザー： 横浜SR

パネル割図		ミラー	シャワーフックスライドバー		
ハネK16C2B 0799 R<JDS ハネK16C1G 0799 L<JDS ハネK16NW 0799 <VW ハネK16NW 0799 <VW ハネK16A 0799 <VW ハネK16A 0799 <VW ハネK16AD 0799 <VW AR勝手		ハネK16C2B 0799 R<JDS ハネK16C1G 0799 L<JDS ※：現地加工φ18 ・：現地加工φ3.5	ハネK16A 0799 <VW 現地加工：φ3.5		
ランドリーパイプ		風呂蓋収納			
ハネK16C1G 0799 L<JDS ハネK16AD 0799 <VW 現地加工：φ3.5		ハネK16AD 0799 <VW 現地加工：φ3.5 ■留意事項 タオルカケ・ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。			
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 横浜－横浜SR SB34様邸 現場番号： C3420954 横浜支店 販売課	GRANSPA グランspa プラン番号： 2701A-2506-0042T 担当営業：横浜SR	穴開け指示図 作成日： 2025年6月2日 担当アドバイザー： 横浜SR	1/1
