

システムバス 御見積書

御名前	SB展示 2021.02⑥	様
業者		様
商品名	RELAGE レラージュ	

作成日 2020年11月29日
プラン番号 2901A-2011-0733T
現場番号 C1963311

タカラスタンダード株式会社
◆米子支店
鳥取県米子市両三柳2900番地の3
TEL 0859-33-0631 / FAX 0859-33-3851

◆米子シヨールーム
TEL 0859-33-3547 / FAX 0859-33-8774

商品御見積金額	¥758,900	(税込 ¥834,790)
() 内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。		
《参考》別途 商品組付費	¥121,000	(税込 ¥133,100)

※	商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※	商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆御見積仕様

《システムバス》	
ユニットサイズ	1616 (AR勝手)
洗い場仕様	キープクリンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームベージュ
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	シュガーライトベージュ
浴槽形状	ラウンド浴槽(ベンチ付)
浴槽・風呂フタ	高断熱仕様
カウンター材質	アクリル人造大理石
カウンターカラー	シュガーライトベージュ
エプロン材質/カラー	ステンレス / ベージュ
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ウォルナットグレージュ
パネルカラー(周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 60Hz

◆御確認事項

- ☆御見積りの商品は受注生産品の為、納期は約2週間程度いただきます。
- ☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事があります。
- ☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等接続工事は含まれておりません。
- ☆ご発注後のキャンセル・変更は応じかねますので、ご確認宜しくお願い申し上げます。
- ☆この御見積書の有効期間は30日間です。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
⑥		

◆備考

--

--	--

No.*

現場番号	C1963311	プラン番号	2901A-2011-0733T	作成日	2020/11/29
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	レラージュ 1616サイズ		1	684,000	684,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームベージュ)	1		
7	排水口カバー	ステンレス	1		
8	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(シュガーライトベージュ)	1		
9	浴槽追い焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ベージュ)	1		
11	浴槽形状	ラウンド浴槽(ベンチ付)	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1		
14	ガス温水式床暖房	なし	1		
15	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB181-5UTH	1		
16	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:SB181-5UTHB1N	1		
17	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
18	カウンター	人スクエアカウンター	1		
19	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	1	+5,200	+5,200
20	浴室パネル	ハイクラス(一面デザイン)(Kパネル)	1		
21	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
22	天井	高光沢フラット天井	1		
23	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V規格)	1	+41,000	+41,000
24	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
25	換気機器開口	工場開口	1		
26	照明	天井付スクエア照明+ダウンライト(1灯)(電球色)	1		
27	天井照明開口	工場開口	1		
28	ミラー	ロングクリアミラー	1		
29	風呂フタ	断熱風呂フタ	1	+5,000	+5,000
30	タオル掛け	スクエアタイプ	1		
31	ハンドバー	樹脂製 1型600タイプ(ホワイト)	1	+9,500	+9,500

現場番号	C1963311	プラン番号	2901A-2011-0733T	作成日	2020/11/29
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	収納棚	スクエアタイプ(3段)＜ベージュ＞	1	+1,700	+1,700
33	循環金具セット	PLIX	1	+12,500	+12,500
34	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
35	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			35		¥758,900

商品総合計	35	¥758,900
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥121,000 (税込 ¥133,100)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

パース

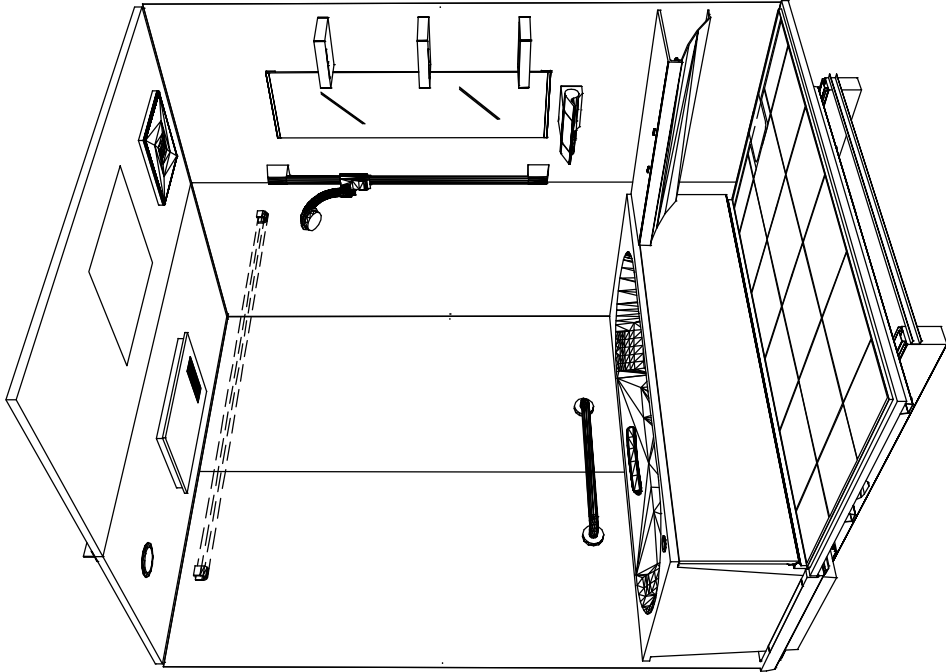

鳥瞰図

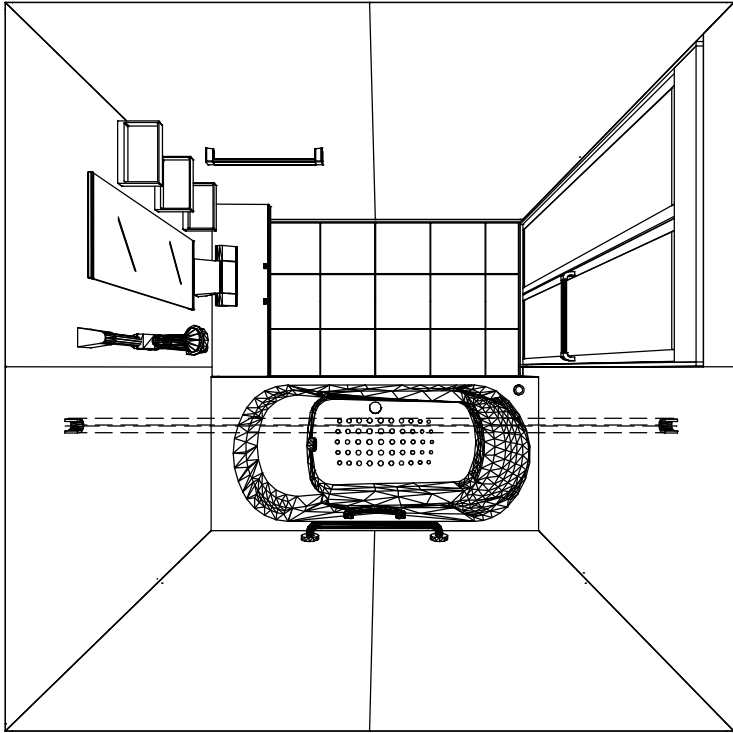


1616





キープグリーン浴槽<アクリル人造大理石>
高光沢フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：SB展示 2021.02?様邸		RELAGE レフージュ	姿図
	現場番号：C1963311		プラン番号：2901A-2011-0733T	作成日：2020年11月29日
	米子支店		担当営業：?	担当アドバイザー：
				縮尺：A3サイズ等倍



このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼書、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
・土間には床名盛面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・ドアアンクル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認をお願いします。
・外寸は突出部を含みます。
・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

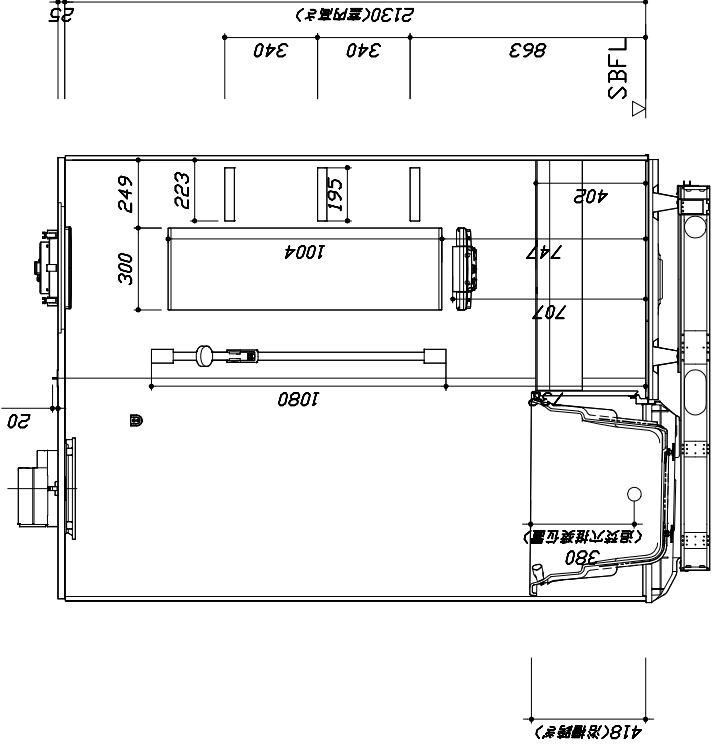

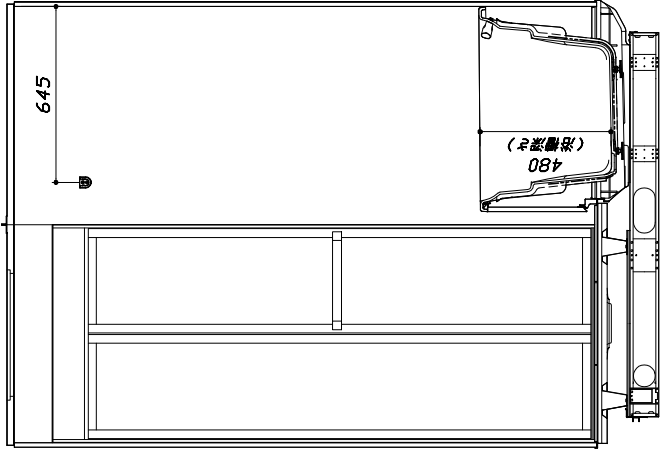



■土間コン仕上げ寸法
ドアアンクル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

＜カウンター対面図＞

＜カウンター面図＞

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼書、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
・土間には床名産面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー・設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認をお願いします。
・外寸は突出部を含みます。
・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

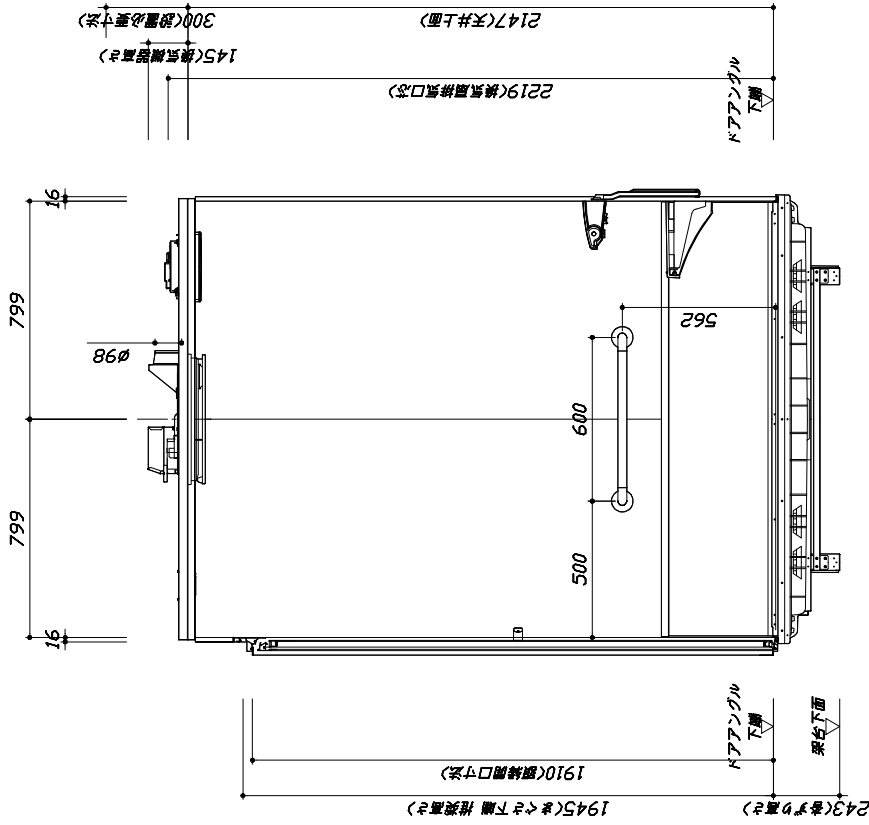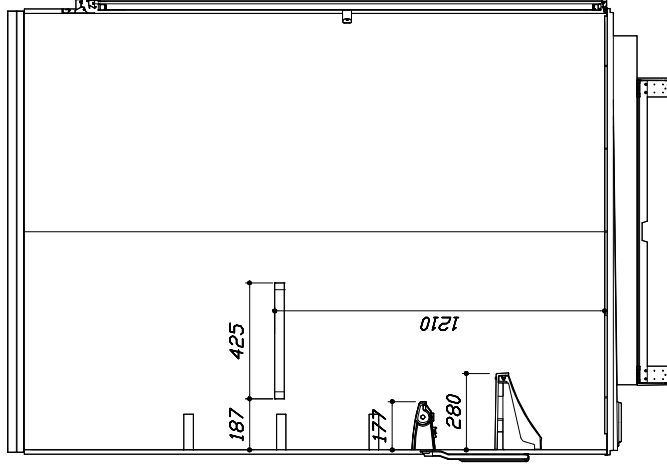

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

< 洗場側面図 >

< 浴槽側面図 >

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	AR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ銅板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ラウンド浴槽(ベンチ付) グリップ付 (285リットル) 追い焚き穴:あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂 (FRP)
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンタ―	スクエアカウンタ―：アクリル人造大理石 カウンタ―下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：銅板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし
天井	高光沢パンドイがパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア:19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	洗い場:ABS樹脂、 浴槽:ASSA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	300kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ロングクリアミラー くりり止め加工
収納棚	スクエアタイプ：ABS樹脂製（3段）
タオル掛け	スクエアタイプ(ホワイト)：ABS樹脂製
洗場側水栓	キープカット(SBI81-5UTHBIN)（樹脂ホース:メタリ調）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
スライドバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（ホワイト-T1020S MH）
照明	天井付スクエア照明+LEDダウンライト（LED 15.1W電球色）
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機（100V・最大消費電力1250W）(ダクト径φ98)（常時換気対応品）
フロフタ	保温風呂フタ（PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚）
給水給湯管	銅管（10A）
循環金具	循環金具セットPLLA：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	樹脂製 I型600タイプ ホワイト
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー


浴槽	DA：シユガーライトベージュ
カウンタ―	DA：シユガーライトベージュ
パネル(カウンター面)	YG：ウォールナットグレージュ
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カバー	－
浴槽エプロン	D：ベージュ
洗場	HD：カームベージュ
ドア	W：ホワイト
収納棚	スクエアタイプ(D：ベージュ)
タオル掛け	スクエアタイプ(ホワイト)
ランドリーセット	ホワイト

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

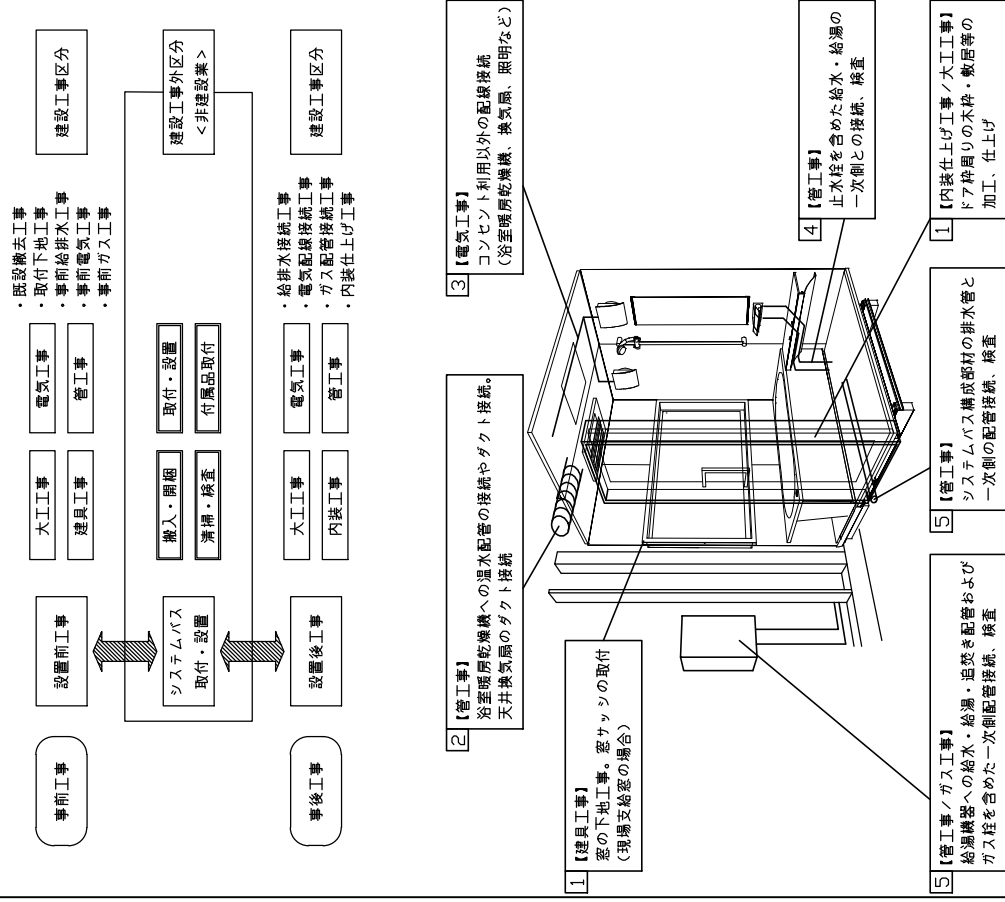

■システムバス 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事			建設工事外	
				大工・土工・石工事	とび・土工・石工事	管工事		
設置前工事		大工・土工・建具	設置基礎、設置床の工事	○	○		浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
	1		浴室ドア、窓サッシの下の地下工事	○	○	建築躯体への浴室ドア枠回り、窓サッシの下の地下工事		
	2		給排水配管工事		○	浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事		
	3	管	換気機器のダクト配管事前工事			○	浴室の専用ダクト事前工事、壁六加工	
		電気	給湯機器専用配管事前工事			○	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
			浴室専用電気配線事前工事			○	浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
			架台・浴槽パンプ・流し場の取付・設置			○	浴室専用の架台・浴槽パンプ・流し場を所定の位置に設置	
システムバス 本体取付・設置	建設工事 外区分		壁パネルの組立・設置				○	流し場・浴槽・浴室パネルの排水トラップ取付
			天井・浴槽の組立・設置				○	浴室パネル部材の加工と組立
			内装品、器具類の取付・設置【注記 1】				○	天井部材・浴槽部材の取付
			水栓類の組立・取付【注記 1】				○	カウンター、ミラー、ハンダー等の取付
			浴室専用換気機器の取付【注記 1】				○	水栓類の組立、浴室部材への取付
			風呂追焚き部品の取付【注記 1】				○	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付				○	循環追焚き金具の取付
			浴室照明器具の取付				○	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付【注記 1】				○	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			浴室ドアの組立・取付				○	電化品、オブション品の取付
			浴室窓サッシの取付【注記 1】				○	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付【注記 1】				○	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
設置後工事		管 大工 電気	シリコンコーンの充填				○	接合部、仕上り部へのシリコン塗布・充填
			試運転、完成検査【注記 2】				○	完成後の試運転、性能確認検査
			建築外壁の穴あけ	○	○		建築壁の仮体加工作業	
		管 大工 電気	排気ダクトの敷設工事			○	浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事			○	建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・フェース接続工事			○	建築側の屋内配線と配線器具、フェース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付			○	建築の外装仕上り工事	
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事			○	給水・給湯の二次配管、追焚き配管の接続、検査	
			建築側排水配管との接続工事【注記 3】			○	浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
		管	給湯機器本体工事(試運転・確認)			○	機器の設置工事(ガス、電気工事を含む)	
			内装仕上げ工事	○	○		床、ドア廻縁、脱衣室仕上げ工事	
			浴室用電線配線、接続工事			○	浴室機器の事後電気工事	
		他	浴室天井裏の電線、スイッチ工事			○	浴室全体の電気器具、配線接続工事	

- ※ 注記 1) 原則、現場支取製品は支給側で取付実施とする。
※ 注記 2) 製品の完成検査、試験検査、工事完成検査は、試験型が可能な範囲のみシステムで設置者が実施する。
※ 注記 3) 製品内の立上げ、ざり出し配管の場合は、原則、設備側との合番を接続とする。但し、システム内付属配管内はバス設置者の作業範囲とする。
※ 注記 4) 製品内配管の接続は、原則、設備側とする。

Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： SB展示 2021.02?様邸	RELEASE レラージュ	工事区分表
		現場番号： C1963311	プラン番号： 2901A-2011-0733T	作成日： 2020年11月29日
		米子支店	担当営業： ?	担当アドバイザー：


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



■ 給水給湯管工事注意事項




- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

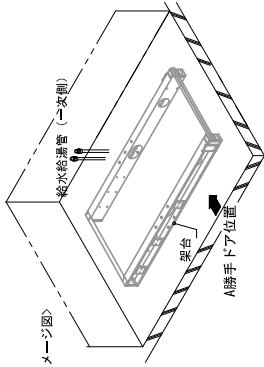

〈給水立上げイメージ図〉


■ 土間コンクリート仕上り方法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

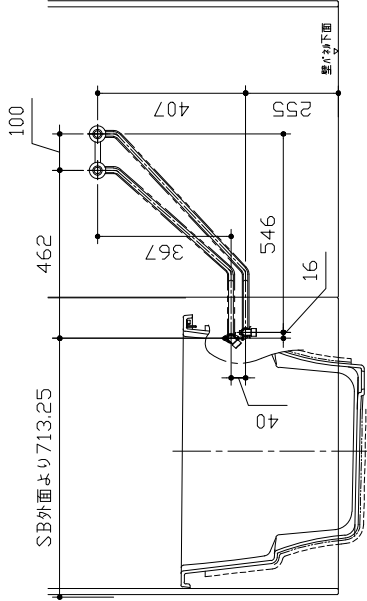

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

■ 設備記号		
記号	記号の意味	
○	給水位置	
△	給湯位置	

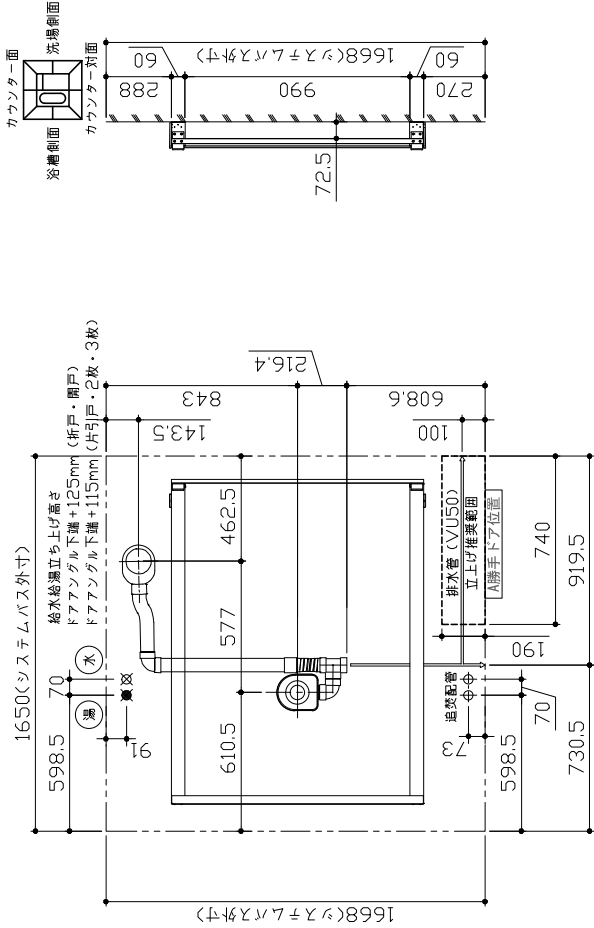

〈給水給湯管取合詳細図〉

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： SB展示 2021.02?様邸

現場番号： C1963311

米子支店

RELAGE レラージュ

プラン番号： 2901A-2011-0733T

担当営業： ?

排水配管図

作成日： 2020年11月29日

担当アドバイザー：





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
 - ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
 - ・ドア部はSB外寸より突出します。
- 詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

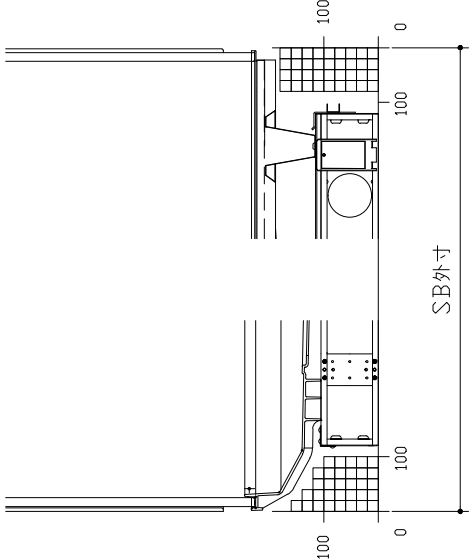


A矢視

B矢視

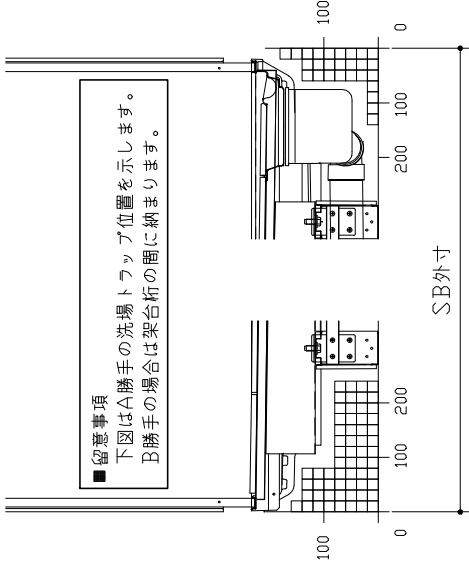

C矢視

D矢視

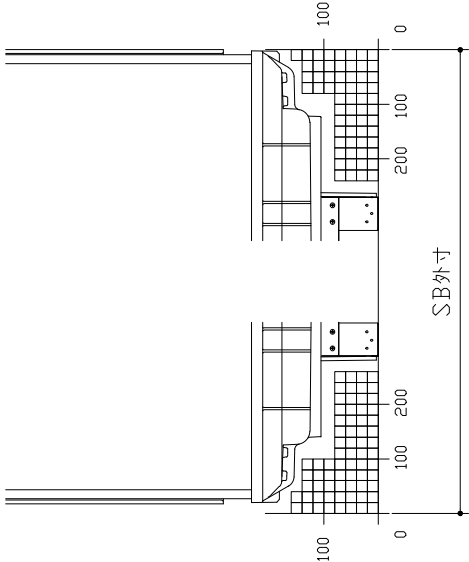

E矢視

F矢視

Takara standard

タカラスタンダード株式会社

現場名称：SB展示 2021.02?様邸

現場番号：C1963311

米子支店

RELAGE レラージュ


プラン番号：2901A-2011-0733T

担当営業：?

床下空間図

作成日：2020年11月29日

担当アドバイザー：

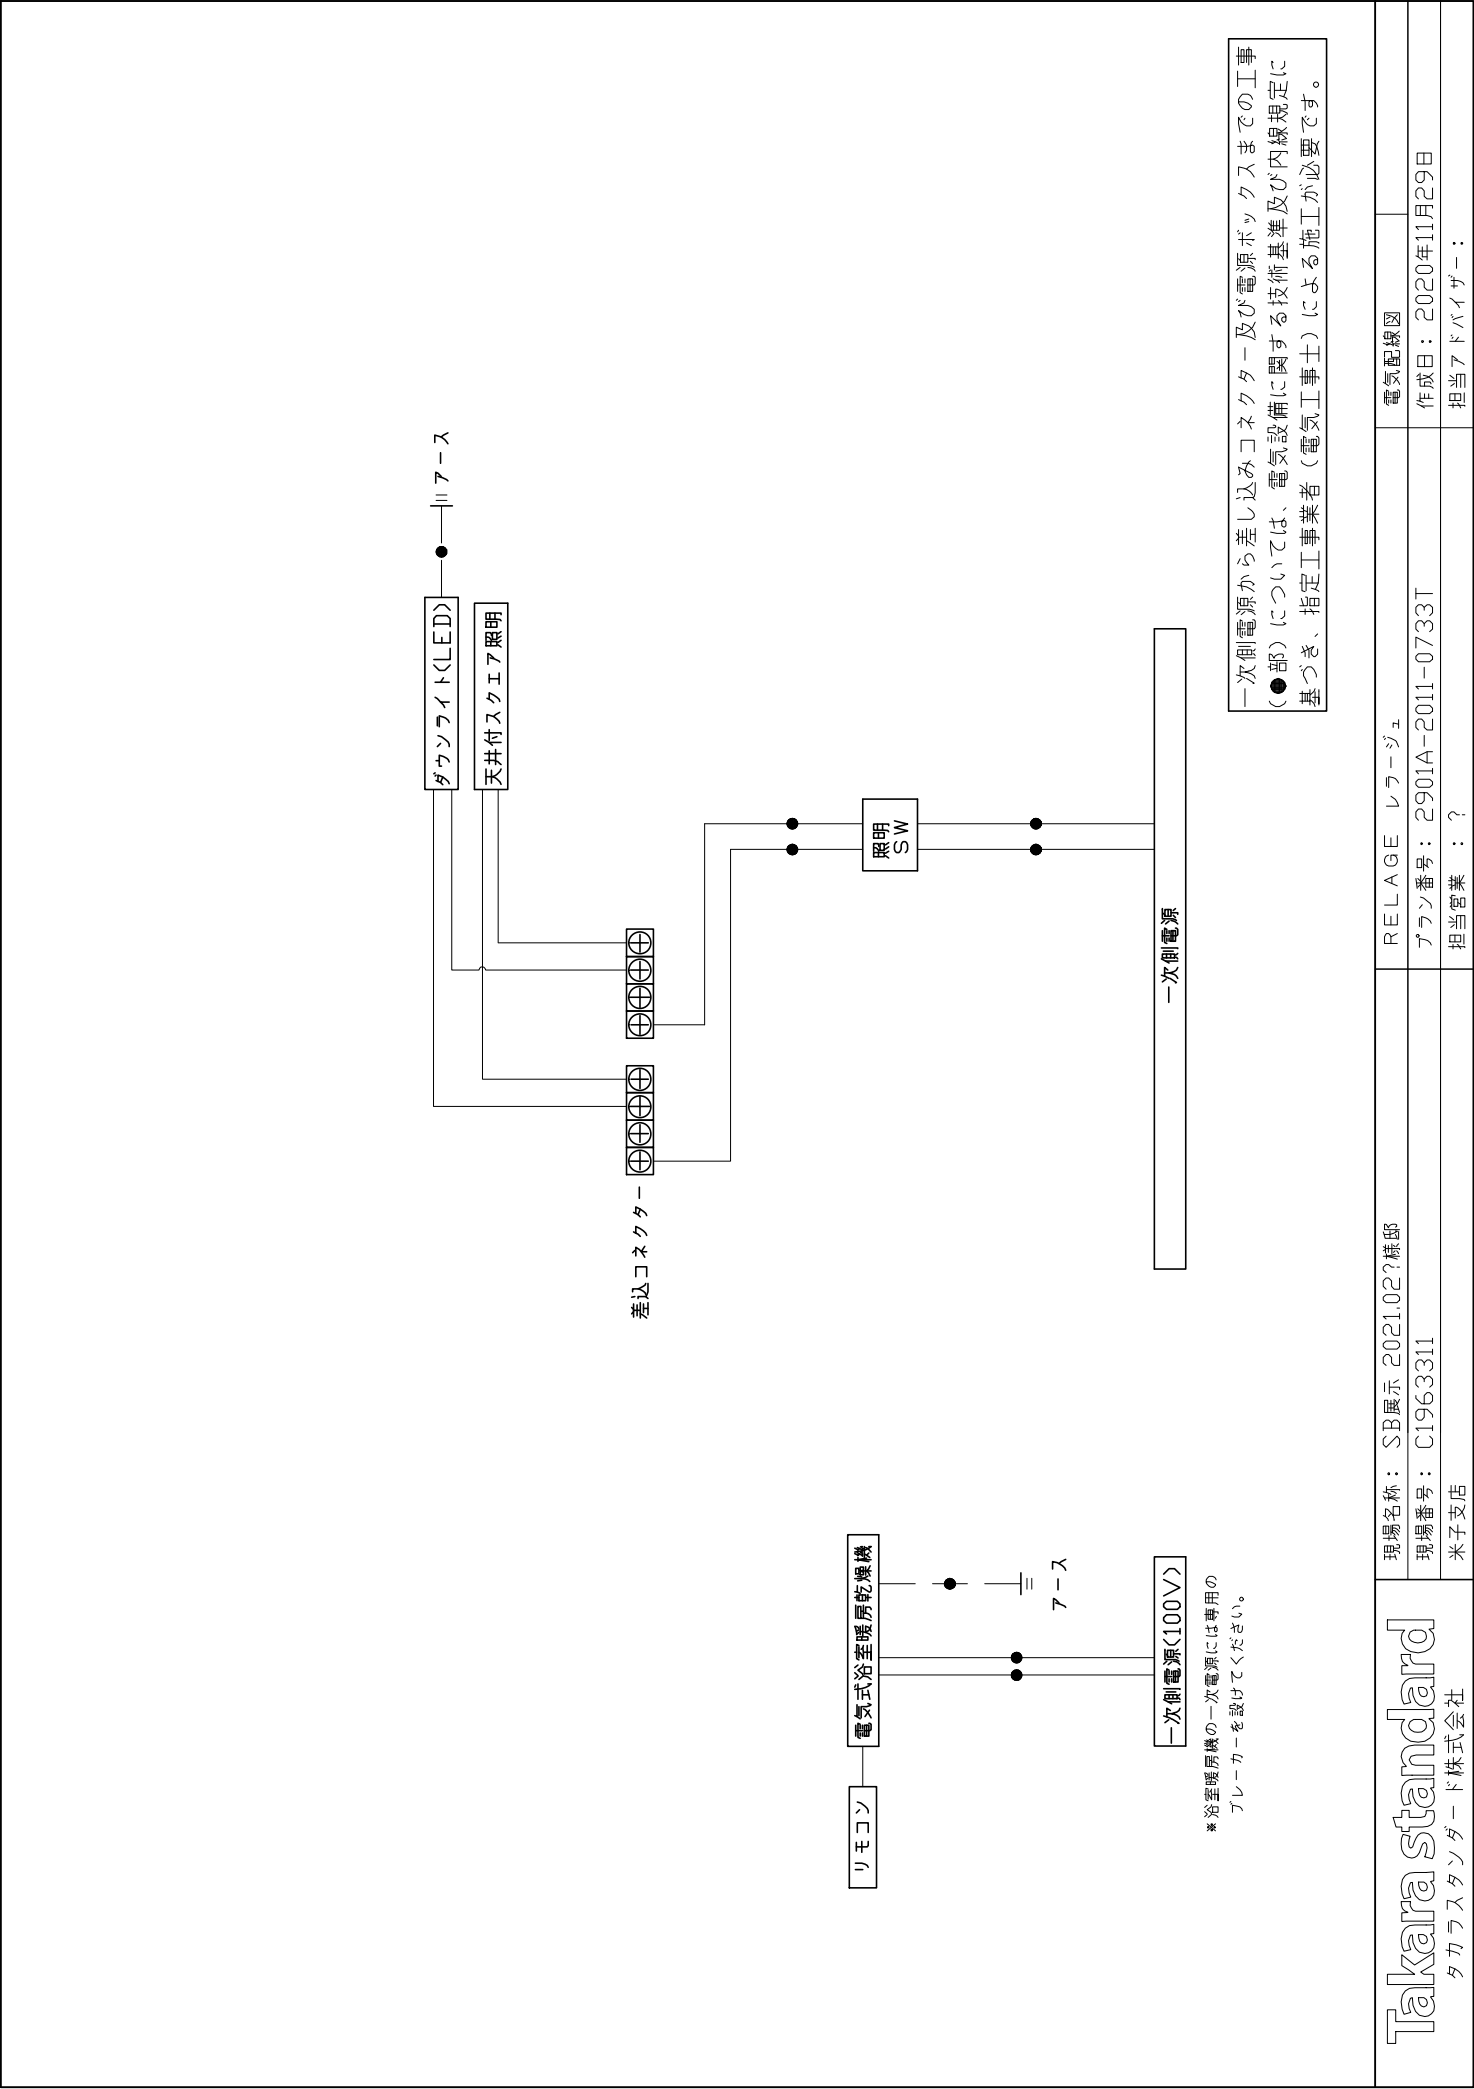

[illegible]
