

システムバス 御見積書

御名前	SB展示 2021.02 ^⑩	様
業者		様
商品名	EMELORD エメロード	

作成日 2020年12月21日
プラン番号 2901A-2011-0789T
現場番号 C1962700

タカラスタンダード株式会社
◆米子支店
鳥取県米子市両三柳2900番地の3
TEL 0859-33-0631 / FAX 0859-33-3851

商品
御見積金額 ￥523,000 (税込 ￥575,300)
()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥90,000 (税込 ￥99,000)
※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆御見積仕様

《システムバス》	
ユニットサイズ	S1216(AL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:レギュラークラス
洗い場カラー	ホワイトグレー
浴槽材質	カラーステンレス
浴槽カラー	ホワイト
浴槽形状	—
浴槽・風呂フタ	高断熱仕様
カウンター材質	樹脂
カウンターカラー	ホワイト
エプロン材質/カラー	ステンレス / ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	デニムブルー(アクセント)
パネルカラー(周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 未定

◆御確認事項

- ☆御見積りの商品は受注生産品の為、納期は約2週間程度いただきます。
- ☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事があります。
- ☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等接続工事は含まれておりません。
- ☆ご発注後のキャンセル・変更は応じかねますので、ご確認宜しくお願い申し上げます。
- ☆この御見積書の有効期間は30日間です。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
⑩1216	S12浴槽	サントストーンホ ワイト

◆備考

--

--	--

No.*

現場番号	C1962700	プラン番号	2901A-2011-0789T	作成日	2020/12/21
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	エメロード S1216サイズ		1	469,000	469,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイ特)ノ樹脂ガラス(半透明)(20サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーニングフロア(ホワイ特グレー)	1		
7	排水口カバー	ステンレス	1		
8	浴槽	ステンレス浴槽(高断熱浴槽)(ホワイ特)	1		
9	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ホワイ特)	1		
10	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
11	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂ホース(シルバーク)KF9032SJN	1		
12	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:KF9032SJN	1		
13	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
14	カウンター	ワイドカウンター	1		
15	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックなし	1		
16	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	1	+14,000	+14,000
17	浴室パネル	ハイクラス(アクセントデザイン)(Kバネル)	1		
18	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
19	天井	フラット天井	1		
20	換気機器	天井換気扇	1		
21	換気機器開口	工場開口	1		
22	照明	照明W(LED)<電球色>	1		
23	ミラー	ショートミラー(フック固定)	1	+5,500	+5,500
24	風呂フタ	断熱風呂フタ	1	+13,000	+13,000
25	タオル掛け	タオル掛けなし	1		
26	ハンドバー	樹脂製 I型400タイプ(ホワイ特)	1	+8,000	+8,000
27	収納棚	収納棚なし	1		
28	どこでもラック	マルチラック+フック(ホワイ特)	1	+3,000	+3,000
29	循環金具セット	ELX	1	+10,500	+10,500
30	給水給湯管	洗い場1水栓	1		

現場番号	C1962700	プラン番号	2901A-2011-0789T	作成日	2020/12/21
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
31	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			31		¥523,000

商品総合計	31	¥523,000
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。


《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費


¥90,000 (税込 ¥99,000)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。
()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

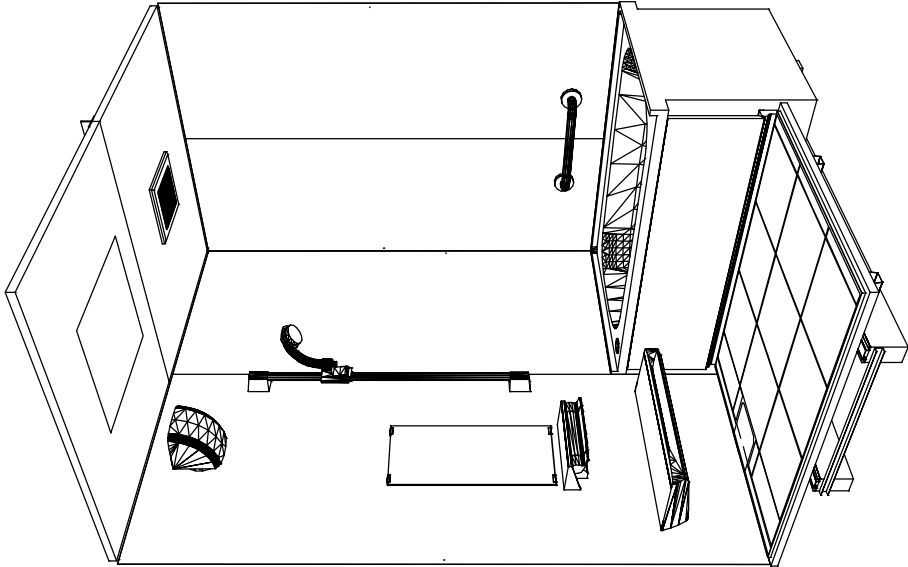

鳥瞰図

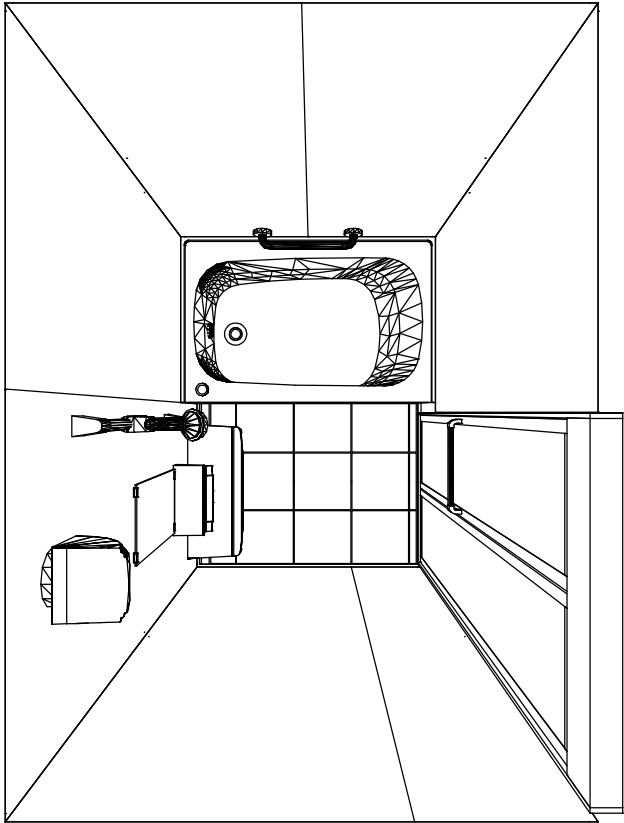

S1216

カーステンレス浴槽
フット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：SB展示 2021.02?様邸		EMELORD エメロード	姿図
	現場番号：C1962700		プラン番号：2901A-2011-0789T	作成日：2020年12月21日
	米子支店		担当営業：?1216	担当アドバイザー：S12浴槽
			縮尺：A3サイズ等倍	

カウンター面

浴槽前面



浴槽側面

カウンター下面

※設置事項


※印寸法は給水給湯器の

突出寸法18mmを含まず。

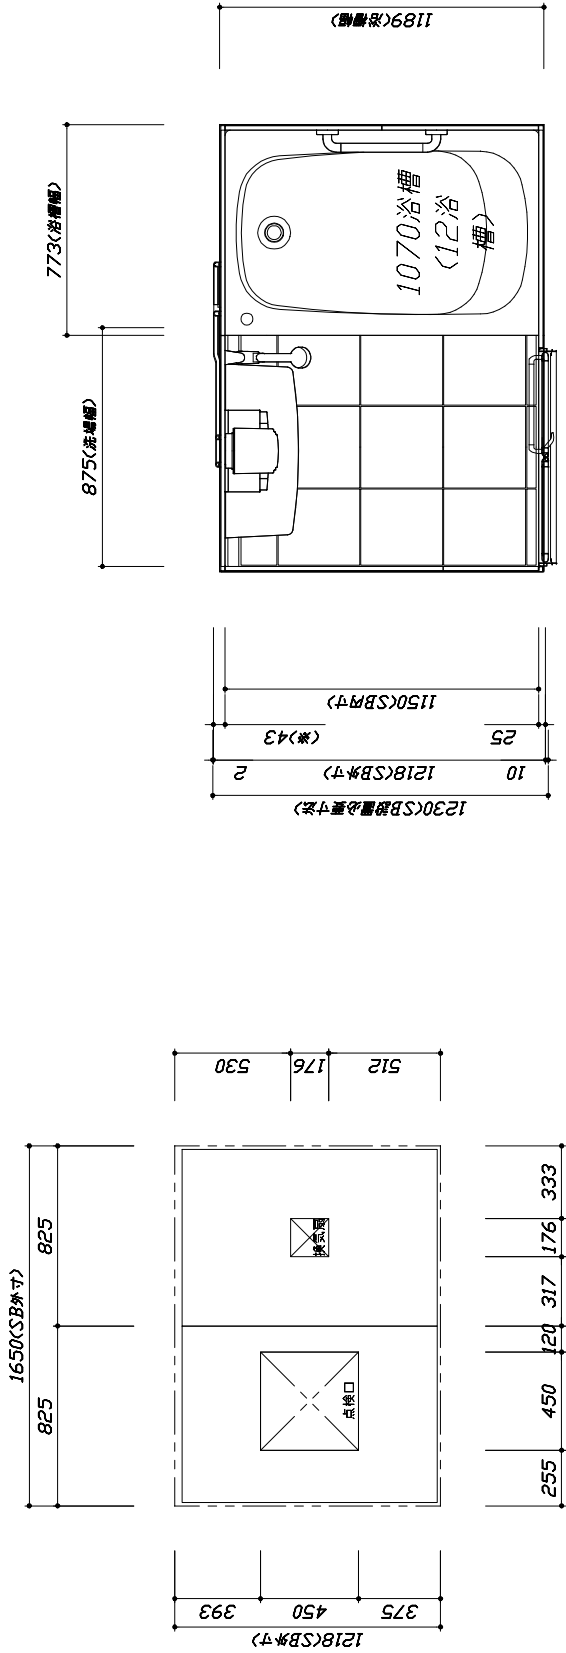

< 平面図 >

< 天井伏図 >



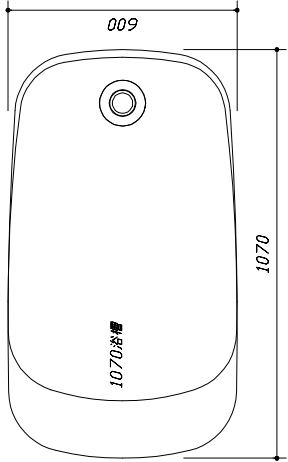


< 浴槽詳細図 >

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：SB展示 2021.02?様邸	EMELORD エムロード	施工図1	縮 尺： 1:25,20
	現場番号： C1962700	プラン番号： 2901A-2011-0789T	作成日： 2020年12月21日	
	米子支店	担当営業： ?1216	担当アドバイザー： S12浴槽	

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼書、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
・土間には床名産面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・ドアアンクル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認をお願いします。
・1.2万までの仕面との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との打ち合わせを十分おこなってください。
・外寸は突出部を含みます。

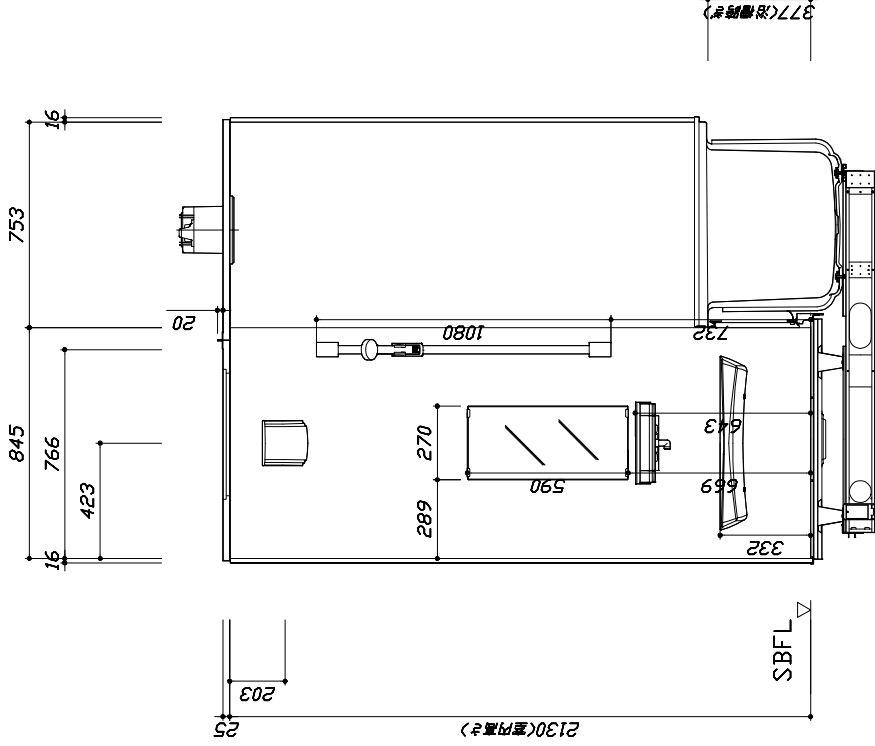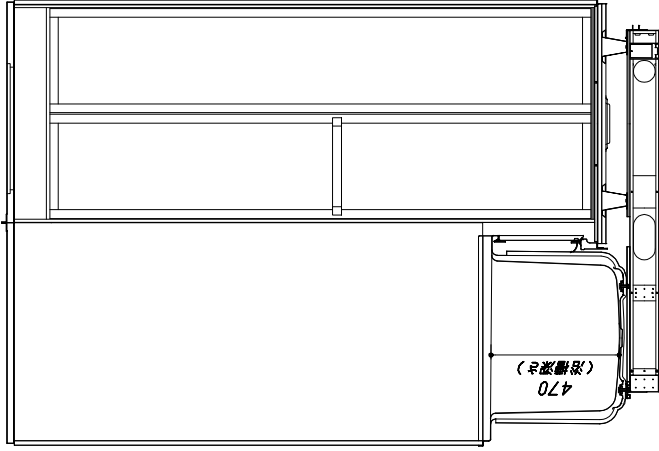


■土間コン仕上げ寸法
ドアアンクル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

＜カウンター対面図＞

＜カウンター面図＞




このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼書、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
・土間：床名産面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認お願い致します。
・1.2万までの柱間との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との打ち合わせを十分おこなってください。
・外寸は突出部を含みます。

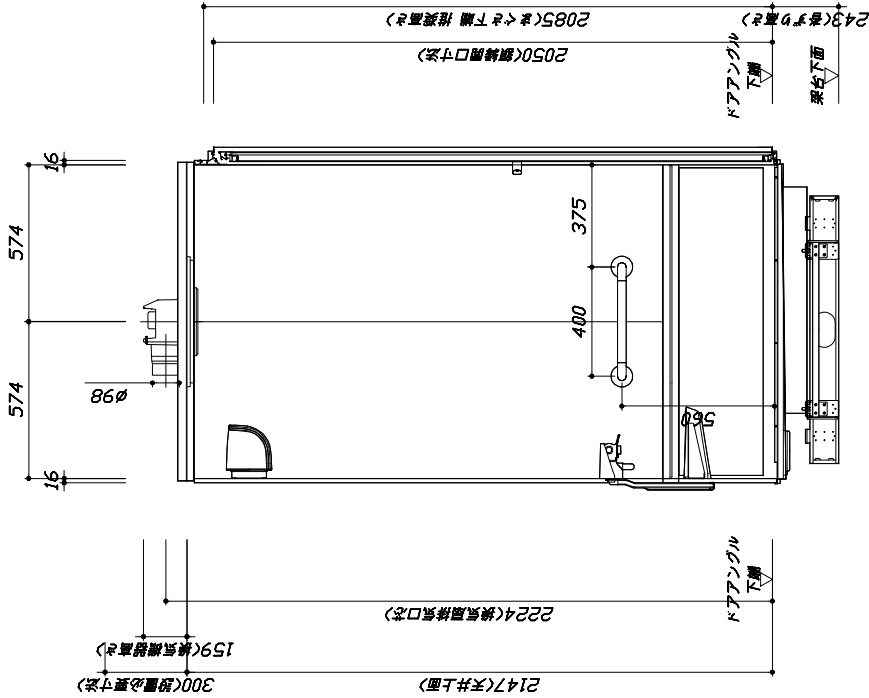


■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

< 浴槽側面図 >

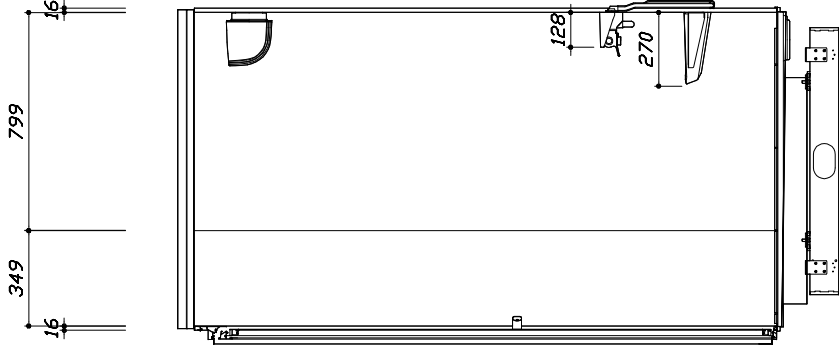

< 洗場側面図 >



本体仕様表

浴室サイズ	S1216サイズ(室内容量3.9立方メートル)
ドア勝手	AL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	ステンレス 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ラウンド浴槽（1070浴槽・225リットル）
浴槽パン	－
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンタ―	ワイドカウンタ―：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：銅板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	化粧パドイがパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：なし
ドア	キープクリーンアア：20高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂、浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	250kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ショートミラー（フック固定）
収納棚	－
タオル掛け	－
洗場側水栓	シャワーヘッド(KVK KF9032SN) (樹脂ホース：シルバー)
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
スライドバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（スライドバー：T1020S MH）
照明	照明W（LED 8W電球色）
換気機器	天井換気扇（100V・最大消費電力9.3W）（ダクト径φ98）
フロフタ	保温風呂フタ（PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚）
給水給湯管	銅管（10A）
循環金具	循環金具セットELX：ホース先端部RI/2オススネジ仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	樹脂製 I型400タイプ ホワイト
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー


浴槽	W：ホワイト
カウンタ―	W：ホワイト
パネル(カウンター面)	JNA：デニムブルー（アクセント）
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カバー	W：ホワイト
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	BW：ホワイトグレー
ドア	W：ホワイト
収納棚	－
タオル掛け	－
ランドリーセット	－

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部も含む場合は、建設工事となります。

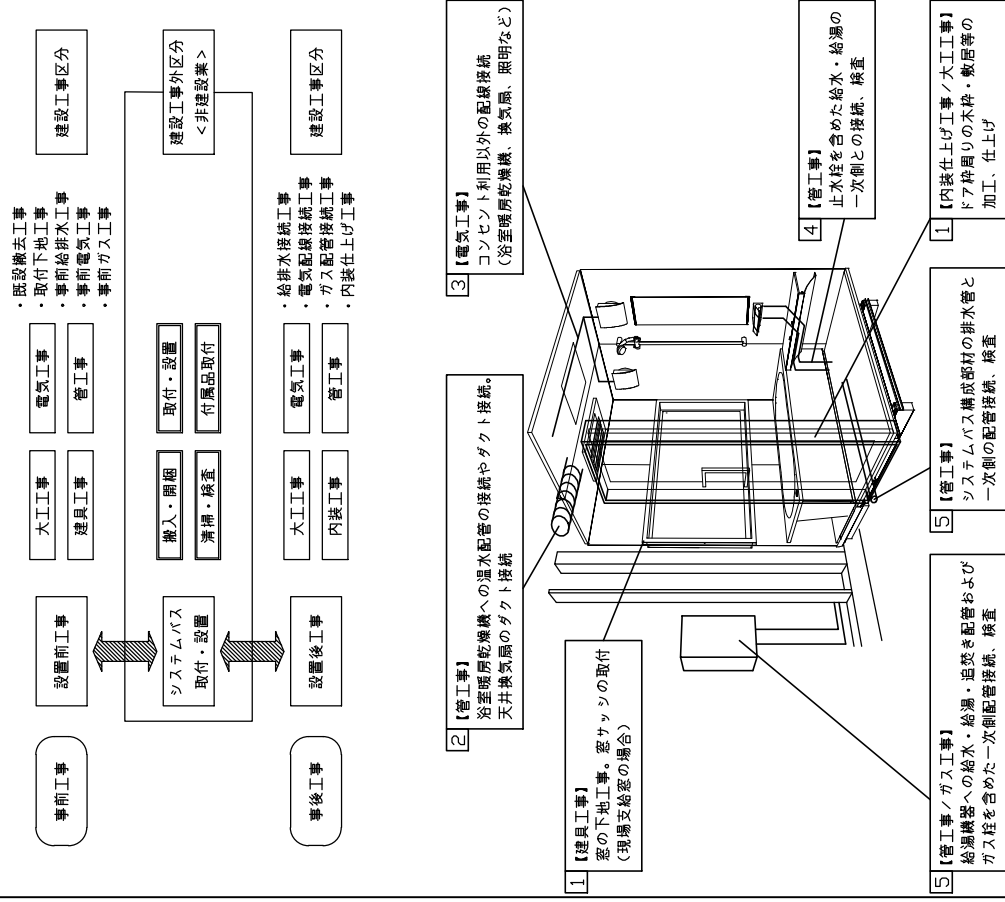

■システムバス 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事			建設工事外	
				大工・土工・石工事	とび・土工・石工事	管工事		
設置前工事		大工・土工・建具	設置基礎、設置床の工事	○	○		浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
	1		浴室ドア、窓サッシの地下工事	○	○	建築躯体への浴室ドア枠回り、窓サッシの地下工事		
	2		給排水配管工事		○	浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事		
	3	管	換気機器のダクト配管事前工事			○	浴室の専用ダクト事前工事、壁六加工	
		電気	給湯機器専用配管事前工事			○	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
			浴室専用電気配線事前工事			○	浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
			架台・浴槽パンプ・流し場の取付・設置			○	浴室専用の架台・浴槽パンプ・流し場を所定の位置に設置	
システムバス 本体取付・設置	建設工事 外区分		壁パネルの組立・設置				○	流し場・浴槽・浴室への排水トラップ取付
			天井・浴槽の組立・設置				○	浴室パネル部材の加工と組立
			内装品、器具類の取付・設置【注記1】				○	天井部材・浴槽部材の取付
			水栓類の組立・取付【注記1】				○	カウンター、ミラー、ハンダー等の取付
			浴室専用換気機器の取付【注記1】				○	水栓類の組立、浴室部材への取付
			風呂追焚き部品の取付【注記1】				○	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付				○	循環追焚き金具の取付
			浴室照明器具の取付				○	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付【注記1】				○	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			浴室ドアの組立・取付				○	電化品、オプション品の取付
			浴室窓サッシの取付【注記1】				○	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付【注記1】				○	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
設置後工事		管 大工 電気	シリコンコーンの充填				○	接合部、仕上り部へのシリコン塗布・充填
			試運転、完成検査【注記2】				○	完成後の試運転、性能確認検査
			建築外壁の穴あけ	○	○		建築壁の仮体加工作業	
		管 大工 電気	排気ダクトの敷設工事		○	○	浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事		○	○	建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・フェース接続工事		○	○	建築側の屋内配線と配線器具、フェース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付		○	○	建築の外装仕上り工事	
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				給水・給湯の二次配管、追焚き配管の接続、検査	
			建築側排水配管との接続工事【注記3】				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
		管	給湯機器本体工事(試運転・確認)		○	○	機器の設置工事(ガス、電気工事を含む)	
			内装仕上げ工事	○	○		床、ドア廻縁、脱衣室仕上げ工事	
			浴室用電線配線、接続工事			○	浴室機器の事後電気工事	
		電気 他	浴室天井裏の電線、スイッチ工事			○	浴室全体の電気器具、配線接続工事	

- ※ 注記 1) 原則、現場完成製品は支給側で取付実施とする。
※ 注記 2) 製品の完成検査、試験検査、工事完了後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時には検査、試験検査が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する。
※ 注記 3) 設置室内の工仕、ざり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲内とする。

Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： SB展示 2021.02?疎邸	EMELORD エムロード	工事区分表
		現場番号： C1962700	プラン番号： 2901A-2011-0789T	作成日： 2020年12月21日
		米子支店	担当営業： ?1216	担当アドバイザー： S12浴槽





ふたたび「監獄」を

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留學事項


- ・カウンスターの下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
 - ・水柱・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンスターの壁パネル裏に、外すより部材が突出する場合があります。
 - ・ドア前はSB外寸より突出します。
- 詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

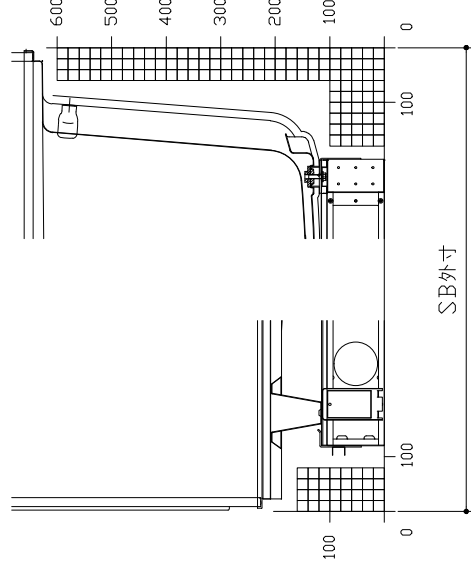

B矢視

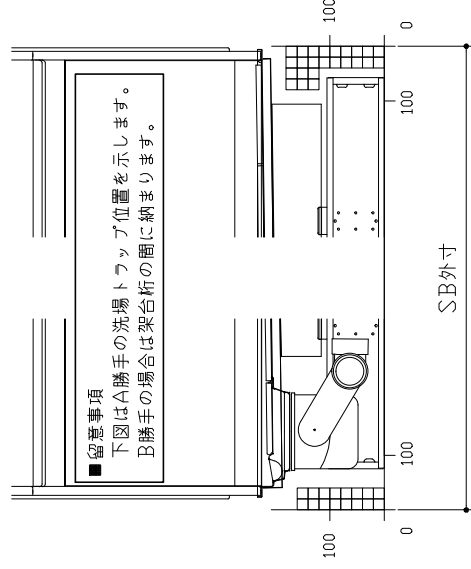

D矢視

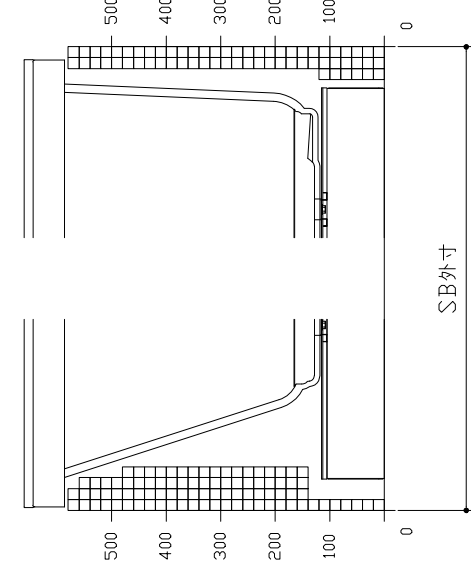


F矢視

E矢視

Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： SB展示 2021.02?様邸	EMELORD エムロード	床下空間図
		現場番号： C1962700	アッソ番号： 2901A-2011-0789T	作成日： 2020年12月21日
		米子支店	担当営業： ?1216	担当アドバイザー： S12浴槽

キープクリーンドア：折戸・上部換気口


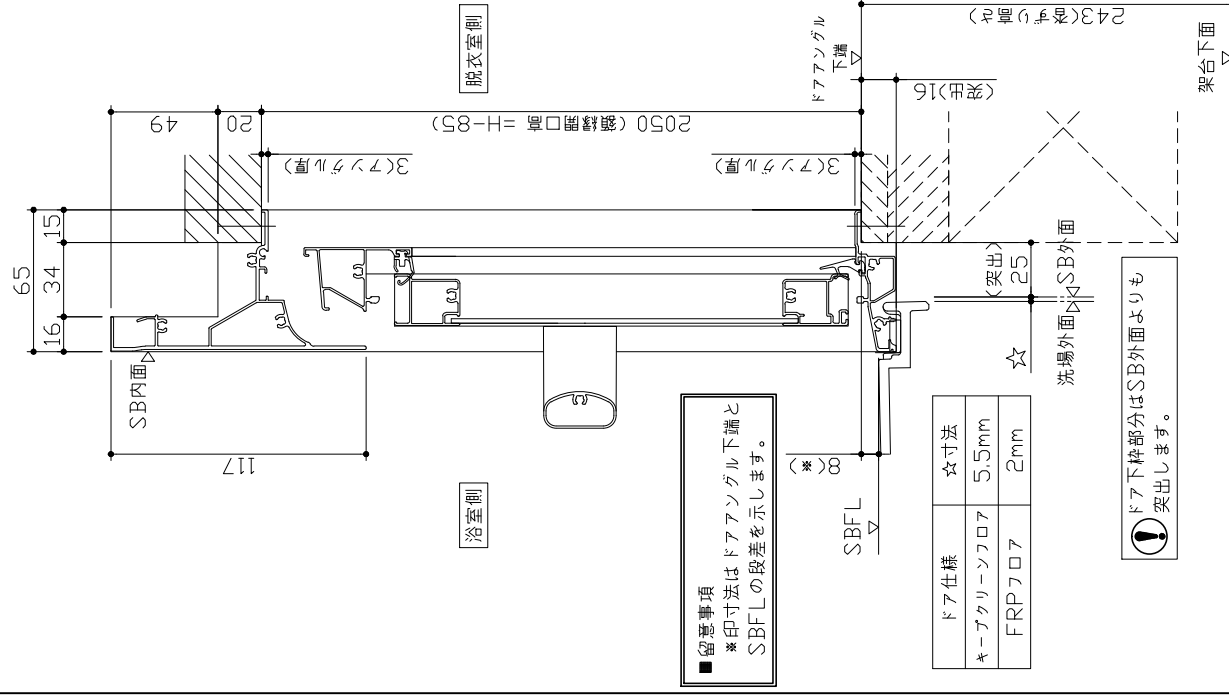


⚠ 下枠部分はSB外面より組み出します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらなければならないように十分に考慮してください。
 - ・ 躯体へドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無 躯体状況によって異なる場合があります。

参考尺寸

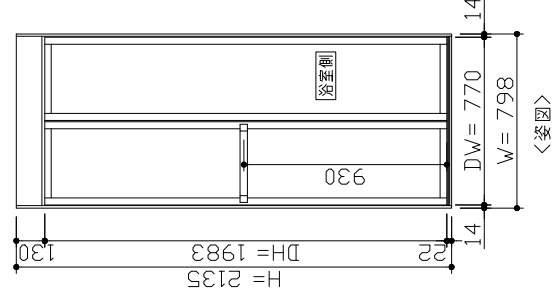
$$\left\langle \begin{array}{c} \square \\ \times \end{array} \right\rangle$$

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： SB展示 2021.02?森邸	EMELORD エムロード	ドア取合詳細図
	現場番号： C1962700	プラン番号： 2901A-2011-0789T	作成日： 2020年12月21日
	米子支店	担当営業： ?1216	担当アドバイザー： S12浴槽

Takara standard タカラスタンダード株式会社 換気扇 換気扇SW 一次側電源 アース	現場名称：SB展示 2021.02?様邸		EMELORD エムロード	電気配線図
	現場番号：C1962700		プラン番号：2901A-2011-0789T	作成日：2020年12月21日
	米子支店		担当営業：?1216	担当アドバイザー：S12浴槽

換気扇

換気扇SW

一次側電源

アース

照明

照明SW

一次側電源

差込コネクター

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。

現場名称： SB展示 2021.02?藤邸	EMELORD エムロード	窓取合詳細図
現場番号： C1962700	プラン番号： 2901A-2011-0789T	作成日： 2020年12月21日
米子支店	担当営業： ?1216	担当アドバイザー： S12浴槽


Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： SB展示 2021.02?様邸		EMELORD エムロード		吊金具設置図
	現場番号： C1962700		プラン番号： 2901A-2011-0789T		作成日： 2020年12月21日
	米子支店		担当営業： ?1216		担当アドバイザー： S12浴槽

槽浴




洗い場用水栓

照明

規格	SB 実行方法	L	A
	1218	1189	40
	1243	1214	65
	1268	1239	90
	1293	1264	115
	1318	1289	140

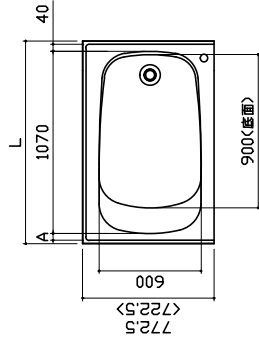

※開口1625以下の場合は＜＞内寸法参照のこと





换气機器

カウンター

シャワーフックスライドバー

歸二

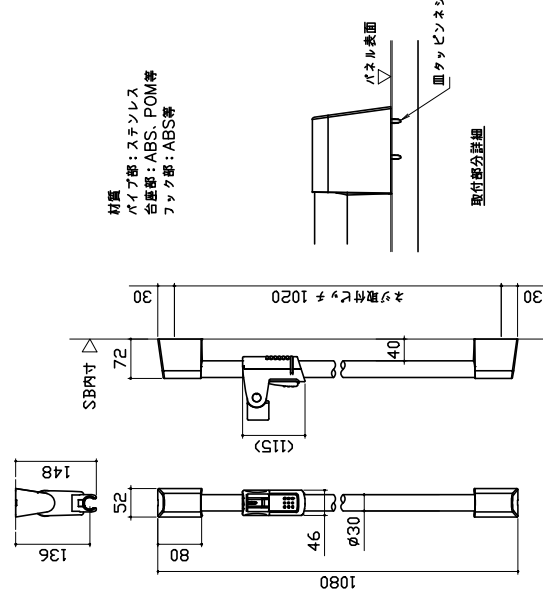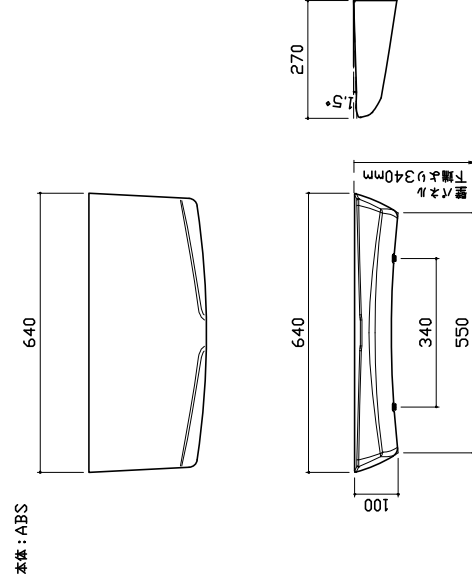

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称	現場番号	米子支店
------	------	------

現場名称：SB展示 2021.02?様邸

現場名称: SB展示 202
現場番号: C1962700

EMELORD I x
プラン番号: 2901A
担当営業: ?1216

2011-0789T

部材詳細図	1/2
作成日：2020年12月21日	
担当アドバイザー：S12浴槽	

パネル割図		ミラー		シャワーフックスライドバー	
※K16C2Z 0845 LUNA ※L16C1N 0753 < W ※K16A 0799 < W ※K12A 0349 < W AL勝手 ※L12NW 0574 < W ※L12NW 0574 < W ※L16C1N 0799 < W ※K16C2Z 0845 LUNA		※K16C2Z 0845 LUNA 845 1259 690 531 313 現地加工：φ3.5		※K16C2Z 0845 LUNA 845 1774 754 33 33 64 現地加工：φ3.5	
照明					
※K16C2Z 0845 LUNA 845 208 389 423 456 ※：現地加工の18 ・：現地加工の3.5					
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称：SB展示 2021.02?藤邸 現場番号：C1962700 米子支店		EMELORD エムロード プラン番号：2901A-2011-0789T 担当営業：?1216	
		穴開け指示図		1/1	
		作成日：2020年12月21日		S12浴槽	
