

システムバス 御見積書

御名前 横浜-新藤沢SR SB2 様

業者 様

商品名 PREDECIA プレデンシア

商品御見積金額 **¥1,793,300 (税込 ¥1,972,630)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 ¥165,000 (税込 ¥181,500)

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

作成日 2020年11月7日
プラン番号 2710B-1809-0130T
現場番号 A7803237

タカスタンダード株式会社
藤沢営業所
神奈川県藤沢市石川1丁目1番地の17
TEL 0466-86-1848 / FAX 0466-86-1832

藤沢ショールーム
TEL 0466-86-1800 / FAX 0466-86-2195

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
SB2		

備考

御見積仕様

(システムバス)	
ユニットサイズ	1616(AL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア(プレミアムクラス)
浴槽材質	鋳物ホーロー
カラー	プレシャスホワイト
形状	くつろぎラウンジ浴槽(ハンチ付)
浴槽・風呂フタ	高断熱仕様
カウンター材質	クォーツストーン
カラー	ジュエルブラック
エプロン材質	ステンレス(カラーコーティング)
カラー	ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
カラー	ウォルナットブラウン(HDタイプ)
ガス種	未定
周波数	50Hz

御確認事項

--	--

御名前 横浜-新藤沢SR SB2

様

現場番号	A7803237	プラン番号	2710B-1809-0130T	作成日	2020/11/7
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシアプレミアム 1616サイズ		1	1,226,000	1,226,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	キーブクリーンドア:開き戸<800幅>(ブラック)(19サイズ)	1	+57,000	+57,000
4	洗い場	キーブクリーンフロア(プレミアムクラス・グラングレー)	1	+20,000	+20,000
5	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)	1		
6	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
7	浴槽追焚き穴	あり	1		
8	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)	1		
9	浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付)	1	+50,000	+50,000
10	ヘルシージェット	なし	1		
11	浴槽ハンドグリップ	2本仕様	1	+7,000	+7,000
12	ガス温水式床暖房	なし	1		
13	洗い場用水栓	プッシュ式水栓(メタルホース)SB280	1		
14	洗い場用水栓	マッサージシャワー	1	+13,000	+13,000
15	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
16	カウンター	クォーツストーンデュアルカウンター	1	+212,000	+212,000
17	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	1	+5,200	+5,200
18	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザイン4面同柄)	1	+70,000	+70,000
19	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
20	天井	高光沢フラット天井	1		
21	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V規格)	1	+41,000	+41,000
22	換気機器	ランドリーパイプメタルタイプ(1本)	1	+1,500	+1,500
23	換気機器開口	工場開口	1		
24	照明	ストレートライン照明(調光機能付き)	1	+29,000	+29,000
25	天井照明開口	工場開口	1		
26	ミラー	ワイドクリアミラー(収納棚対応)	1	+17,000	+17,000
27	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
28	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-4,000	-4,000
29	ハンドバー	ステン I型600タイプ	1	+8,000	+8,000
30	収納棚	クリアタイプ(2段)	1	-4,000	-4,000
31	どこでもラック	風呂フタフック(チャコールグレー)	1	+2,100	+2,100

御名前 横浜-新藤沢SR SB2

様

現場番号	A7803237	プラン番号	2710B-1809-0130T	作成日	2020/11/7
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500
33	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
34	トラップカバー	なし	1		
35	壁面スピーカー	どこでもスピーカー	1	+25,000	+25,000
システムバス合計			35		¥1,793,300

商品総合計	35	¥1,793,300
-------	----	------------

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥165,000 (税込 ¥181,500)


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

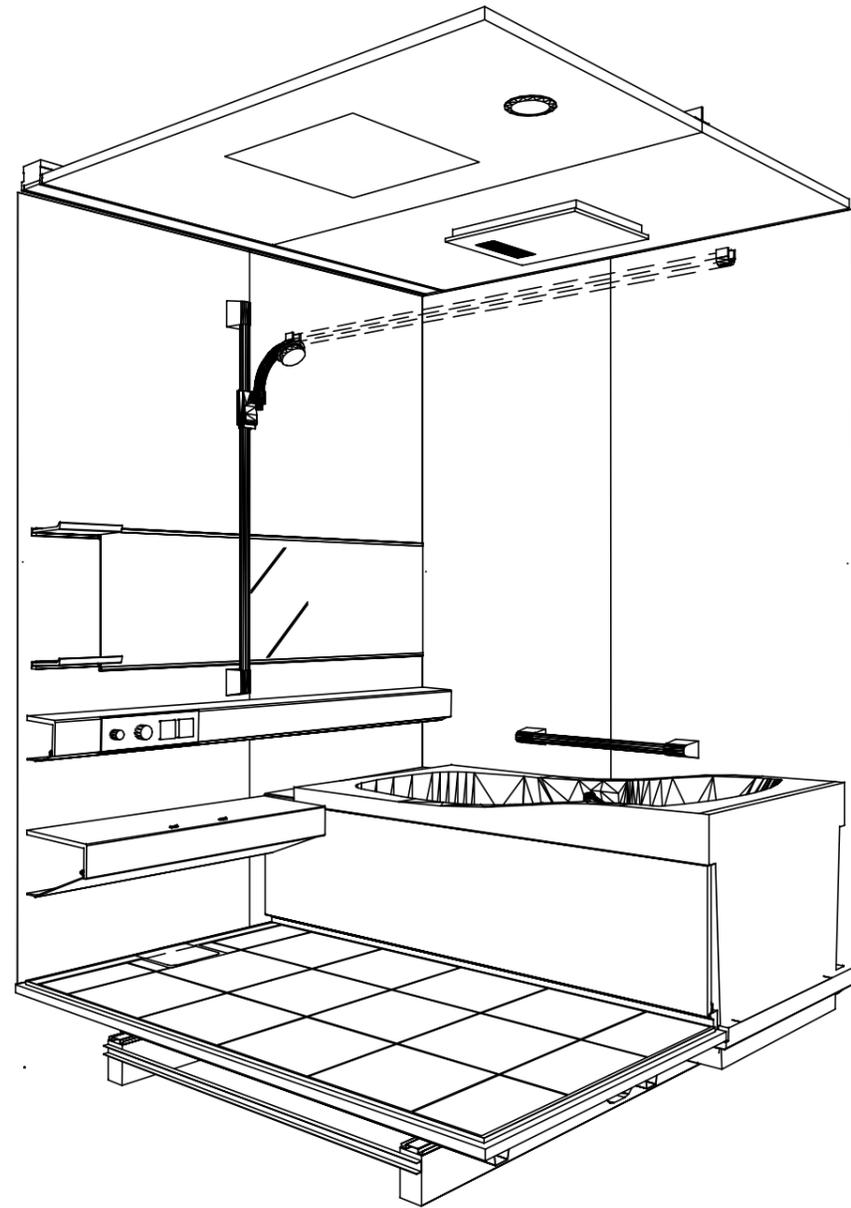

鳥瞰図

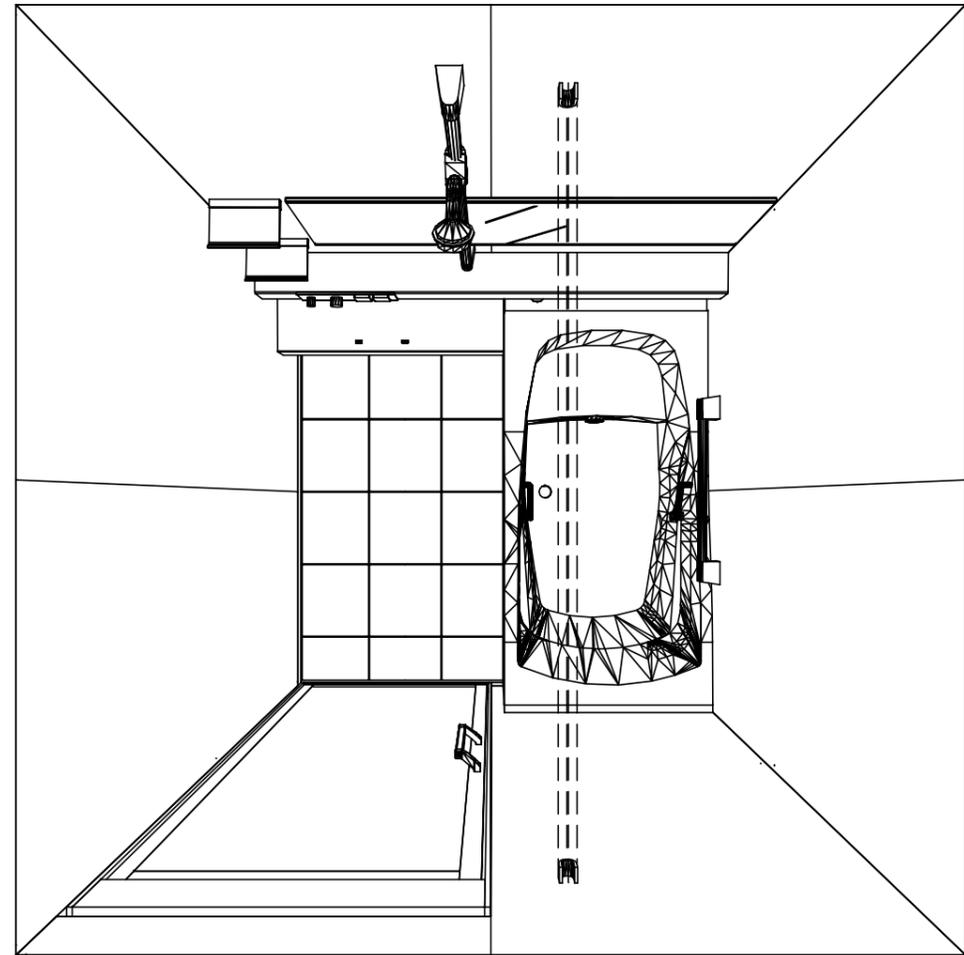

1616

鋳物ホーロー浴槽

高光沢フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

Takara standard
タカラストانダード株式会社

現場名称： 横浜-新藤沢SR SB2様邸

現場番号： A7803237

藤沢営業所

PREDENCIA プレデンスシア

プラン番号： 2710B-1809-0130T

担当営業： SB2

姿図


作成日： 2020年11月7日

担当アドバイザー：


縮尺：A3サイズ等倍





■留意事項
 ※印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

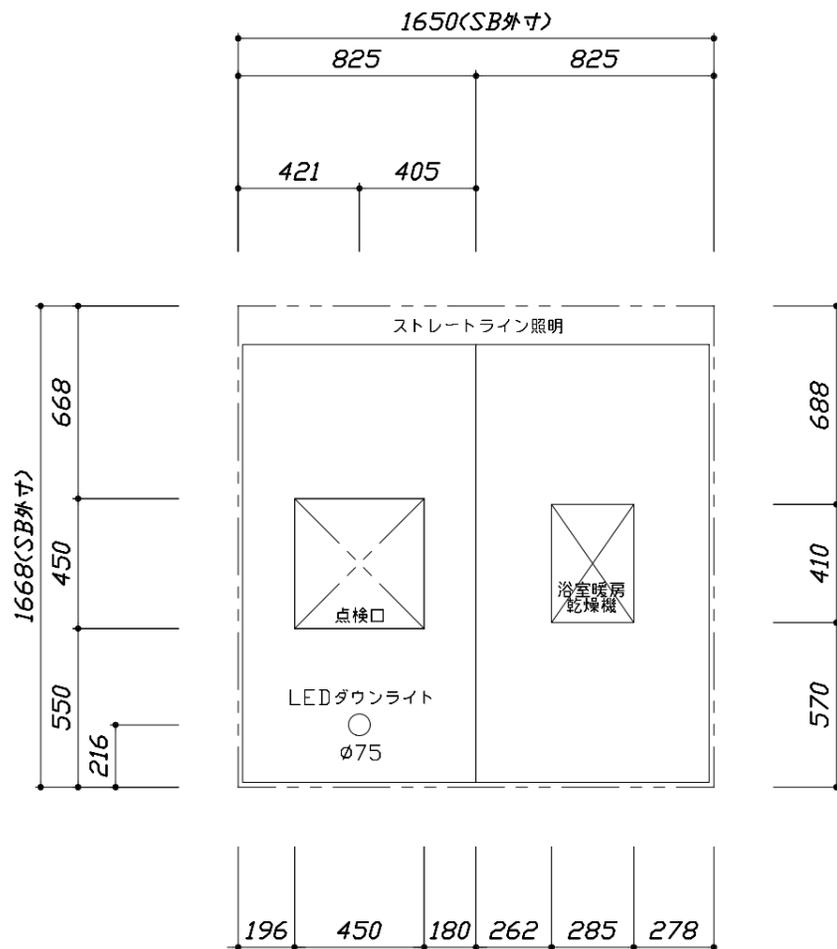

<天井伏図>

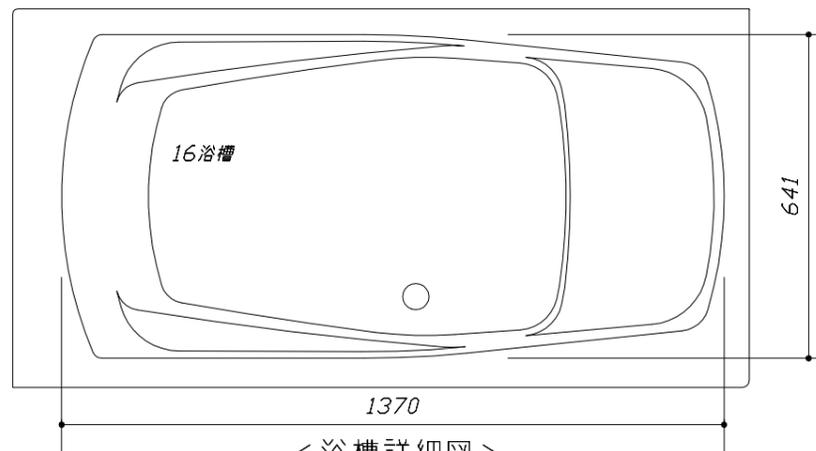

<浴槽詳細図>

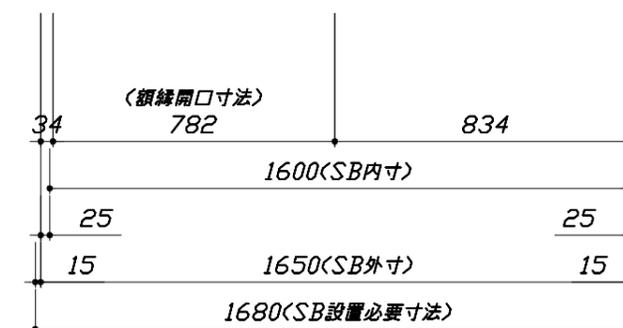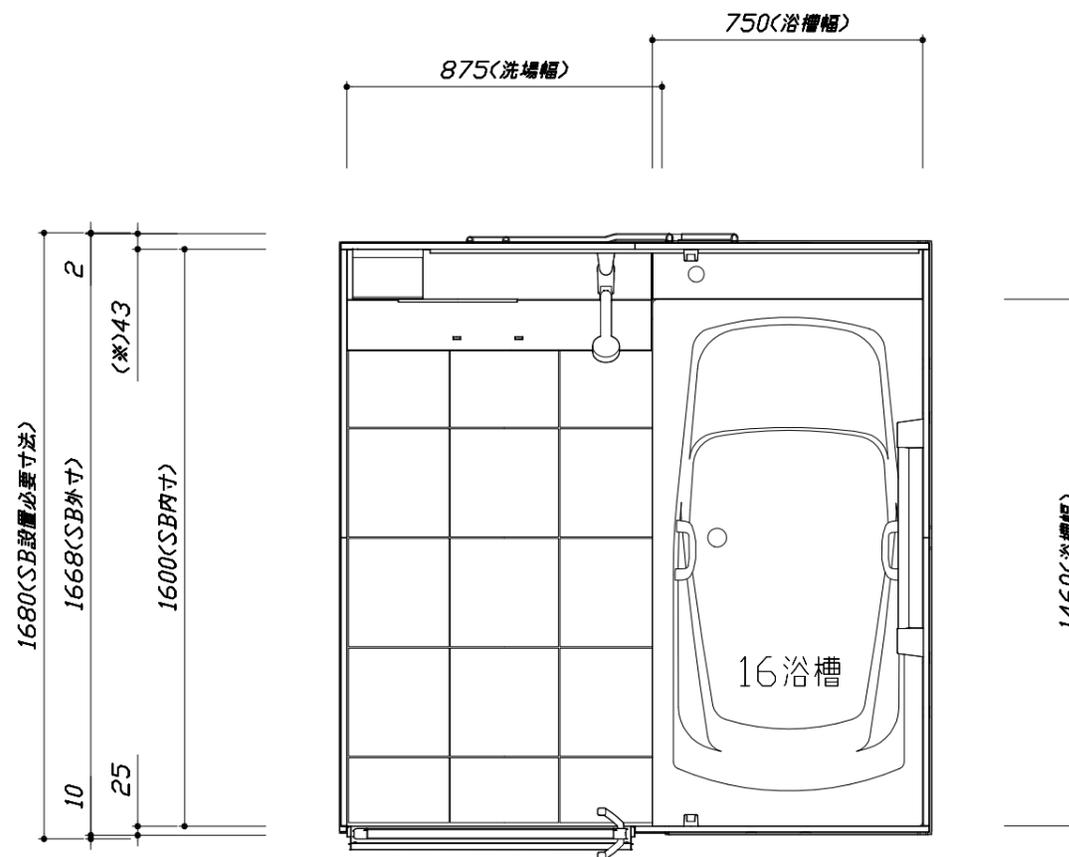

<平面図>

Takara standard
 タカラストANDARD株式会社




現場名称： 横浜-新藤沢SR SB2様邸
 現場番号： A7803237
 藤沢営業所

PREDECIA プレデンスア
 プラン番号： 2710B-1809-0130T
 担当営業： SB2

施工図1 縮尺： 1:25,20
 作成日： 2020年11月7日
 担当アドバイザー：

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

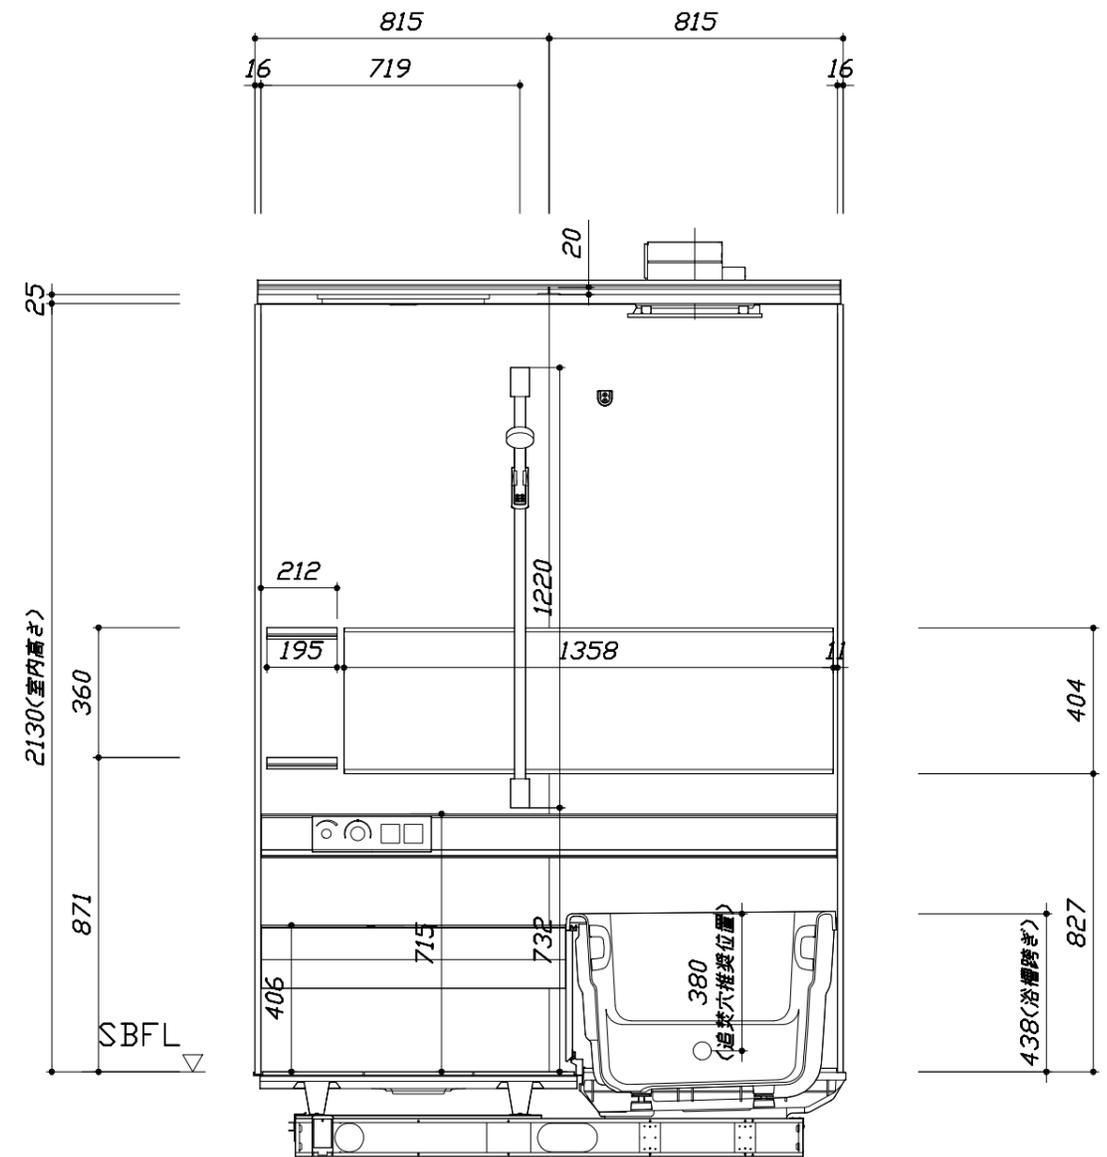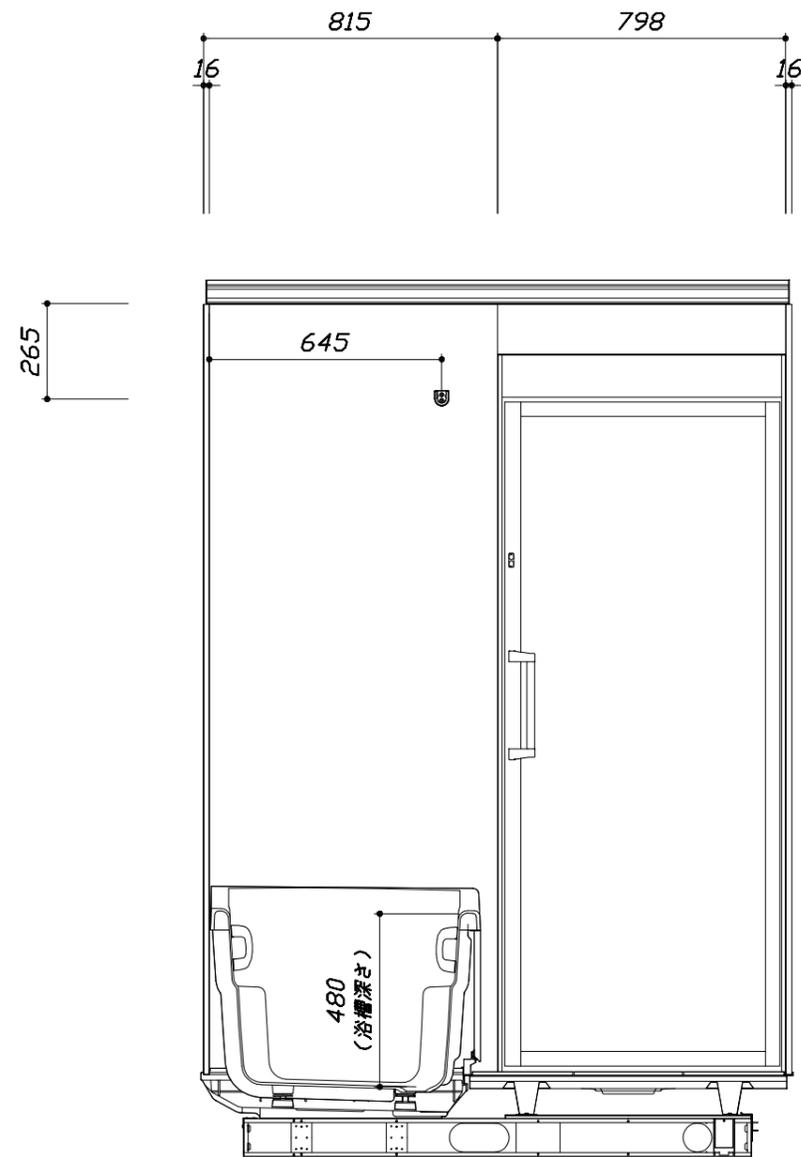

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

<カウンター面図>

Takara standard
タカスタンダード株式会社



現場名称： 横浜-新藤沢SR SB2様邸
現場番号： A7803237
藤沢営業所

PREDECENCIA プレデンスシア
プラン番号： 2710B-1809-0130T
担当営業： SB2

施工図2
縮尺： 1:20
作成日： 2020年11月7日
担当アドバイザー：


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

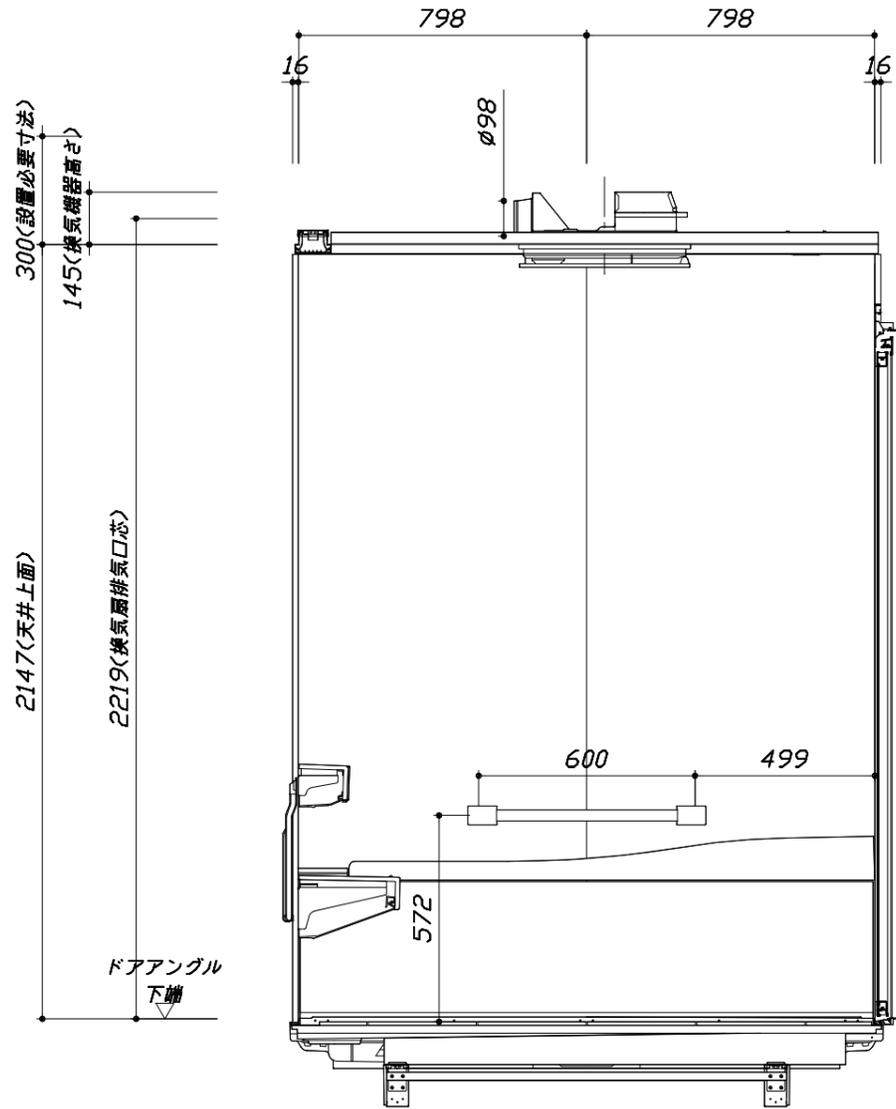

■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)

< 浴槽側面図 >

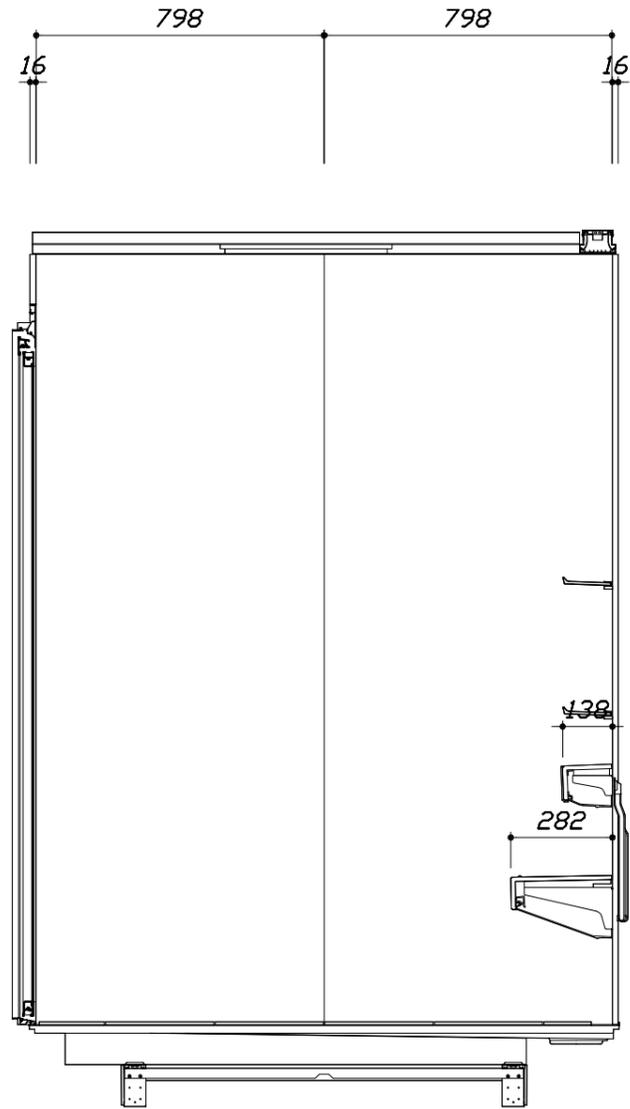

< 洗場側面図 >

Takara standard
 タカラストANDARD株式会社

現場名称： 横浜-新藤沢SR SB2様邸
 現場番号： A7803237
 藤沢営業所

PREDECENCIA プレデンスシア
 プラン番号： 2710B-1809-0130T
 担当営業： SB2

施工図3 縮尺： 1:20
 作成日： 2020年11月7日
 担当アドバイザー：

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	AL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	鋳物ホーロー 裏面保温材・高断熱仕様(発泡ウレタン)
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付) グリップ付(270リットル) 追い焚き穴：あり
浴槽パン	ガラス強化繊維樹脂(FRP)
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材(発泡ポリエチレン)
カウンター	クォーツストーンデュアルカウンター：クォーツストーン カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	高光沢フラット天井：高光沢サトウイッパル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ開き戸(アルミ框/飛散防止フィルム付強化ガラス)
窓1	—
窓2	—
窓枠1	—
窓枠2	—
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂、浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	410kg

アクセサリ仕様表


ミラー	ワイドクリアミラー(収納棚対応) くもり止め加工
収納棚	クリアタイプ：アクリル樹脂製(2段)
タオル掛け	—
洗場側水栓	サモシャワー付・タッチ式(メタルホース仕様・SB280LAB(M)/RAB(M))
浴槽側水栓	—
兼用水栓	—
スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ) シルバー
照明	ストレートライン照明(LED 23.7W調光機能付)
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V・最大消費電力1250W)(ダクト径φ98)(常時換気対応品)
フロタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	—
ハンドバー②	—
ハンドバー③	—
ハンドバー④	ステンレスタイプ I型600タイプ
ハンドバー⑤	—
ハンドバー⑥	—
ハンドバー⑦	—

本体カラー

浴槽	WP：プレシャスホワイト
カウンター	Q：ジュエルブラック
パネル(カウンター面)	JNB：ウォルナットブラウン(HDタイプ)
パネル(周辺・3面)	JNB：ウォルナットブラウン(HDタイプ)
浴槽エプロン	K：ブラック
洗場	PG：グラングレー
ドア	B：ブラック
収納棚	クリアタイプ
タオル掛け	—
ランドリセット	M：メタル


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。







■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

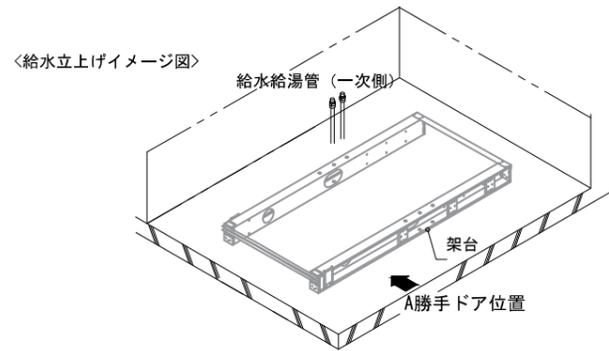



■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

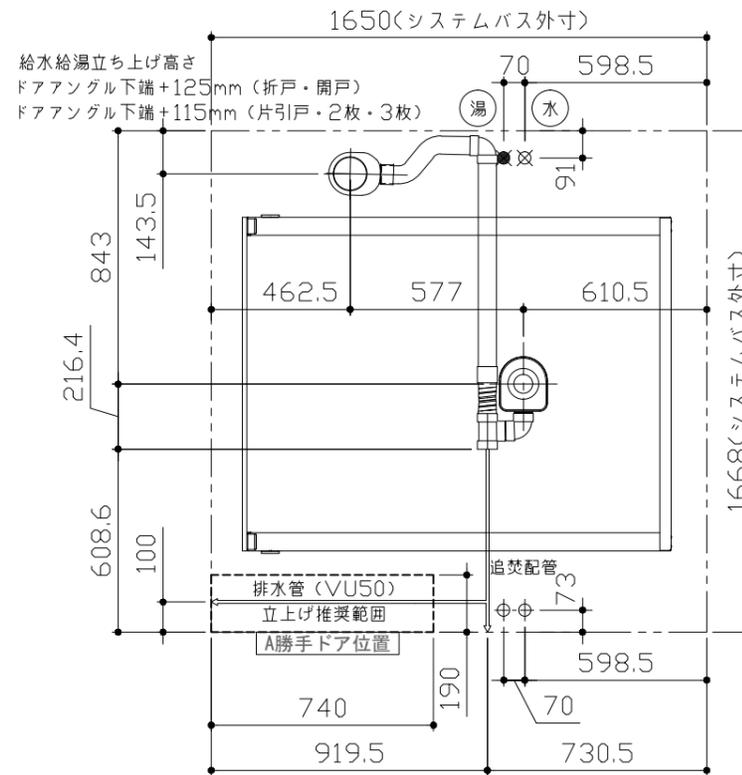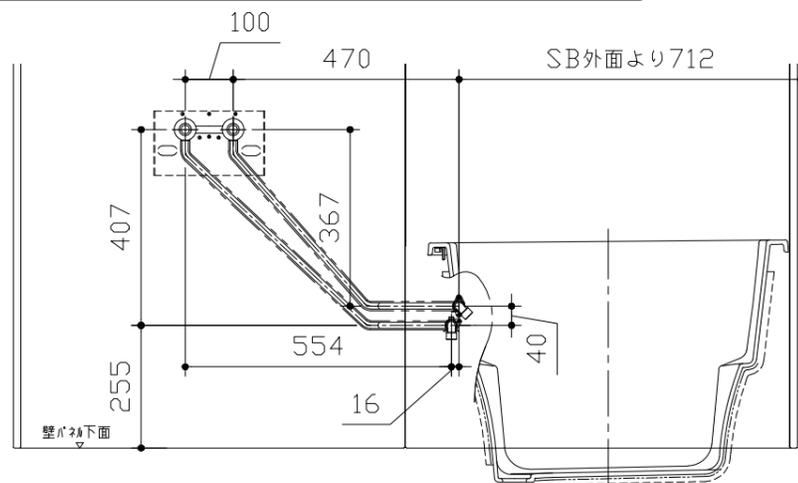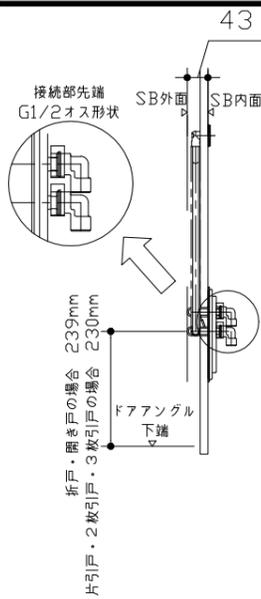

■ 設備記号

記号	記号の意味
⊗	給水位置
⊙	給湯位置

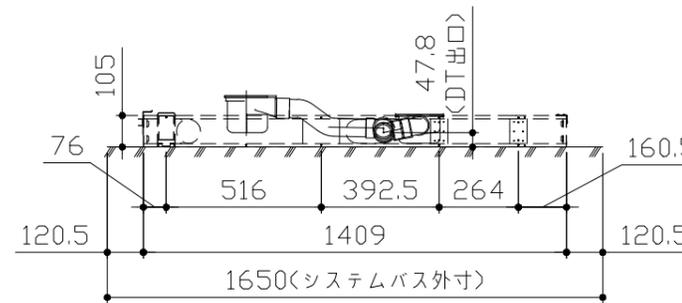

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

〈給水給湯管取合詳細図〉

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 横浜-新藤沢SR SB2様邸
現場番号： A7803237
藤沢営業所

PRENENCIA プレデンシア
プラン番号： 2710B-1809-0130T
担当営業： SB2

排水配管図
作成日： 2020年11月7日
担当アドバイザー：





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

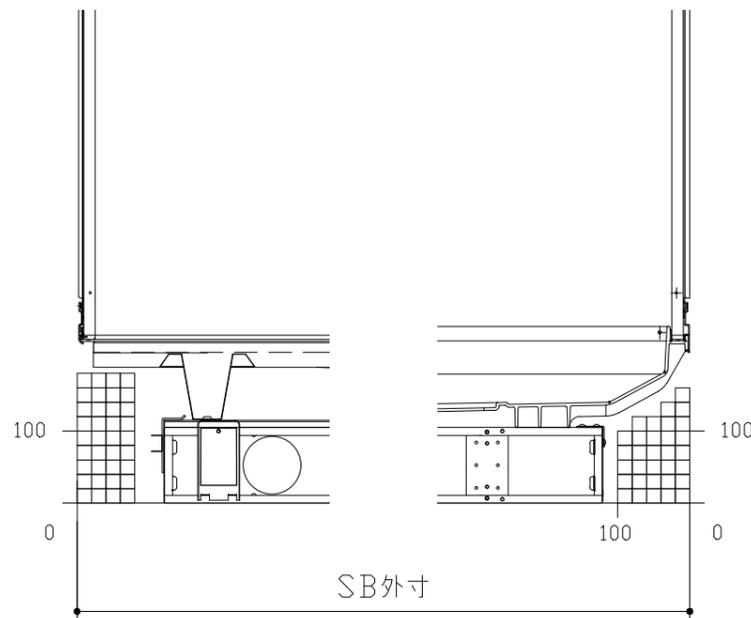


B矢視

A矢視

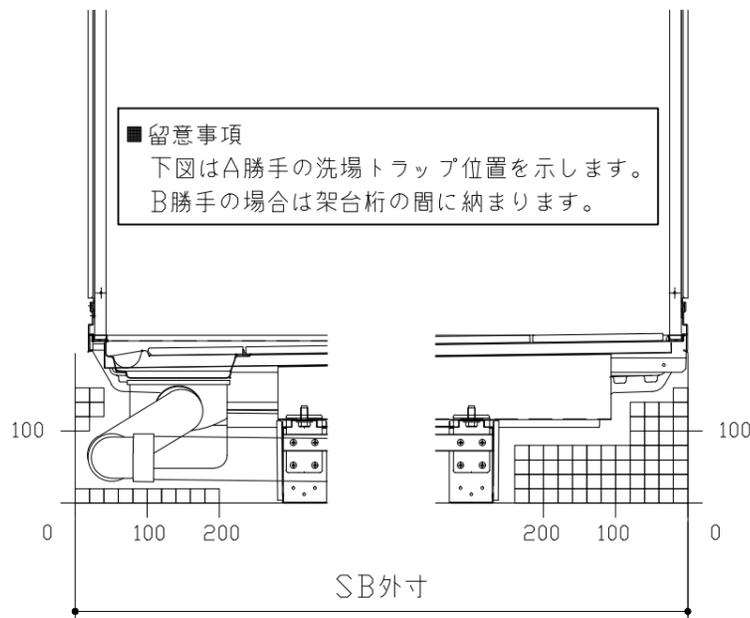

D矢視



C矢視

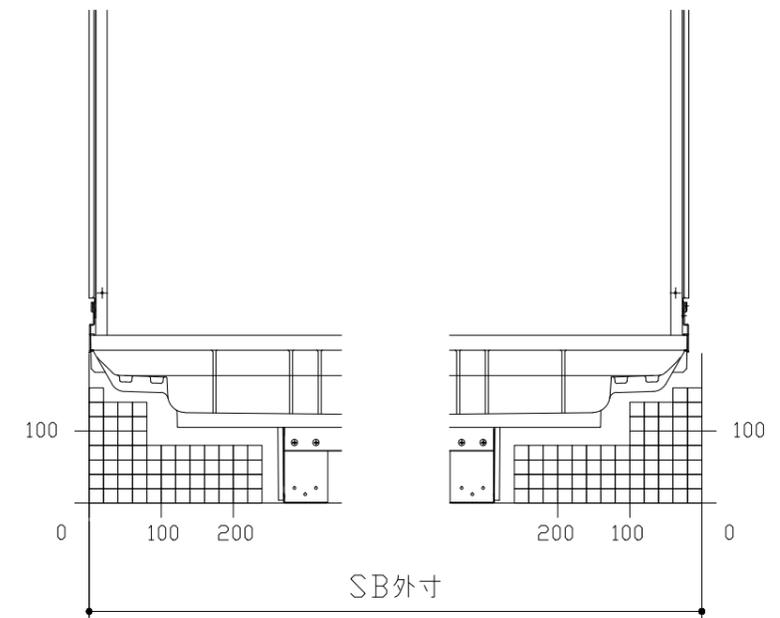

F矢視

E矢視

キープクリーンドア：開き戸グレー・ブラック（YGTド78・YBTド78）

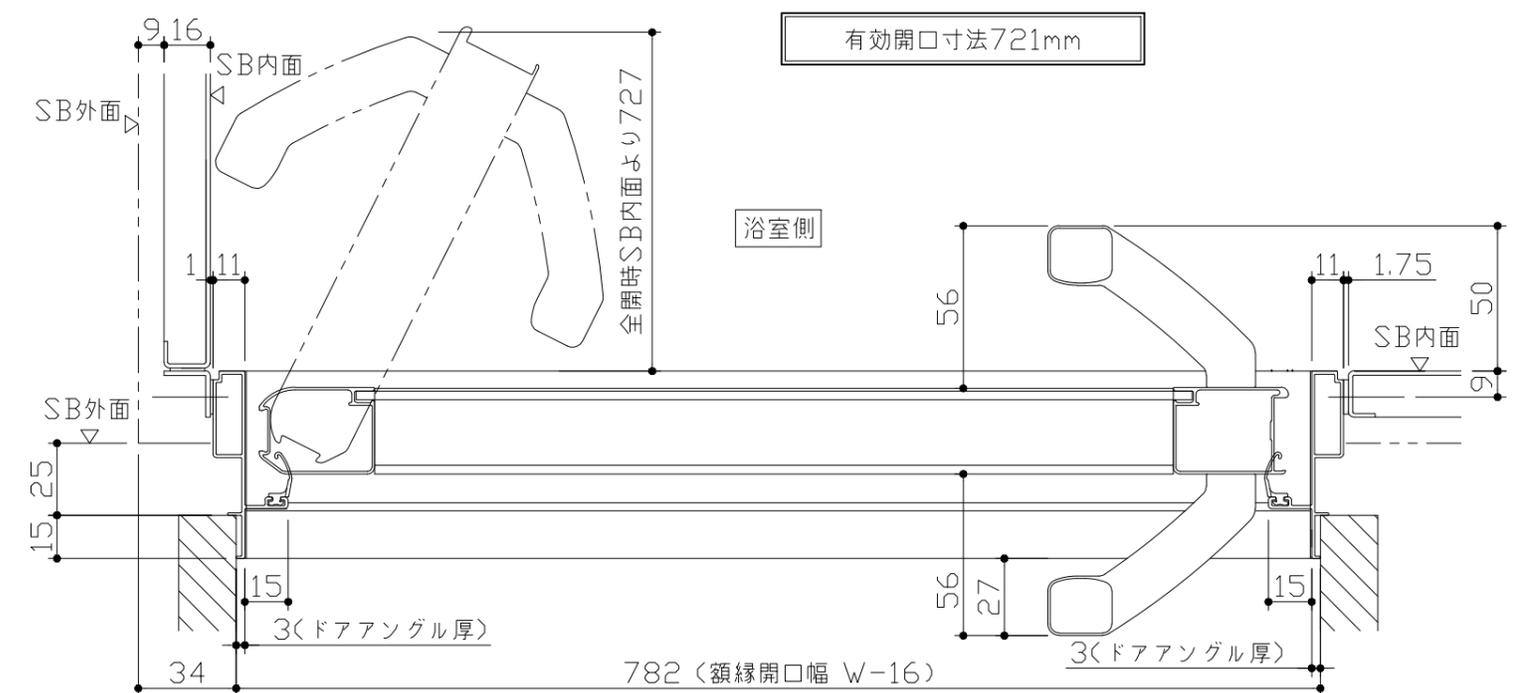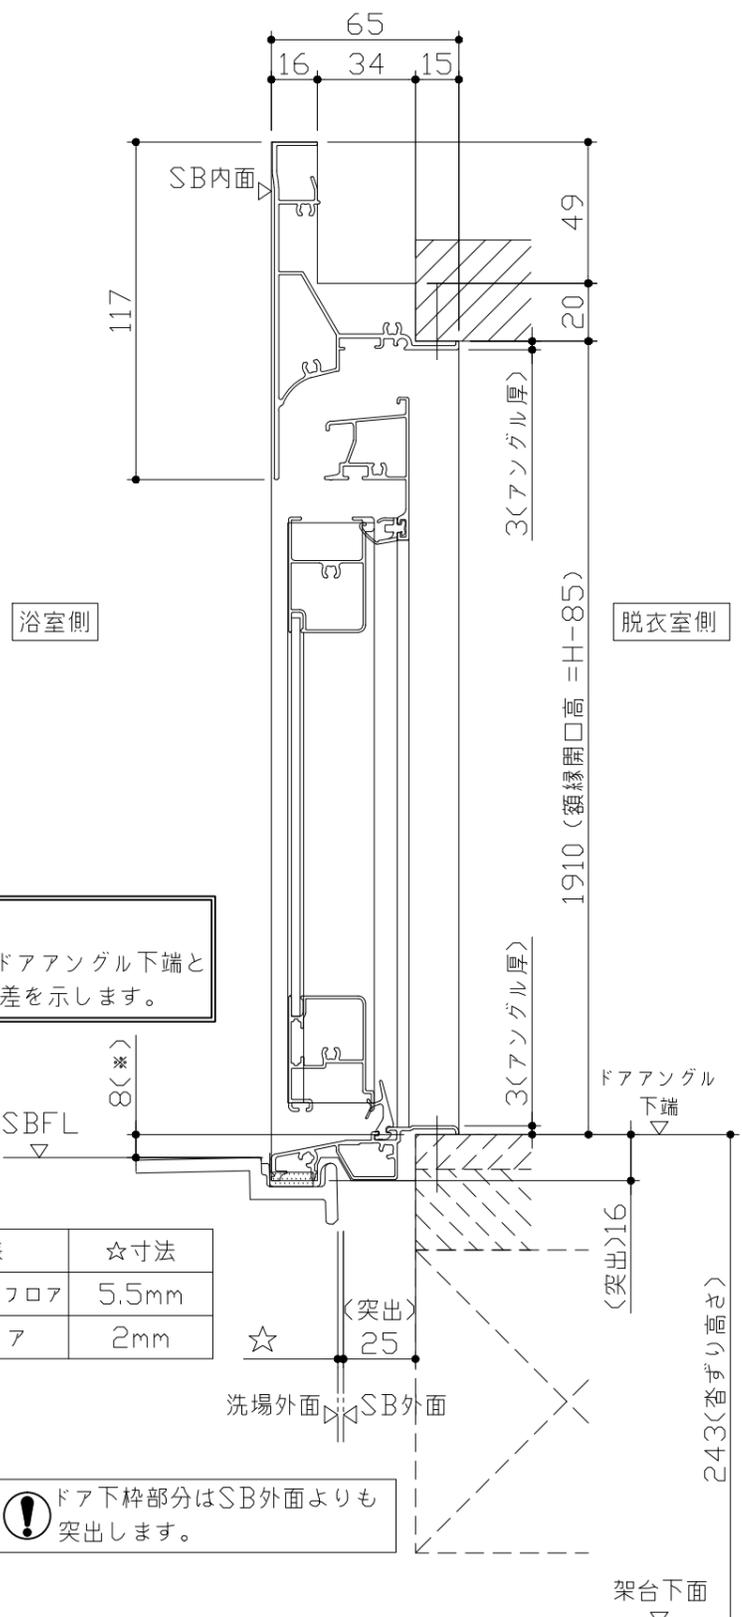


■ 留意事項
 * 印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。


ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm


⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

ドア開き角度65°以上でタオル掛けと干渉の恐れがあります。

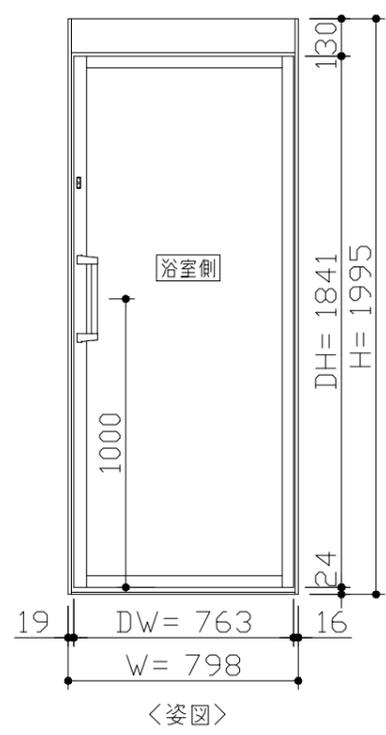


■ ドア横の管柱、間柱について
 ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。






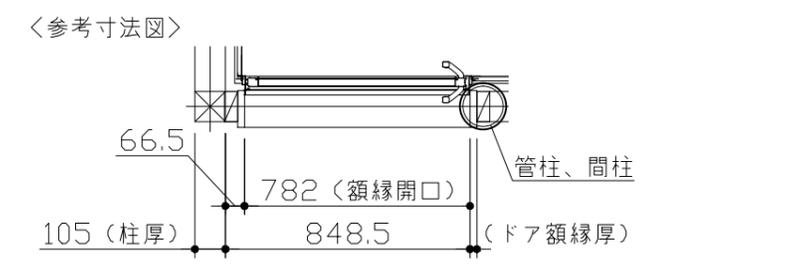


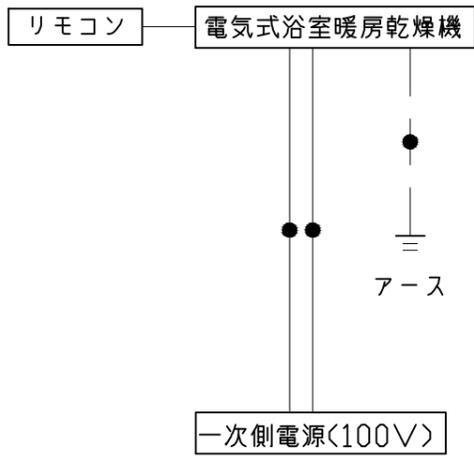

*浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

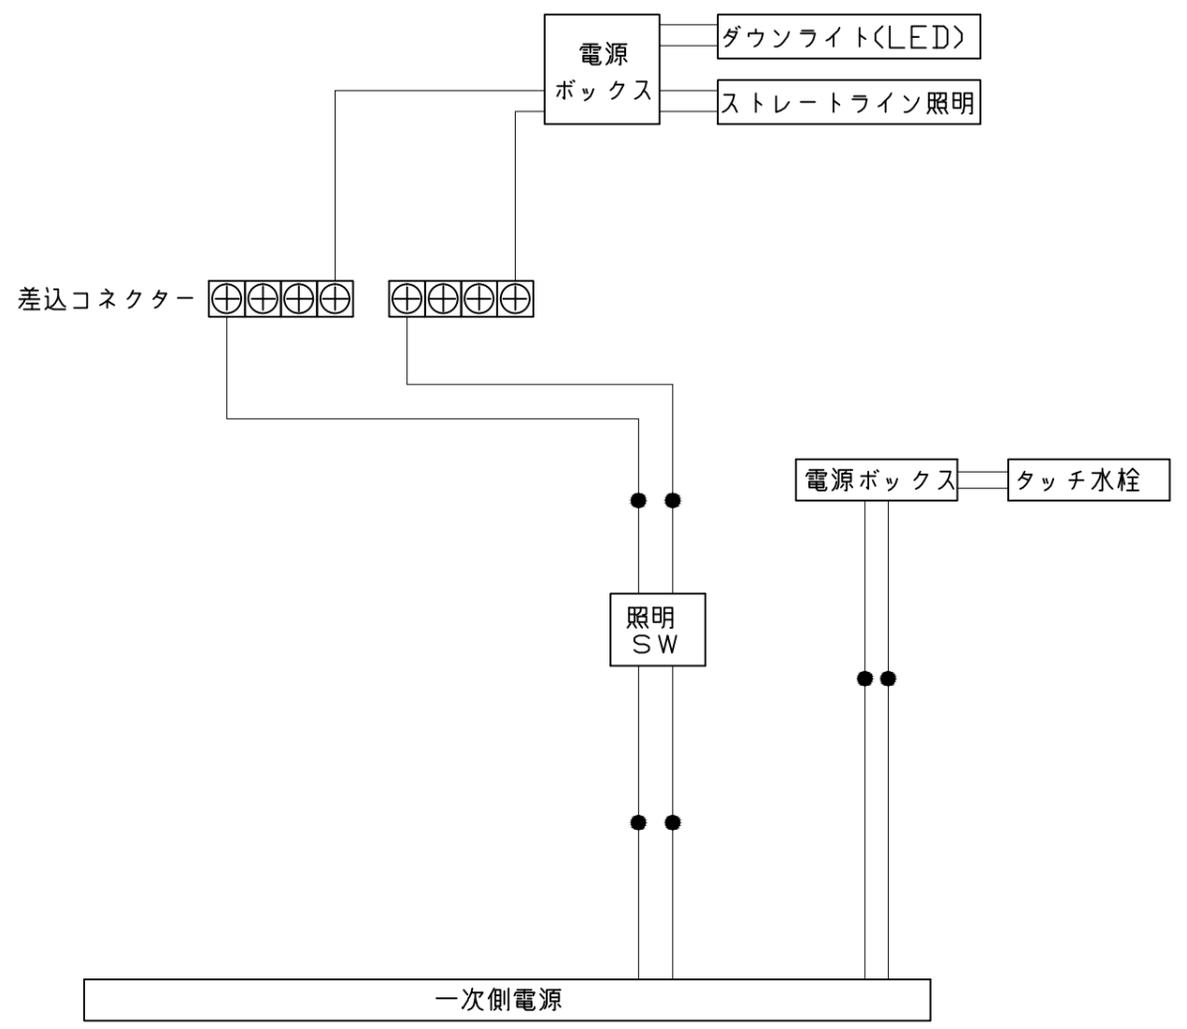


一次側電源から差し込みコネクタ及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。

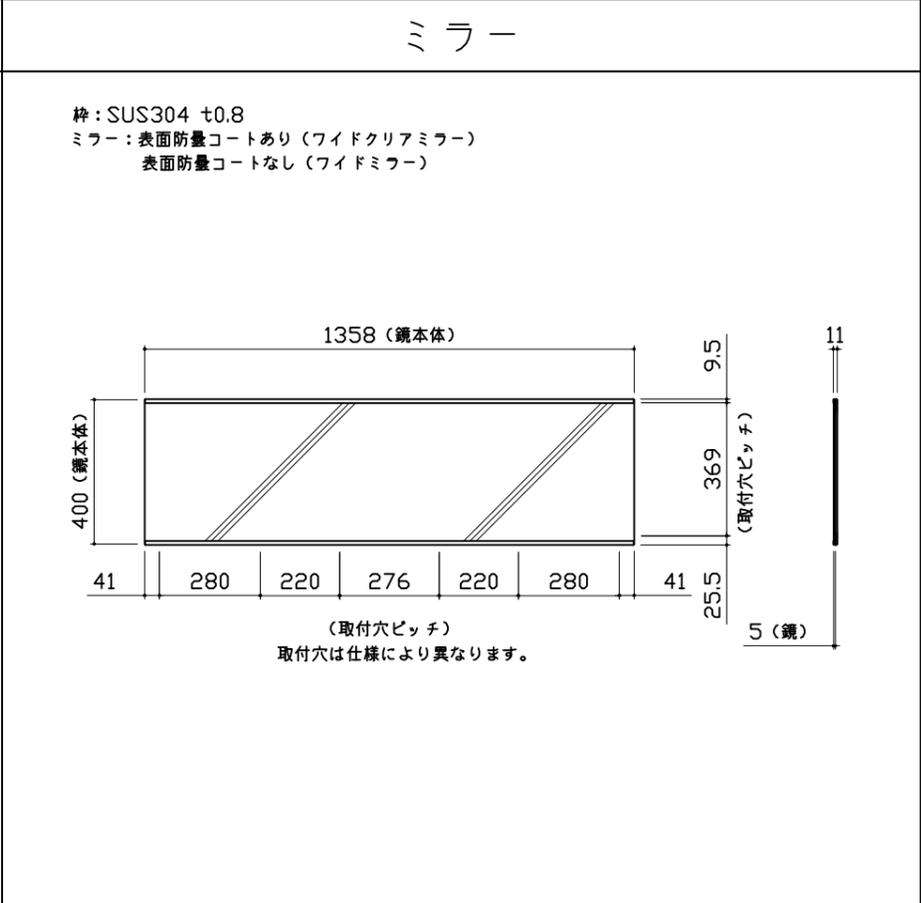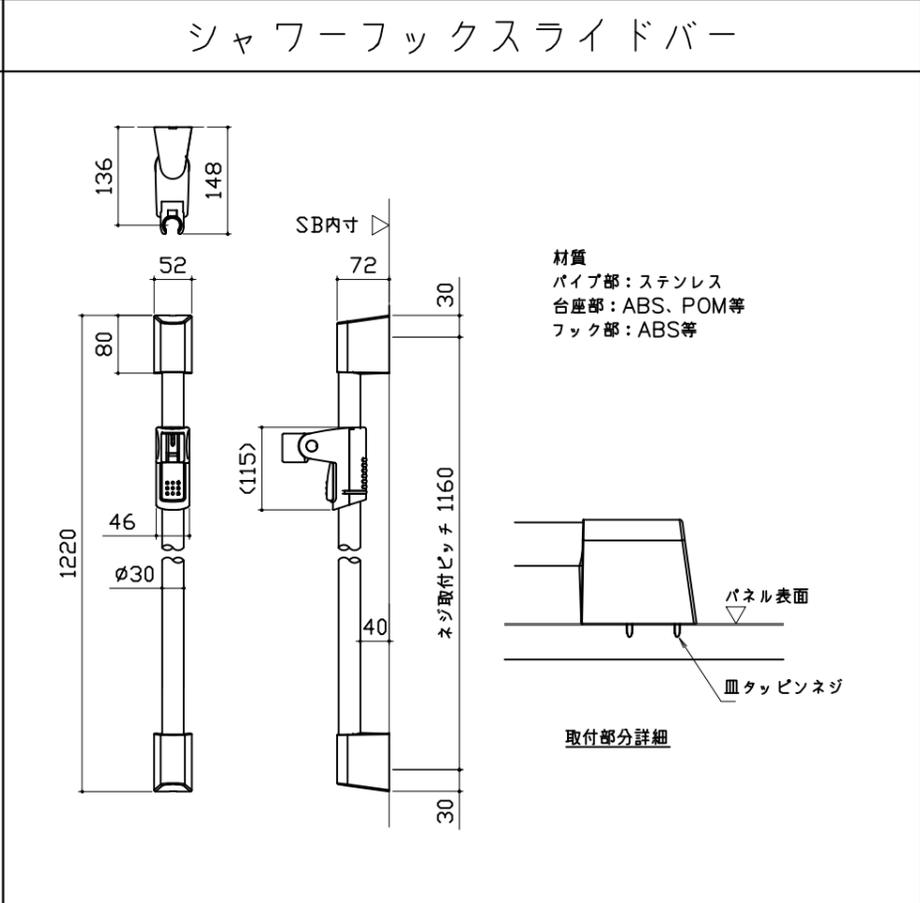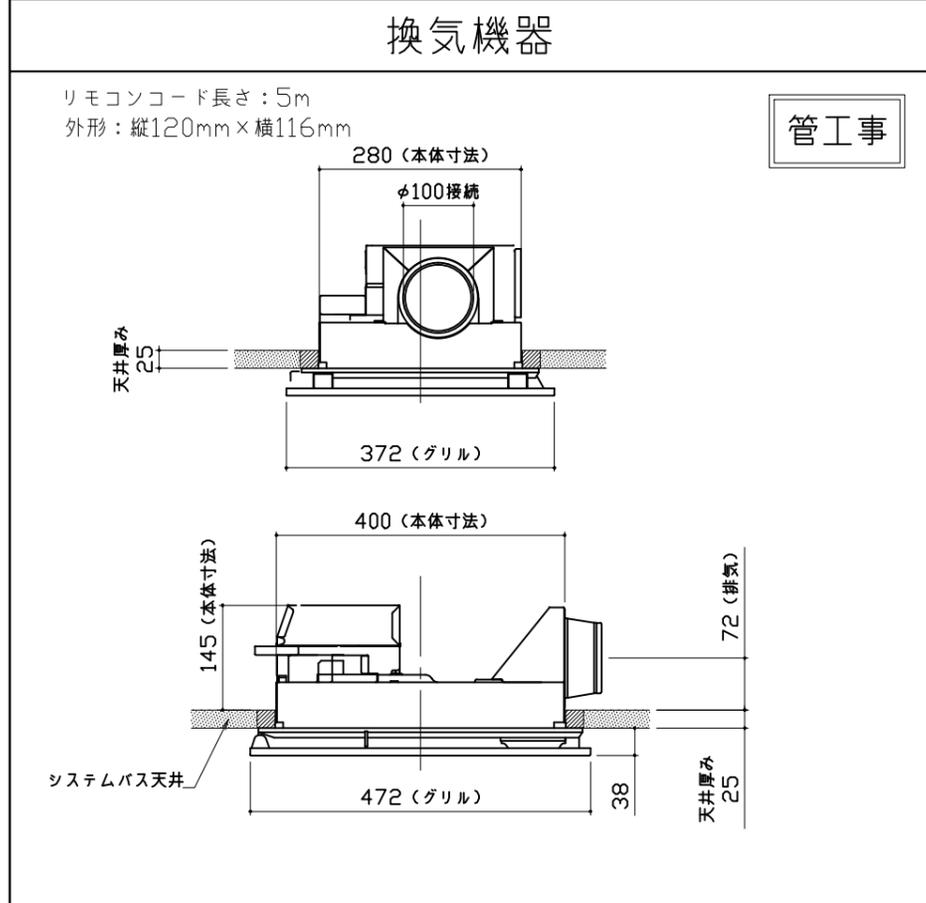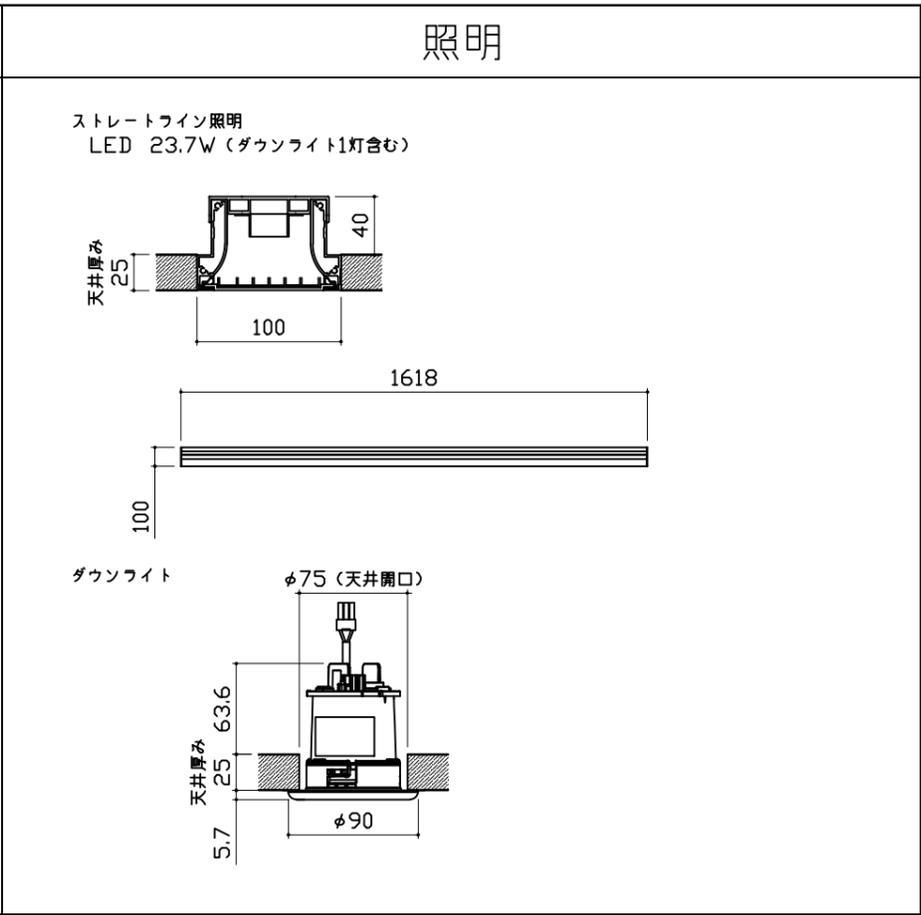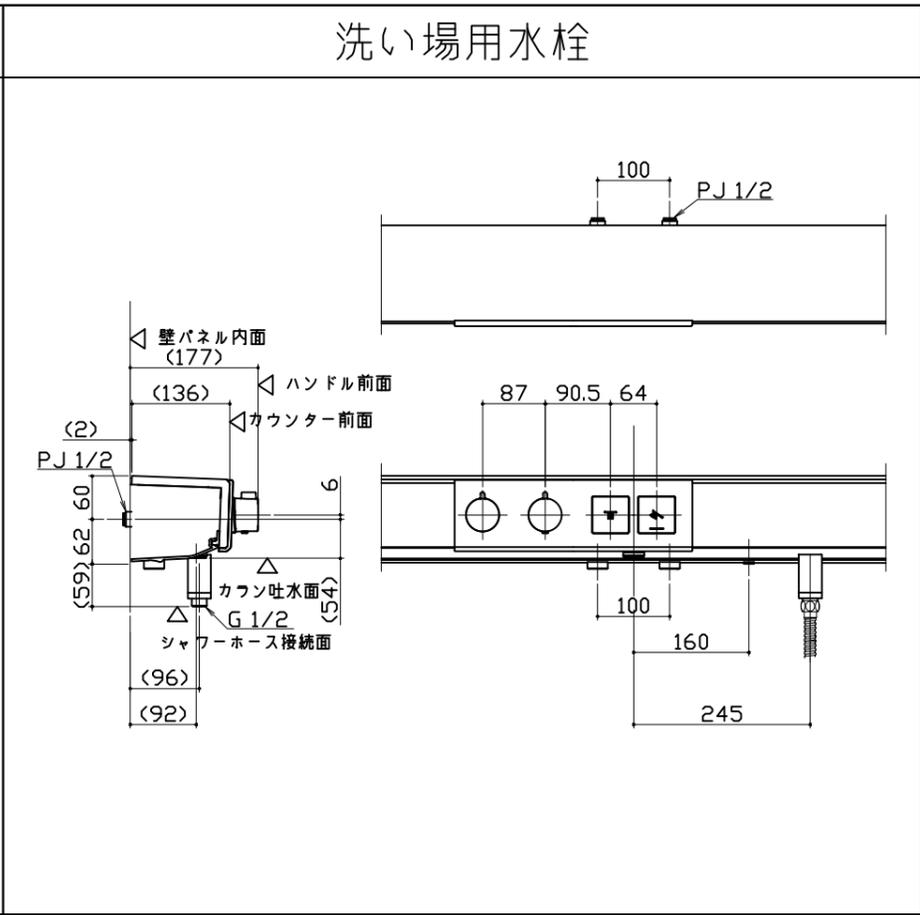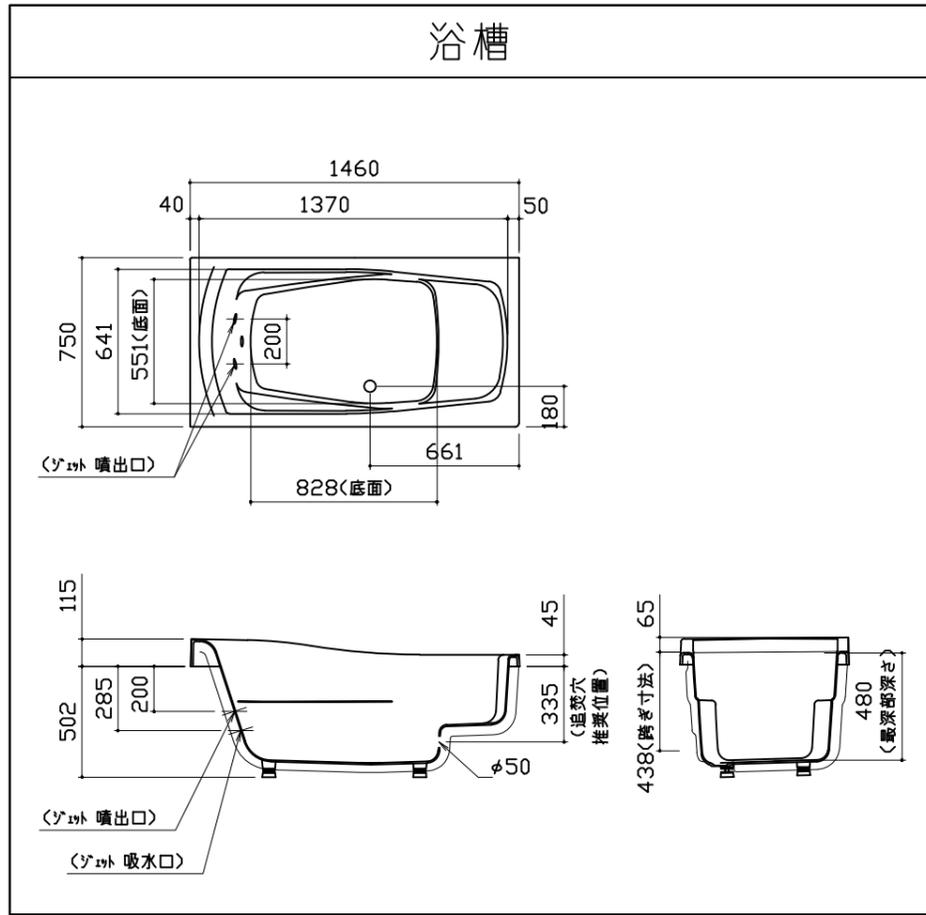


<h1 style="margin: 0;">Takara standard</h1> <p style="margin: 0;">タカラスタンダード株式会社</p>	現場名称: 横浜-新藤沢SR SB2様邸	PREDECENCIA プレデンスシア	部材詳細図	1/2
	現場番号: A7803237	プラン番号: 2710B-1809-0130T	作成日: 2020年11月7日	
	藤沢営業所	担当営業: SB2	担当アドバイザー:	

収納棚


本体：PMMA

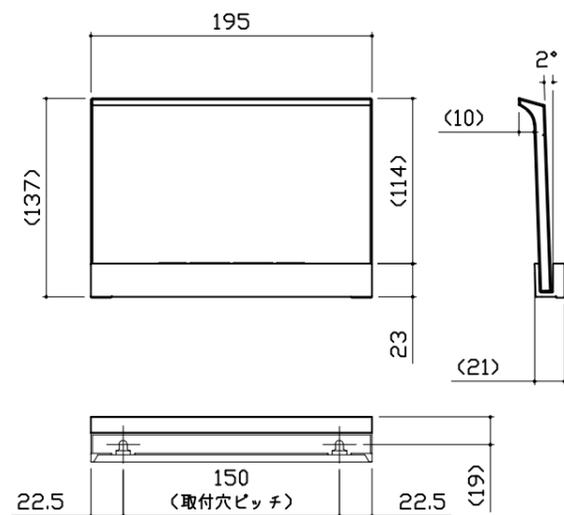


ハンダー支持部取合詳細図

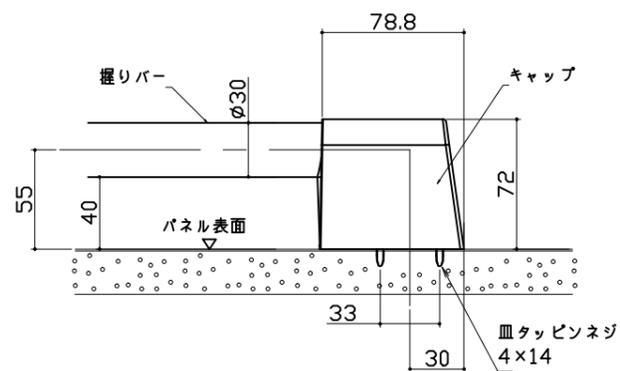


循環金具・フロアダプタ関連

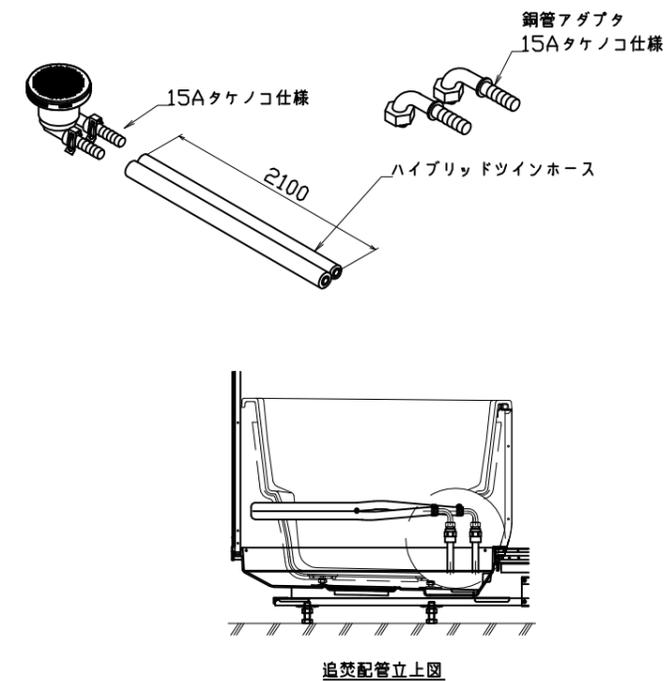


風呂蓋 707MDH-16XST

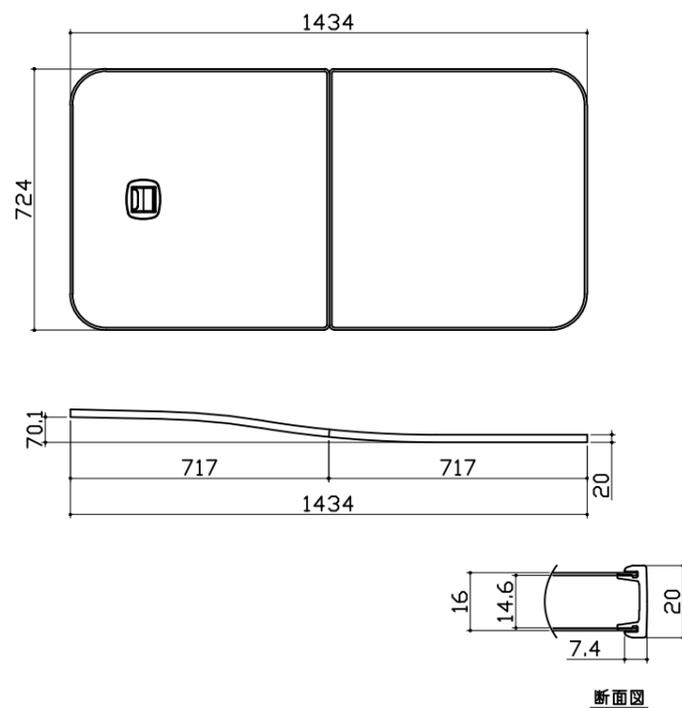

洗い場側排水トラップ

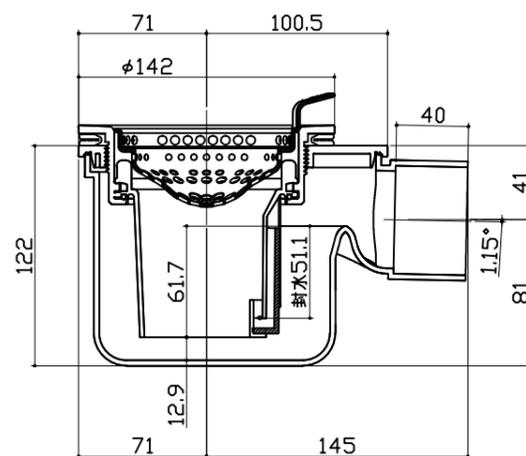

浴槽側排水トラップ

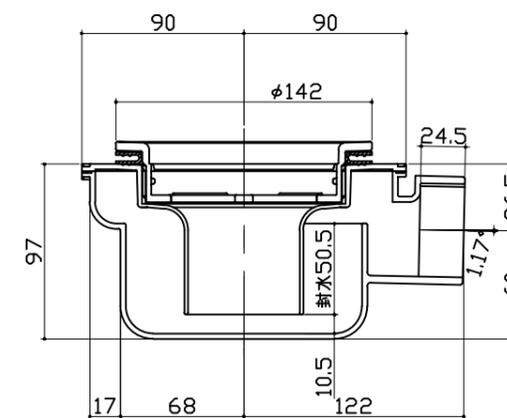

パネル割図	ミラー	収納棚
<p>パネル割図</p>	<p>ミラー</p> <p>ハネUHK 16C2Q L JNB</p>	<p>収納棚</p> <p>ハネUHK 16C2Q L JNB</p>
シャワーフックスライドバー	ランドリーパイプ	
<p>シャワーフックスライドバー</p> <p>ハネUHK 16C2Q L JNB</p>	<p>ランドリーパイプ</p> <p>ハネUHK 16AD JNB</p> <p>ハネUHK 16C1Q R JNB</p>	
