

システムバス 御見積書

御名前	北陸-金沢SR新SB7	様
業者		様
商品名	RELAGE レラージュ	

作成日 2020年4月25日
プラン番号 1600A-2004-0720T
現場番号 A7961596

タカラスタンダード株式会社
◆北陸支店 販売課
石川県金沢市新保本4丁目65番5
TEL 076-269-4400 / FAX 076-269-4499

◆金沢シヨールーム
TEL 076-269-4450 / FAX 076-269-4407

商品御見積金額 ￥774,200 (税込 ￥851,620)
()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥128,000 (税込 ￥140,800)
※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆御見積仕様

《システムバス》	
ユニットサイズ	1616 (AL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア(プレミアムクラス)
浴槽材質	アクリル人造大理石
カラー	シュガーホワイト
形状	ラウンド浴槽
カウンタータ材質	アクリル人造大理石
カラー	シュガーホワイト
エプロン材質	ステンレス(カラーコーティング)
カラー	ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
カラー	ブリックベージュ
ガス種	LPG
周波数	60Hz

◆御確認事項

- ☆御見積りの商品は受注生産品の為、納期は約2週間程度いただきます
- ☆商品の仕様・価格等は予告なく変更する事があります。ご購入の際には、弊社支店営業所等へお問い合わせ、またはカタログにてよく御確認下さるようお願い致します。
- ☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。
- ☆この御見積書の有効期間は30日間です。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
	2020.04	谷村

◆備考

2020.04 入れ替え

--	--

No.*

現場番号	A7961596	プラン番号	1600A-2004-0720T	作成日	2020/4/25
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	レラージュ 1616サイズ		1	684,000	684,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	キープクリーンドア:折戸<800mm幅>(ホワイト)(20サイズ)	1		
4	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・グランベージュ)	1	+20,000	+20,000
5	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)	1		
6	排水口カバー	ステンレス	1		
7	浴槽追炊き穴	あり	1		
8	エプロン	カラスステンレス(保温材あり)	1		
9	浴槽形状	16ラウンド浴槽	1		
10	ヘルシージェット	なし	1		
11	浴槽ハンドグリップ	なし	1	-10,000	-10,000
12	ガス温水式床暖房	なし	1		
13	洗い場用水栓	サーモ水栓(メタルホース)SB181-5UT	1		
14	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド	1		
15	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
16	カウンター	人スクエアカウンター	1		
17	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	1	+5,200	+5,200
18	浴室パネル	ハイクラス(一面デザイン)	1		
19	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
20	天井	高光沢フラット天井	1		
21	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V規格)	1	+41,000	+41,000
22	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
23	換気機器開口	工場開口	1		
24	照明	天井付スクエア照明+ダウンライト(1灯)(電球色)	1		
25	天井照明開口	工場開口	1		
26	ミラー	ロングクリアミラー	1		
27	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
28	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,500	-1,500
29	ハンドバー	ステン 1型600タイプ	1	+8,000	+8,000
30	収納棚	クリアタイプB(2段)	1	+3,500	+3,500
31	どこでもラック	シャワーフック(ホワイト)	1	+2,100	+2,100

現場番号	A7961596	プラン番号	1600A-2004-0720T	作成日	2020/4/25
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	どこでもラック	小物置きS+フック+タオルハンガー(ホワイト)	1	+4,400	+4,400
33	風呂フタフック	風呂フタフック(固定式)(ホワイト)	1	+5,000	+5,000
34	循環金具セット	PLIX	1	+12,500	+12,500
35	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
36	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			36		¥774,200

商品総合計	36	¥774,200
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥128,000 (税込 ¥140,800)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

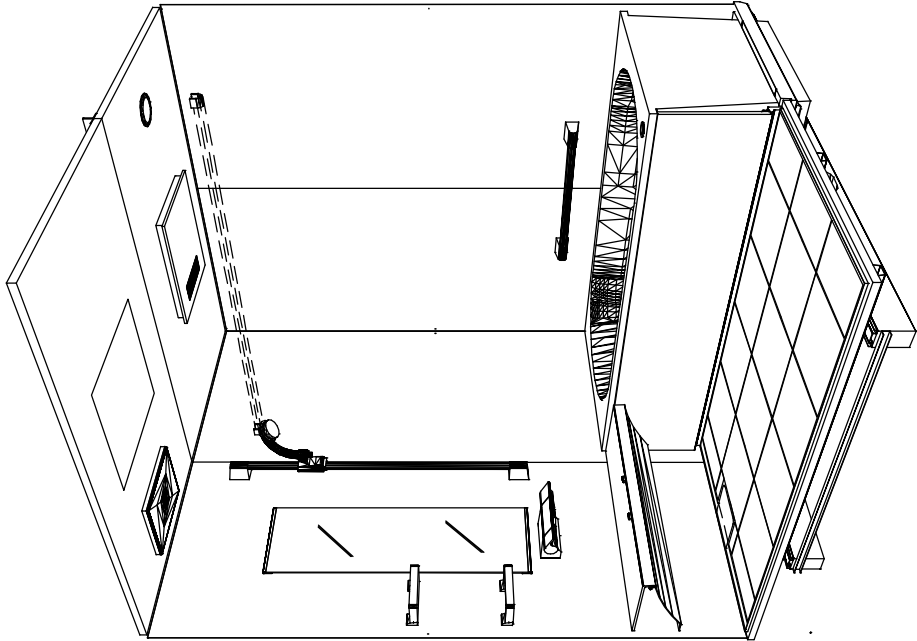

鳥瞰図

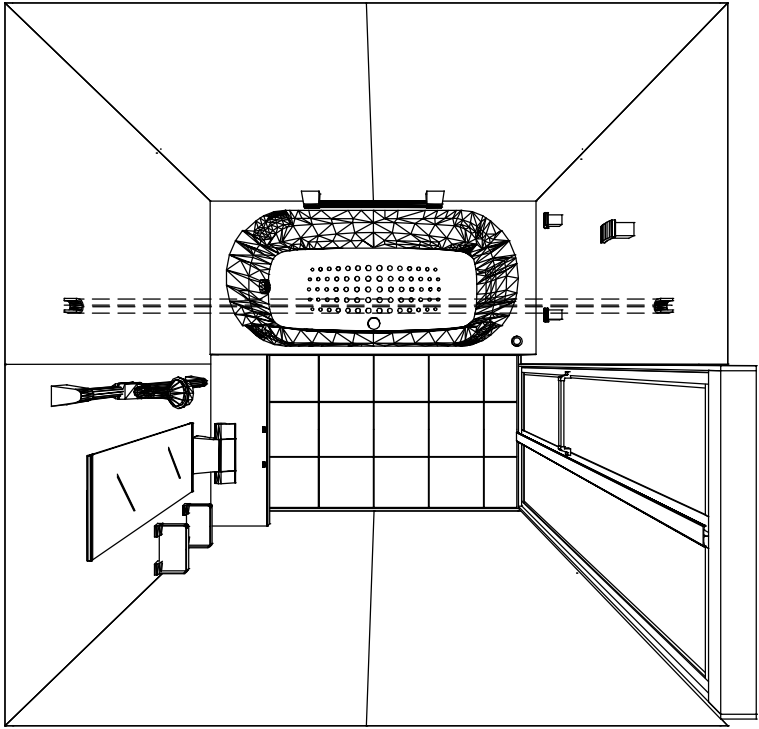

1616

キープグリーン浴槽<アクリル人造大理石>

高光沢フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：北陸-金沢SR 新SB7様邸		RELAGE レフージュ	姿図
	現場番号：A7961596		ファン番号：1600A-2004-0720T	作成日：2020年4月25日
	北陸支店 販売課		担当営業：	担当アドバイザー：2020.04
				縮尺：A3サイズ等倍

カウンター面



浴槽前面

浴槽側面

カウンター背面


※重要事項

※印寸法は給水給湯器の
突出寸法18mmを含みます。

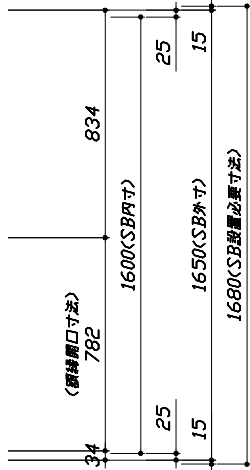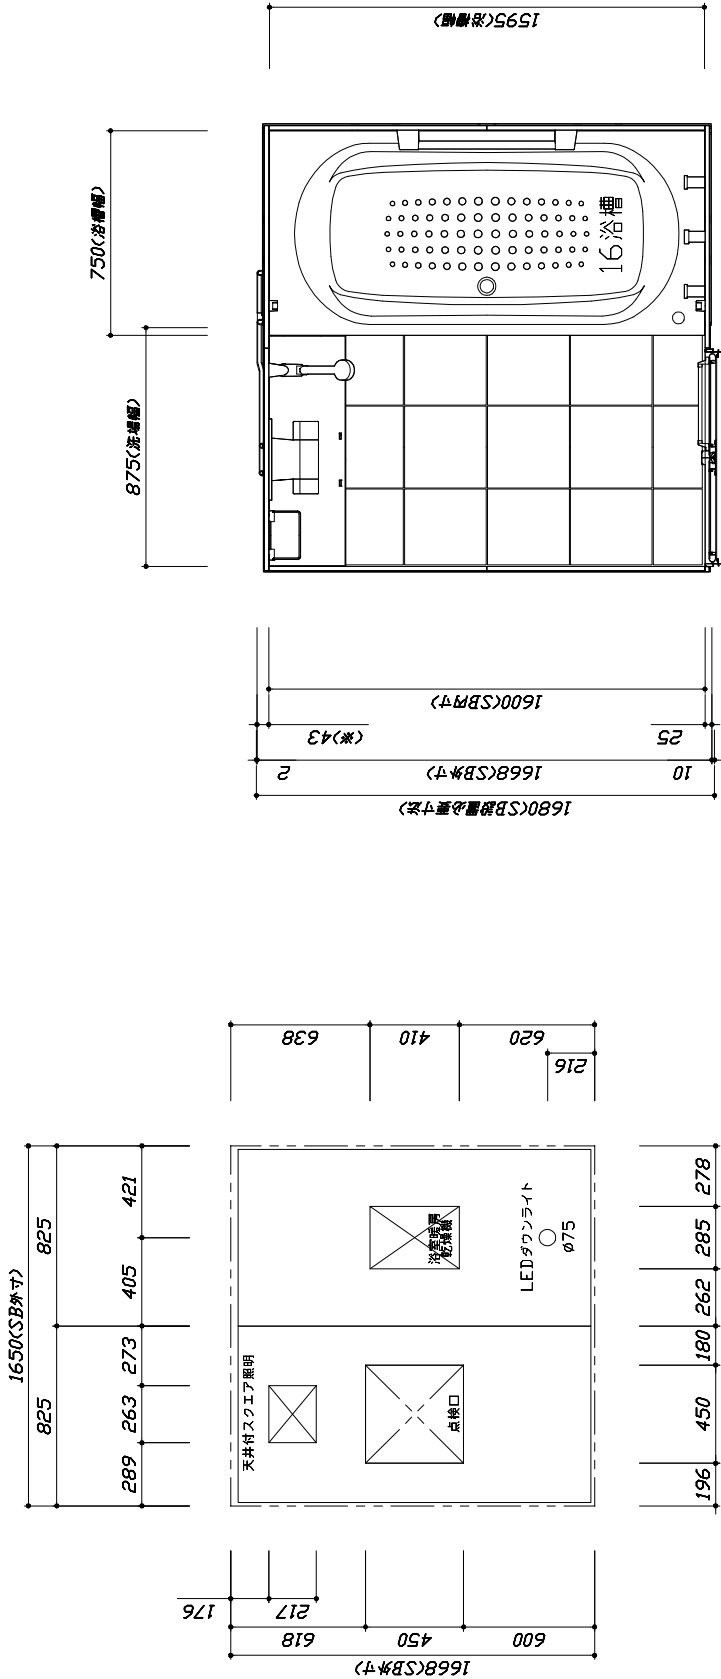

< 平面図 >





< 天井伏図 >

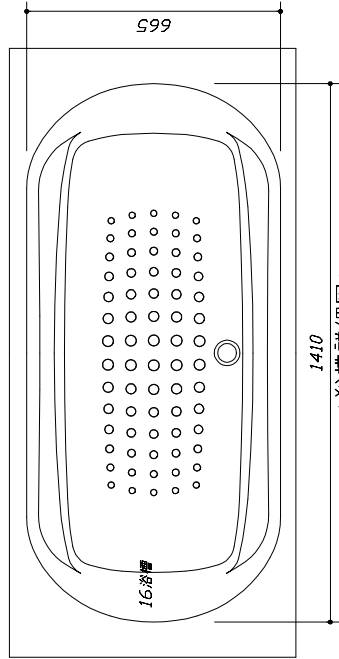

< 浴槽詳細図 >

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：北陸-金沢SR 新SB7様邸	RELAGE レラージュ	施工図1	縮 尺： 1:25,20
	現場番号：A7961596	プラン番号：1600A-2004-0720T	作成日：2020年4月25日	
	北陸支店 販売課	担当営業：	担当アドバイザー：2020.04	

縮尺：A3サイズ等倍

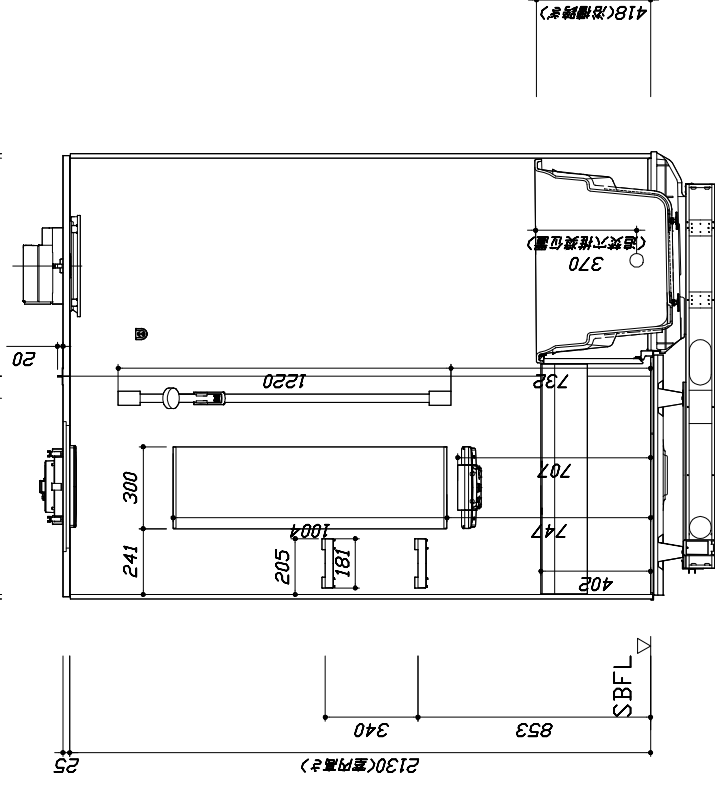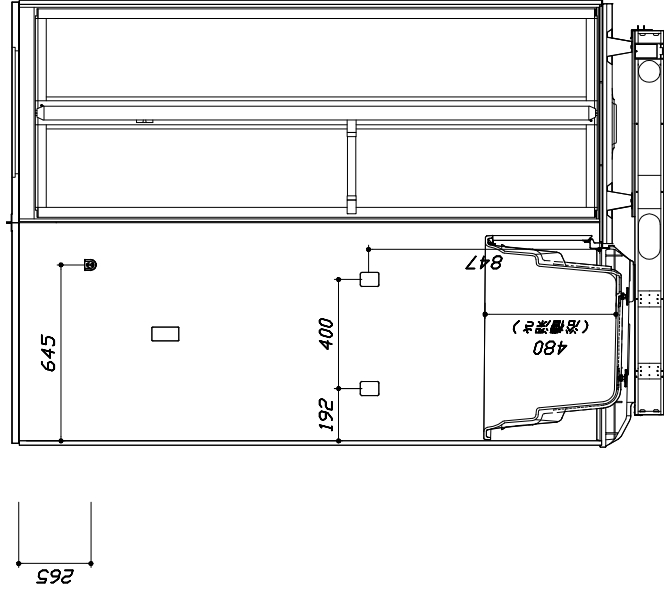


＜カウンタ－対面図＞

＜カウンタ－面図＞

Takara standard		現場名称：北陸-金沢SR 新SB7棟邸	RELAGE レラージュ	施工図2	縮 尺： 1:20
		現場番号： A7961596	プラン番号： 1600A-2004-0720T	作成日： 2020年4月25日	
タカラスタンダード株式会社		北陸支店 販売課	担当営業：	担当アドバイザー： 2020.04	


縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼書、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
・土間には床名産面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認をお願いします。
・外寸は突出部を含みます。
・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

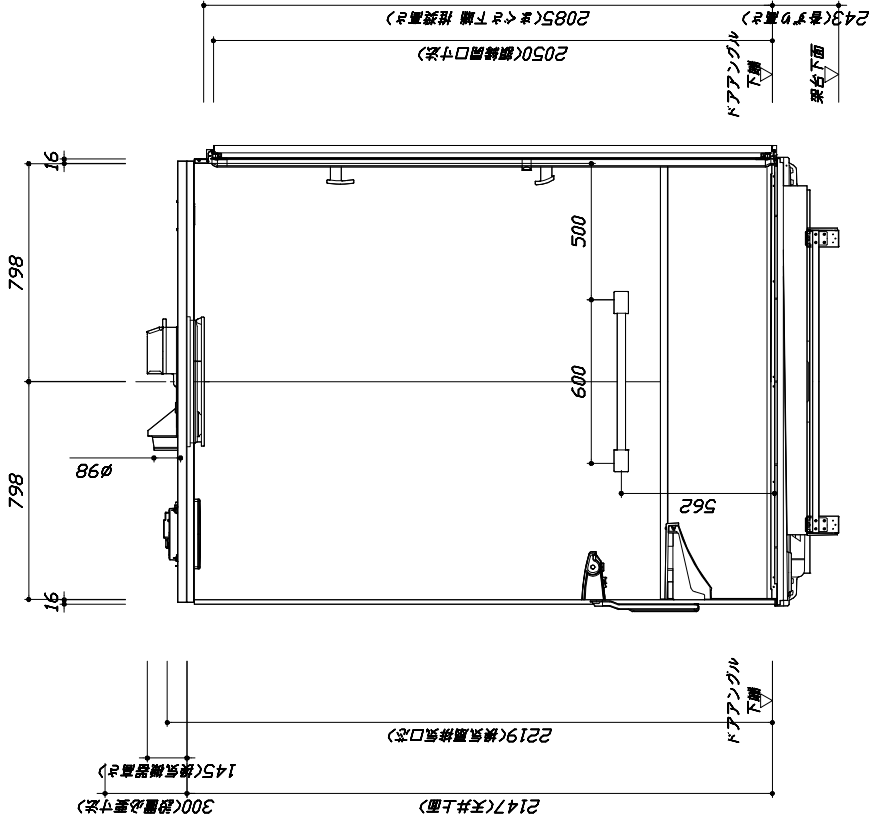

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

＜浴槽側面図＞

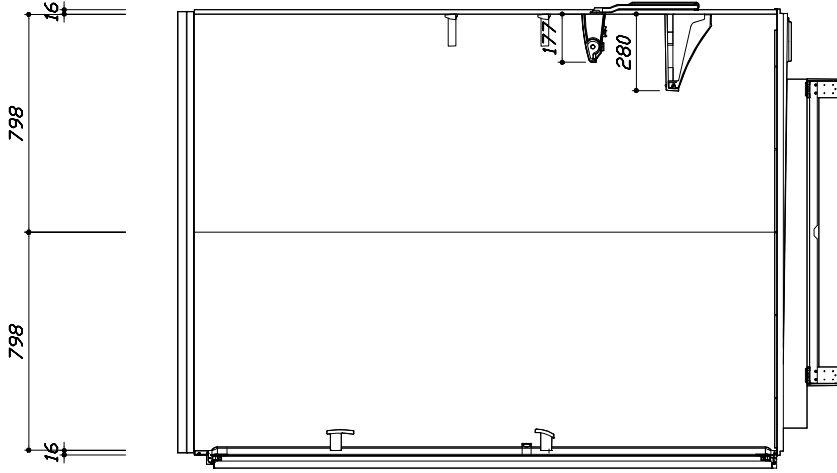

＜洗場側面図＞



本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	AL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーン浴槽フロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ラウンド浴槽（300リットル）追いつき穴：あり
浴槽パン	ガラス強化繊維樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンタ―	スクエアカウンタ―：アクリル人造大理石 カウンタ―下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：銅板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	高光沢グロス天井：高光沢パンドル（内部発泡樹脂）換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：20高さ折戸（7kg/框/樹脂ガラス）
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂、浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	300kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ロングクリアミラー くもり止め加工
収納棚	クリアタイプB：AS樹脂製（2段）
タオル掛け	－
洗場側水栓	リモコン付（リモコン仕様・SB181-5UTB1）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
スライドバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）シルバー
照明	天井付スクエア照明＋LEDダウンライト（LED 16W電球色）
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機（100V・最大消費電力1250W）（ダクト径φ98）（常時換気対応品）
フロフタ	組合せ式（アルミ複合板：2枚）
給水給湯管	銅管（10A）
循環金具	循環金具セットPLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	ステンレスタイプ I型600タイプ
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	W：シユガーホワイト
カウンタ―	W：シユガーホワイト
パネル(カウンター面)	HI：ブリックベージュ
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	PD：グランベージュ
ドア	W：ホワイト
収納棚	クリアタイプB
タオル掛け	－
ランドリセット	ホワイト



●雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVU50の配管を使用してください。

-  マス状に仕上げ
排水管（横引き管・エルボ）が
土間コンクリート上に露出しない高さで配管

●給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。

-
- 抽水機
- 一次配
- 排水路
- 図1 排水上げイメージ

■土間コンクリート仕上げ寸法

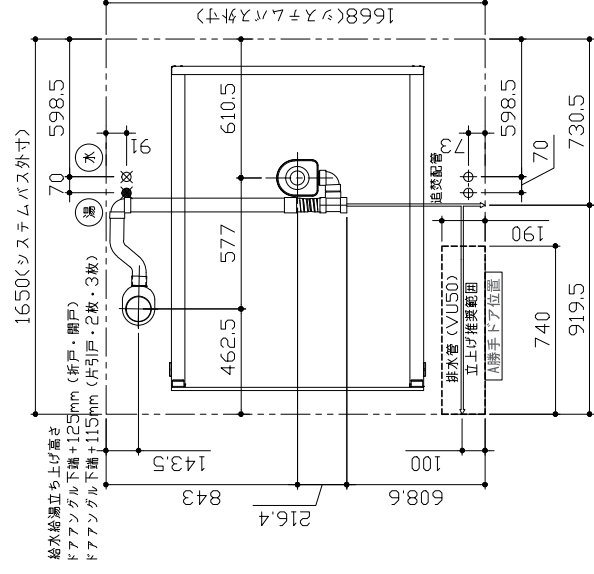

〈給湯管取合詳細図〉





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯・追焚配管を立上げるので注意してください。
 - ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
 - ・ドア部はSB外寸より突出します。
- 詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

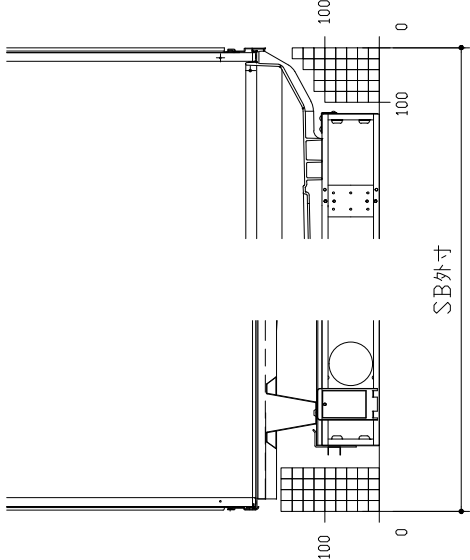


B矢視

A矢視

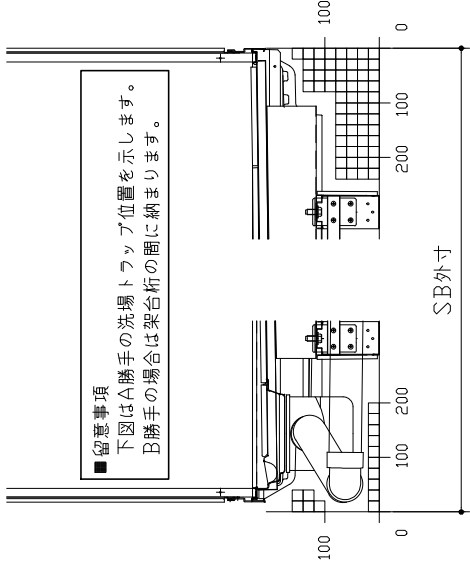

D矢視




C矢視

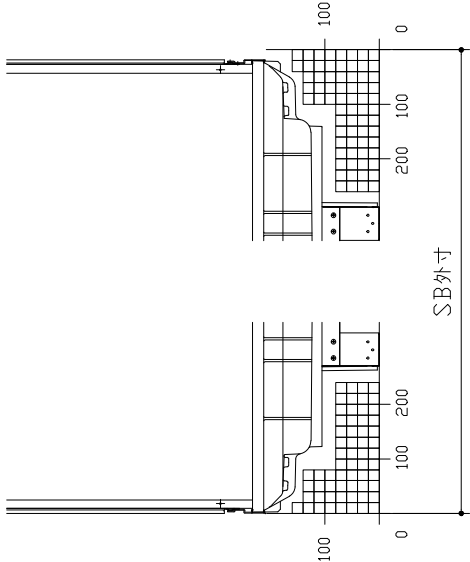

F矢視


E矢視

キーブックリーニングドア：折戸ホワイト（AWTオールド8）

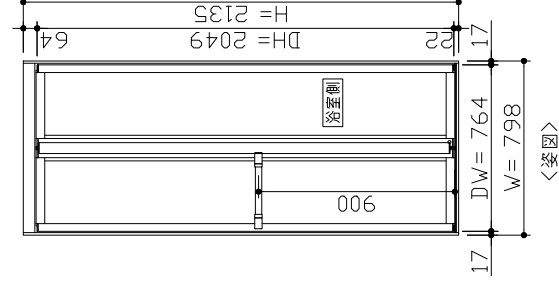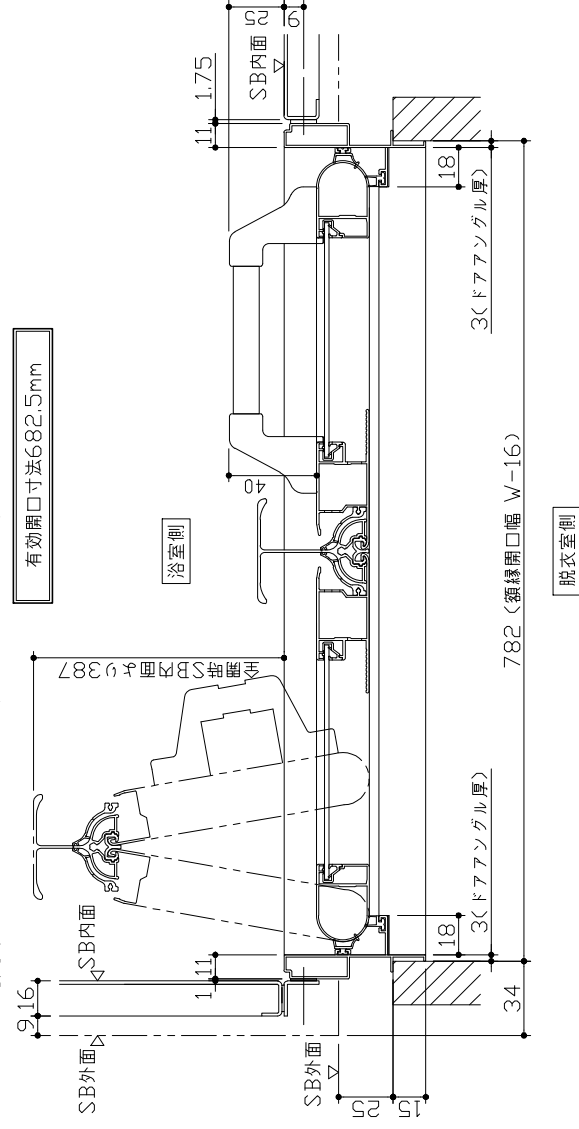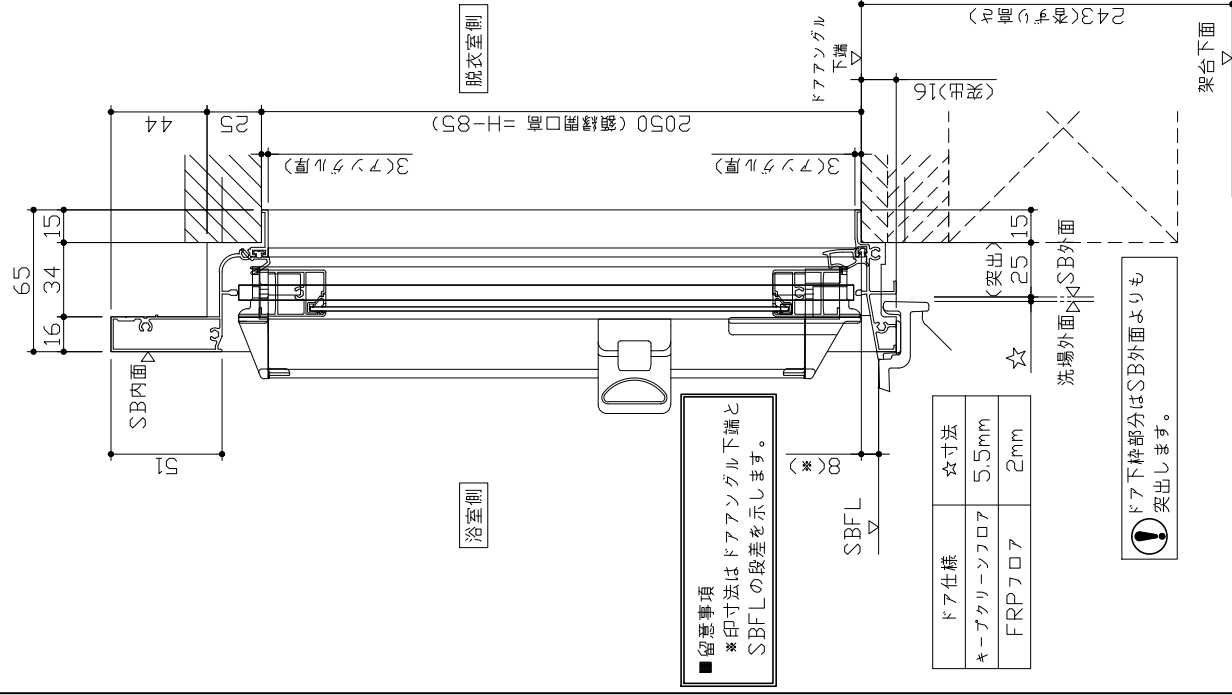

■ ドア横の管柱、間柱について


- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないように十分に考慮してください。
- ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。



ドア仕様	☆寸法
キープクリンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

 下枠部分はSB外面よりも
出っ張ります。

Takara standard		
タカラスタンダード株式会社		
現場名称：北陸-金沢SR 新SB7嶺邸	RELA GE レラージュ	ド7取合詳細図
現場番号：A7961596	プラン番号：1600A-2004-0720T	作成日：2020年4月25日
北陸支店 販売課	担当営業：	担当アドバイザー：2020.04


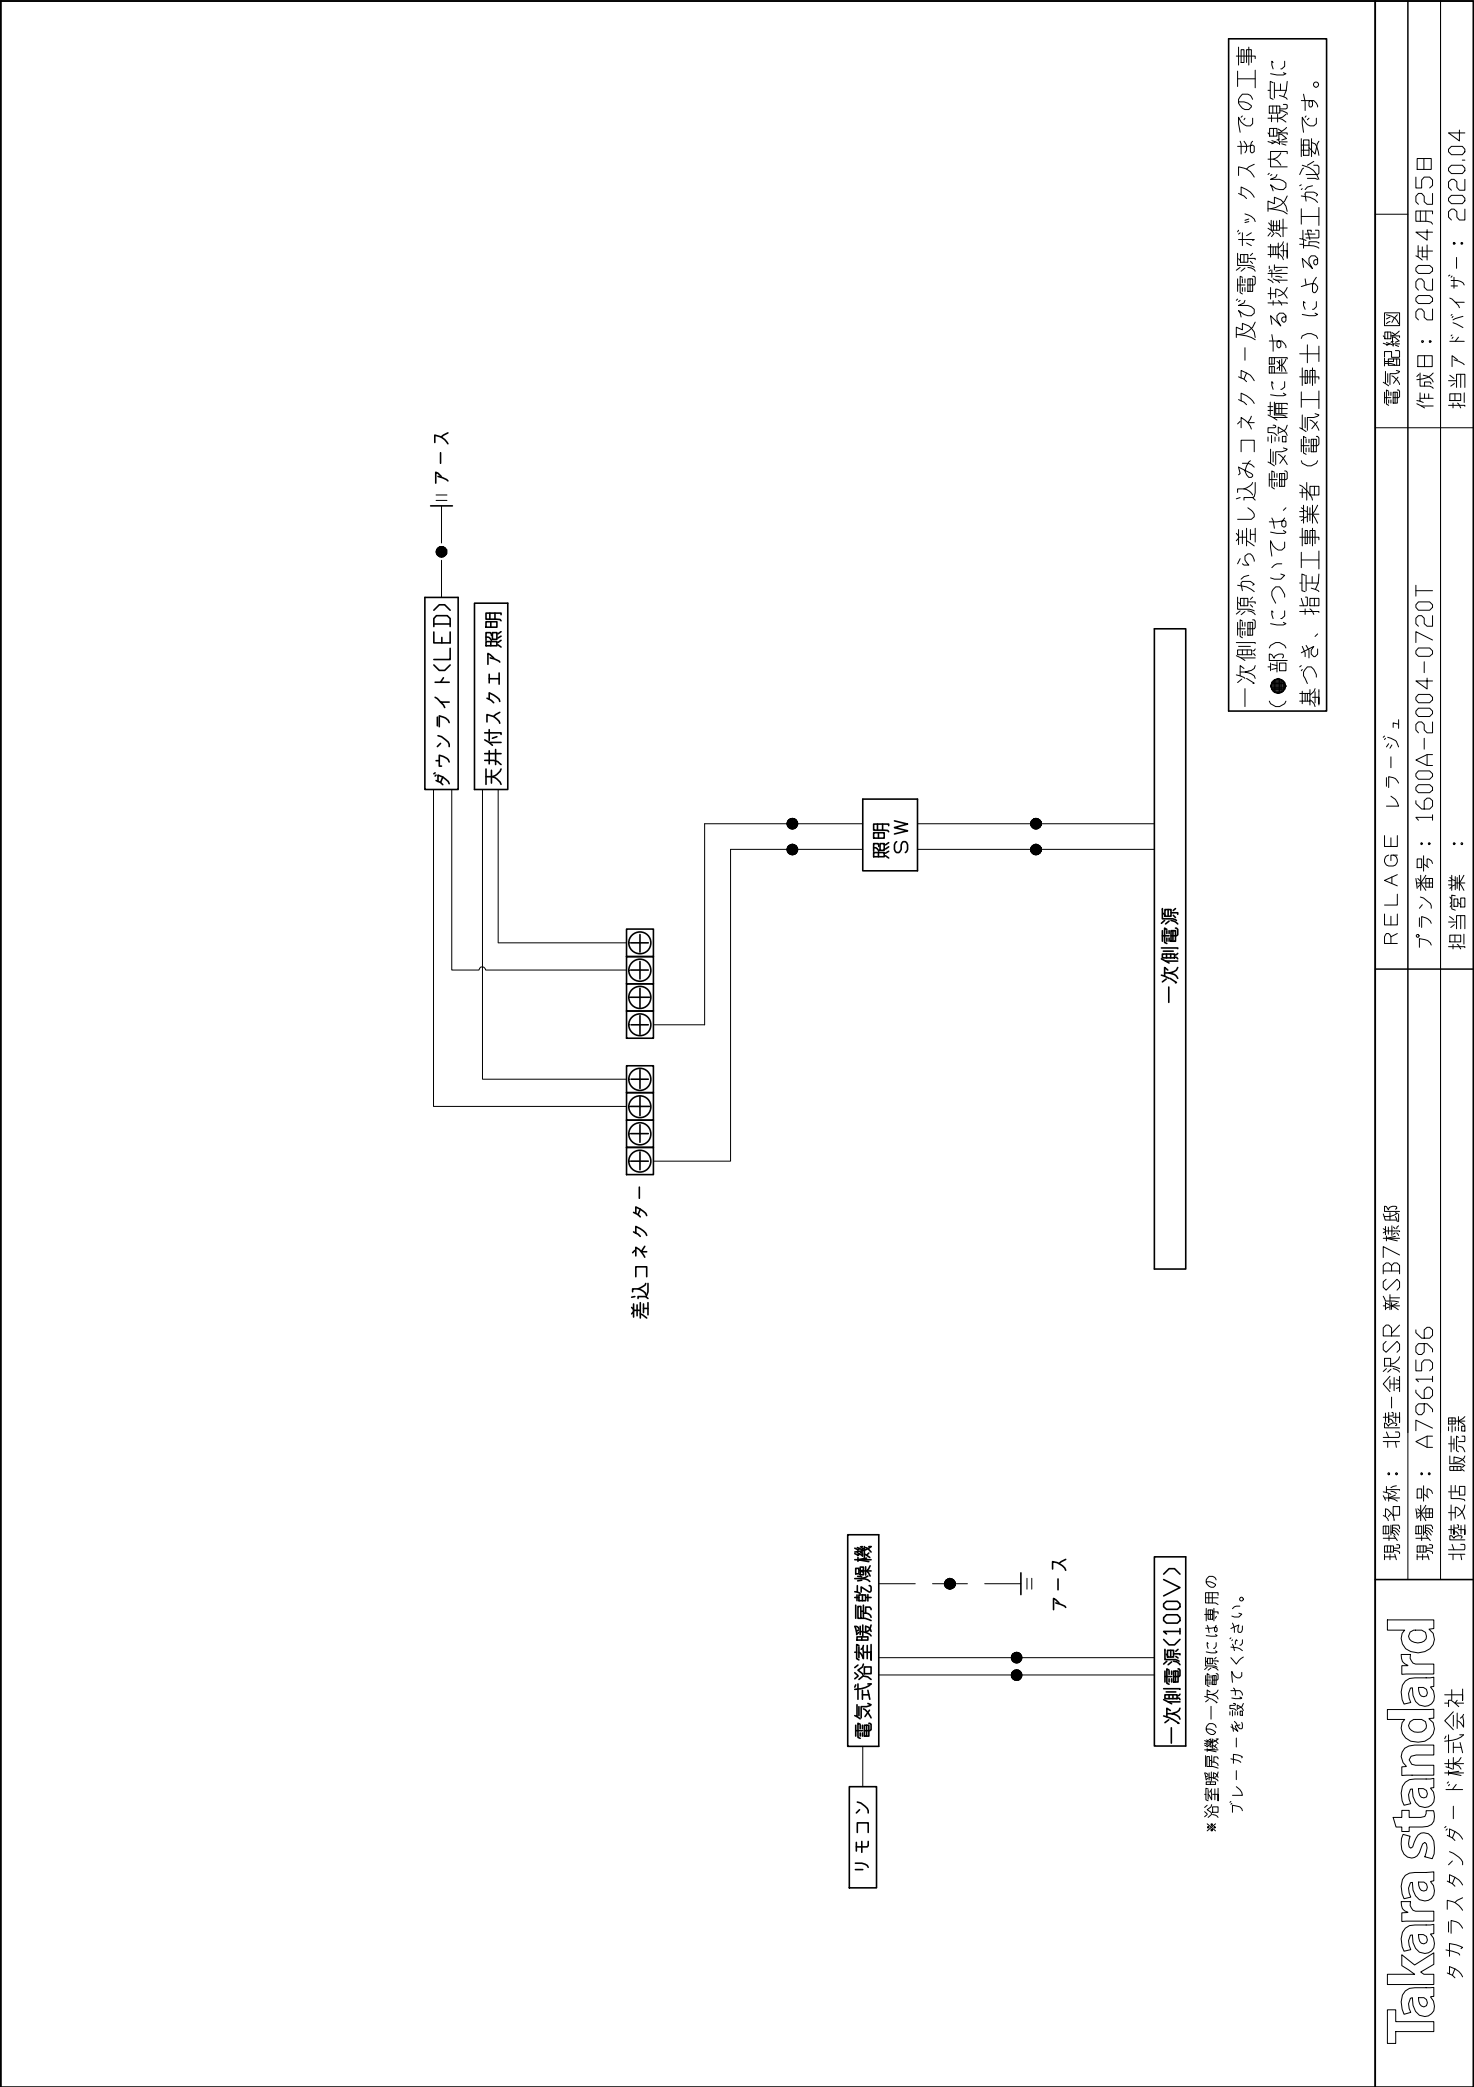


浴槽

洗い場用水栓




照明

SB 奥行寸法	浴槽奥行寸法	
	L	B
1568	1495	42.5
1593	1520	55
1618	1545	67.5
1643	1570	80
1668	1595	92.5
1693		
1718		
1743		
1768	1620	105
1793		
1818		
1843		
1868		

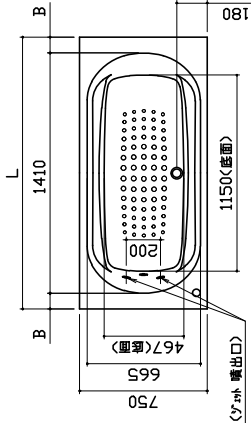


換気機器

リモコンコード長さ：5m
外形：縦120mm×横116mm

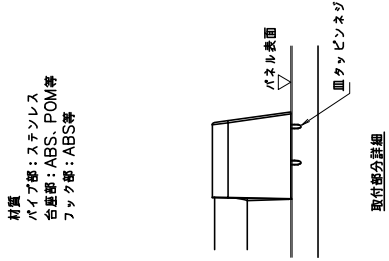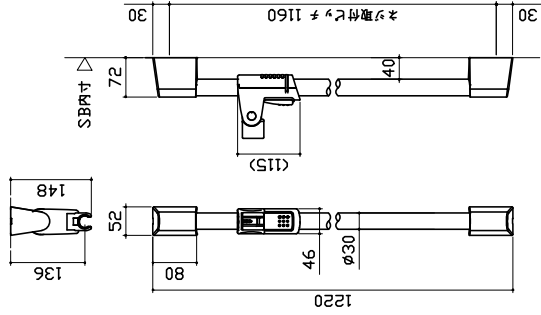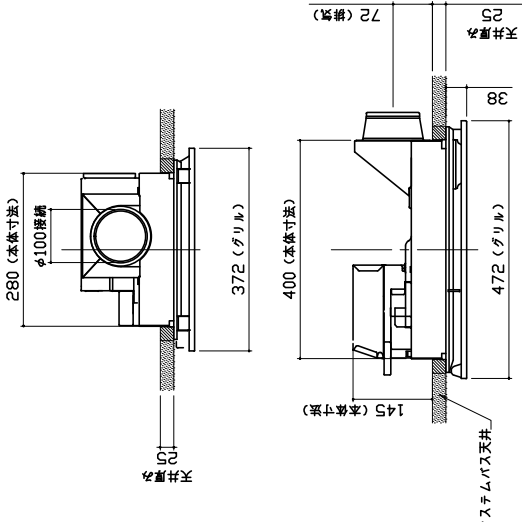

枠：SUS304 t0.8
ミラー：表面防曇コートあり（ロングクリアミラー-A）
表面防曇コートなし（ロングミラー-A）

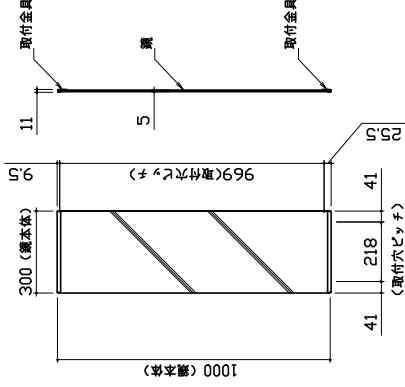

収納棚 ハンドバー 支持部取合詳細図 循環金具・フロアダプタ関連	本体：AS Top view dimensions: 181 (width), 115 (depth). Side view dimensions: 155 (total height), 150 (shelf height), 13 (gap), 28 (bar height), 40 (bar width), 6 (top flange). Text: 取付穴からラケット天面まで (From mounting hole to racket top surface). Dimensions: 788 (total length), 72 (bar length), 30 (flange), 33 (gap), 40 (bar width), 55 (base width), 4 (hole offset), 14 (hole diameter). Labels: キャップ (Cap), 握りバー (Grip bar), パネル裏面 (Back of panel), 皿タッピンネジ (Plate tapping screw). Components: 鋼管アダプタ (Steel pipe adapter), 15Aタケノコ仕様 (15A bamboo style), ハイブリッドインホース (Hybrid in-hose). Dimension: 2700 (length). Label: 通気配管立上図 (Ventilation pipe stand-up diagram).	風呂蓋 7077MVA-16Y 洗い場側排水トラップ 浴槽側排水トラップ	Dimensions: 730 (width), 717 (height), 1434 (length). Dimensions: 3.3 (thickness), 4.3 (flange), 13.4 (total height), 5 (top flange), 10 (hole diameter). Label: 断面図 (Cross-section diagram). Dimensions: 71 (width), 100.5 (length), 122 (total length), 145 (height), 12.9 (gap), 61.7 (hole offset), 51.1 (hole diameter), 40 (flange), 81 (total height), 41 (top flange), 1.15 (gap). Dimensions: 90 (width), 90 (length), 17 (gap), 68 (hole offset), 122 (total length), 10.5 (gap), 50.5 (hole offset), 24.5 (flange), 36.5 (total height), 1.17 (gap), 60 (top flange), 142 (hole diameter).	Takara standard タカラスタンダード株式会社 RELAGE レラージュ 現場名称：北陸-金沢SR 新SB7様邸 部材詳細図 2/2 現場番号：A7961596 プラン番号：1600A-2004-0720T 作成日：2020年4月25日 北陸支店 販売課 担当営業： 担当アドバイザー：2020.04
--	---	---	--	--

パネル割図	ミラー	収納棚
パズUHK 16C2J L HI パズUHK 16C1 パズUHK 16NWN W パズUHK 16NWN W パズUHK 16AD W パズUAK 16A M パズUAK 16A M AL勝手	パズUHK 16C2J L HI	パズUHK 16C2J L HI
シャワーフックスライドバー	ランドリ-パイプ	風呂蓋収納
パズUHK 16C2J L HI	パズUHK 16AD W パズUHK 16C1 HI	パズUHK 16AD W ■留意事項 ツヨルカラー・ハンドバーなどの平歩がないか確認のうえ、穴加工してください。
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称：北陸—金沢SR 新SB7様邸 現場番号：A7961596 北陸支店 販売課
RELAGE レラージュ プラン番号：1600A-2004-0720T 担当営業：		穴開け指示図 1/1 作成日：2020年4月25日 担当アドバイザー：2020.04
