

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 千葉-成田SR SB6 様

業者 様

商品名 PREDENCIA プレデンシア

作成日 2019年11月13日
 プラン番号 5217G-1903-0659T
 現場番号 A4267419

タカスタンダード株式会社
 ◆成田営業所
 千葉県成田市美郷台2丁目1番1号
 TEL 0476-23-6922 / FAX 0476-23-6925

◆成田ショールーム
 TEL 0476-23-6969 / FAX 0476-23-6926

商品
 御見積金額 ￥1,038,600 (税込 ￥1,142,460)
 ()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥159,000 (税込 ￥174,900)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616 (AR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア(ハイクラス)
浴槽材質	鋳物ホーロー
カラー	シルキーベージュ
形状	ラウンド浴槽
浴槽・風呂フタ	高断熱仕様
カウンター材質	アクリル人造大理石
カラー	ミストベージュ
エプロン材質	ステンレス(カラーコーティング)
カラー	ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
カラー	ウォルナットグレージュ
ガス種	未定
周波数	50Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

No.プレ16 *

御名前 千葉-成田SR SB6

様

現場番号	A4267419	プラン番号	5217G-1903-0659T	作成日	2019/11/13
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1616サイズ		1	1,038,000	1,038,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	キープクリーンドア:折戸<800mm幅>(ホワイ特)(19サイズ)	1		
4	洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームベージュ)	1		
5	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)	1		
6	排水口カバー	ステンレス	1		
7	浴槽追炊き穴	あり	1		
8	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)	1		
9	浴槽形状	16ラウンド浴槽	1		
10	ヘルシージェット	なし	1		
11	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1		
12	ガス温水式床暖房	なし	1		
13	洗い場用水栓	棚付サーモ水栓(メタルホース)KF9152 水栓上部カウンター(ベージュ)	1		
14	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド	1		
15	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
16	カウンター	人大スクエアカウンター	1		
17	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(TN-116)	1		
18	浴室パネル	ハイクラス(一面デザイン)	1		
19	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
20	天井	高光沢フラット天井	1		
21	換気機器	天井換気扇	1		
22	換気機器開口	現場開口	1		
23	照明	ダウンライト照明(3灯)(電球色)	1	-8,000	-8,000
24	天井照明開口	工場開口	1		
25	ミラー	横長クリアミラー	1	-1,500	-1,500
26	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
27	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-4,000	-4,000
28	収納棚	クリアタイプ(2段)	1	-4,000	-4,000
29	どこでもラック	タオルハンガーL(ホワイ特)	1	+2,800	+2,800
30	どこでもラック	小物置きS+フック(ホワイ特)	1	+2,800	+2,800
31	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500

御名前 千葉-成田SR SB6 様

現場番号	A4267419	プラン番号	5217G-1903-0659T	作成日	2019/11/13
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
33	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			33		¥1,038,600

商品総合計	33	¥1,038,600
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥159,000 (税込 ¥174,900)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

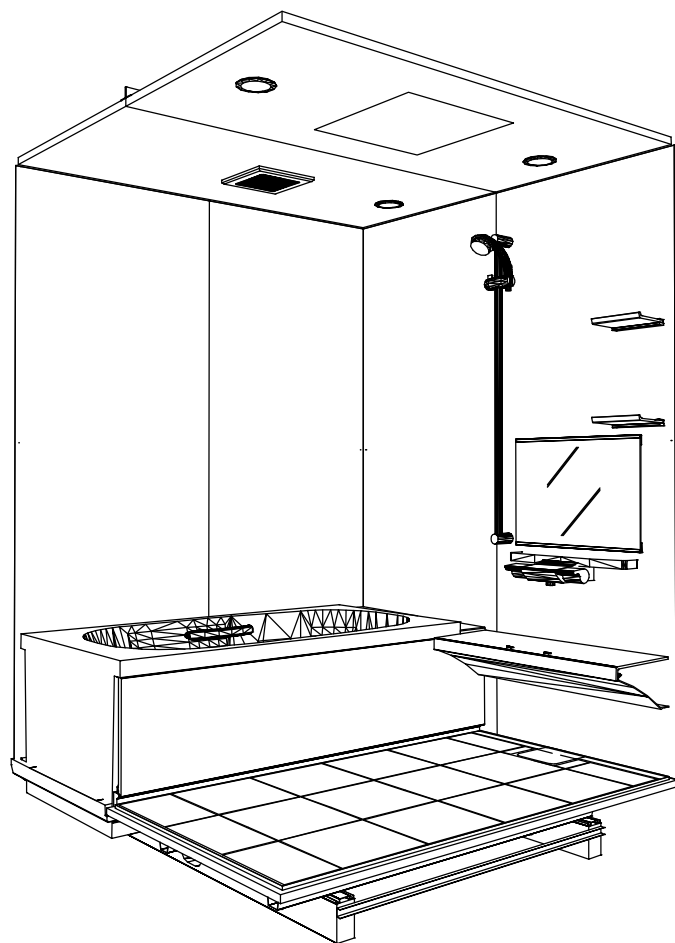


鳥瞰図

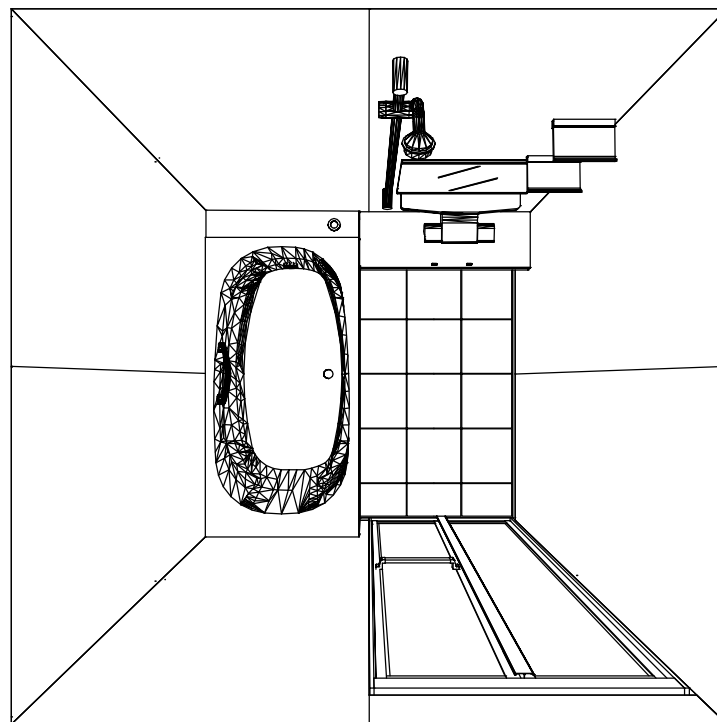


1616

鑄物ホーロー浴槽
高光沢フラット天井
天井換気扇


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。





■留意事項
*印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。

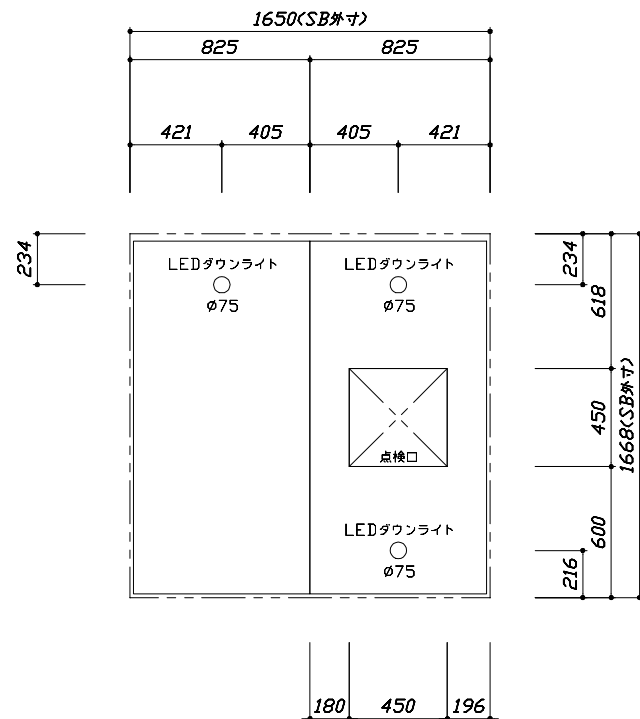

< 天井伏図 >

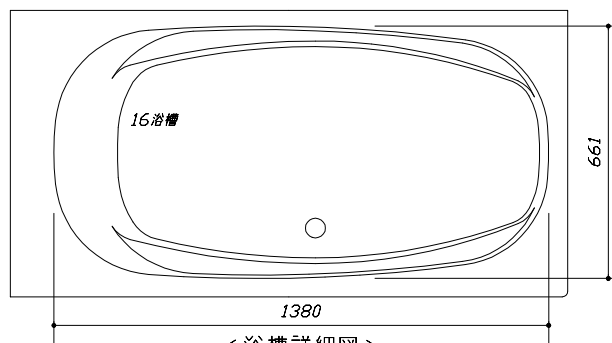

< 浴槽詳細図 >

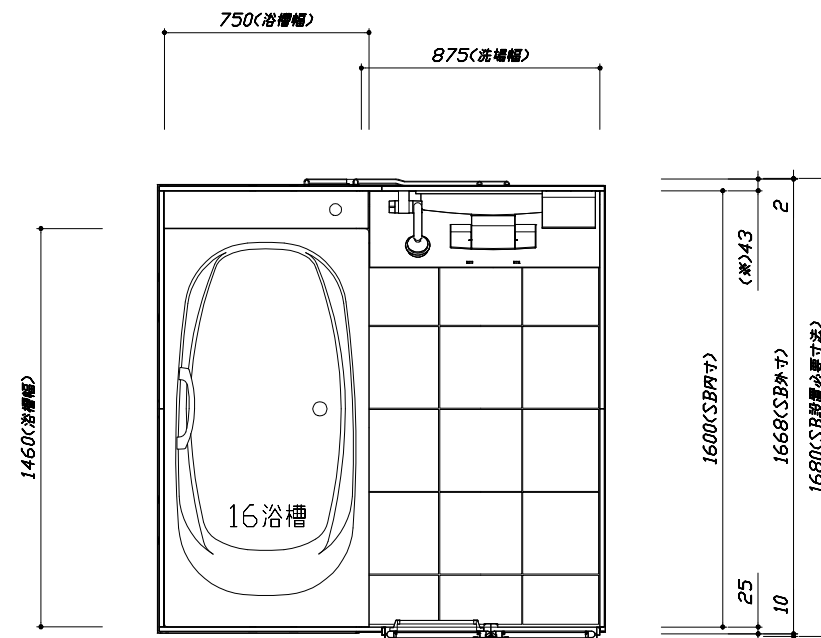

< 平面図 >

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 千葉-成田SR SB6様邸
現場番号： A4267419
成田営業所



PREDENCIA プレデンスシア
プラン番号： 5217G-1903-0659T
担当営業：

施工図1 縮尺： 1:25,20
作成日： 2019年11月13日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行き・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

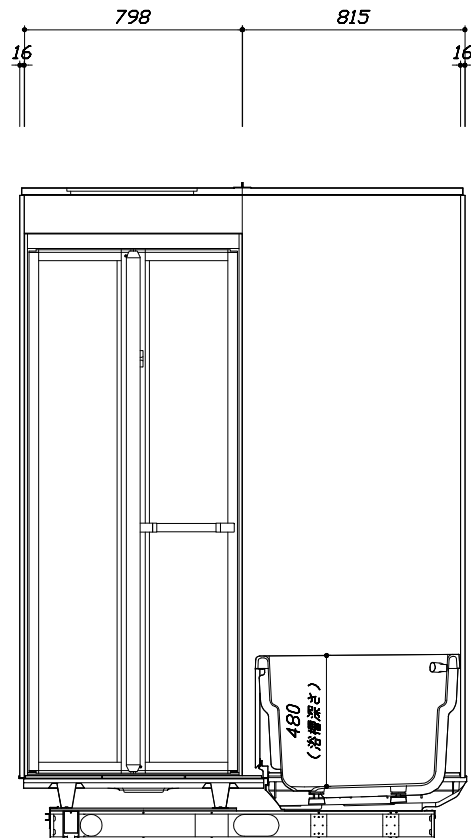

<カウンター対面図>

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

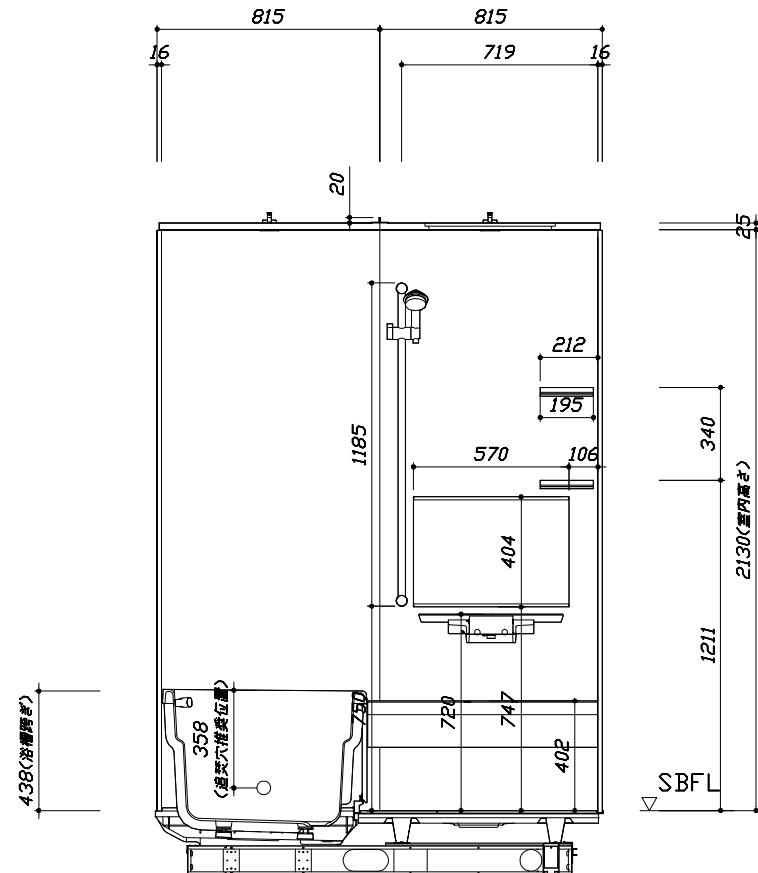

<カウンター面図>

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 千葉一成田SR SB6様邸
現場番号： A4267419
成田営業所



PREDENCIA プレデンスシア
プラン番号： 5217G-1903-0659T
担当営業：

施工図2 縮尺： 1:20
作成日： 2019年11月13日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。

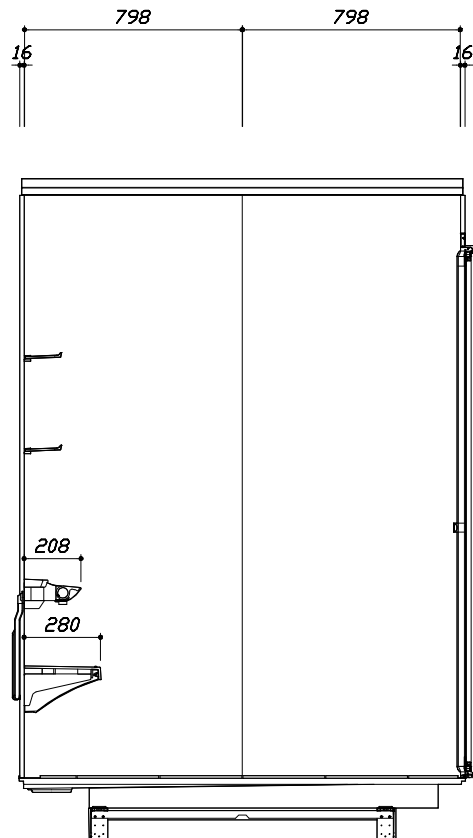

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

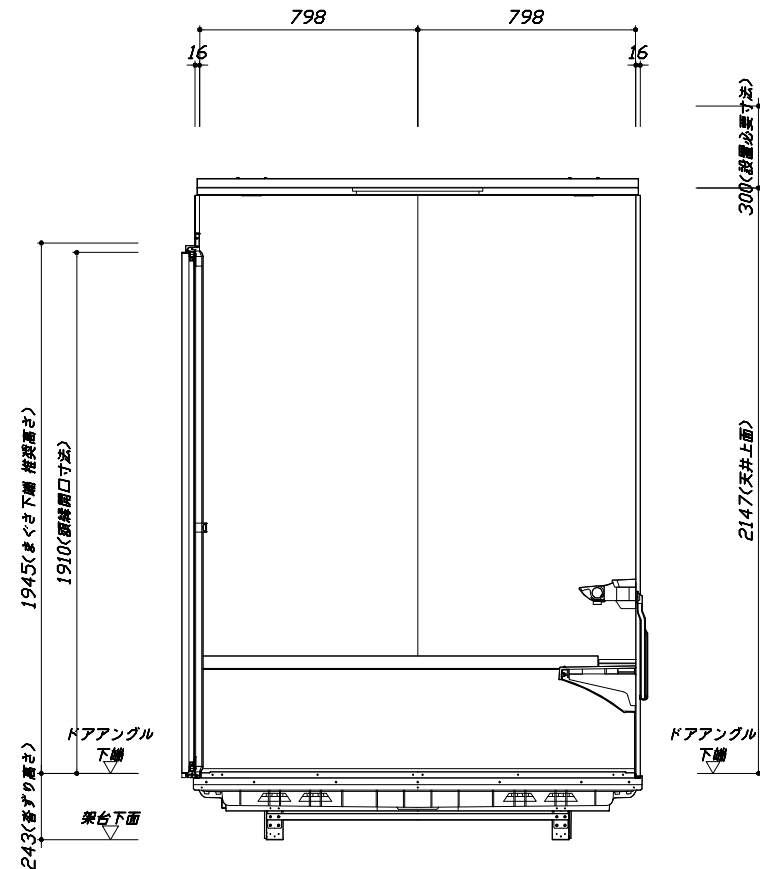

< 浴槽側面図 >

Takara standard
タカラストンダード株式会社

現場名称： 千葉ー成田SR SB6様邸
現場番号： A4267419
成田営業所


PREDENCIA プレデンスシア
プラン番号： 5217G-1903-0659T
担当営業：

施工図3
縮 尺： 1:20
作成日： 2019年11月13日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

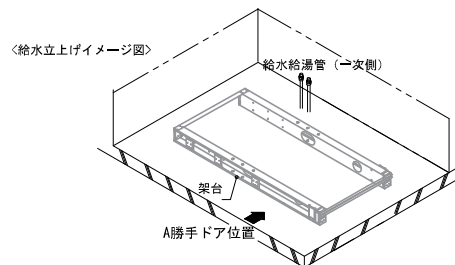

■ 土間コンクリート仕上げ寸法




ドアングル下端より 265mm 下がりて打設してください。

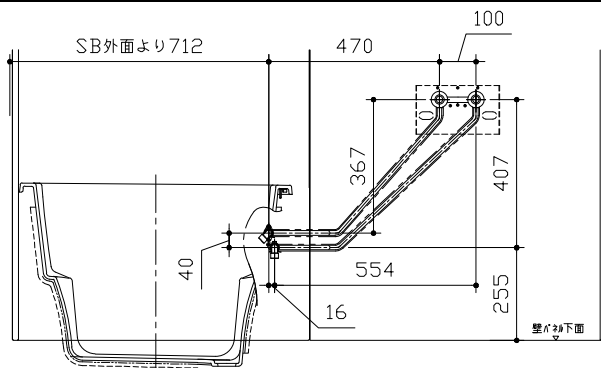

＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置

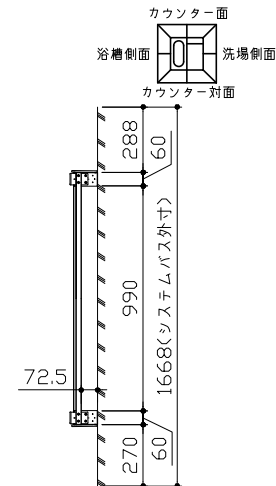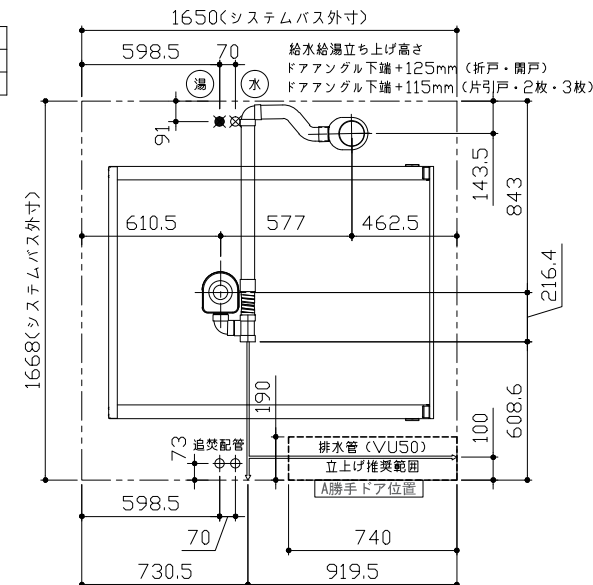

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

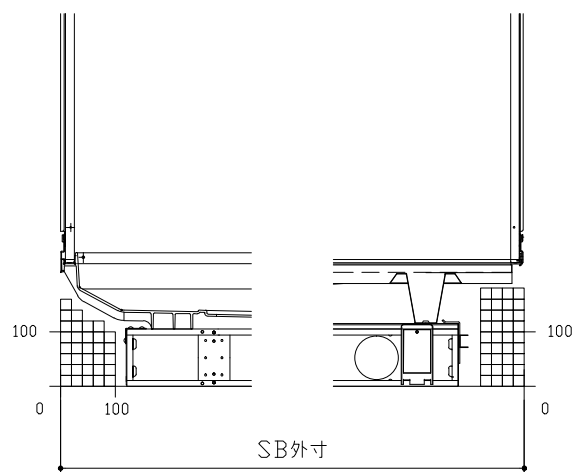


A矢視

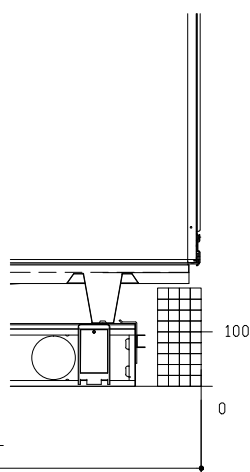


B矢視

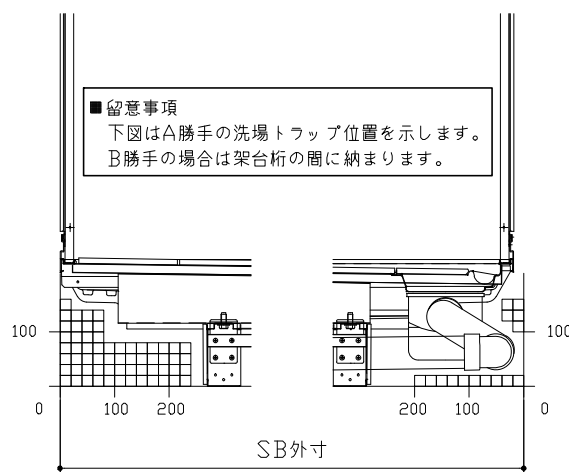


C矢視

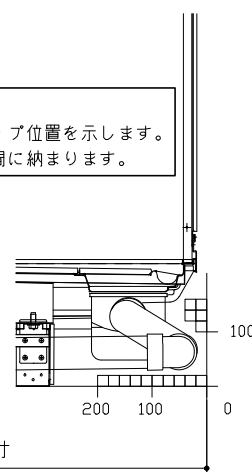

D矢視



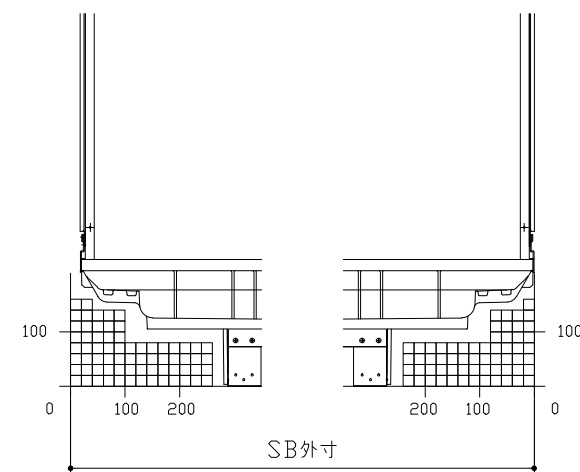


E矢視

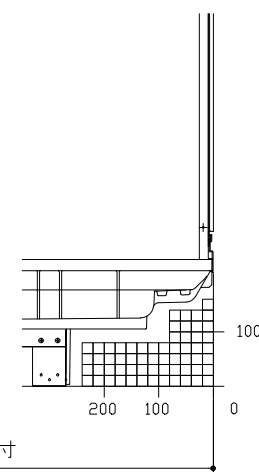


F矢視


キープクリーンドア：折戸ホワイト（AWTオレド®8）

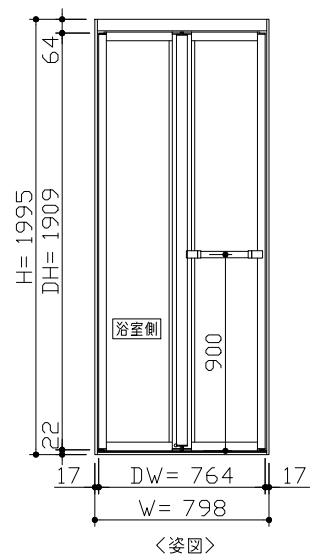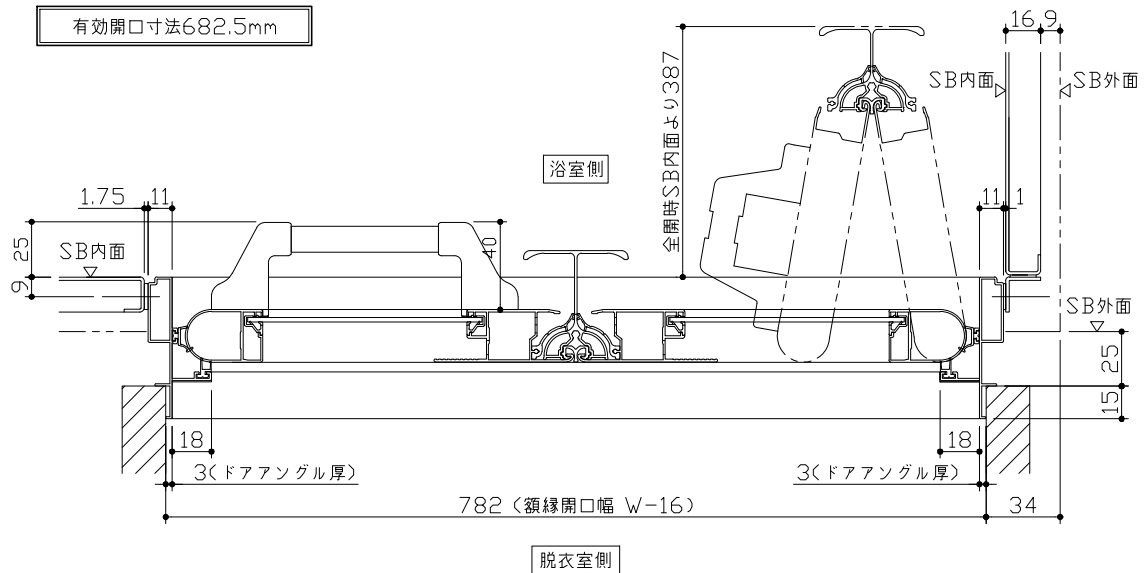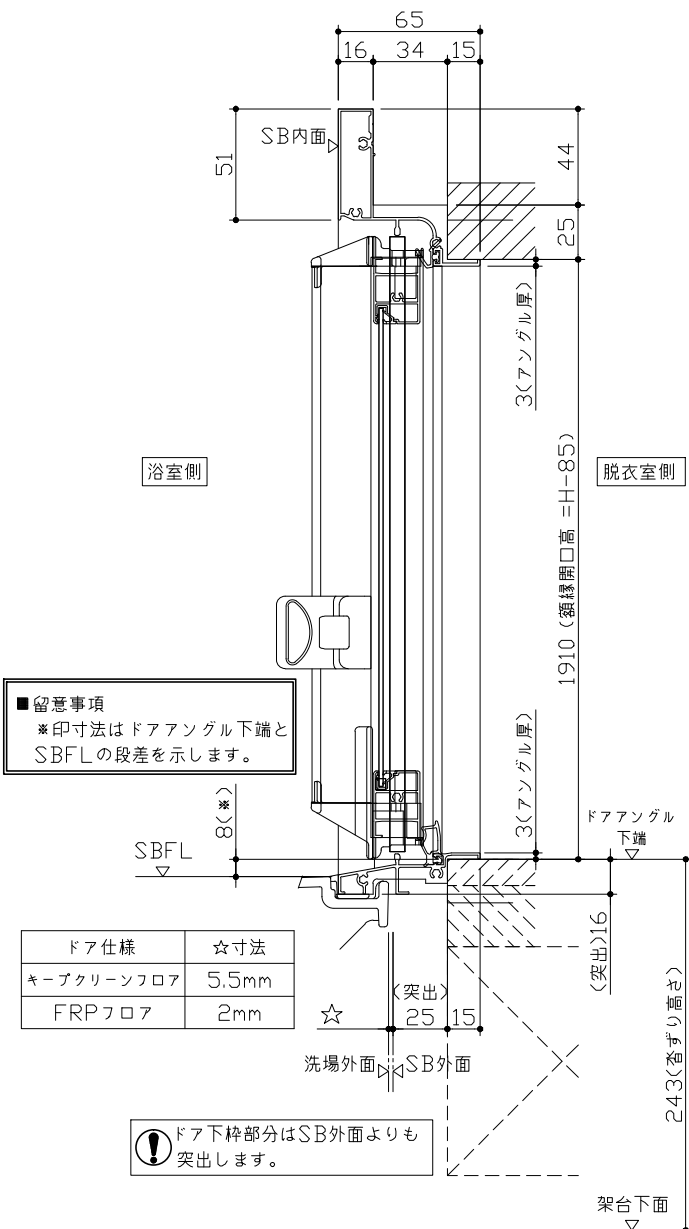






- ・ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- ・躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



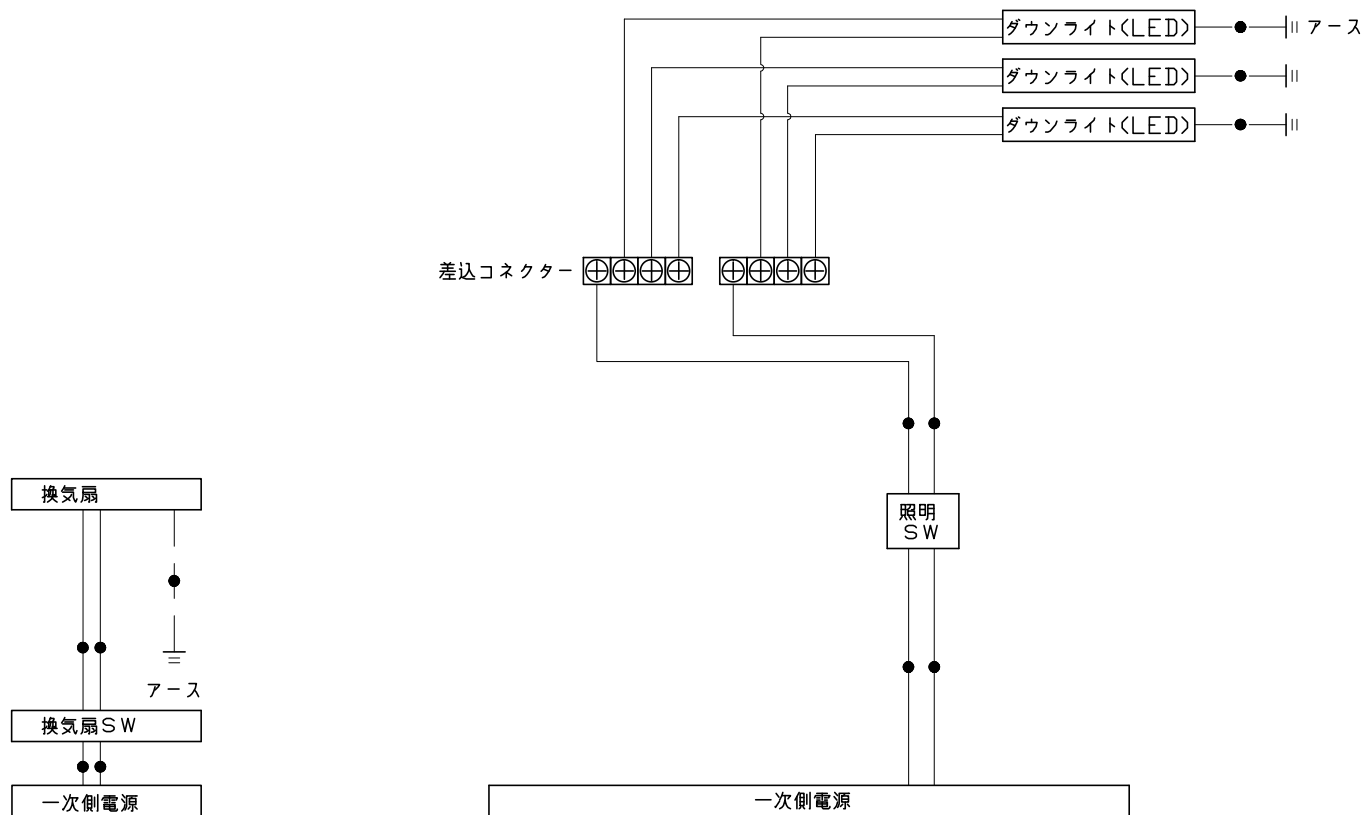

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

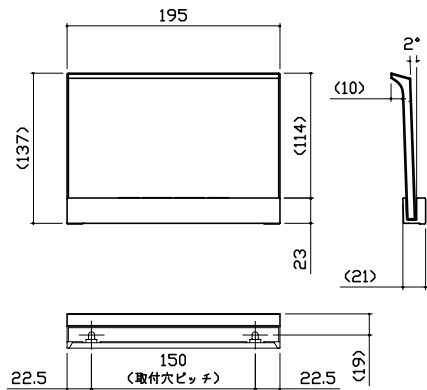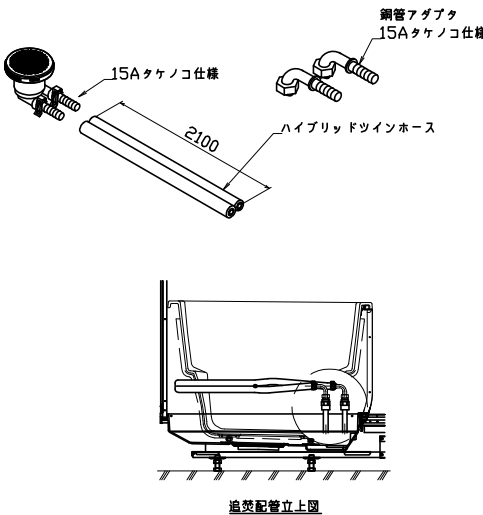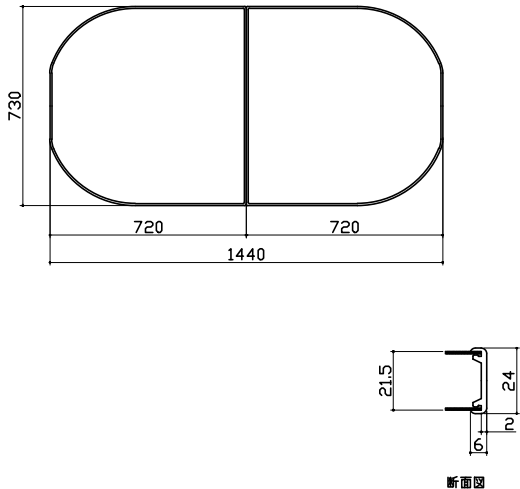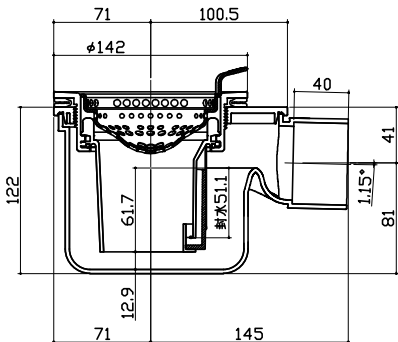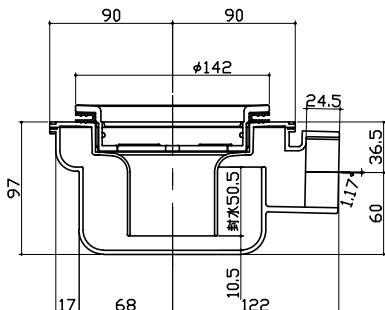収納棚 本体：PMMA 	循環金具・フロアダプタ関連 	風呂蓋 7079MDH-16YK 	
洗い場側排水トラップ 	浴槽側排水トラップ 		
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：千葉-成田SR SB6様邸 現場番号：A4267419 成田営業所	PREDENCIA プレデンスシア プラン番号：5217G-1903-0659T 担当営業：	部材詳細図 2/2 作成日：2019年11月13日 担当アドバイザー：

パネル割図	ミラー	収納棚
パネUHK 16C1 YG パネUHK 16C2J R YG パネUHK 16NWN W パネUAK 16A M W パネUHK 16NWN W パネUAK 16A M W パネUHK 16AD W AR勝手	パネUHK 16C2J R YG 815 652 408 164 780 1149 現地加工：φ3.5	パネUHK 16C2J R YG 815 205 55 1540 1200 現地加工：φ3.5
シャワーフックスライドバー		
パネUHK 16C2J R YG 815 80 1930 770 現地加工：φ3.5		

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 千葉ー成田SR SB6様邸	PRE DENC I A プレデンスシア	穴開け指示図	1/1
	現場番号： A4267419	プラン番号： 5217G-1903-0659T	作成日： 2019年11月13日	
	成田営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	
