

システムバス 御見積書

御名前 東京-新立川 SB9 様

業者 様

商品名 伸びの美浴室

作成日 2020年4月7日
プラン番号 1404G-2004-0056T
現場番号 C0354751

タカラスタンダード株式会社
立川営業所
東京都立川市幸町1-26-2
TEL 042-537-0770 / FAX 042-537-0791

立川ショールーム
TEL 042-537-0811 / FAX 042-537-0805

商品御見積金額 **¥450,300 (税込 ¥495,330)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 ¥90,000 (税込 ¥99,000)

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
小柳	若林	若林

備考

展示入替用TOP作成 H20.04.07

御見積仕様

(システムバス)

ユニットサイズ	1216(AL勝手)
洗い場仕様	ガラス繊維強化樹脂<FRP>
浴槽材質	FRP
カラー	ホワイト
形状	セミスクエア浴槽
カウンター材質	樹脂
カラー	チャコールグレー
エプロン材質	樹脂
カラー	ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
カラー	マーブルホワイト
ガス種	13A
周波数	50Hz

御確認事項

現場の状況により、別途商品搬入費が発生する場合がございます。

御見積りの商品は受注生産品の為、納期は約2週間から3週間程度頂きます。

商品の仕様/価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には弊社支店営業所等へお問合せ、又はカタログにてよく御確認下さるようお願い致します。

この御見積書の有効期間は30日間です。

--	--

No.*

御名前 東京-新立川 SB9

様

現場番号	C0354751	プラン番号	1404G-2004-0056T	作成日	2020/4/7
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	伸びの美浴室Pタイプ 1216サイズ		1	401,000	401,000
2	架台	低床タイプ ボルト脚架台	1		
3	ドア	キーブクリーンドア:折戸<800mm幅>(ホワイト)(19サイズ)	1		
4	洗い場	FRP洗い場(ホワイトグレー)	1		
5	浴槽	FRP	1		
6	エプロン	保温材なし	1		
7	浴槽形状	セミスクエア浴槽	1		
8	循環金具水受けトレイセット	なし	1		
9	浴槽追い焚き穴	あり	1		
10	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
11	浴槽パン	あり	1		
12	洗い場用水栓	サーモ水栓(樹脂ホース)KF9032S	1		
13	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド	1		
14	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
15	カウンター	スリムカウンター	1	-1,500	-1,500
16	シャワーフック/スライドバー	シャワーフック	1		
17	浴室パネル	ハイクラス(一面デザイン)(Kタイプ)	1	+15,000	+15,000
18	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
19	天井	フラット天井	1		
20	換気機器	天井換気扇	1		
21	換気機器開口	工場開口	1		
22	照明	天井付ミニ照明<昼白色>	1		
23	天井照明開口	工場開口	1		
24	ミラー	ショートミラー(フック固定)	1	+5,500	+5,500
25	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1	+9,400	+9,400
26	タオル掛け	タオル掛けなし	1		
27	収納棚	収納棚なし	1		
28	どこでもラック	シャンプーフック(チャコールグレー)	1	+2,100	+2,100
29	どこでもラック	タオルハンガーS(チャコールグレー)	1	+1,300	+1,300
30	風呂フタフック	あり(チャコールグレー)	1	+5,000	+5,000
31	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500

御名前 東京-新立川 SB9 様

現場番号	C0354751	プラン番号	1404G-2004-0056T	作成日	2020/4/7
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
33	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			33		¥450,300
商品総合計			33		¥450,300

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥90,000 (税込 ¥99,000)


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。

パース

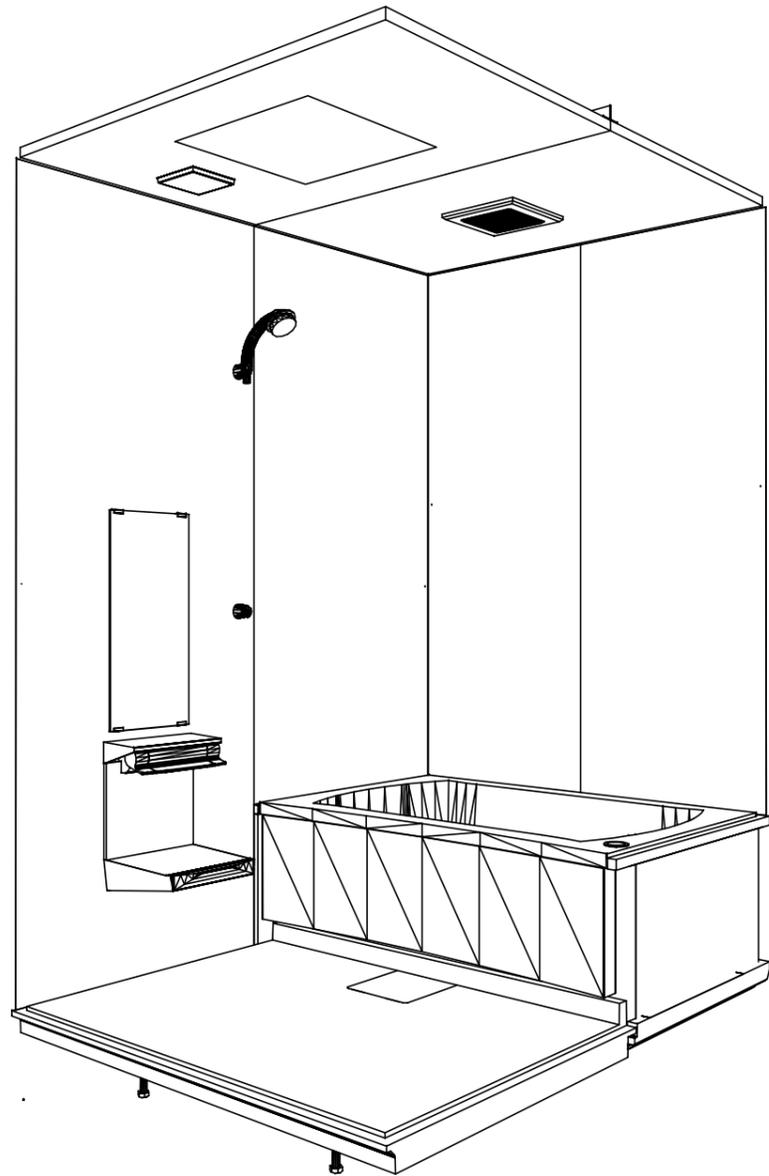

鳥瞰図

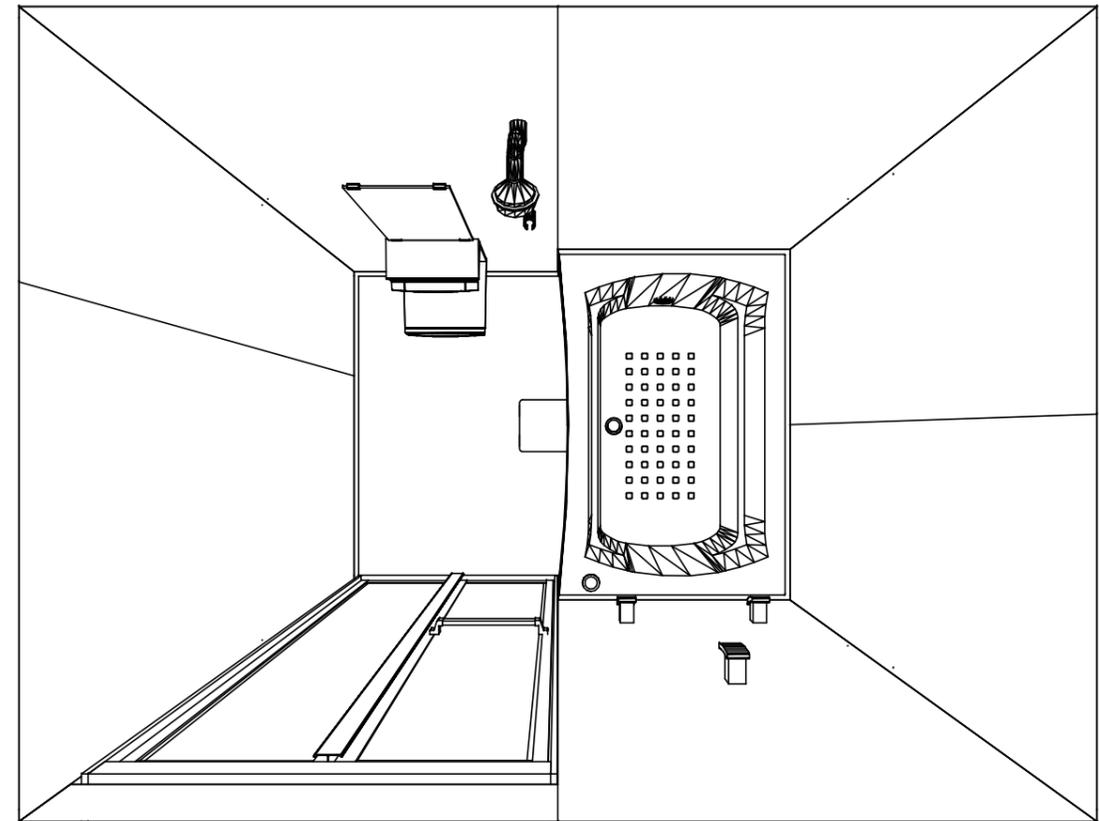

1216

ガラス繊維強化樹脂<FRP>浴槽

フラット天井

天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

Takara standard
タカラストANDARD株式会社

現場名称： 東京-新立川 SB9様邸

現場番号： C0354751

立川営業所

伸びの美浴室

プラン番号： 1404G-2004-0056T

担当営業： 小柳

姿図


作成日： 2020年4月7日

担当アドバイザー： 若林


縮尺：A3サイズ等倍





■留意事項
 ※印寸法は給水給湯管の
 突出寸法18mmを含みます。

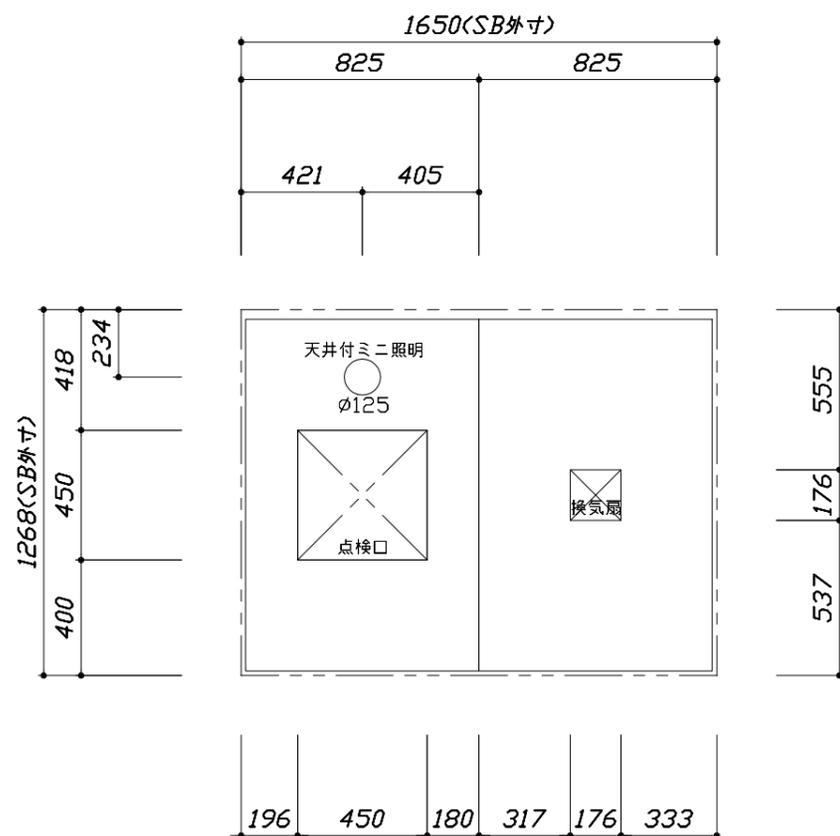

<天井伏図>

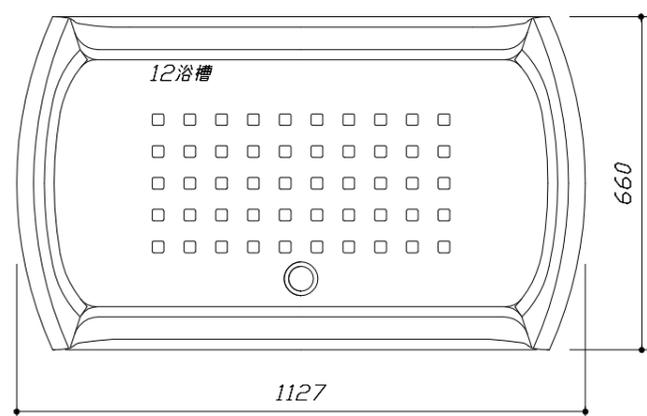

<浴槽詳細図>

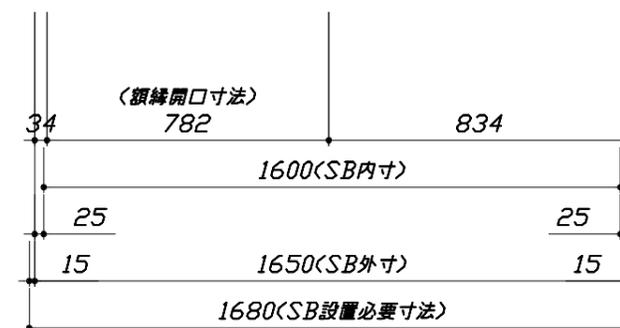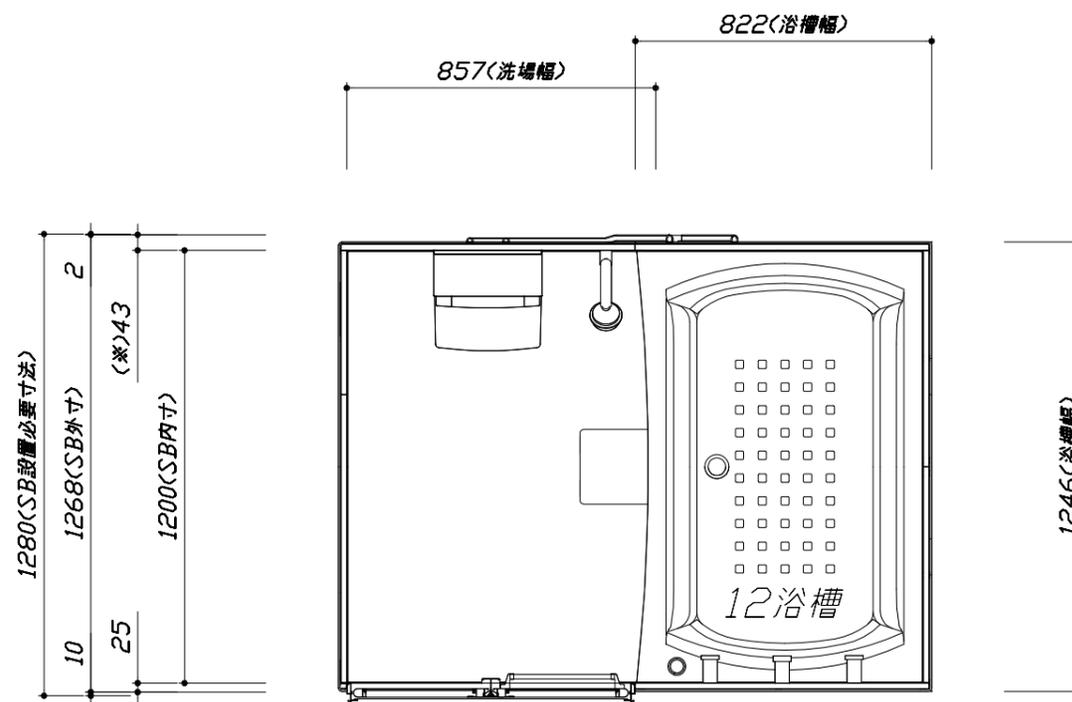

<平面図>

Takara standard
 タカラストANDARD株式会社



現場名称： 東京-新立川 SB9様邸
 現場番号： C0354751
 立川営業所

伸びの美浴室
 プラン番号： 1404G-2004-0056T
 担当営業： 小柳


施工図1
 縮尺： 1:25,20
 作成日： 2020年4月7日
 担当アドバイザー： 若林

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・12方向での柱間との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との打ち合わせを十分おこなってください。
- ・外寸は突出部を含みます。

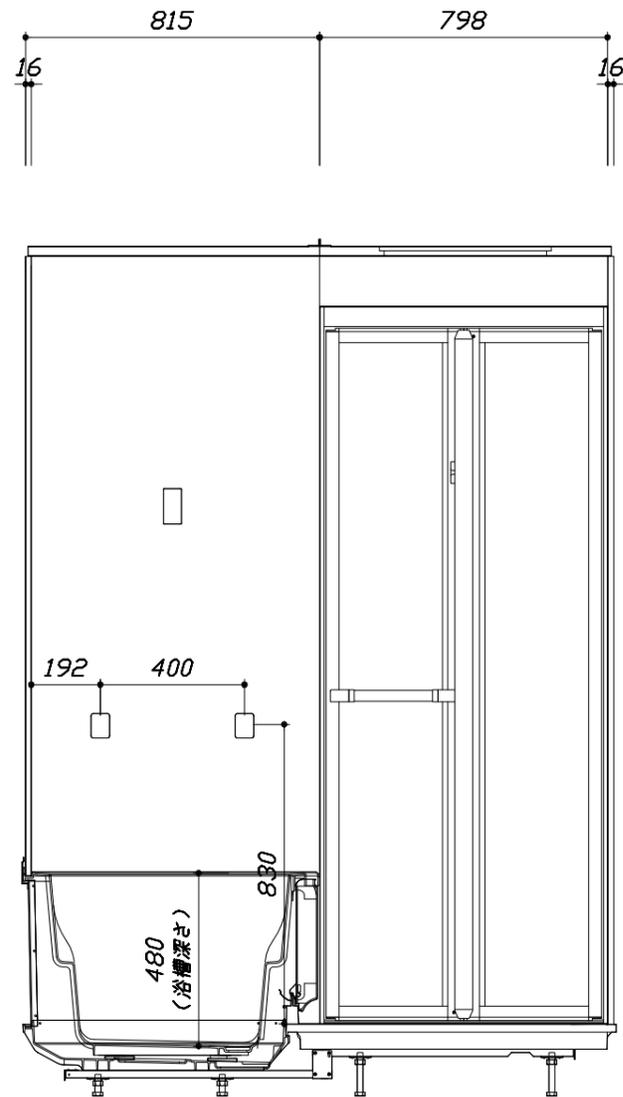

<カウンター対面図>



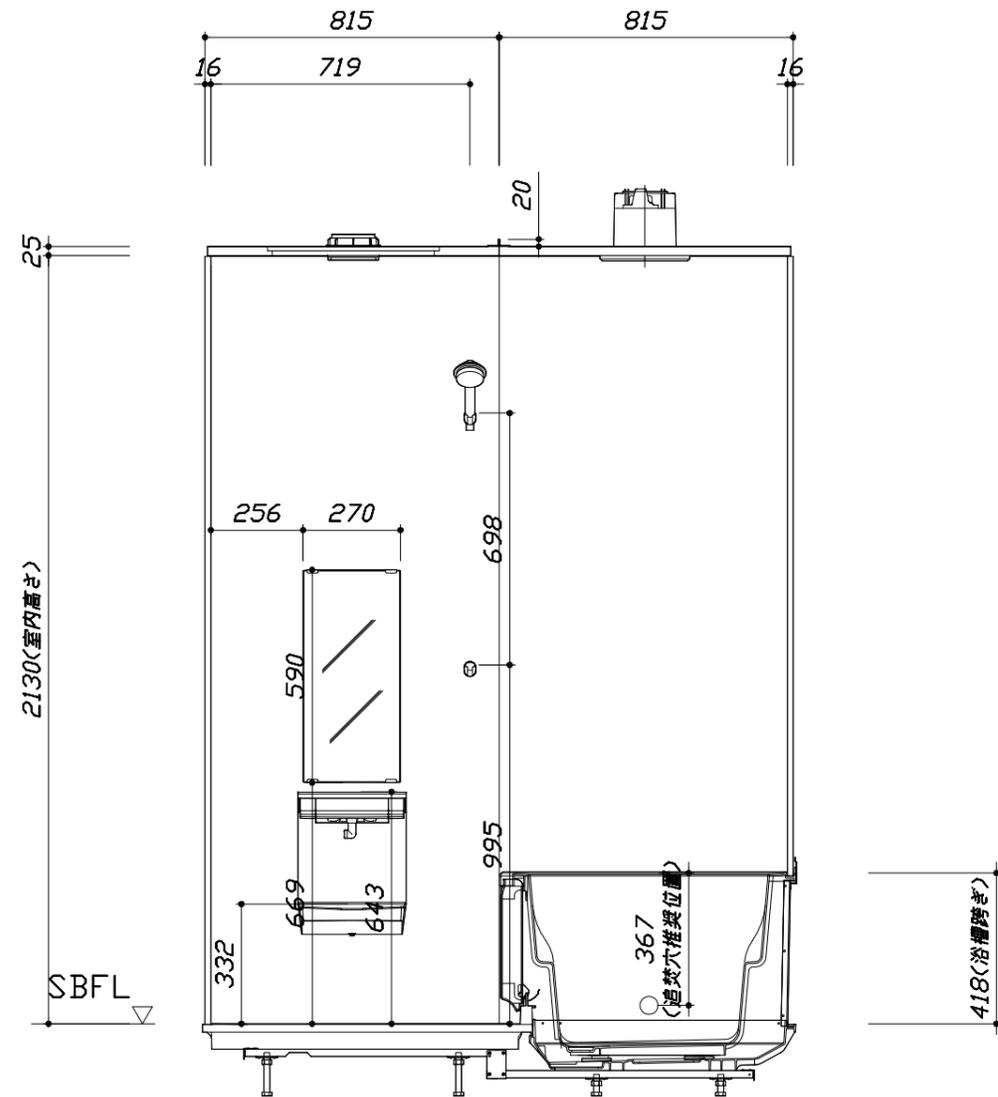


<カウンター面図>

■ボルト脚架台高さ寸法
 各ずり高さに対して
 -9~+11mm調整可能


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・12方向での柱間との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との打ち合わせを十分おこなってください。
- ・外寸は突出部を含みます。

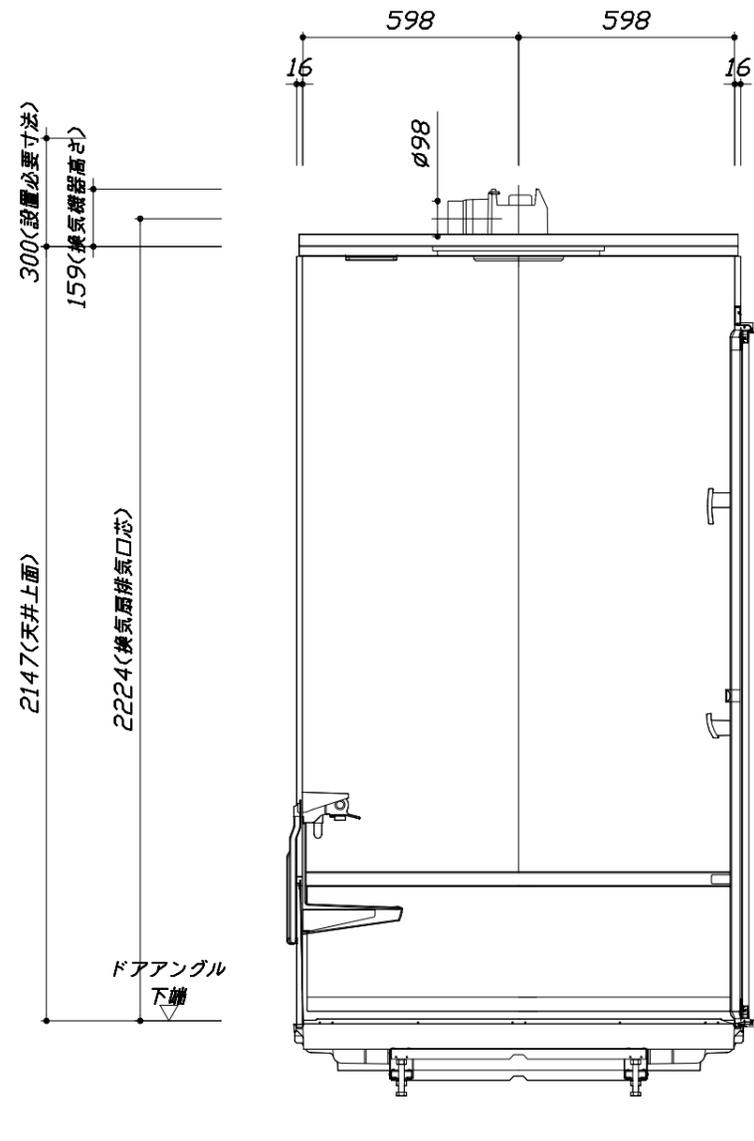

■ボルト脚架台高さ寸法
さすり高さに対して
-9~+11mm調整可能

< 浴槽側面図 >

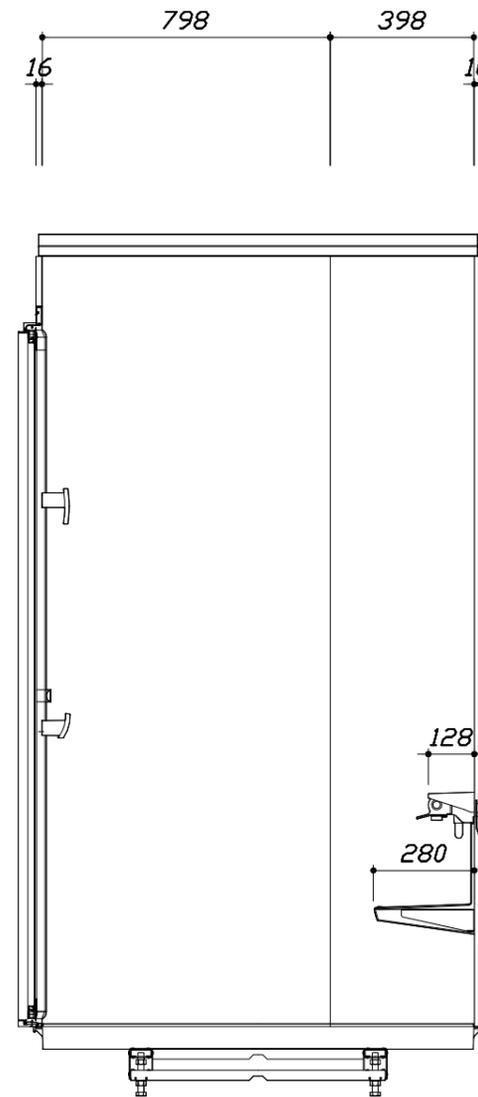

< 洗場側面図 >

Takara standard
タカラストANDARD株式会社


現場名称： 東京-新立川 SB9様邸
現場番号： C0354751
立川営業所

伸びの美浴室
プラン番号： 1404G-2004-0056T
担当営業： 小柳

施工図3
縮尺： 1:20
作成日： 2020年4月7日
担当アドバイザー： 若林




■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



■ 給水給湯管工事注意事項



- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

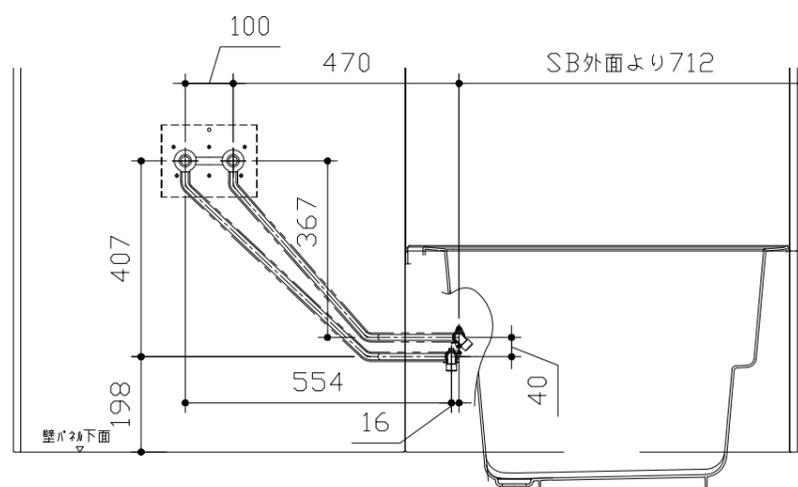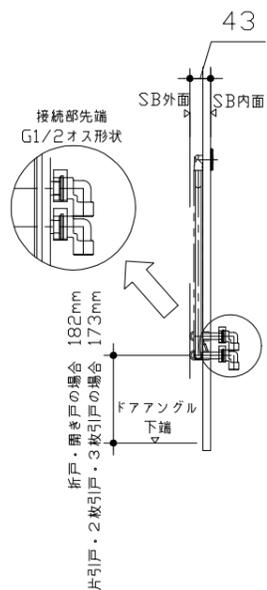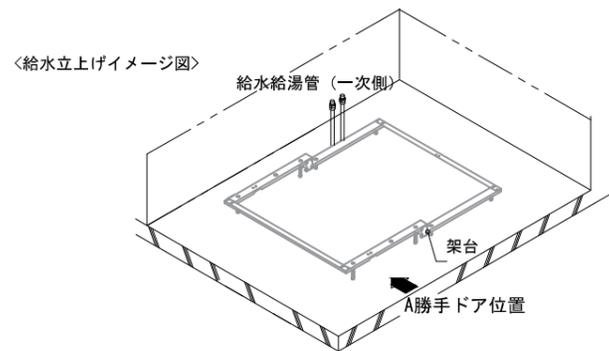

〈給水給湯管取合詳細図〉

■ 設備記号

記号	記号の意味
⊗	給水位置
⊙	給湯位置
▨	排水管立上げ推奨範囲 (VP50)

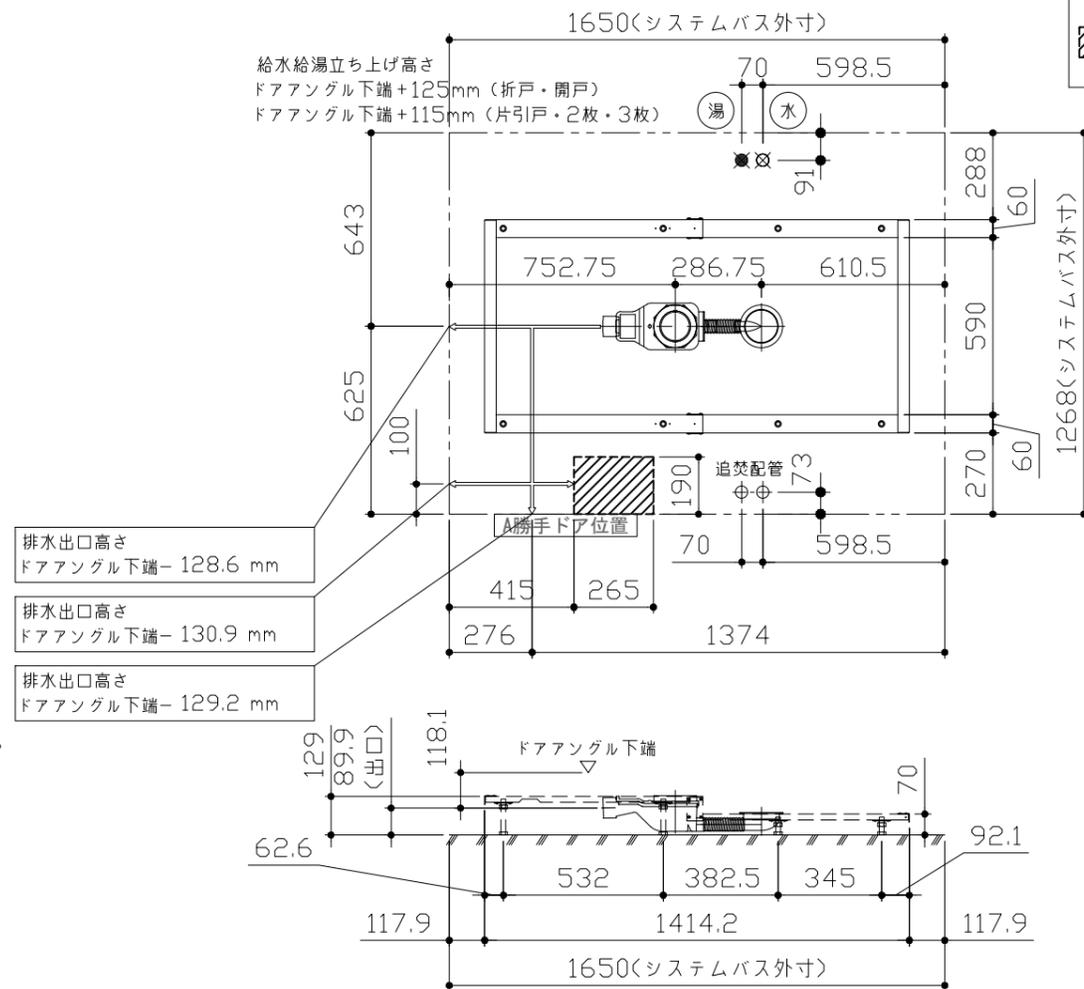

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・浴槽パンの配管導入口下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

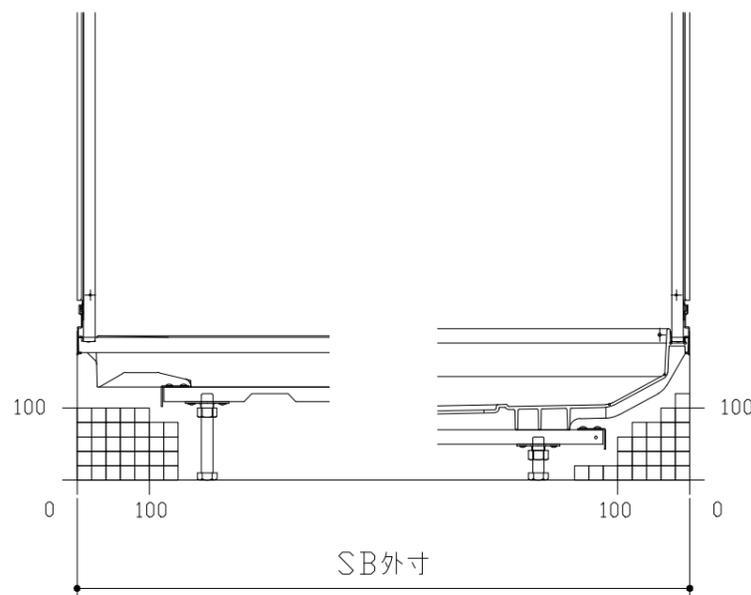


B矢視

A矢視

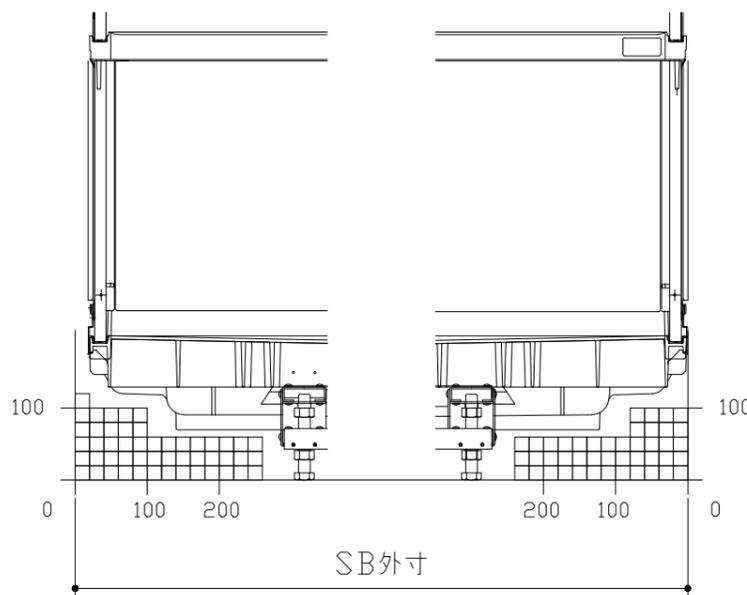

D矢視


C矢視

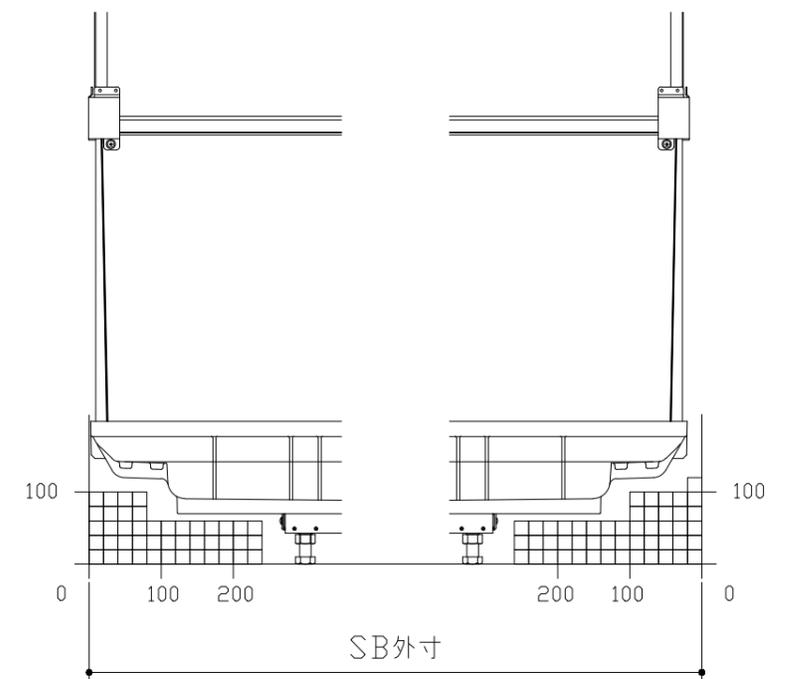

F矢視

E矢視



キープクリーンドア：折戸ホワイト（AWTオレド[®]8）

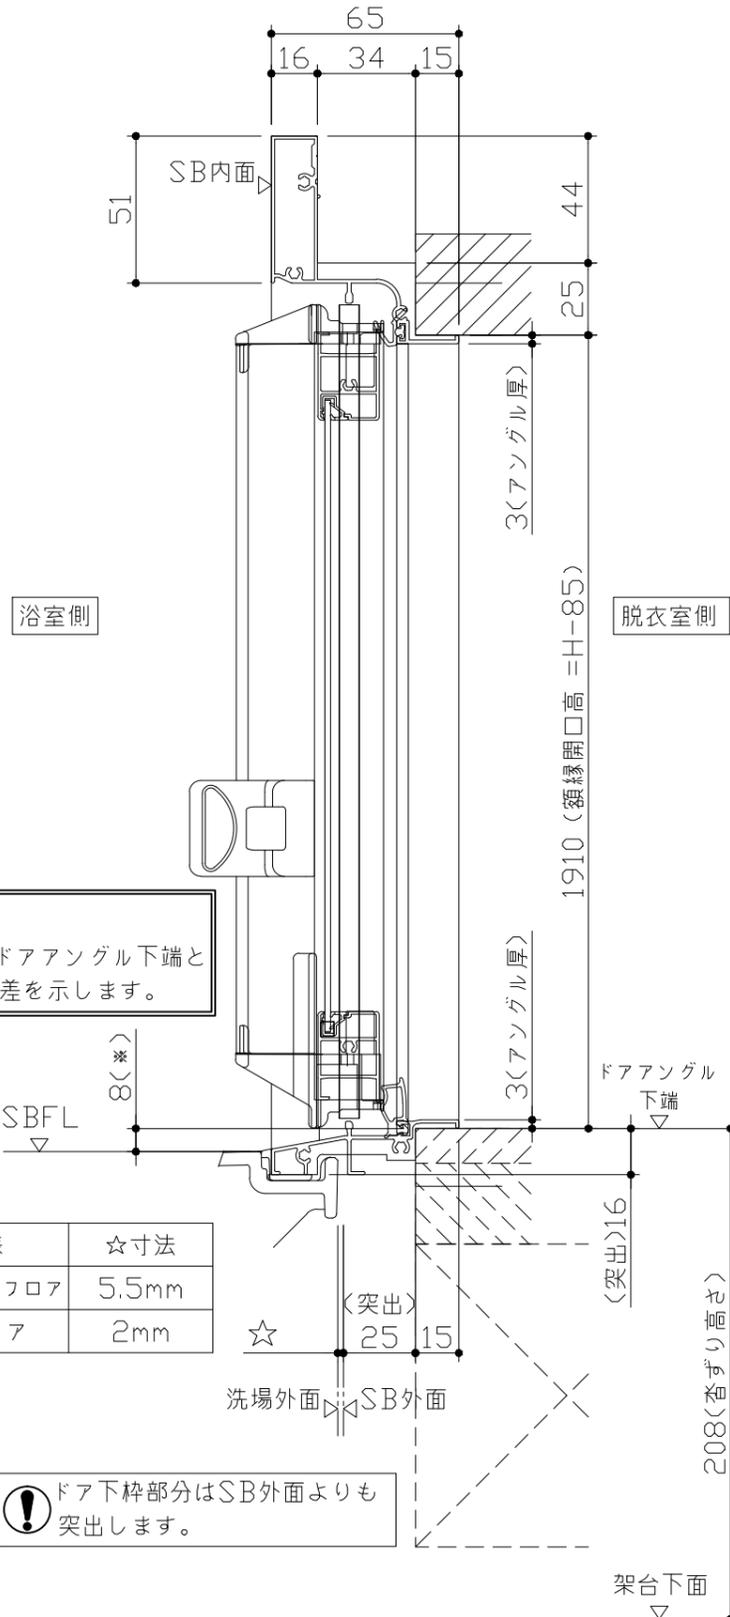

■ 留意事項
 * 印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm



⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

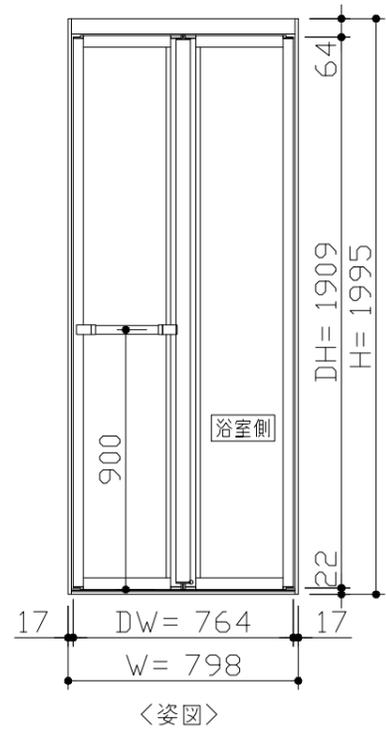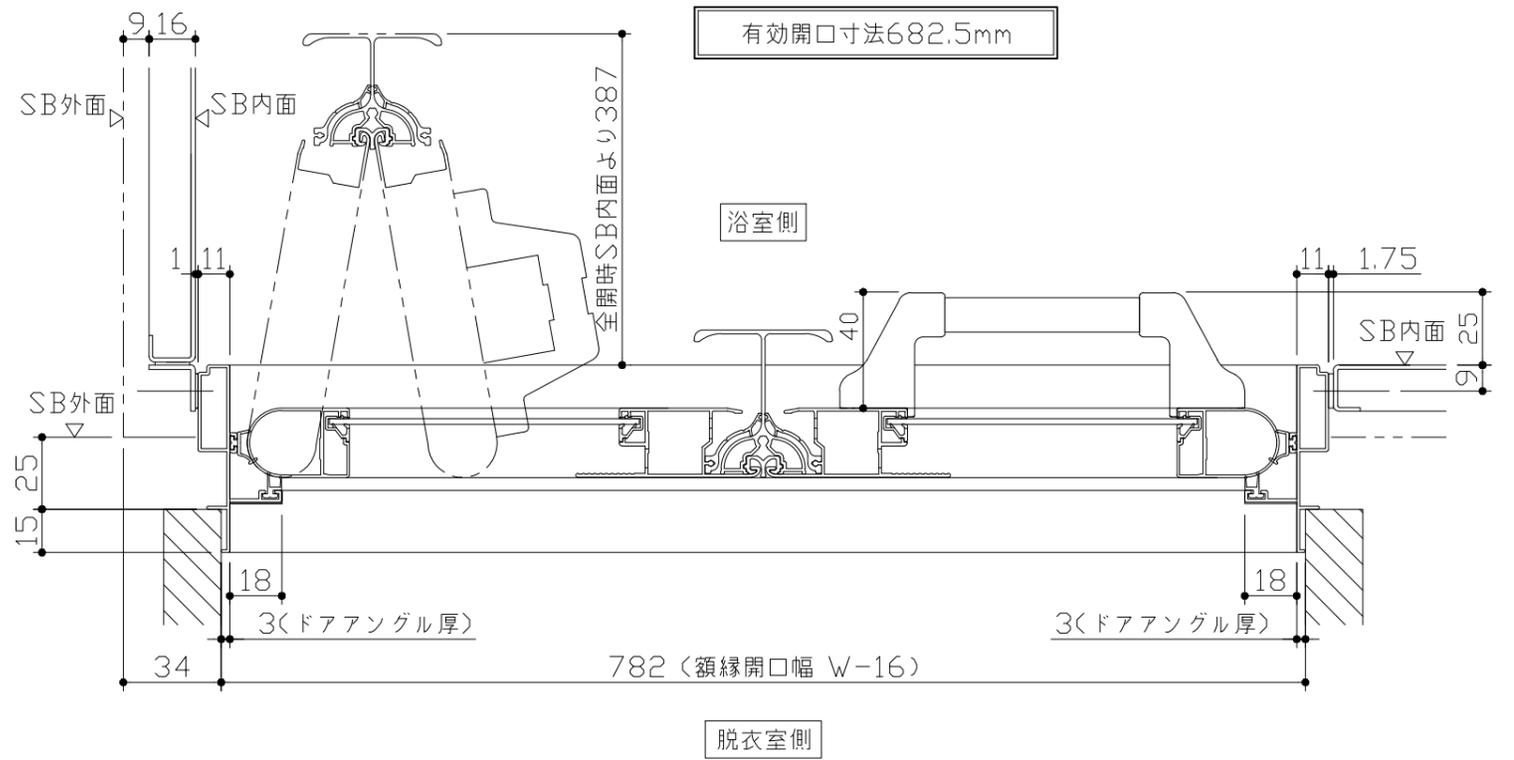

■ ドア横の管柱、間柱について

- ・ ドアが管柱、間柱にあたらぬよう十分に考慮してください。
- ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

<参考寸法図>

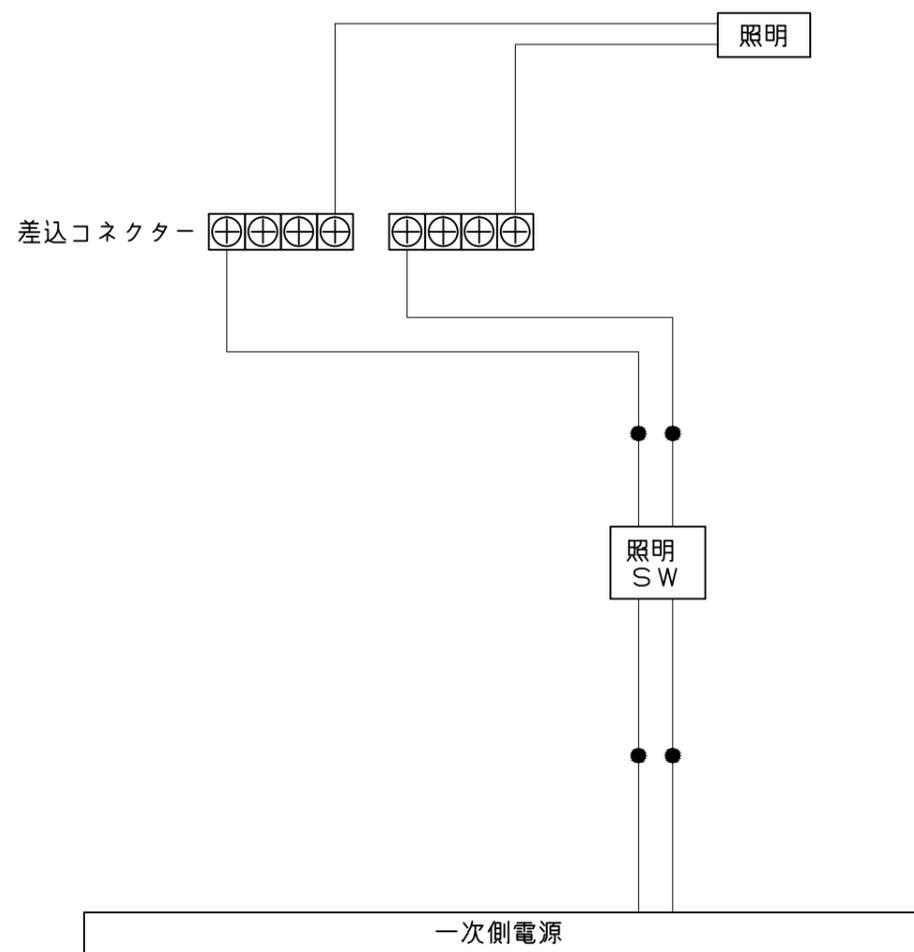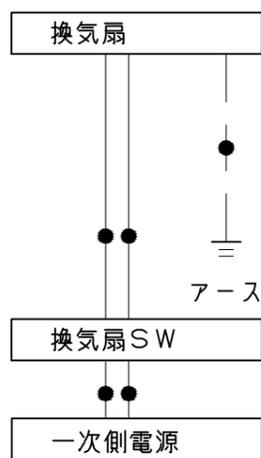

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。
