システムバス 御見積書

御名前　支社_福島SR SB1　様

業者　様

商品名　PREDENCIA　プレデンシア

商品
御見積金額　¥2,236,000　（ 税込 ¥2,459,600 ）

（　）内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

作成日　2025年8月9日
ﾌﾟﾗﾝ番号　7207B-2505-0108T
現場番号　C6437439

タカラスタンダード株式会社
◆福島ショールーム
福島県福島市東中央2-3-10

TEL 024-525-1231 / FAX 024-525-1232
◆郡山営業所
TEL 024-922-7617 / FAX 024-922-7823

担当営業	担当ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ	ﾌﾟﾗﾝ作成者
		遠藤（し）

※　商品御見積金額には商品組付費と現場配送費が含まれております。
※　給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》	
ユニットサイズ	1616（BL勝手）
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	チェッポビアンコ
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	プレシャスホワイト
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽
カウンター材質	クォーツストーン
カウンター/下カバーカラー	ブランソルベ　/　ホワイト
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	ステンレス　/　ベージュ
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー（正面）	ホワイトオニキス
パネルカラー（周辺）	アウリジーナフィオリート
ガス種　/　周波数	ー　/　50Hz

◆ 備考

◆ 御確認事項

No.＊

御名前　支社 福島SR SB1　様

現場番号	C6437439	プラン番号	7207B-2505-0108T	作成日	2025/8/9

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1616サイズ		1	1,227,000	1,227,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	片引戸＜800幅＞（ホワイト）／樹脂ガラス（半透明）（19サイズ）	1	+50,500	+50,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・周辺プレミアムクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア（プレミアムクラス・チェッポビアンコ）	1	+29,000	+29,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	鋳物ホーロー浴槽（高断熱浴槽）（プレシャスホワイト）	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス（保温材あり）（ベージュ）	1		
11	浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯（ジェットバス機能付）	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
16	洗い場用水栓	プッシュ式水栓：樹脂製ホース（メタル調）SB280	1	+71,000	+71,000
17	洗い場用水栓	ヒロカルシャワー（手元止水）：SB280LABHK	1		
18	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
19	カウンター	クオーツストーンカウンター（ラグジュアリーライトあり）	1	+89,000	+89,000
20	カウンター	クオーツストーンデュアルカウンター	1	+138,000	+138,000
21	浴槽前間接照明	ラグジュアリーライト	1	+13,500	+13,500
22	シャワーフックスライドバー	＜手すりタイプ＞（T1020S MH）	1	+9,000	+9,000
23	浴室パネル	プレミアムクラス（全面デザイン 周辺プレミアムクラス）（Kパネル）	1	+85,000	+85,000
24	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
25	天井	カラーフラット天井（ベージュ）	1		
26	換気機器	浴室暖房乾燥機（100V）ホワイト	1	+45,500	+45,500
27	換気機器	ランドリーパイプメタルタイプ（1本）	1	+1,500	+1,500
28	換気機器開口	工場開口	1		
29	照明	ストレートライン照明（調光・調色機能付・ラグジュアリーミラー/ライト対応用）	1	+91,000	+91,000
30	天井照明開口	工場開口	1		
31	ミラー	ラグジュアリーミラー（全幅タイプ）	1	+117,000	+117,000

御名前 支社 福島SR SB1 様

現場番号	C6437439	プラン番号	7207B-2505-0108T	作成日	2025/8/9

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
33	タオル掛け	クリアタイプ クリア	1		
34	収納棚	収納棚なし	1	−17,000	−17,000
35	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
36	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
37	トラップカバー	洗い場側トラップカバー	1		
38	トラップカバー	浴槽側トラップカバー（浴槽パンあり）	1		
39	ブロック積用ボンド	2段用	1	+2,000	+2,000
	システムバス合計		39		¥1,980,500

商品総合計	39	¥1,980,500

	商品組付費	数量	金額
1	本体組付費	1	247,500
	商品組付費合計		¥247,500

	その他費用	数量	金額
	現場配送費	1	8,000
	配送費他合計		¥8,000

商品御見積金額	¥2,236,000

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。
※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

パース

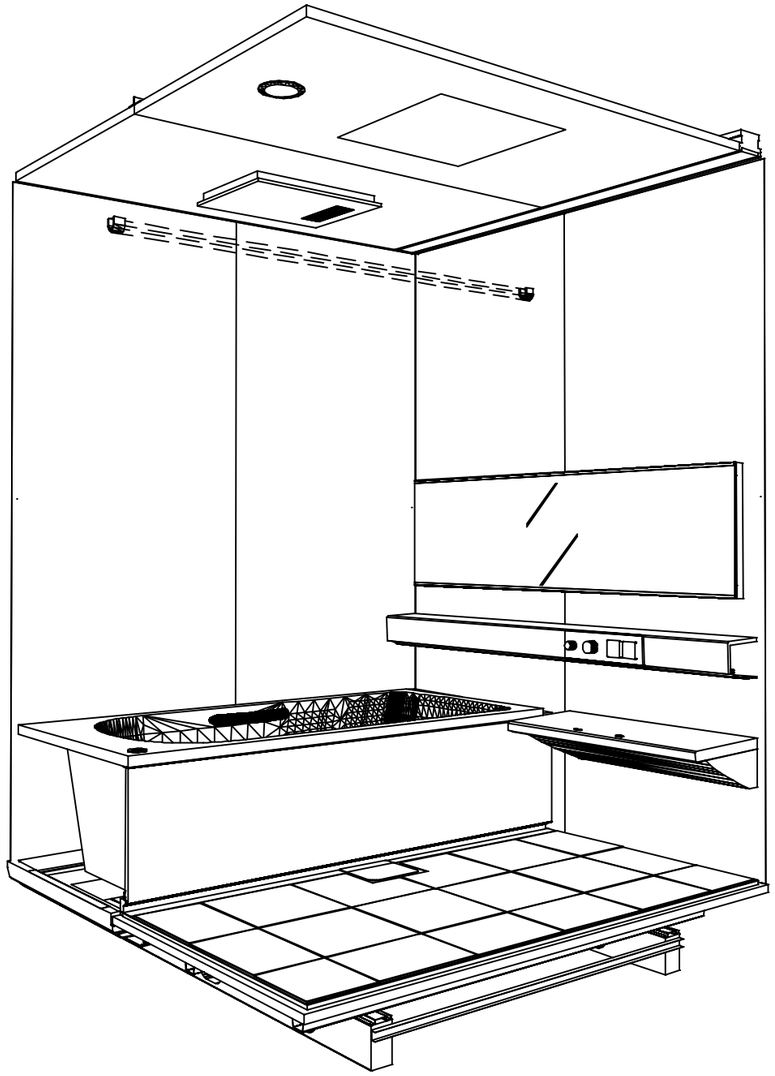

鳥瞰図

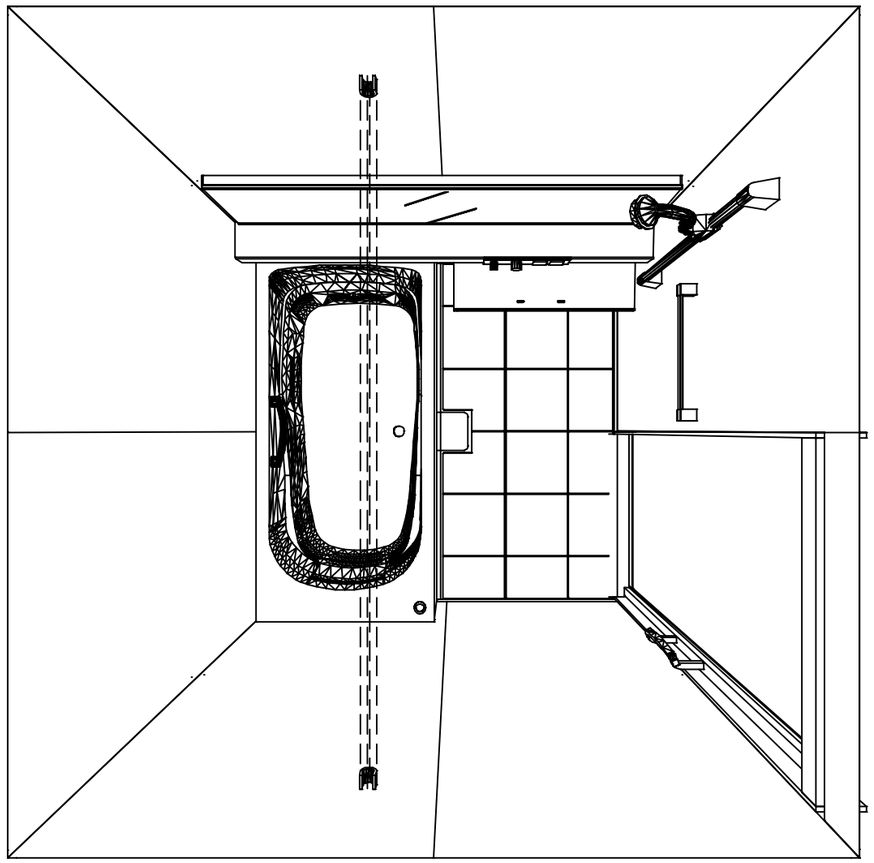

1616

フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 支社_福島SR SB1様邸	PREDENCIA プレデンシア	姿図
	現場番号： C6437439	プラン番号： 7207B-2505-0108T	作成日： 2025年8月9日
	福島ショールーム	担当営業 ：	担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍
