システムバス 御見積書

御名前　新三重-津SR SB3　様

業者　様

商品名　PREDENCIA　プレデンシア

作成日　2018年9月7日
ﾌﾟﾗﾝ番号　5901A-1808-0517T
現場番号　A9056411

タカラスタンダード株式会社
◆三重支店
三重県津市高茶屋小森上野町2793-2
TEL 059-234-5711 / FAX 059-234-9203

◆津ショールーム
TEL 059-234-9843 / FAX 059-234-2490

商品
御見積金額　￥1,027,800　（税込 ￥1,110,024）

（　）内の価格は税込価格＜税率8%＞を表示しています。

《参考》別途 商品組付費　￥195,000　（税込 ￥210,600）

※　商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※　商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
　　又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ	ﾌﾟﾗﾝ作成者
3	1616ﾗｳﾝﾄﾞ	展2018.7

◆ 御見積仕様

《システムバス》	
ユニットサイズ	1616（AR勝手）
洗い場仕様	ｷｰﾌﾟｸﾘｰﾝﾌﾛｱ(ﾊｲｸﾗｽ)
浴槽材質	鋳物ホーロー
カラー	ミストローズ
形状	ラウンド浴槽
浴槽・風呂フタ	高断熱仕様
カウンター材質	アクリル人造大理石
カラー	ミストローズ
エプロン材質	ステンレス（カラーコーティング）
カラー	ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
カラー	フェミニンマーブル
ガス種	未定
周波数	60Hz

◆ 備考

ﾌﾟﾗｲｽ表示価格　1,009,500円
循環金具12,500円　MG小物5,800円

◆ 御確認事項

No.*

御名前 新三重-津SR SB3 様

現場番号	A9056411	プラン番号	5901A-1808-0517T	作成日	2018/9/7

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1616サイズ		1	1,038,000	1,038,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	キープクリーンドア:折戸＜800mm幅＞(ホワイト)(19サイズ)	1		
4	洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームベージュ)	1		
5	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)	1		
6	排水口カバー	ステンレス	1		
7	浴槽追炊き穴	あり	1		
8	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)	1		
9	浴槽形状	16ラウンド浴槽	1		
10	ヘルシージェット	なし	1		
11	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1		
12	ガス温水式床暖房	なし	1		
13	洗い場用水栓	サーモ水栓(メタルホース)SB181-5UT	1	-26,000	-26,000
14	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド	1		
15	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
16	カウンター	人大スクエアカウンター	1		
17	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(TN-90)	1		
18	浴室パネル	プレミアムクラス(一面デザイン)	1	+15,000	+15,000
19	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
20	天井	高光沢フラット天井	1		
21	換気機器	天井換気扇	1		
22	換気機器開口	工場開口	1		
23	照明	ダウンライト照明(3灯)(電球色)	1	-8,000	-8,000
24	天井照明開口	工場開口	1		
25	ミラー	横長クリアミラー	1	-1,500	-1,500
26	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
27	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-4,000	-4,000
28	収納棚	クリアタイプ(2段)	1	-4,000	-4,000
29	どこでもラック	タオルハンガーL(ホワイト)	1	+2,800	+2,800
30	どこでもラック	マルチラック＋フック(ホワイト)	1	+3,000	+3,000
31	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500

御名前 新三重-津SR SB3 様

現場番号	A9056411	プラン番号	5901A-1808-0517T	作成日	2018/9/7

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
33	トラップカバー	なし	1		
	システムバス合計		33		¥1,027,800

商品総合計		33	¥1,027,800

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費 ¥195,000（税込 ¥210,600）

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

（ ）内の価格は税込価格＜税率8%＞を表示しています。

パース

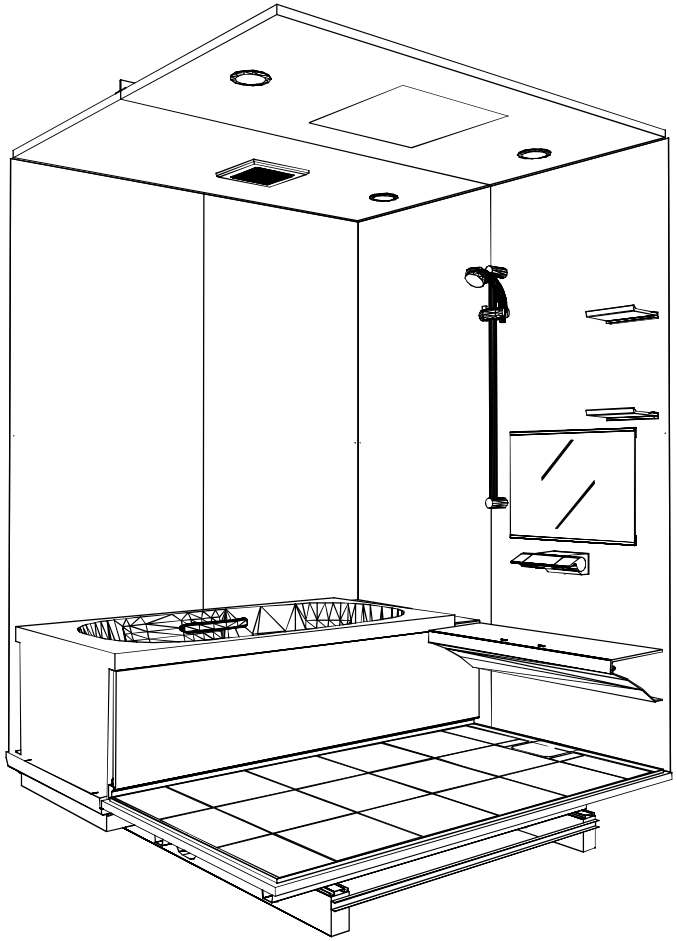

鳥瞰図

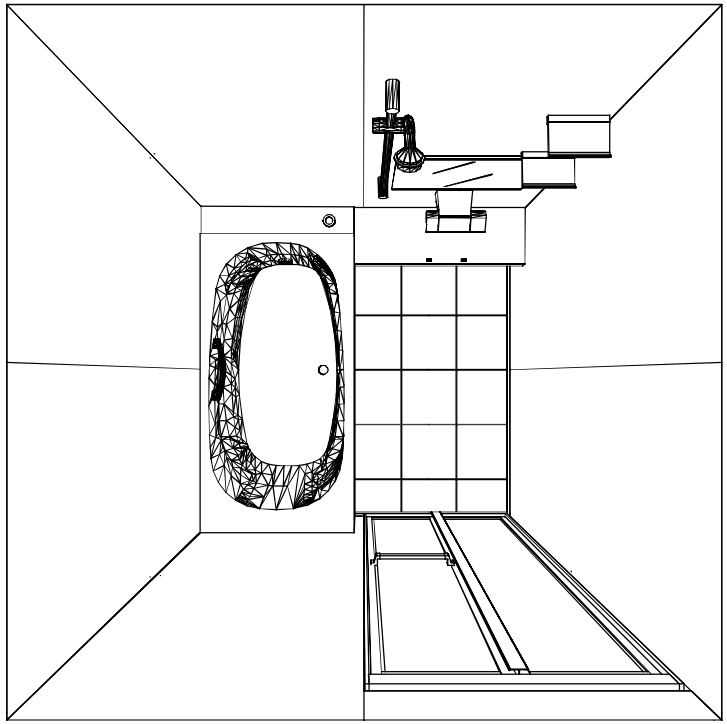

1616
鋳物ホーロー浴槽
高光沢フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 新三重一津SR SB3様邸	PREDENCIA プレデンシア	姿図
	現場番号： A9056411	プラン番号： 5901A-1808-0517T	作成日： 2018年9月7日
	三重支店	担当営業 ： 3	担当アドバイザー： 1616ﾗｳﾝﾄﾞ

縮尺：A3サイズ等倍

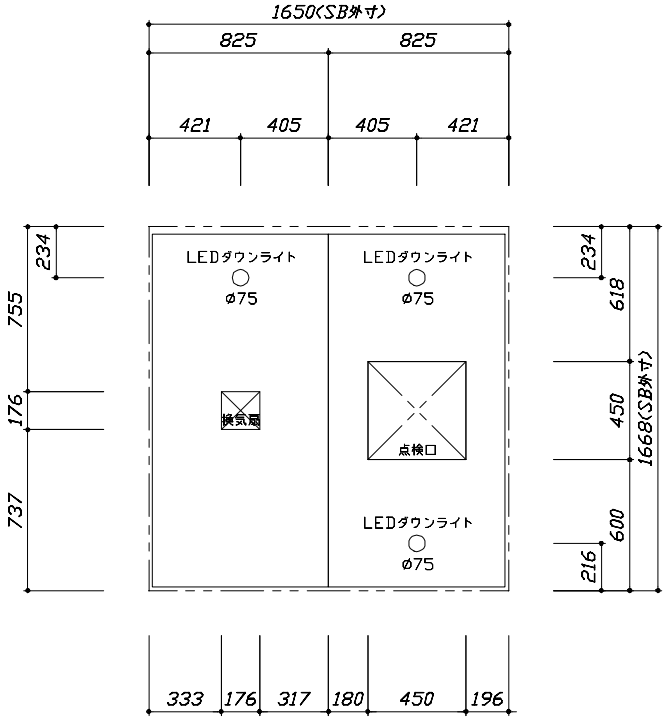

＜天井伏図＞

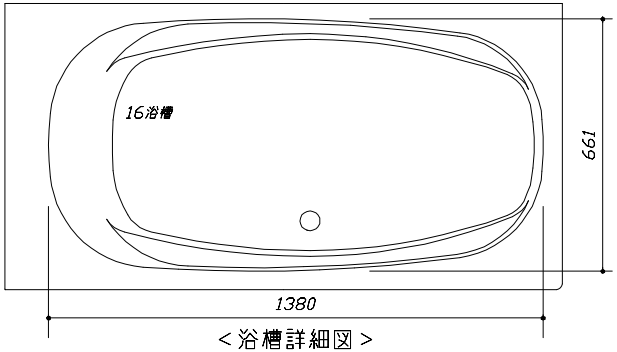

＜浴槽詳細図＞

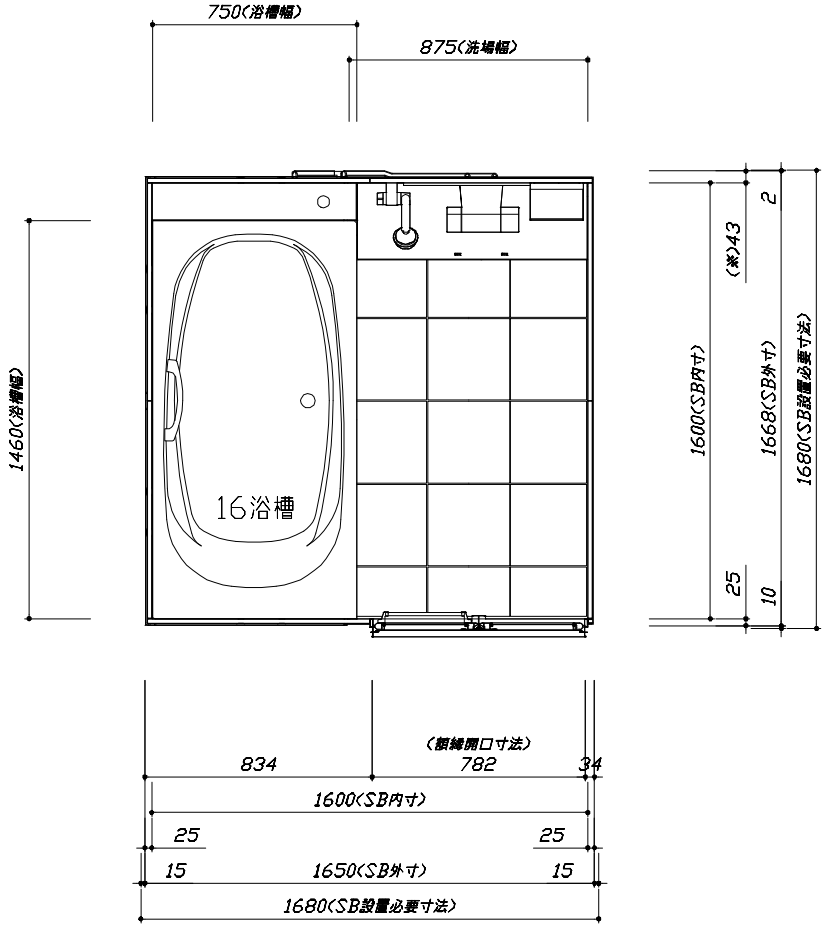

＜平面図＞



■留意事項
＊印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 新三重ー津SR SB3様邸	PREDENCIA プレデンシア	施工図1 縮 尺： 1:25,20
	現場番号： A9056411	プラン番号： 5901A-1808-0517T	作成日： 2018年9月7日
	三重支店	担当営業 ： 3	担当アドバイザー： 1616ﾗｳﾝﾄﾞ

縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認お願いします。
・外寸は突出部を含みます。
・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。



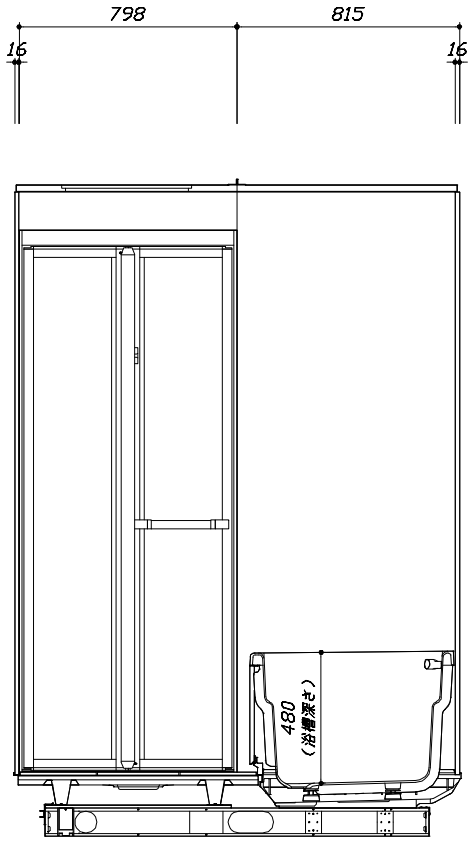

<カウンター対面図>

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

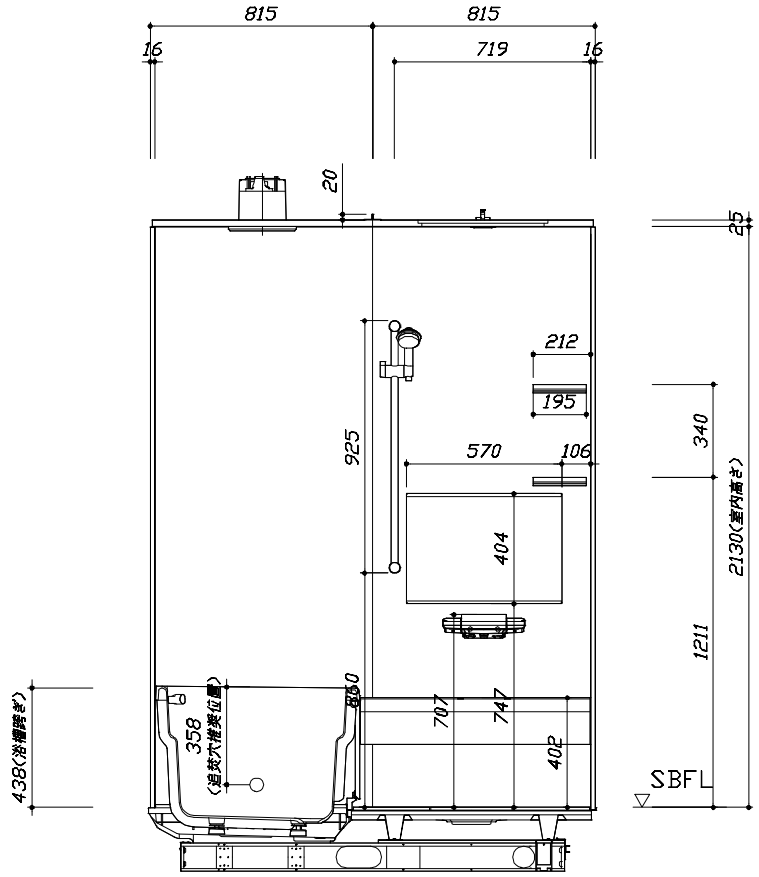

<カウンター面図>

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 新三重一津SR SB3様邸	PREDENCIA プレデンシア	施工図2 / 縮 尺： 1:20
	現場番号： A9056411	プラン番号： 5901A-1808-0517T	作成日： 2018年9月7日
	三重支店	担当営業 ： 3	担当アドバイザー： 1616ｳﾝﾄﾞ

縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認お願いします。
・外寸は突出部を含みます。
・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。



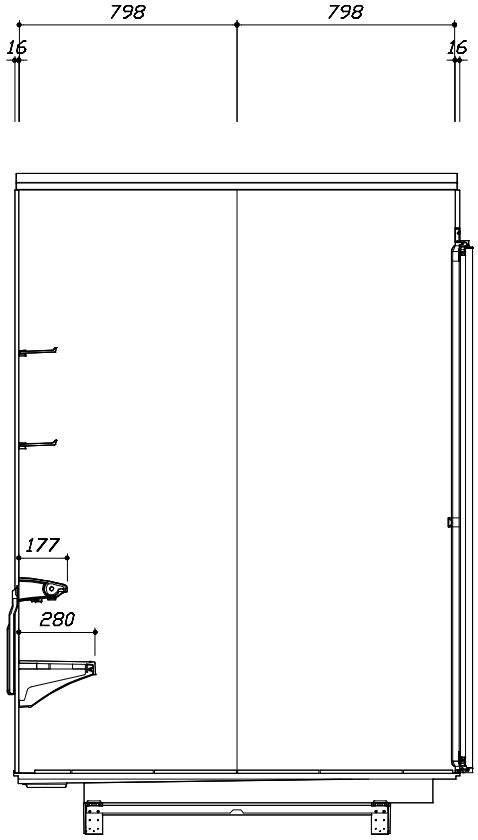

＜洗場側面図＞

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
（クリア寸法含む）

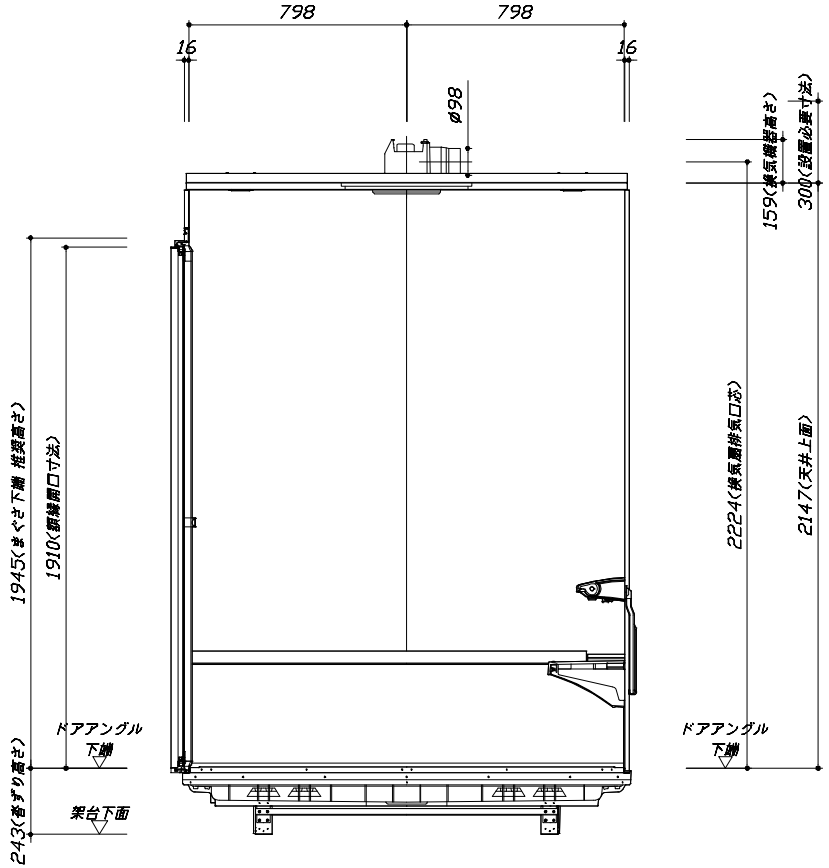

＜浴槽側面図＞

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 新三重一津SR SB3様邸	PREDENCIA プレデンシア	施工図3 縮 尺： 1:20
	現場番号： A9056411	プラン番号： 5901A-1808-0517T	作成日： 2018年9月7日
	三重支店	担当営業 ： 3	担当アドバイザー： 1616ﾗｳﾝﾄﾞ

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	AR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼　保温材内蔵
浴槽材質	鋳物ホーロー 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ラウンド浴槽 グリップ付（280リットル） 追い焚き穴:あり
浴槽パン	ガラス強化繊維樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング)　 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	スクエアカウンター：アクリル人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー　裏面保温材　タオル掛け穴:なし
天井	高光沢ﾌﾗｯﾄ天井：高光沢ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス)
窓１	ー
窓２	ー
窓枠１	ー
窓枠２	ー
排水トラップ	洗い場:ＡＢＳ樹脂,　浴槽:ＡＳＡ樹脂　　封水50㎜
雑排水配管	硬質塩ビパイプ　VU50
製品重量	410kg

アクセサリー仕様表

ミラー	横長クリアミラー くもり止め加工
収納棚	クリアタイプ：ｱｸﾘﾙ樹脂製（2段）
タオル掛け	ー
洗場側水栓	ｻｰﾓｼｬﾜｰ付(ﾒﾀﾙﾎｰｽ仕様・SB181-5UTB1)
浴槽側水栓	ー
兼用水栓	ー
スライドバー	TN-90
照明	LEDダウンライト（LED 15W電球色）（3灯）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W)(ﾀﾞｸﾄ径φ98)
フロフタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	ー
ハンドバー②	ー
ハンドバー③	ー
ハンドバー④	ー
ハンドバー⑤	ー
ハンドバー⑥	ー
ハンドバー⑦	ー

本体カラー

浴槽	PN：ミストローズ
カウンター	PN：ミストローズ
ﾊﾟﾈﾙ(ｶｳﾝﾀｰ面)	MP：フェミニンマーブル
ﾊﾟﾈﾙ(周辺・3面)	W：ホワイト
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	HD：カームベージュ
ドア	W：ホワイト
収納棚	クリアタイプ
タオル掛け	ー
ﾗﾝﾄﾞﾘｰｾｯﾄ	ー

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称：　新三重－津SR SB3様邸	PREDENCIA　プレデンシア	仕様表	
現場番号：　A9056411	プラン番号：　5901A-1808-0517T	作成日：　2018年9月7日	
三重支店	担当営業　：　3	担当アドバイザー：　1616ﾗｳﾝﾄﾞ	

■ 排水配管工事注意事項

●雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
●2重トラップにしないでください。
●配管途中で配管径を狭めないでください。
●排水勾配は1/100～1/50設けてください。
●排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
●立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



■ 給水給湯管工事注意事項

●給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
●給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
●給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

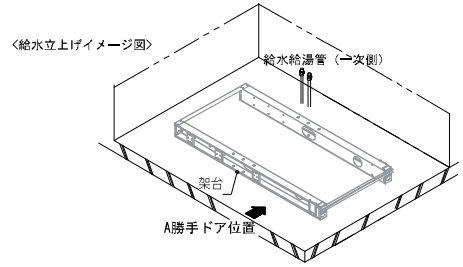

■土間コンクリート仕上げ寸法
ドアアングル下端より２６５mm下がりで打設してください。

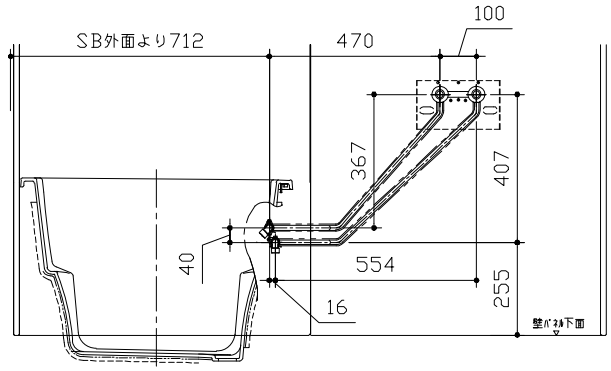



〈給水給湯管取合詳細図〉

■設備記号

記号	記号の意味
⊠	給水位置
■	給湯位置



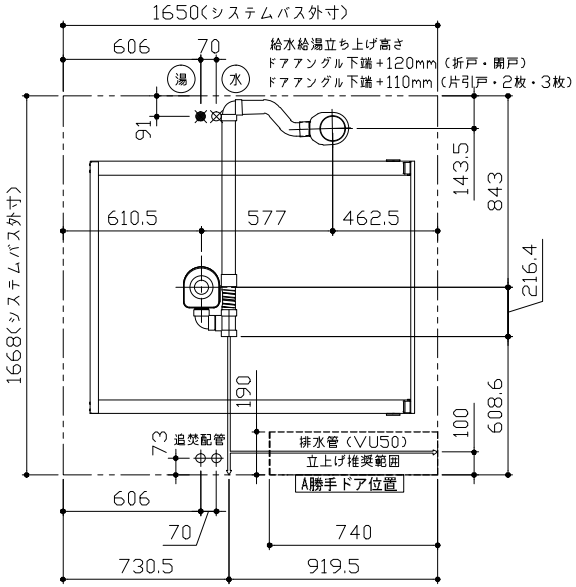

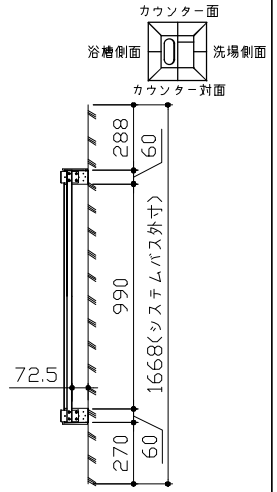



〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 新三重−津SR SB3様邸	PREDENCIA プレデンシア	排水配管図
	現場番号： A9056411	プラン番号： 5901A-1808-0517T	作成日： 2018年9月7日
	三重支店	担当営業 ： 3	担当アドバイザー： 1616ﾗｳﾝﾄﾞ

■必ずご確認ください
（１）図面の見方
・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
・マス表示：□=20mm角

（２）留意事項
・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。







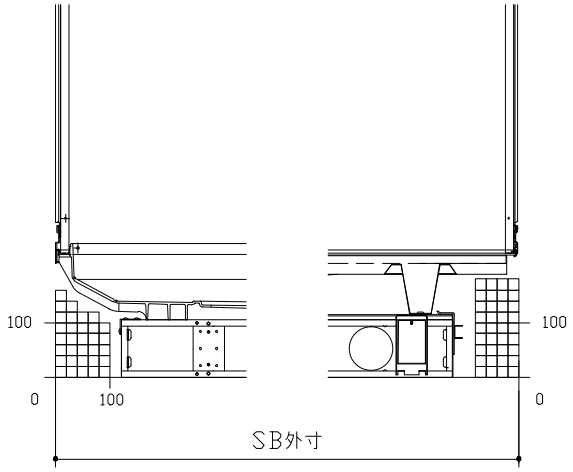

A矢視　B矢視

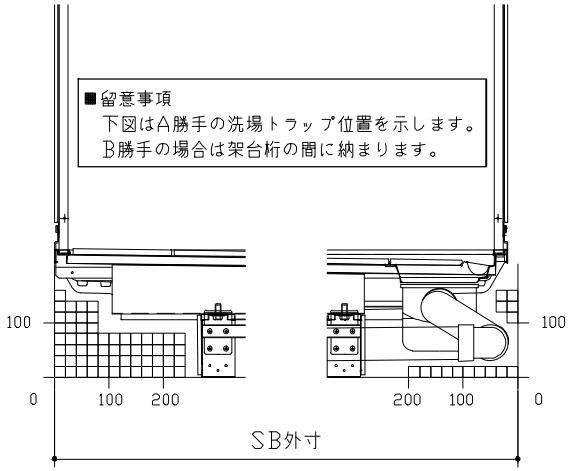

C矢視　D矢視

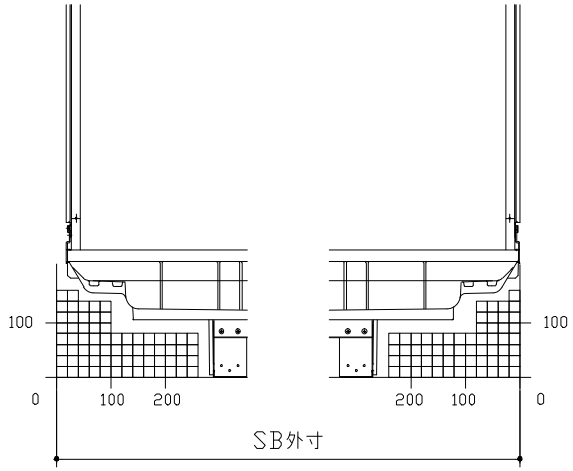

E矢視　F矢視

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 新三重一津SR SB3様邸	PREDENCIA プレデンシア	床下空間図
	現場番号： A9056411	プラン番号： 5901A-1808-0517T	作成日： 2018年9月7日
	三重支店	担当営業 ： 3	担当アドバイザー： 1616ﾗｳﾝﾄﾞ

キープクリーンドア：折戸ホワイト（AWTｵﾚﾄﾞ8）

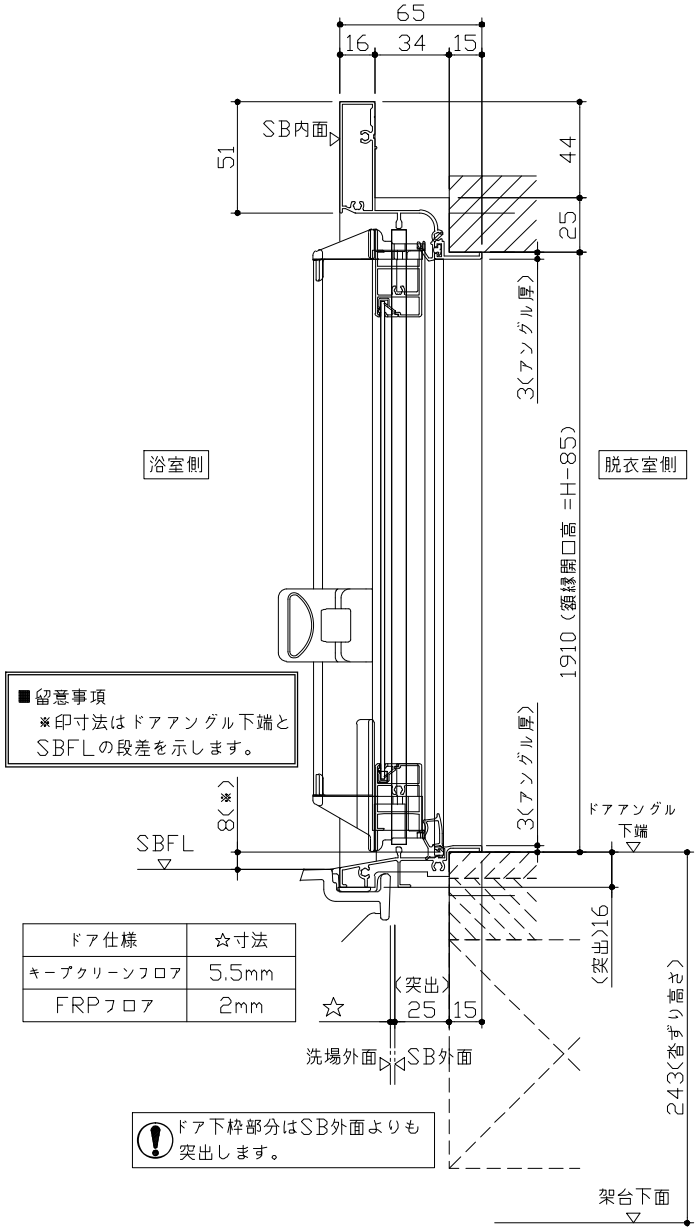

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

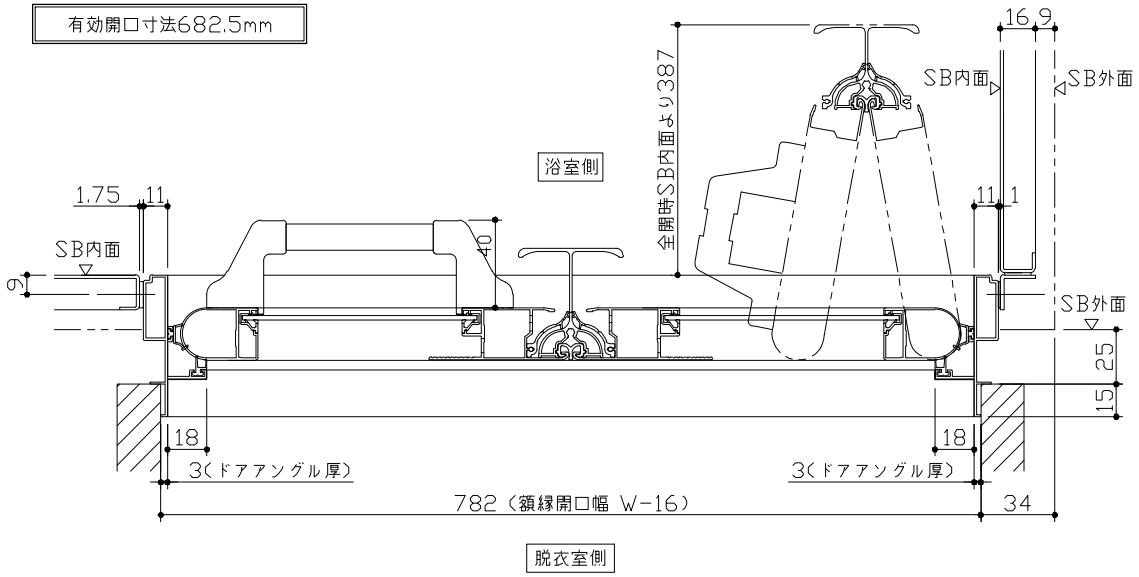

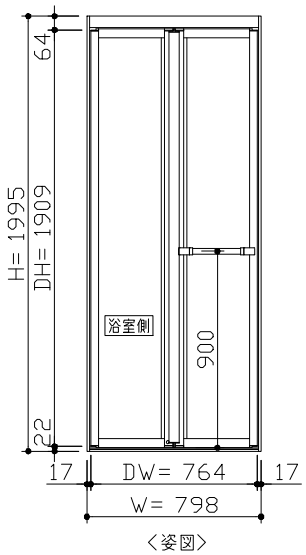

■ドア横の管柱、間柱について
- ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 新三重ー津SR SB3様邸	PREDENCIA プレデンシア	ドア取合詳細図
	現場番号： A9056411	プラン番号： 5901A-1808-0517T	作成日： 2018年9月7日
	三重支店	担当営業 ： 3	担当アドバイザー： 1616ﾗｳﾝﾄﾞ

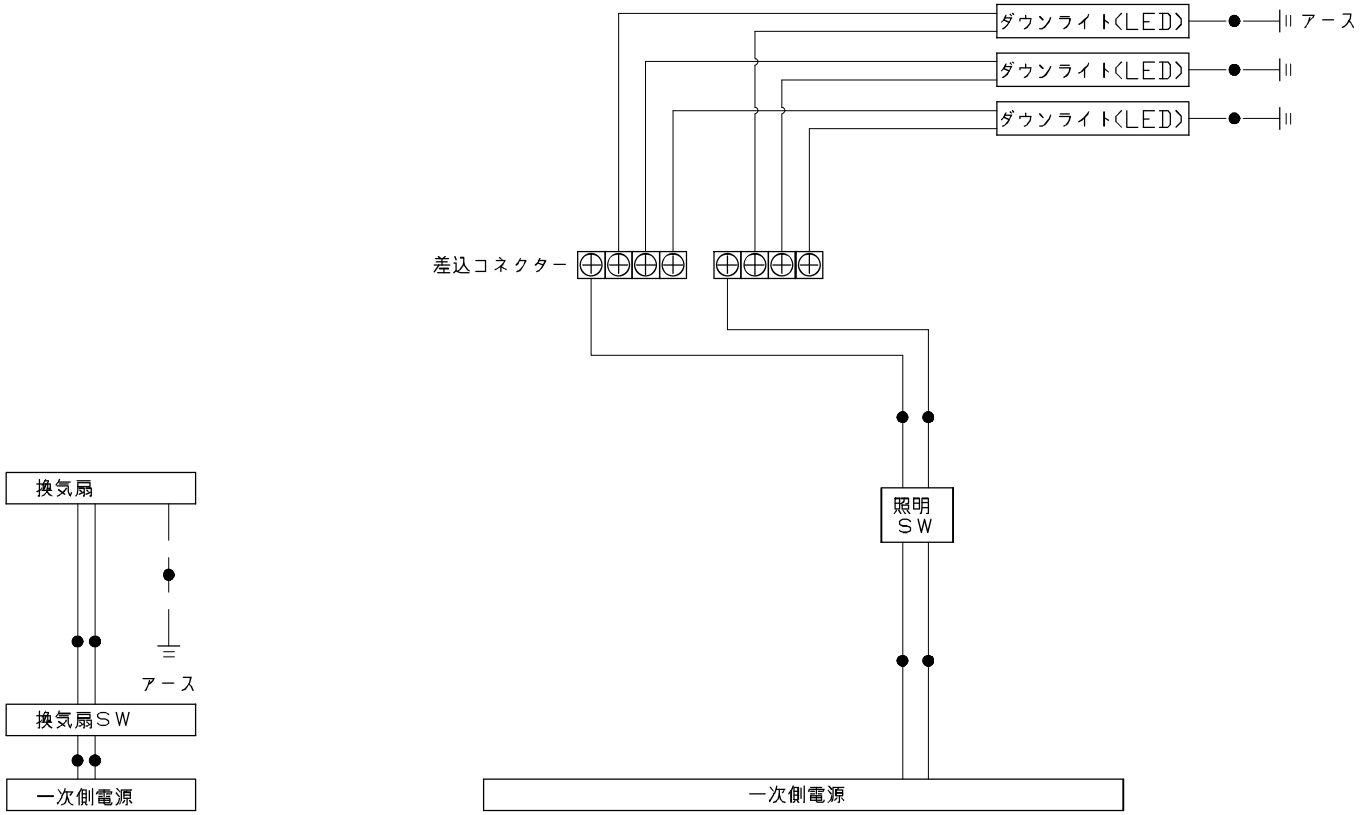

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 新三重一津SR SB3様邸	PREDENCIA プレデンシア	電気配線図
	現場番号： A9056411	プラン番号： 5901A-1808-0517T	作成日： 2018年9月7日
	三重支店	担当営業 ： 3	担当アドバイザー： 1616ﾗｳﾝﾄﾞ
